

基本設施補助計畫 108 年度第 2 季執行情形季報

國家發展委員會

108 年 7 月

目 次

壹、前言	- 1 -
貳、執行概況	- 5 -
一、108 年第 2 季(截至 6 月底)基本設施管考重點	- 5 -
二、截至 108 年 6 月整體概況	- 8 -
三、預算執行情形	- 10 -
四、標案落後情形	- 16 -
參、建議事項	- 27 -
肆、附表	- 29 -
附表 1、預算執行情形一覽表	- 29 -
附表 2、各縣市預算執行進度—依計畫類別	- 31 -
附表 3、落後標案統計表—依計畫類別	- 32 -
附表 4、落後標案統計表—依查核點	- 33 -
附表 5、落後標案統計表—依縣市別、落後原因	- 34 -
伍、各縣市執行分析	- 35 -
1. 新北市	- 35 -
2. 臺北市	- 39 -
3. 桃園市	- 42 -
4. 臺中市	- 45 -
5. 臺南市	- 48 -

6. 高雄市.....	- 53 -
7. 宜蘭縣.....	- 58 -
8. 新竹縣.....	- 61 -
9. 苗栗縣.....	- 68 -
10. 彰化縣.....	- 77 -
11. 南投縣.....	- 81 -
12. 雲林縣.....	- 88 -
13. 嘉義縣.....	- 92 -
14. 屏東縣.....	- 99 -
15. 臺東縣.....	- 102 -
16. 花蓮縣.....	- 109 -
17. 澎湖縣.....	- 114 -
18. 基隆市.....	- 118 -
19. 新竹市.....	- 128 -
20. 嘉義市.....	- 132 -
21. 金門縣.....	- 142 -
22. 連江縣.....	- 151 -

圖 次

圖 1 基本設施補助-依計畫類別.....	- 1 -
圖 1- 1 基本設施補助-文化類.....	- 2 -
圖 1- 2 基本設施補助-體育類.....	- 2 -
圖 1- 3 基本設施補助-補助貧瘠鄉鎮市類.....	- 3 -
圖 1- 4 基本設施補助-道路養護及道安計畫類.....	- 3 -
圖 1- 5 基本設施補助-交通建設類.....	- 3 -
圖 1- 6 基本設施補助-水利建設類.....	- 3 -
圖 1- 7 基本設施補助-農業建設類.....	- 4 -
圖 1- 8 基本設施補助-公有建物及設施類.....	- 4 -
圖 1- 9 基本設施補助-其他類.....	- 4 -
圖 2 基本設施補助-依縣市別.....	- 4 -
圖 3 各縣市 6 月份預算分配比例.....	- 6 -

圖 4 各縣市 6 月份發包率	- 7 -
圖 5 各縣市 6 月份預算達成率	- 8 -
圖 6 預算達成率—各縣市分布圖	- 10 -
圖 7 預算支用情形-依縣市別	- 11 -
圖 8 預算達成率-依計畫類別	- 12 -
圖 8- 1 預算達成率-農業建設類.....	- 13 -
圖 8- 2 預算達成率-公有建物及設施類	- 14 -
圖 8- 3 預算達成率-水利建設類	- 15 -
圖 8- 4 預算達成率-道路養護及道安計畫	- 16 -
圖 9 標案落後比率-依縣市別	- 17 -
圖 10 標案落後比率-依計畫類別	- 18 -
圖 11 標案落後時點	- 26 -
圖 12 標案落後原因	- 27 -

表 次

表 1 108 年 6 月份基本設施補助計畫標案執行進度（標案總件數：3,689 件）	- 9 -
表 2 水利建設類落後比率前三大縣市之原因	- 18 -
表 3 公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因	- 20 -
表 4 農業建設類落後比率前三大縣市之原因	- 22 -
表 5 道路養護及道安計畫類落後比率前三大縣市之原因	- 23 -
表 6 交通建設類落後比率前三大縣市之原因	- 24 -

壹、前言

108 年度一般性補助款基本設施計畫總經費新臺幣(以下同)360.77 億元，其計畫類別可分為 9 類，各類經費由高至低依序為其他建設 (170 億元，47%)、水利建設(44 億元，12%)、公有建物及設施(40 億元，11%)、交通建設(不含道路養護及道安計畫)(33 億元，9%)、道路養護及道安計畫(31 億元，9%)、文化(18 億元，5%)、農業建設(11 億元，3%)、體育(9 億，3%)以及補助貧瘠鄉鎮市(4 億元，1%)。(詳圖 1、附表 2)。

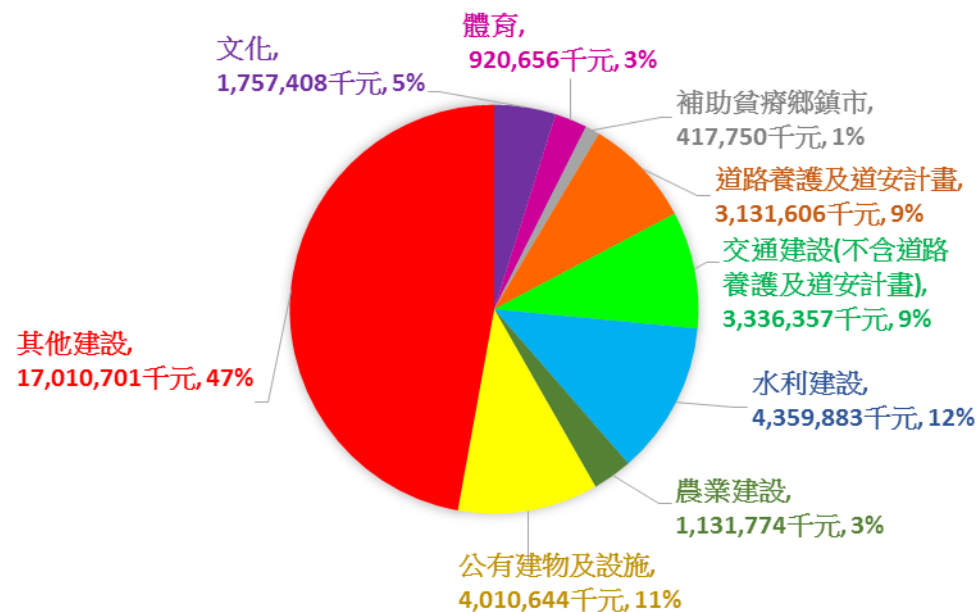


圖 1 基本設施補助-依計畫類別

另由各類別經費的縣市分布，可瞭解各縣市需求差異(圖 1-1 至圖 1-9)。各類補助前三大縣市依序為：文化類(臺南市>基隆市>臺北市)、體育類(高雄市>臺中市>嘉義市)、補助貧瘠鄉鎮市類(嘉義縣>屏東縣>雲林縣)、道路養護及道安計畫類(雲林縣>南投縣>彰化縣)、交通建設類(高雄市>彰化縣>臺南市)、水利建設類(臺南市>雲林縣>屏東縣)、農業建設類(臺南市>高雄市>南投縣)、公有建物及設施類(新北市>臺中市>桃園市)、其他類(基隆市>嘉義市>高雄市)。至於整體補助經費的縣市分布，以高雄市最多，其次為基隆市，再其次為臺南市(如圖 2)。

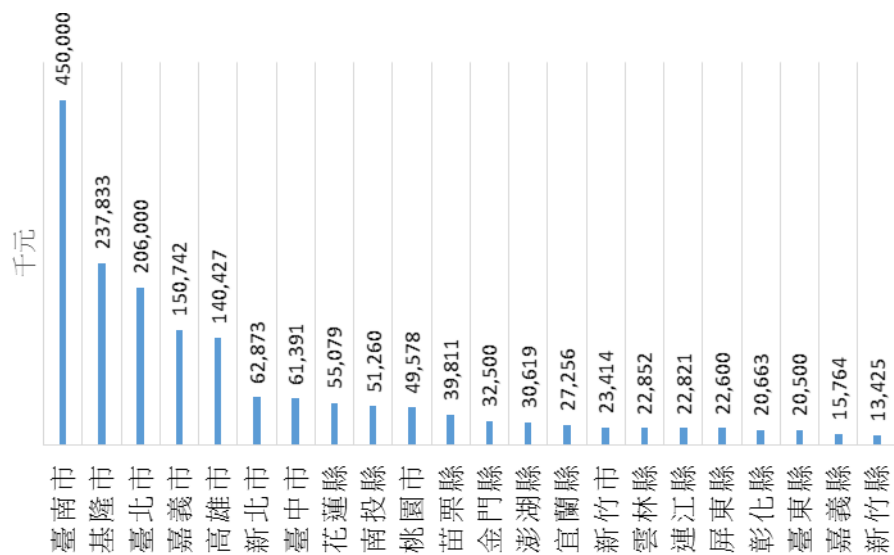


圖 1- 1 基本設施補助-文化類

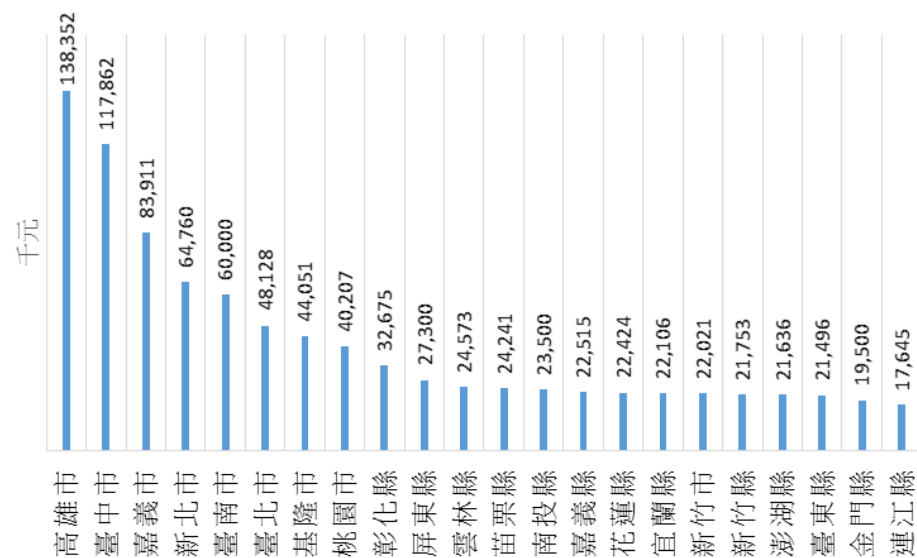


圖 1- 2 基本設施補助-體育類

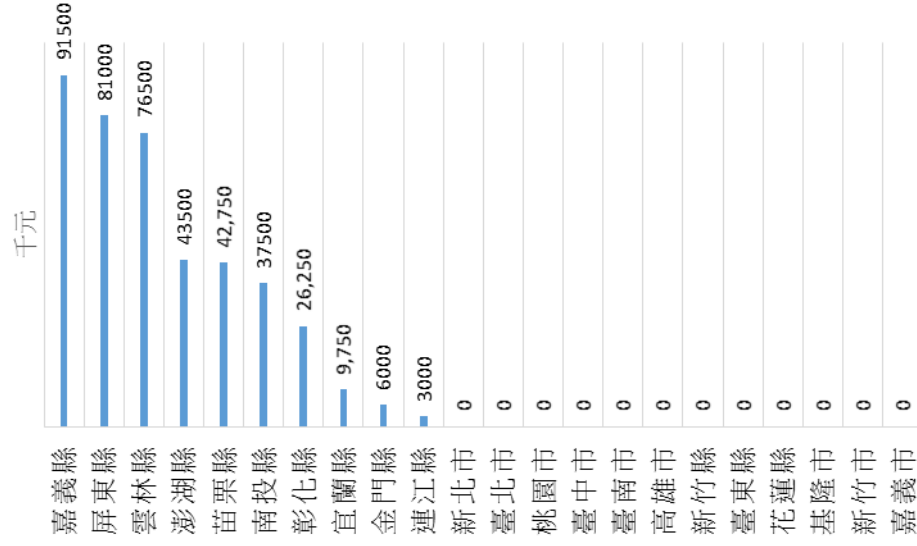


圖 1- 3 基本設施補助-補助貧瘠鄉鎮市類

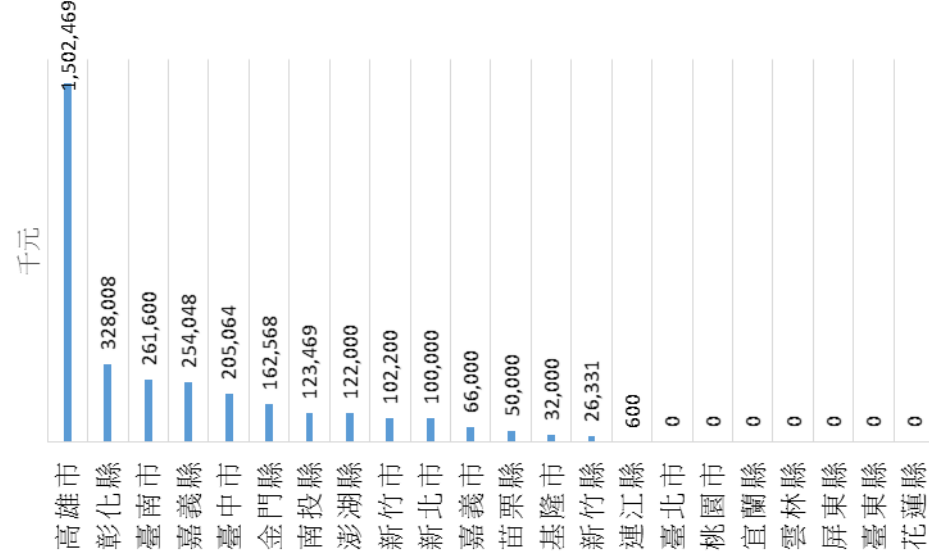


圖 1- 5 基本設施補助-交通建設類

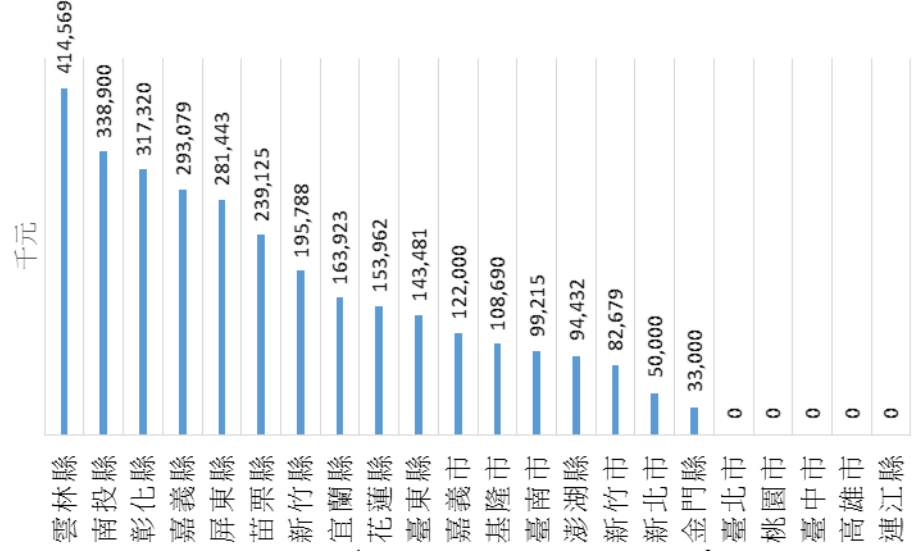


圖 1- 4 基本設施補助-道路養護及道安計畫類

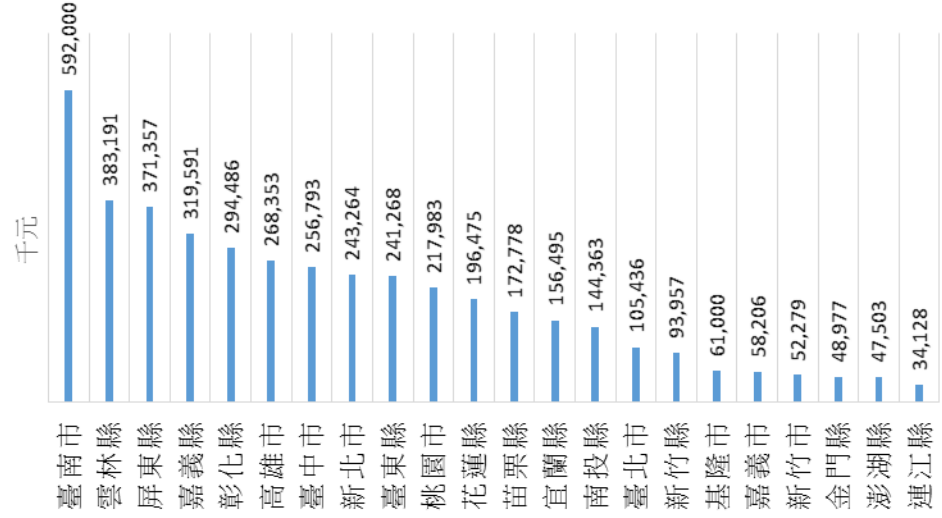


圖 1- 6 基本設施補助-水利建設類

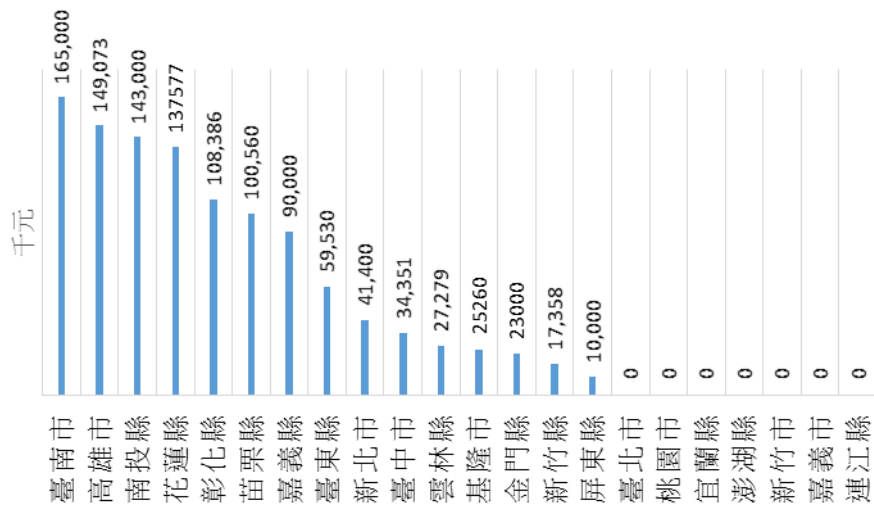


圖 1- 7 基本設施補助-農業建設類

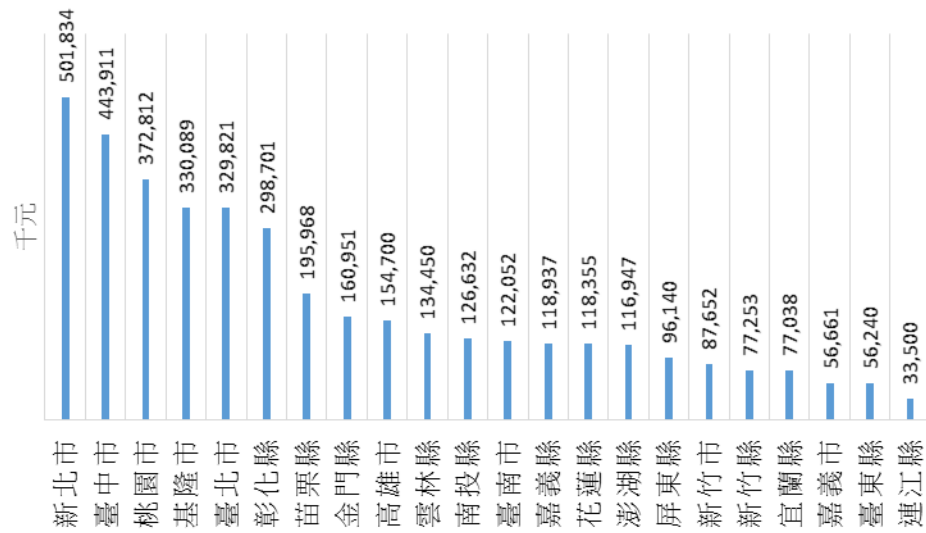


圖 1- 8 基本設施補助-公有建物及設施類

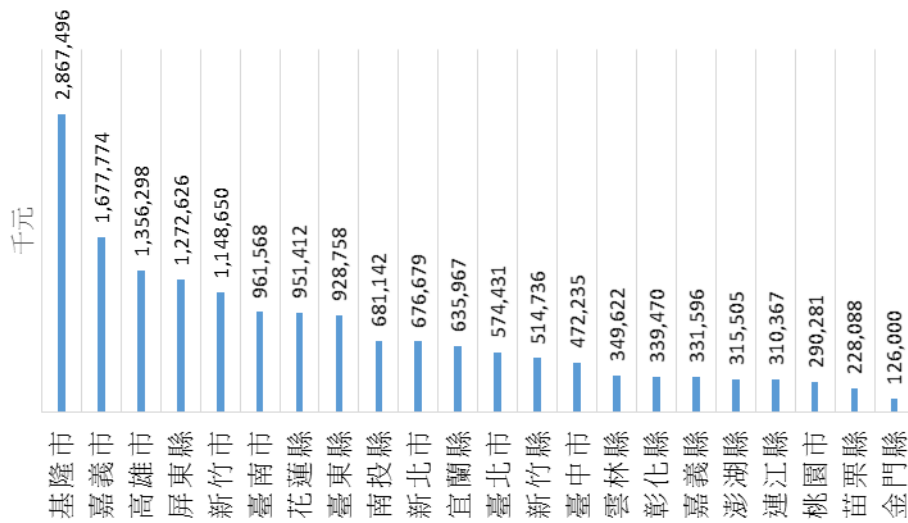


圖 1- 9 基本設施補助-其他類

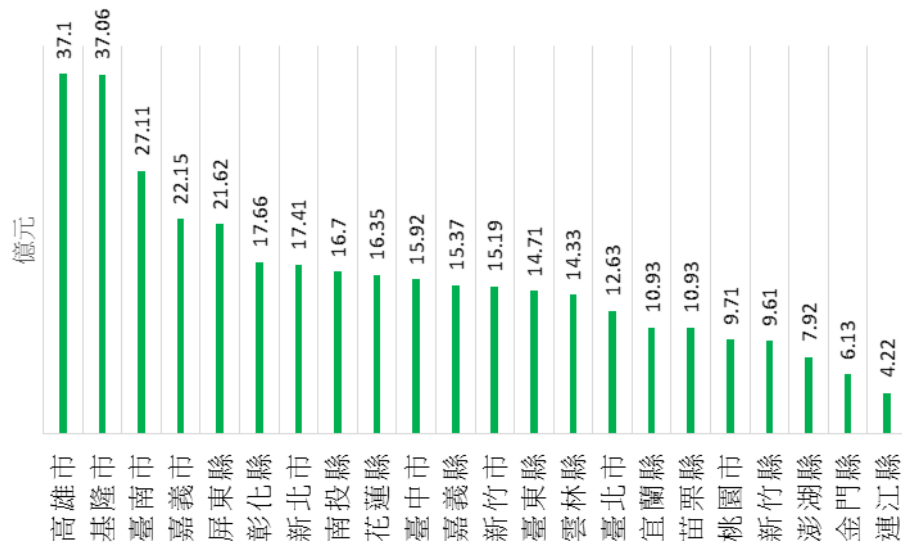


圖 2 基本設施補助-依縣市別

為使基本設施補助如期如質發生預期效益，謹就補助經費執行情形按季彙編報告，供精進參考。

貳、執行概況

一、108 年第 2 季(截至 6 月底)基本設施管考重點

第 2 季基本設施管考重點在於 6 月底各縣市平均發包率及預算達成率之達成情形，以「發包率」達 85%、「預算達成率」達 27%為本階段預定目標值。因此，管考重點第 2 季著重各縣市標案「設計完成」、「發包決標」及「預算達成」之完成比率，謹就各縣市於該指標之達成度說明如下：

(一) 13 個縣市預算分配比例低於平均值：各縣市 6 月份預算分配比例平均值為 25.55%，其中低於預算分配比例平均值者計有連江縣、澎湖縣、金門縣、南投縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、臺東縣、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、臺南市及臺中市等 13 個縣市。(如圖 3 及附表 1)

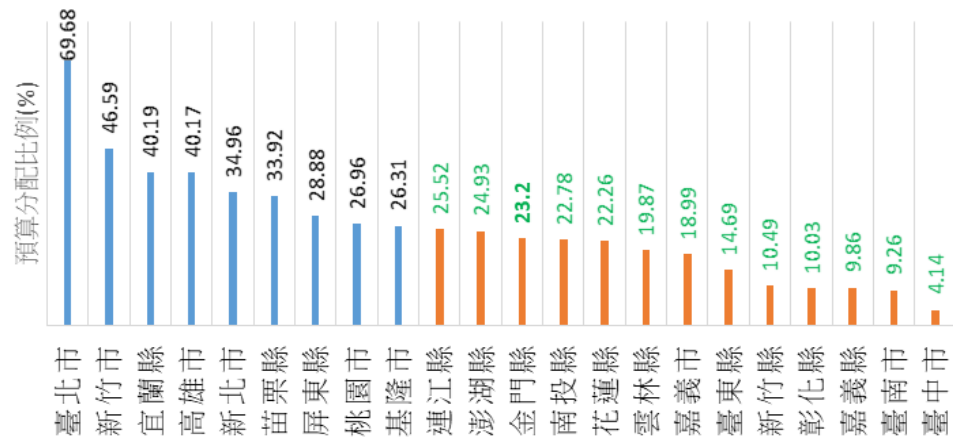


圖 3 各縣市 6 月份預算分配比例

註:預算分配比例低於平均值者，以橘色標示，並以綠色標示數值。

(二)6 個縣市發包率未達預定目標值、9 個縣市低於平均值:各縣市 6 月份發包率平均值為 88.80%，與預定目標值 85%比較，符合預期執行進度。其中發包率未達預定目標值者計有苗栗縣、臺東縣、嘉義市、新竹縣、連江縣及金門縣等 6 個縣市；低於發包率平均值者則較前者增加有雲林縣、南投縣及桃園市，共計有 9 個縣市。(如圖 4 及附表 4)

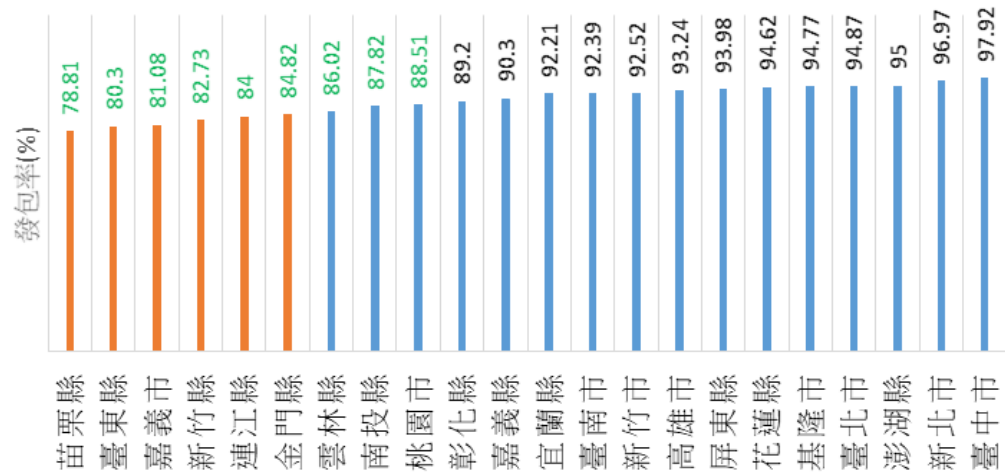


圖 4 各縣市 6 月份發包率

註:發包率低於預定目標值者，以橘色標示。發包率低於平均值者，以綠色標示。

(三) 6 個縣市預算達成率未達預定目標值、13 個縣市低於平均值：各縣市 6 月份預算達成率平均值為 35.30%，與預定目標值 27% 比較，符合預期執行進度。其中預算達成率未達預定目標值者計有嘉義市、臺東縣、南投縣、澎湖縣、新竹縣及彰化縣等 6 個縣市；低於預算達成率平均值者則較前者增加有嘉義縣、基隆市、臺南市、臺中市、苗栗縣、花蓮縣及雲林縣，共計有 13 個縣市。(如圖 5 及附表 1)

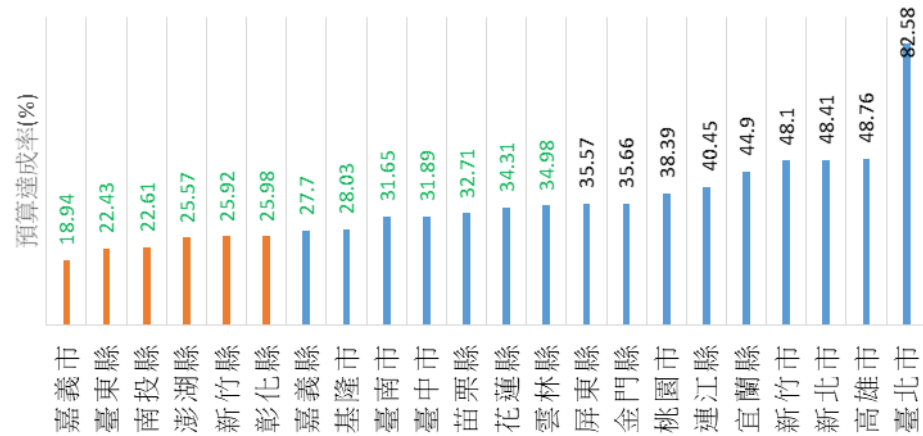


圖 5 各縣市 6 月份預算達成率

註：預算達成率低於預定目標值者，以橘色標示，預算達成率低於平均值者，以綠色標示。

二、截至 108 年 6 月整體概況

- (一) 累計實際支用比為 29.38%：108 年度核定一般性基本設施經費為 360.77 億元(包含中央補助 357.00 億元及縣市自籌 3.77 億元)，累計預定支用數為 92.18 億元，累計實際支用數 105.98 億元，累計實際支用比為 29.38%，較累計預定支用比(25.55%)高 3.83 個百分點。(如附表 1)
- (二) 預算執行率 138.15%、預算達成率為 35.30%：累計預定支用數為 92.18 億元，累計實際支用數 105.98 億元，已執行應付未付數 20.87 億元，發包結餘數 0.49 億元，合計預算執行數為 127.35

億元，預算執行率 138.15%。預算達成率為 35.30%，較歷年同期之平均值(27.77%)高 7.53 個百分點，較 107 年度同期(36.76%)低 1.46 個百分點。

(三) 標案執行-設計完成率 94.25%、發包率 88.80%：標案之執行可區分為設計完成、發包決標、開工、施工進度 50%、完工、驗收完工等六個階段。截至 108 年 6 月底，標案總數計 3,689 件，其中 3,477 件已設計完成，設計完成率 94.25%；3,276 件標案已完成發包，發包率 88.80%；791 件標案完工，完工率 21.44%；另 656 件標案完成驗收，驗收率 17.78%。(如表 1)

表 1 108 年 6 月份基本設施補助計畫標案執行進度 (標案總件數：3,689 件)

項目	設計完成	發包決標	開工	施工進度達 50%	完工	驗收完成
預定完成	3,531	3,345	2,411	988	541	431
實際完成	3,477	3,276	2,705	1,364	791	656
達成率(%)	94.25	88.8	73.33	36.97	21.44	17.78

(四) 標案落後比率 10.06%：依查核點檢視，所謂「標案落後」係指預算執行率未達 80%或查核點進度落後者。標案總數 3,689 件中，進度落後者計有 371 件，落後比率為 10.06%，較歷年同期平均值(13.25%)降低 3.19 個百分點。(如附表 4)

三、預算執行情形

(一)年度預算達成率平均值 35.30%，有 9 個縣市年度預算達成率高於平均值：截至 108 年 6 月底，年度預算達成率高於平均預算達成率(35.30%)者，計有臺北市、高雄市、新北市、新竹市、宜蘭縣、連江縣、桃園市、金門縣及屏東縣等 9 個縣市。(如圖 6)

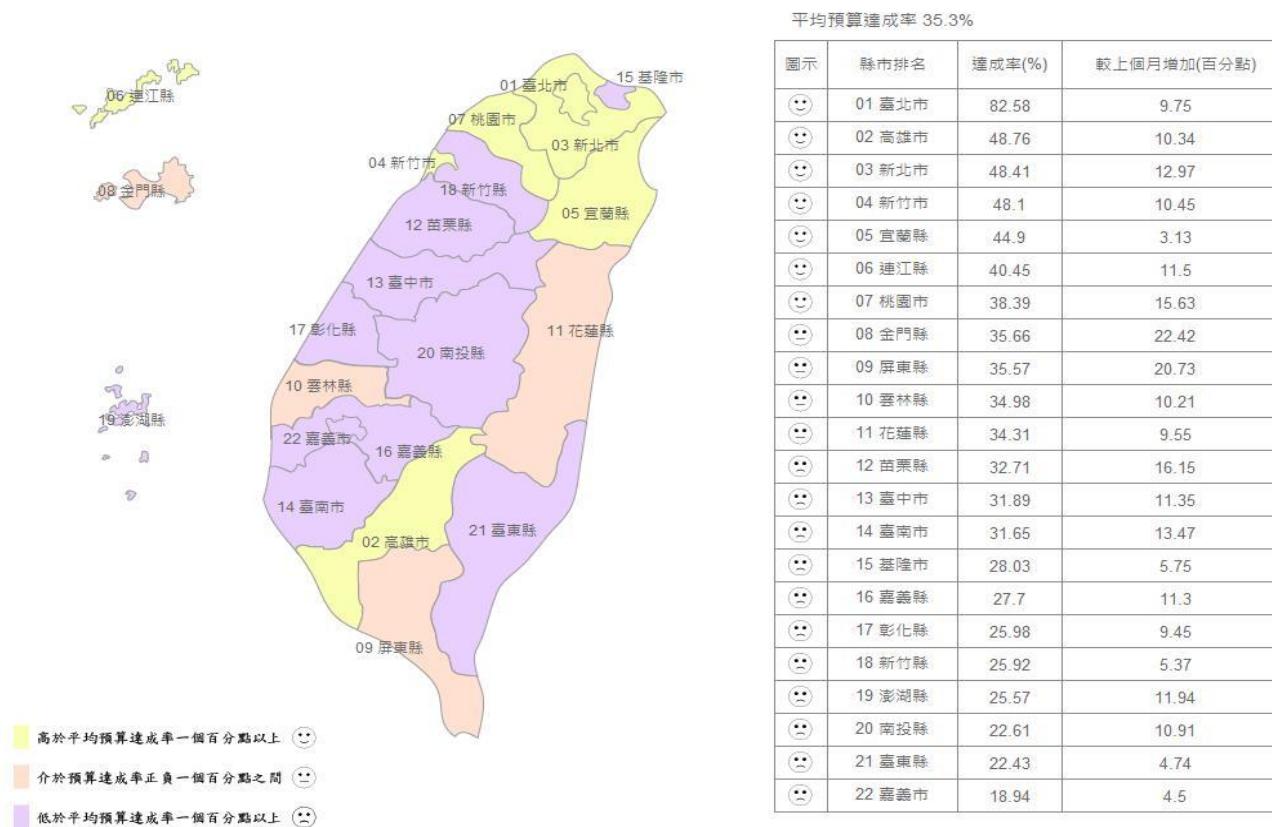


圖 6 預算達成率—各縣市分布圖

(二)有 6 縣市累計實際支用比低於累計預定支用比：依各縣市累計實際支用比情形分析，計有臺北市、新竹市、苗栗縣、基隆市、南投縣及嘉義市等 6 縣市。(如圖 7 及附表 1)

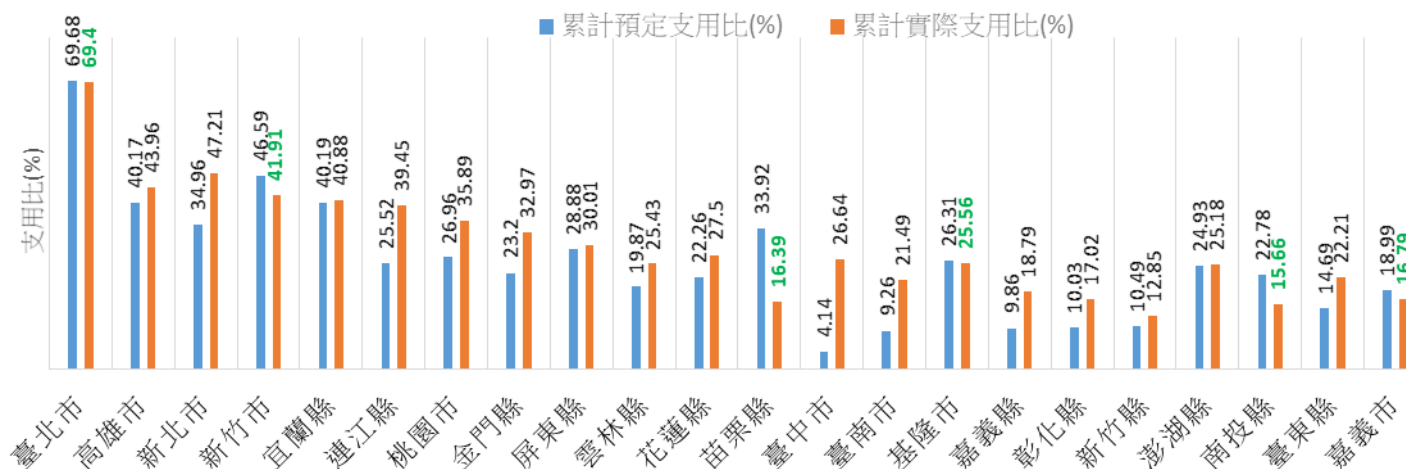


圖 7 預算支用情形-依縣市別

(三)9 類計畫中有 4 類預算達成率低於平均值：依基本設施補助經費 9 類分析，低於平均預算達成率 (35.30%)分別為「農業建設」、「公有建物及設施」、「水利建設」、「道路養護及道安計畫」等。(如圖 8 及附表 2)

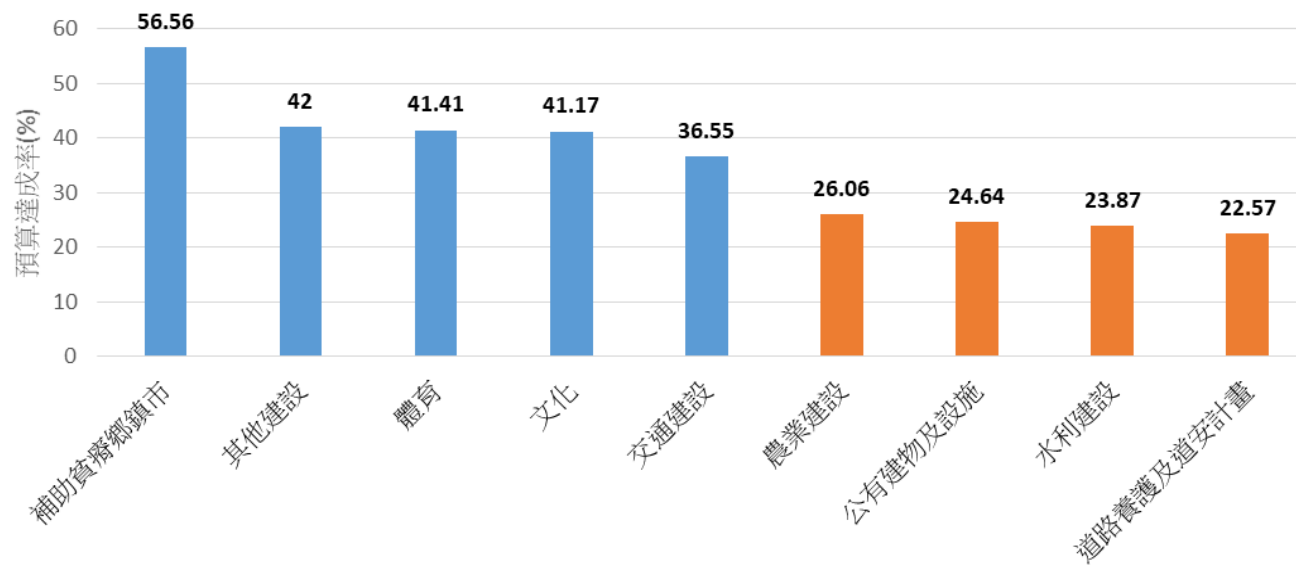


圖 8 預算達成率-依計畫類別

註:累計實際支用比低於累計預定支用比者，以橘色標示。

1. 農業建設情形：

- (1)預算達成率為 26.06%：執行經費占年度預算 3%，年度預算達成率為 26.06%，標案件數總計 102 件，尚在規劃階段計 7 件，占總件數 6.86%。
- (2)新竹縣尚未執行農業建設類預算，有 6 個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，計有新竹縣、臺南市、雲林縣、南投縣、苗栗縣及嘉義縣等 6 個縣市低於年度預算達成率平均值(26.06%)。(如圖 8-1)

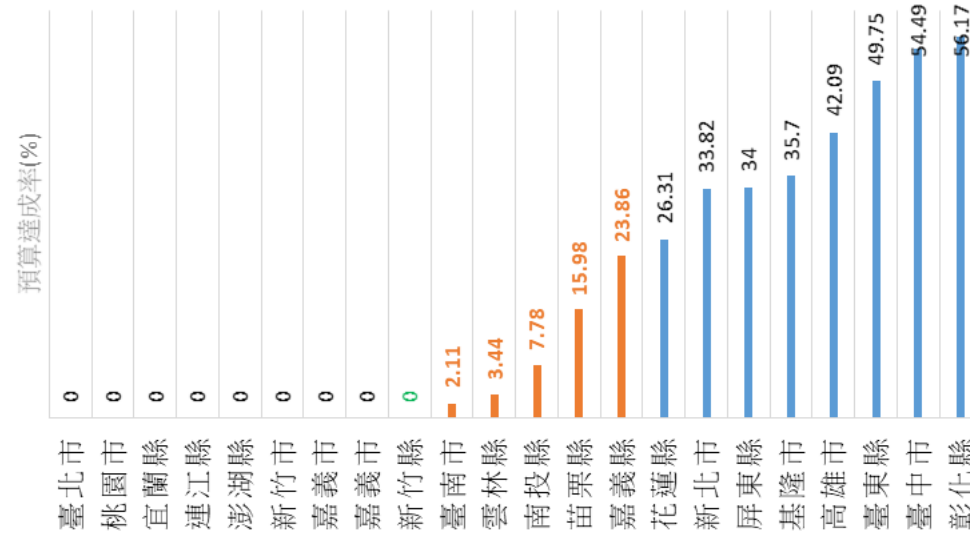


圖 8- 1 預算達成率-農業建設類

註：預算達成率低於平均值者，以橘色標示。尚未執行預算者，以綠色表示。

2. 公有建物及設施執行情形：

(1)預算達成率為 11.12%：執行經費占年度預算 11%，年度預算達成率為 24.64%，標案件數總計 614 件，尚在規劃階段計 38 件，占總件數 6.19%。

(2)嘉義市尚未執行公有建物及設施類預算，有 10 個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，計有嘉義市、連江縣、澎湖縣、新竹市、臺中市、基隆市、屏東縣、嘉義縣、桃園市及高雄市等 10 個縣市低於年度預算達成率平均值(24.64%)。(如圖 8-2)

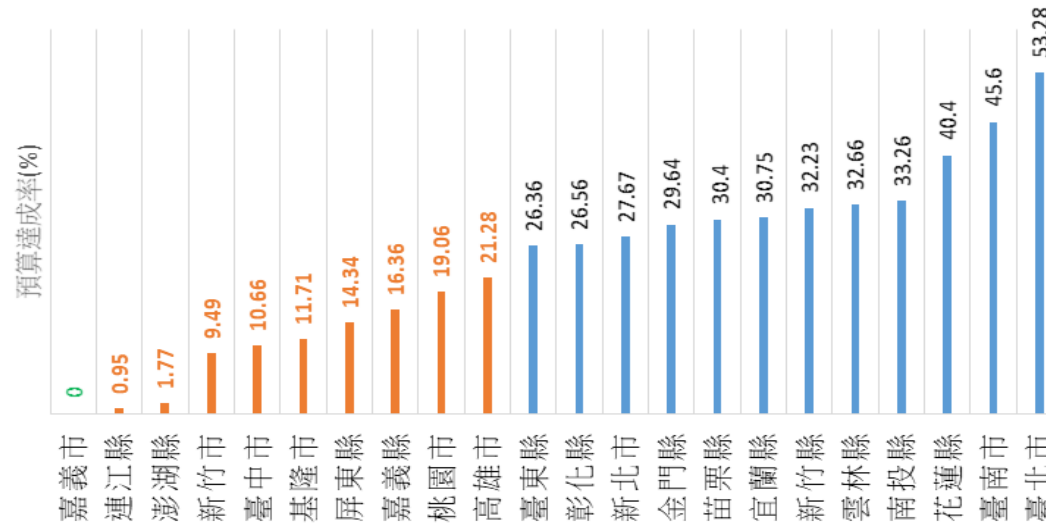


圖 8- 2 預算達成率-公有建物及設施類

註：預算達成率低於平均值者，以橘色標示。尚未執行預算者，以綠色表示。

3. 水利建設執行情形：

(1)預算達成率為 12.09%：執行經費占年度預算 12%，年度預算達成率為 23.87%，標案件數總計 268 件，尚在規劃階段計 7 件，占總件數 2.61%。

(2)新竹縣尚未執行水利建設類預算，有 13 個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，計有新竹縣、南投縣、澎湖縣、臺東縣、基隆市、苗栗縣、彰化縣、臺南市、高雄市、連江縣、嘉義市、金門縣及花蓮縣等 13 個縣市低於年度預算達成率平均值(23.87%)。

(如圖 8-3)

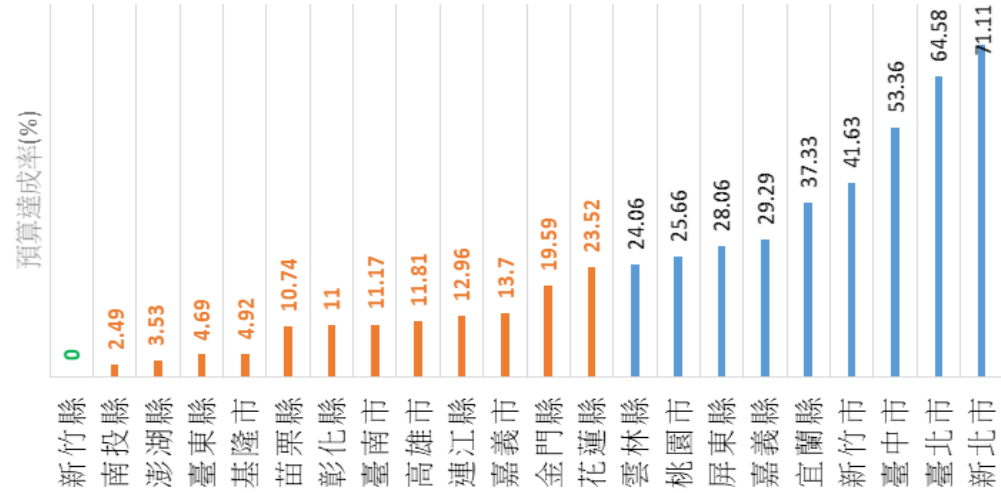


圖 8- 3 預算達成率-水利建設類

註：預算達成率低於平均值者，以橘色標示。尚未執行預算者，以綠色表示。

4. 道路養護及道安計畫執行情形：

(1)預算達成率為 8.68%：執行經費占年度預算 8.68%，年度預算達成率為 22.57%，標案件數總計 131 件，尚在規劃階段計 9 件，占總件數 6.87%。

(2)臺東縣尚未執行道路養護及道安計畫預算，有 10 個縣市預算達成率低於平均值：各縣市預算執行情形，計有臺東縣、嘉義市、宜蘭縣、新北市、基隆市、金門縣、花蓮縣、嘉義縣、彰化縣及南投縣等 10 個縣市低於年度預算達成率平均值(22.57%)。(如圖 8-4)

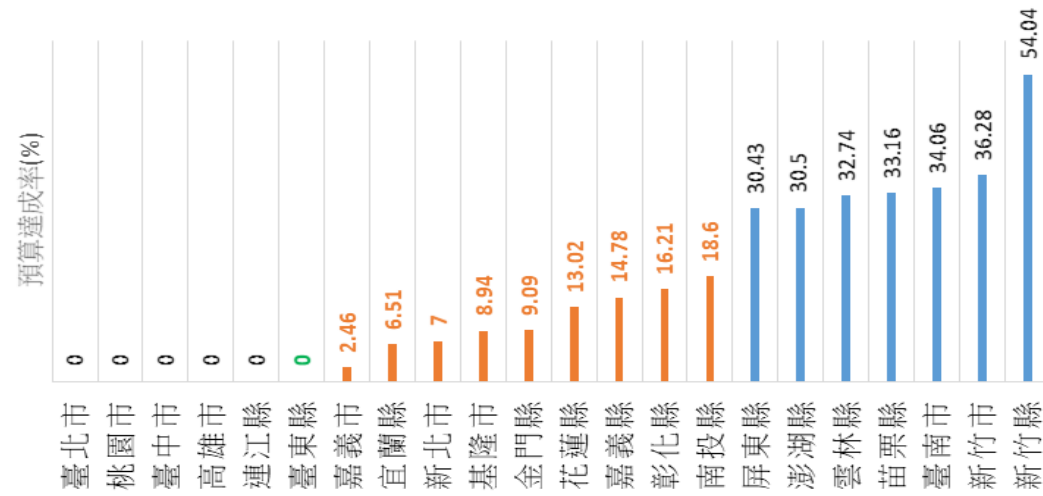


圖 8- 4 預算達成率-道路養護及道安計畫

註：預算達成率低於平均值者，以橘色標示。尚未執行預算者，以綠色表示。

四、標案落後情形

- (一) 有 9 縣市標案落後比率高於平均值：截至 108 年 6 月底止，3,689 件標案計有 371 件落後，標案落後比率為 10.06%。個別縣市標案落後比率超過平均值(10.06%)者，計有雲林縣、嘉義市、基隆市、澎湖縣、連江縣、新竹縣、金門縣、臺東縣及苗栗縣等 9 縣市。(如圖 9 及附表 3)

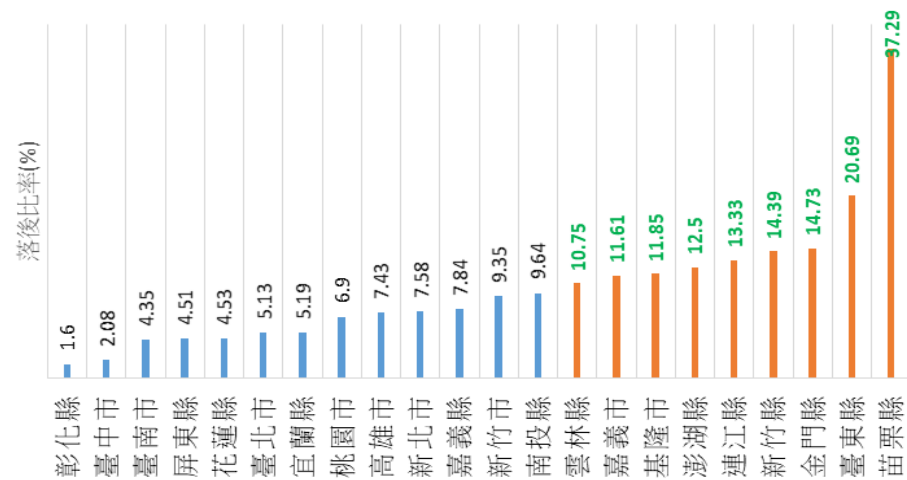


圖 9 標案落後比率-依縣市別

註：落後比率高於平均值者，以橘色標示。

(二)9類計畫中有5類標案落後比率高於平均值：9個計畫類型中，標案落後比率高於平均值(10.06%)者，計有「水利建設」、「公有建物及設施」、「農業建設」、「道路養護及道安計畫」及「交通建設」等5類。(如圖10及附表3)

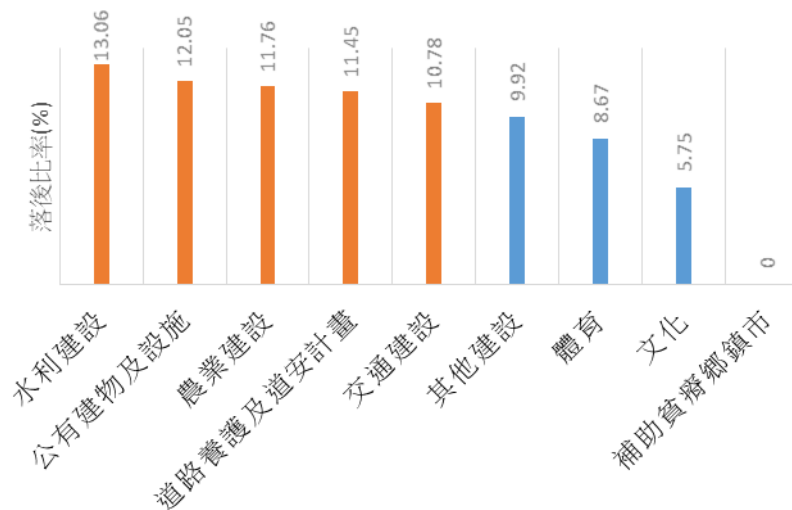


圖 10 標案落後比率-依計畫類別

註:落後比率高於平均值者,以橘色標示。

1. 水利建設類：標案落後比率為 13.06%，其中前三大落後縣市為苗栗縣為 85.71%(12 件)、嘉義市為 66.67%(4 件)、基隆市為 60%(3 件)。其落後原因如表 2。

表 2 水利建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
苗栗縣	12	c006-1-1	01 全縣區域排水水利零星相關工程	本標案含多件小型工程，陸續依實際簽辦結果執行中。
		c006-1-2	02 區域排水應急、疏濬清淤工程經費	部份清淤委請公所代辦，部份辦理後續擴充作業；本府清淤分為北、中、南區，目前工程依進度施作中，北區 18.97%、中區 54.61%、南區 27.82%。
		c006-1-3	03 全縣區域排水防救災暨自來水延管配合業務	部份為勞務開口合約，依實際搶修搶險狀況請款。
		c006-1-4	04 全縣區域排水水利建造物維護管理	年度汛期後進行檢查。

表 2 水利建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
		c006-2-1	05 全縣縣管河川水利零星相關工程	本標案含多件小型工程，陸續依實際簽辦結果執行中。
		c006-2-2	06 縣管河川應急、疏濬清淤工程經費	部份清淤委請公所代辦，部份辦理後續擴充作業；本府清淤分為北、中、南區，目前工程依進度施作中，北區 18.97%、中區 54.61%、南區 27.82%。
		c006-2-3	07 全縣縣管河川防救災暨自來水延管配合業務	部份為勞務開口合約，依實際搶修搶險狀況請款。
		c006-2-4	08 全縣縣管河川水利建造物維護管理	年度汛期後進行檢查。
		c006-3-1	09 108 年度苗栗縣雨水下水道系統興建及改善工程(開口合約)	已於 108 年 6 月 12 日、19 日、26 開標流標。
		c006-3-2	10 雨水下水道清淤工程(開口合約)	顧問公司尚未提送第一次派工預算。
		c006-3-3	11 苗栗縣雨水下水道設施普查及空間資料庫建置	招標文件討論修正耗時。
		c006-3-5	12 苗栗縣造橋鄉、三灣鄉及南庄鄉雨水下水道系統檢討規劃	普查提供資料不足故停工數月，現已復工。
嘉義市	4	c006-1-2	01 區域排水改善工程	招標作業延誤。
		c006-3-1	02 雨水下水道建設及維護工程	招標二次流標。
		c006-3-2	03 雨水下水道建設工程	決標作業延誤。
		c006-3-3	04 疏浚清淤	招標二次流標。
基隆市	3	c006-1-1	01 基隆市區域排水改善工程(A)	廠商提送細部設計資料延遲。
		c006-1-2	02 基隆市區域排水改善工程(B)	第一次開標未達法定家數流標。
		c006-3-1	03 基隆市都市排水疏濬工程(A)	預算書多次修正，造成工程發包進度落後。

2. 公有建物及設施類：標案落後比率為 12.05%，其中前三大落後縣市為苗栗縣為 41.38%(12 件)、嘉義縣為 38.46%(5 件)、南投縣為 37.5%(3 件)。其落後原因如表 3。

表 3 公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
苗栗縣	12	c008-1-1-5	01 頭份市和平路員警宿舍拆除工程	台電線路遷移影響施工。
		c008-1-1-6	02 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築	細部設計尚未完成。
		c008-1-1-7	03 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築	委外設計修正時程較長。
		c008-1-1-8	04 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築	委外設計修正時程較長。
		c008-1-1-9	05 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築	委外設計修正時程較長。
		c008-1-2-1	06 三灣消防分隊廳舍耐震補強工程	廠商未請款。
		c008-1-2-2	07 苗栗分隊辦公廳舍耐震詳細評估	本案已辦理結算中。
		c008-2-2-1	08 雲梯車 1 輛	本案因修正規格，致執行進度落後。
		c008-2-2-2	09 小型水箱車 1 輛	本案因修正規格，致執行進度落後。
		c008-2-2-3	10 水箱消防車 1 輛	本案因修正規格，致執行進度落後。
		c008-2-2-4	11 水庫車 1 輛	本案因修正規格，致執行進度落後。

表 3 公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
		c008-5-1	12 全縣城鄉風貌興建等公共設施工程	目前已核定，尚在辦理設計或發包中金額計 1,900 萬元，盡速完成規劃設計作業，續辦招標作業。
嘉義縣	5	c008-1-1-1	01 老舊宿舍拆除及各分局、派出所圍牆整地	本案原訂拆除布袋分局過路派出所後方舊日式廳舍，因地方文史團體陳情保留，雖經本縣文化觀光局 2 次審議均不具文化保存價值，惟經簽陳縣府批示「研議」，爰無法依約開工拆除。
		c008-1-1-2	02 朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程	本案工程迄今已辦理 7 次招標作業惟均流標，探究原因為營建物料飆漲及工資短缺所致，本局業召開建築面積檢討會縮減建物面積，並勻支他項經費新臺幣 108 萬至本案，惟仍無法決標。
		c008-1-2-1	03 太保消防分隊廳舍興建工程	本案俟取得建照及通過 5 大圖審後方辦理工程招標，以避免於施工過程中辦理變更設計，故造成後續之招標作業延遲辦理。
		c008-1-2-2	04 東石消防分隊廳舍興建工程	本案原訂於 108 年 4 月 12 日辦理第一次招標，惟因該設計監造單位之設計監造費誤植，造成該次開標以廢標辦理，並依設計監造單位重新提送之預算書（修正版）重新簽辦招標事宜。
		c008-3-2	05 設置重要路口監視系統建置	本案擬配合本縣「107 年第 2 期轄內治

表 3 公有建物及設施類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
				安要點錄影監視系統建置整合案」辦理增購，須俟該案進度達 50%始得辦理增購。
南投縣	3	c008-1-2	01 消防廳舍(第二大隊日月潭分隊)	增設無障礙電梯經費已於 108 年 06 月 24 日核准，俟完成變更設計後，請建設處辦理動工事宜。
		c008-1-3	02 消防廳舍(第二大隊魚池分隊)	發包作業正由建設處簽辦中。
		c008-3-1	03 擴增及汰換數位式遠端網路即時監控錄影監視系統	未完成發包預定進度。

3. 農業建設類：標案落後比率為 11.76%，其中前三大落後縣市為苗栗縣為 50%(2 件)、臺中市為 33.33%(1 件)、新竹縣為 33.33%(1 件)。其落後原因如表 4。

表 4 農業建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
苗栗縣	2	c007-1-1	01 治山防災及野溪坑溝整治工程	目前已發包 10 件，刻正施工中，施工部分請廠商在期限內完工，尚未發包部分已請設計公司將預算書送府審查，辦理發包事宜。
		c007-1-2	02 農路改善	目前 14 件工程施工中，59 件預算書審查中，請設計公司盡速將預算書送府審

表 4 農業建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
				查，以利辦理發包。
臺中市	1	c007-2-2	01 本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施規劃案維護興建工程	本案於108年6月26日辦理第一次公開開標，因投標家數未達3家，宣布流標。
新竹縣	1	c007-1-1	01 辦理農地重劃區農水路更新改善工程	108年5月2日府地劃字第1084211388號函簽訂委託設計契約通知廠商文到30日內規劃設計完成。

4. 道路養護及道安計畫類：標案落後比率為 11.45%，其中前三大落後縣市為臺東縣為 62.5%(5 件)、雲林縣為 25%(3 件)、苗栗縣為 15.38%(2 件)。其落後原因如表 5。

表 5 道路養護及道安計畫類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
臺東縣	5	c004-1-1	01 108 年全縣縣鄉道路橋樑基本資料及目視安全檢測工作	辦理發包工作。
		c004-1-2	02 道路交通秩序與交通安全改進方案號誌標線標誌增劃設工作	施作位置勘測中。
		c004-1-4	03 縣鄉道路及市區道路養護	規劃設計延誤。
		c004-1-5	04 市區路平專案計畫	待改善路段有眾多需勘查處。
		c004-1-6	05 全縣橋梁維修、維護工程	請監造設計公司修正工程預算書。
雲林縣	3	C004-2-1	01 自養鄉道養護計畫及村里道路橋樑改善工程	補助公所辦理案件，招標作業延誤。
		c004-2-2	02 轄內鄉道路面養護工程、交通設施改善及	補助公所辦理案件尚未招標。

表 5 道路養護及道安計畫類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
			景觀植栽綠美化、行道樹、草坪修剪、路容維護	
		c004-2-3	03 轄內縣管公園、圓環、道路橋梁、聯外道路、各特定區、污水處理廠、區段徵收自辦市地重劃區範圍內等清潔整理	補助公所案件，因招標流標再次招標。
苗栗縣	2	c004-2-4	01 辦理道路橋樑等設施養護作業	本計畫係依實辦理核銷，目前刻正執行中。
		c004-4-2	02 全縣道路規劃設計	本案第 1 期款項(345,750 元)已支付，刻正辦理召開可行性研究期中報告審查會議前置作業。

5. 交通建設類：標案落後比率為 10.78%，其中前三大落後縣市為苗栗縣為 100%(1 件)、連江縣為 50%(1 件)、嘉義市為 33.33%(1 件)。其落後原因如表 6。

表 6 交通建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
苗栗縣	1	c005-1-1	01 辦理全縣道路(含市區道路)及小型其他公共工程	因部分計畫尚在委託規劃設計現勘，部分工程施工中尚未完工及部分工程公告招標中。
連江縣	1	c005-3-1	01 直昇機場養護工程	本案為東引及西莒直昇機場養護工程；其中西莒直升機飛行場修繕工程已委請廠商進行施工中，東引直升機飛行場修

表 6 交通建設類落後比率前三大縣市之原因

縣市	件數	計畫編號	計畫名稱	落後原因
				繕工程已委託廠商於 6 月 19 日完工。
嘉義市	1	c005-2-3	01 各里道路養護	工程委外設計規劃，已陸續發包，需達一定進度後方能辦理付款。

(三) 標案落後查核點前三大為發包決標(39%)、開工(24%)、設計完成(21%)：標案執行可區分為設計完成、發包決標、開工、施工進度 50%、完工、驗收完成等 6 個階段，由落後案件在各階段的分布可知，第 2 季落後案件最容易發生的前三大階段依序為發包決標(39%)、開工(24%)、設計完成(21%)。(如圖 11 及附表 4)

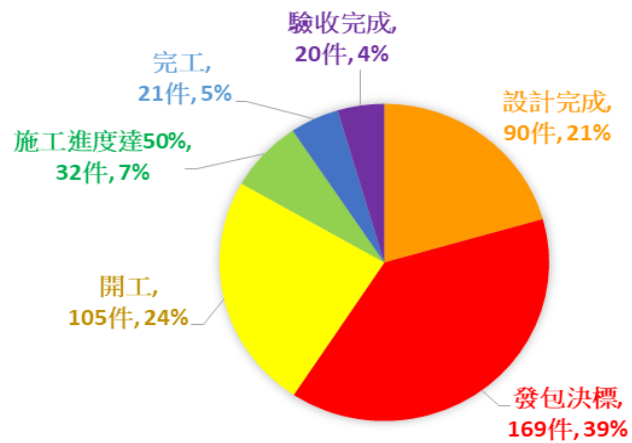


圖 11 標案落後時點

(四)標案落後原因前三大為其他(56%)、招標作業 (19%)及規劃設計(14%):截至 108 年 6 月底, 3,689 件標案計有 371 件落後, 標案落後比率為 10.06%。標案落後原因大致可區分為規劃設計、土地取得、拆遷補償、招標作業、施工作業、驗收作業、計畫變更、人力需求、預算編列、天然因素及其他等因素。371 件落後標案中, 除 13 件未填寫原因外, 其餘 358 件落後原因前三大依序為, 其他(199 件, 56%)、招標作業(67 件, 19%)及規劃設計(52 件, 14%)(如圖 12 及附表 5)。

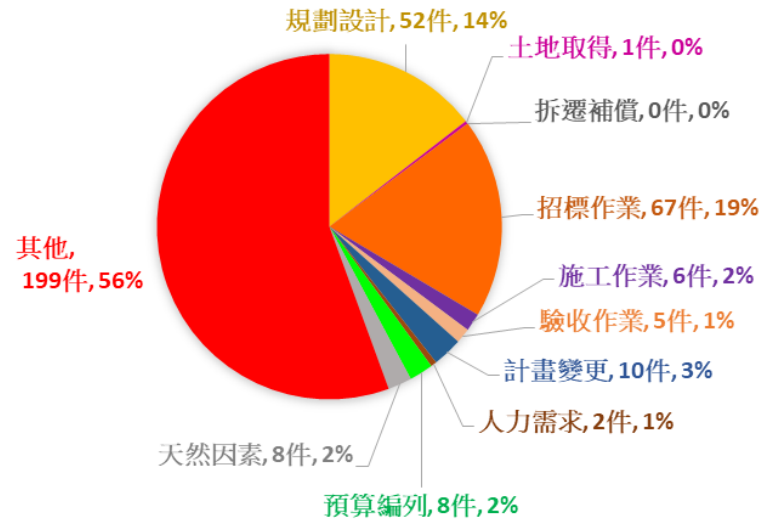


圖 12 標案落後原因

參、建議事項

- 一、發包率與預算達成率未達預定目標值之縣市，請加強督促所屬確實檢討改善：第 2 季各縣市於 6 月底之「發包率」目標值為 85%，未達目標值計有金門縣(84.82%)、連江縣(84%)、新竹縣(82.73%)、嘉義市(81.08%)、臺東縣(80.3%)及苗栗縣(78.81%)等 6 個縣市；「預算達成率」目標值為 27%，未達目標值有彰化縣(25.98%)、新竹縣(25.92%)、澎湖縣(25.57%)、南投縣(22.61%)、臺東縣(22.43%)

及嘉義市(18.94%)等 6 個縣市。上開未達目標值之縣市，請加強督促並協助所屬機關，並按標案期程適時上網填報，以落實自主管理，並提高發包率與預算達成率。

二、標案落後比率高於平均值之縣市，請積極排除落後原因提升執行力：第 2 季落後標案以「水利建設」、「公有建物及設施」、「農業建設」、「道路養護及道安計畫」、「交通建設」等 5 類計畫所占落後比較高。請雲林縣、嘉義市、基隆市、澎湖縣、連江縣、新竹縣、金門縣、臺東縣及苗栗縣等落後比率高於平均值(10.06%)之縣市政府列管單位加強查核資料並適時檢視，以排除落後原因加速辦理。

三、請列管機關落實管考作業，確實掌握落後原因並加強查核資料填報完整性：第 2 季落後原因除「其他」與「未填寫」外，以「招標作業」及「規劃設計」所占比率較高，及對於未填寫落後原因比例偏高縣市(如臺東縣、嘉義市)，請縣市政府列管單位加強查核資料，以落實管考作業。

四、請預算執行率高但預算達成率偏低之縣市，檢討年度預定支用數之分配：第 2 季預算執行率超過 200% 的縣市計有臺中市(769.41%)、臺南市(341.84%)、嘉義縣(280.85%)、彰化縣(259.01%)及新竹縣(247.11%)等 5 縣市，前開縣市之預算達成率皆低於平均值(35.5%)甚至本季目標值(27%)，請檢討年度預定支用數分配，以提升計畫執行績效。

肆、附表

附表 1、預算執行情形一覽表

108 年 6 月份各縣市政府基本設施補助計畫預算執行情形一覽表

單位：億元

縣市別	已核定經費 (A)	累計預定支 用數(B)	累計實際支用 數(C)	累計預定 支用比(%) (B/A)	累計實際支 用比(%) (C/A)	已執行應付 未付數(D)	發包節餘數 (E)	預算執行數 (F=C+D+E)	執行率 (%)(F/B)	達成率 (%)(F/A)
合計	360.77	92.18	105.98	25.55	29.38	20.87	0.49	127.35	138.15	35.30
01 臺北市	12.64	8.81	8.77	69.68	69.40	1.62	0.05	10.44	118.52	82.58
02 高雄市	37.10	14.90	16.31	40.17	43.96	1.74	0.04	18.09	121.39	48.76
03 新北市	17.41	6.09	8.22	34.96	47.21	0.20	0.01	8.43	138.47	48.41
04 新竹市	15.19	7.08	6.37	46.59	41.91	0.94	0.00	7.31	103.24	48.10
05 宜蘭縣	10.93	4.39	4.47	40.19	40.88	0.44	0.00	4.91	111.70	44.90
06 連江縣	4.22	1.08	1.66	25.52	39.45	0.04	0.00	1.71	158.46	40.45
07 桃園市	9.71	2.62	3.48	26.96	35.89	0.20	0.05	3.73	142.40	38.39
08 金門縣	6.12	1.42	2.02	23.20	32.97	0.12	0.04	2.18	153.73	35.66
09 屏東縣	21.62	6.25	6.49	28.88	30.01	1.20	0.00	7.69	123.15	35.57
10 雲林縣	14.33	2.85	3.64	19.87	25.43	1.37	0.00	5.01	176.04	34.98
11 花蓮縣	16.35	3.64	4.50	22.26	27.50	1.01	0.11	5.61	154.14	34.31
12 苗栗縣	10.93	3.71	1.79	33.92	16.39	1.78	0.00	3.58	96.44	32.71
13 臺中市	15.92	0.66	4.24	4.14	26.64	0.84	0.00	5.08	769.41	31.89
14 臺南市	27.11	2.51	5.83	9.26	21.49	2.70	0.06	8.58	341.84	31.65
15 基隆市	37.06	9.75	9.47	26.31	25.56	0.91	0.01	10.39	106.52	28.03
16 嘉義縣	15.37	1.52	2.89	9.86	18.79	1.31	0.06	4.26	280.85	27.70
17 彰化縣	17.66	1.77	3.01	10.03	17.02	1.57	0.01	4.59	259.01	25.98
18 新竹縣	9.61	1.01	1.23	10.49	12.85	1.25	0.00	2.49	247.11	25.92
19 澎湖縣	7.92	1.98	1.99	24.93	25.18	0.03	0.00	2.03	102.54	25.57
20 南投縣	16.70	3.80	2.61	22.78	15.66	1.14	0.02	3.77	99.22	22.61
21 臺東縣	14.71	2.16	3.27	14.69	22.21	0.02	0.01	3.30	152.71	22.43
22 嘉義市	22.15	4.21	3.72	18.99	16.79	0.44	0.04	4.20	99.75	18.94

註：1.108 年度各縣市基本設施補助計畫經費為 360.77 億元。(中央補助 357.00 億元，縣市自籌 3.77 億元)

2. 預算執行率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案累計預定支用數總金額之百分比。
預算達成率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案核定經費總金額之百分比。

附表 2、各縣市預算執行進度—依計畫類別

108 年 6 月份縣市預算執行進度—依計畫類別

單位：千元

縣市別	合計			c001.文化部分			c002.體育部分			c003.補助貧鄉鎮市部分			c004.道路養護及道安計畫部分			c005.交通建設(不含道路養護及道安計畫)			c006.水利建設			c007.農業建設			c008.公有建物及設施			c009.其他建設		
	總經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)	經費	執行率(%)	達成率(%)
總計	36,076,779	138.15	35.3	1,757,408	135.26	41.17	920,656	119.08	41.41	417,750	102.21	56.56	3,131,606	175.94	22.57	3,336,357	155.92	36.55	4,359,883	232.34	23.87	1,131,774	163.76	26.06	4,010,644	184.63	24.64	17,010,701	123.49	42
新北市	1,740,810	138.47	48.41	62,873	115.12	38.22	64,760	139.24	73.75	0	0	0	50,000	100	7	100,000	100	100	243,264	281.74	71.11	41,400	109.11	33.82	501,834	110.71	27.67	676,679	136.5	50.47
臺北市	1,263,816	118.52	82.58	206,000	100	100	48,128	177.74	40.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,436	294.29	64.58	0	0	0	329,821	265.81	53.28	574,431	100	100
桃園市	970,861	142.4	38.39	49,578	128.73	36.58	40,207	119.38	32.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,983	100.32	25.66	0	0	0	372,812	1184.54	19.06	290,281	122.62	73.88
臺中市	1,591,607	769.41	31.89	61,391	229.74	71.52	117,862	100	0.21	0	0	0	0	0	0	205,064	0	0	256,793	100	53.36	34,351	100	54.49	443,911	371.39	10.66	472,235	763.11	55.12
臺南市	2,711,435	341.84	31.65	450,000	305.9	39.32	60,000	153.06	68.16	0	0	0	99,215	218.26	34.06	261,600	20004.71	76.47	592,000	100	11.17	165,000	100	2.11	122,052	783.85	45.6	961,568	196.82	29.25
高雄市	3,709,672	121.39	48.76	140,427	126.97	46.51	138,352	100.4	56.33	0	0	0	0	0	0	1,502,469	119.27	42.9	268,353	104.94	11.81	149,073	95.26	42.09	154,700	185.51	21.28	1,356,298	126.43	65.88
宜蘭縣	1,092,535	111.7	44.9	27,256	133.39	5.87	22,106	0	0	9,750	100	100	163,923	533.97	6.51	0	0	0	156,495	278.58	37.33	0	0	0	77,038	102.85	30.75	635,967	101.1	60.76
新竹縣	960,601	247.11	25.92	13,425	100	43.16	21,753	101.14	40.45	0	0	0	195,788	1706.51	54.04	26,331	0	0	93,957	0	0	17,358	0	0	77,253	103.29	32.23	514,736	185.28	20.14
苗栗縣	1,093,321	96.44	32.71	39,811	106.81	37.02	24,241	100	53.63	42,750	100	100	239,125	101.24	33.16	50,000	31.65	9.49	172,778	35.78	10.74	100,560	81.12	15.98	195,968	82.85	30.4	228,088	169.15	47.74
彰化縣	1,765,959	259.01	25.98	20,663	103.17	43.06	32,675	105.69	74.66	26,250	100	50	317,320	100	16.21	328,008	821.36	14.04	294,486	100	11	108,386	236.16	56.17	298,701	677.22	26.56	339,470	159.51	41.91
南投縣	1,669,766	99.22	22.61	51,260	683.15	44.31	23,500	151.05	57.91	37,500	99.9	49.95	338,900	100	18.6	123,469	100	32.45	144,363	10.96	2.49	143,000	148.09	7.78	126,632	101.21	33.26	681,142	98.86	23.86
雲林縣	1,433,036	176.04	34.98	22,852	100	28.58	24,573	100.98	37.19	76,500	100	50.04	414,569	256.49	32.74	0	0	0	383,191	460.95	24.06	27,279	374.96	3.44	134,450	129.17	32.66	349,622	141.09	49.95
嘉義縣	1,537,030	280.85	27.7	15,764	122.64	42.84	22,515	100	45.78	91,500	100	50	293,079	169.38	14.78	254,048	370.78	16.31	319,591	100	29.29	90,000	376.67	23.86	118,937	486.37	16.36	331,596	266.55	43.34
屏東縣	2,162,466	123.15	35.57	22,600	100	35.9	27,300	100	35.49	81,000	100	50	281,443	100	30.43	0	0	0	371,357	114.02	28.06	10,000	100	34	96,140	100	14.34	1,272,626	135.41	39.59
臺東縣	1,471,273	152.71	22.43	20,500	98.69	20.17	21,496	80.44	41.69	0	0	0	143,481	0	0	0	0	0	241,268	198.39	4.69	59,530	121.58	49.75	56,240	2316.76	26.36	928,758	154.88	28.12
花蓮縣	1,635,284	154.14	34.31	55,079	117.76	35.35	22,424	117.01	42.27	0	0	0	153,962	286.44	13.02	0	0	0	196,475	232.84	23.52	137,577	644.16	26.31	118,355	745.35	40.4	951,412	127.08	40.13
澎湖縣	792,142	102.54	25.57	30,619	123.63	51.8	21,636	129.08	36.99	43,500	112.38	44.59	94,432	137.13	30.5	122,000	111.86	11	47,503	100	3.53	0	0	0	116,947	56.12	1.77	315,505	90.98	35.91
基隆市	3,706,419	106.52	28.03	237,833	81.94	6.4	44,051	110.93	49.87	0	0	0	108,690	146.93	8.94	32,000	124.92	48.41	61,000	145.28	4.92	25,260	181.68	35.7	330,089	245.48	11.71	2,867,496	103.43	32.29
新竹市	1,518,895	103.24	48.1	23,414	150.76	43.33	22,021	102.37	37.06	0	0	0	82,679	100	36.28	102,200	100	27.98	52,279	153.88	41.63	0	0	0	87,652	91.24	9.49	1,148,650	102.04	54.29
嘉義市	2,215,294	99.75	18.94	150,742	77.25	22.51	83,911	301.74	24.02	0	0	0	122,000	100	2.46	66,000	100	7.58	58,206	87.39	13.7	0	0	0	56,661	0	0	1,677,774	99.04	20.84
金門縣	612,496	153.73	35.66	32,500	118.57	24.31	19,500	46.13	46.13	6,000	200	100	33,000	100	9.09	162,568	748.13	49.24	48,977	100	19.59	23,000	181.54	31.57	160,951	118.57	29.64	126,000	99.04	38.04
連江縣	422,061	158.46	40.45	22,821	228.7	32.73	17,645	94.01	40.52	3,000	100	66.67	0	0	0	600	47.37	15	34,128	44238.48	12.96	0	0	0	33,500	100	0.95	310,367	157.68	48.09

附表 3、落後標案統計表—依計畫類別

108 年 6 月份各縣市政府執行基本設施補助計畫落後標案統計表—依計畫類別

單位：件數

縣市別	合計			文化			體育			補助貧瘠鄉鎮市			道路養護及道安計畫			交通建設			水利建設			農業建設			公有建物及設施			其他建設		
	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率
總計	3,689	371	10.06%	313	18	5.75%	150	13	8.67%	64	0	0%	131	15	11.45%	102	11	10.78%	268	35	13.06%	102	12	11.76%	614	74	12.05%	1,945	193	9.92%
新北市	66	5	7.58%	3	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	2	0	0%	9	1	11.11%	8	1	12.5%	18	1	5.56%	19	2	10.53%
臺北市	39	2	5.13%	1	0	0%	5	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	25	2	8%	4	0	0%
桃園市	87	6	6.9%	15	1	6.67%	23	3	13.04%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	18	1	5.56%	25	1	4%
臺中市	96	2	2.08%	16	0	0%	5	1	20%	0	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	6	0	0%	3	1	33.33%	38	0	0%	26	0	0%
臺南市	184	8	4.35%	53	2	3.77%	8	0	0%	0	0	0%	8	0	0%	11	2	18.18%	22	1	4.55%	2	0	0%	12	0	0%	68	3	4.41%
高雄市	148	11	7.43%	13	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	22	1	4.55%	13	3	23.08%	9	1	11.11%	17	2	11.76%	68	4	5.88%
宜蘭縣	77	4	5.19%	6	0	0%	2	0	0%	1	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	10	0	0%	0	0	0%	8	0	0%	46	4	8.7%
新竹縣	139	20	14.39%	17	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	1	0	0%	9	1	11.11%	3	1	33.33%	7	0	0%	94	18	19.15%
苗栗縣	118	44	37.29%	16	0	0%	1	0	0%	10	0	0%	13	2	15.38%	1	1	100%	14	12	85.71%	4	2	50%	29	12	41.38%	30	15	50%
彰化縣	250	4	1.6%	3	0	0%	14	0	0%	6	0	0%	19	1	5.26%	14	0	0%	35	0	0%	18	0	0%	69	3	4.35%	72	0	0%
南投縣	197	19	9.64%	11	0	0%	4	0	0%	7	0	0%	6	0	0%	3	0	0%	15	6	40%	3	0	0%	8	3	37.5%	140	10	7.14%
雲林縣	93	10	10.75%	6	0	0%	8	3	37.5%	15	0	0%	12	3	25%	0	0	0%	29	0	0%	6	2	33.33%	16	2	12.5%	1	0	0%
嘉義縣	268	21	7.84%	8	0	0%	9	0	0%	15	0	0%	17	2	11.76%	15	2	13.33%	14	0	0%	7	1	14.29%	13	5	38.46%	170	11	6.47%
屏東縣	133	6	4.51%	2	0	0%	9	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	20	1	5%	1	0	0%	12	1	8.33%	82	4	4.88%
臺東縣	203	42	20.69%	4	0	0%	3	2	66.67%	0	0	0%	8	5	62.5%	0	0	0%	12	2	16.67%	11	3	27.27%	11	3	27.27%	154	27	17.53%
花蓮縣	353	16	4.53%	55	4	7.27%	3	0	0%	0	0	0%	7	1	14.29%	0	0	0%	16	0	0%	18	0	0%	75	4	5.33%	179	7	3.91%
澎湖縣	80	10	12.5%	12	0	0%	5	0	0%	7	0	0%	7	1	14.29%	6	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	14	2	14.29%	21	7	33.33%
基隆市	287	34	11.85%	10	2	20%	3	0	0%	0	0	0%	9	0	0%	5	1	20%	5	3	60%	5	0	0%	19	4	21.05%	231	24	10.39%
新竹市	107	10	9.35%	3	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	3	0	0%	8	0	0%	0	0	0%	7	2	28.57%	78	8	10.26%
嘉義市	465	54	11.61%	47	7	14.89%	14	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	3	1	33.33%	6	4	66.67%	0	0	0%	10	0	0%	380	42	11.05%
金門縣	224	33	14.73%	7	1	14.29%	1	1	100%	1	0	0%	3	0	0%	12	2	16.67%	3	0	0%	4	0	0%	183	27	14.75%	10	2	20%
連江縣	75	10	13.33%	5	1	20%	11	3	27.27%	1	0	0%	0	0	0%	2	1	50%	4	1	25%	0	0	0%	5	0	0%	47	4	8.51%

附表 4、落後標案統計表—依查核點

108 年 6 月份各縣市政府基本設施補助計畫落後標案統計表—依查核點

單位：件數

縣市別	標案件數	落後件數	標案落後比率(%)	預算執率低於80%件數	發包率	完工率	驗收率	設計完成			發包決標			開工			施工進度達五十%			完工			驗收完成		
								預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數
總計	3,689	371	10.06	208	88.80	21.44	17.78	3,531	3,477	90	3,345	3,276	169	2,411	2,705	105	988	1,364	32	541	791	21	431	656	20
新北市	66	5	7.58	3	96.97	31.82	24.24	66	66	0	66	64	2	59	63	1	17	32	1	8	21	0	6	16	0
臺北市	39	2	5.13	0	94.87	46.15	30.77	39	39	0	39	37	2	38	36	2	13	23	0	10	18	0	9	12	0
桃園市	87	6	6.90	3	88.51	26.44	18.39	79	80	2	74	77	3	63	70	3	29	39	0	19	23	0	12	16	0
臺中市	96	2	2.08	0	97.92	26.04	22.92	96	96	0	96	94	2	47	74	0	9	40	0	2	25	0	1	22	0
臺南市	184	8	4.35	0	92.39	21.74	16.85	176	177	2	169	170	6	119	139	2	38	65	1	24	40	0	12	31	0
高雄市	148	11	7.43	5	93.24	25.68	21.62	139	143	0	134	138	3	127	138	1	46	83	0	30	38	3	24	32	2
宜蘭縣	77	4	5.19	2	92.21	23.38	22.08	75	74	1	72	71	2	62	63	2	25	27	0	15	18	0	12	17	0
新竹縣	139	20	14.39	4	82.73	30.94	25.18	128	125	7	124	115	13	94	101	5	54	57	3	38	43	3	31	35	2
苗栗縣	118	44	37.29	33	78.81	16.95	14.41	116	100	16	102	93	10	77	79	8	33	36	3	16	20	0	14	17	0
彰化縣	250	4	1.60	0	89.20	19.60	13.20	235	241	1	220	223	3	147	190	3	68	97	0	30	49	0	17	33	0
南投縣	197	19	9.64	11	87.82	14.21	12.18	194	190	4	189	173	16	111	128	4	39	52	0	14	28	0	10	24	0
雲林縣	93	10	10.75	5	86.02	22.58	12.90	92	90	2	84	80	8	46	68	3	17	39	0	2	21	0	2	12	1
嘉義縣	268	21	7.84	4	90.30	20.15	17.54	263	256	7	259	242	18	187	195	14	42	100	1	10	54	1	10	47	1
屏東縣	133	6	4.51	3	93.98	36.09	33.83	129	129	2	127	125	4	78	81	4	52	57	0	43	48	0	41	45	0
臺東縣	203	42	20.69	22	80.30	29.06	22.66	195	180	15	182	163	20	127	129	10	75	79	8	53	59	0	37	46	1
花蓮縣	353	16	4.53	7	94.62	24.36	21.81	349	342	7	342	334	10	247	272	5	124	166	1	57	86	2	47	77	2
澎湖縣	80	10	12.50	7	95.00	6.25	6.25	80	78	2	80	76	4	57	60	0	17	19	0	3	5	0	3	5	0
基隆市	287	34	11.85	27	94.77	4.18	3.48	283	280	3	277	272	5	230	227	7	70	75	4	6	12	1	6	10	2
新竹市	107	10	9.35	6	92.52	18.69	9.35	105	103	2	104	99	5	85	87	3	35	38	2	21	20	2	9	10	1
嘉義市	465	54	11.61	46	81.08	7.31	6.24	412	418	4	335	377	9	172	271	9	54	88	1	29	34	3	24	29	3
金門縣	224	33	14.73	12	84.82	54.91	50.89	213	204	11	207	190	22	189	182	16	114	134	7	105	123	6	98	114	5
連江縣	75	10	13.33	8	84.00	8.00	8.00	67	66	2	63	63	2	49	52	3	17	18	0	6	6	0	6	6	0

附表 5、落後標案統計表—依縣市別、落後原因

落後標案統計表—依縣市別、落後原因

統計截止日期：108 年 6 月底

縣市別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
合計	52	1	0	67	6	5	10	2	8	8	199	13	371
新北市				3						1	1		5
臺北市				2									2
桃園市				5							1		6
臺中市				1							1		2
臺南市	3			2							3		8
高雄市	1			1	2	1		2		1	3		11
宜蘭縣	1				1						2		4
新竹縣	5			2		1	1				11		20
苗栗縣	3			2		1	1			1	36		44
彰化縣	1										3		4
南投縣	5			7		1					6		19
雲林縣				4							5	1	10
嘉義縣	1			4			2		1	1	12		21
屏東縣	2	1		1			1		1				6
臺東縣	4			3			1		1		25	8	42
花蓮縣	5			2			2		1		6		16
澎湖縣										1	9		10
基隆市	7			4	1						22		34
新竹市	1			3	1					1	4		10
嘉義市	7			12			1		1		30	3	54
金門縣	5			9	1		1		3	1	12	1	33
連江縣	1					1				1	7		10
總計	358											13	371

伍、各縣市執行分析

1. 新北市

新北市 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 17.41 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
66	17.41	0	842,656.577	138.47	48.41	66	66	66	64	59	63	17	32	8	21	6	16

本年度基本設施補助經費 17.41 億元(中央補助 17.41 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 66 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 608,527.118 仟元，預算實際支用數 821,788.127 仟元，已執行應付未付數 19,868.45 仟元，發包結餘數 1,000 仟元，合計預算執行數 842,656.577 仟元，預算執行率 138.47%，預算達成率 48.41%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 1,740,810 仟元，直轄市執行率 138.47%，預算達成率 48.41%。
- 依標案執行情形進度區分：66 件標案，已設計完成者 66 件，已發包決標者 64 件，已開工者 63 件，施工進度已達 50%者 32 件，已完工者 21 件，已驗收完成者 16 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，66 件標案計有 5 件落後，落後比率 7.58%。
落後原因：

- 108 年 6 月落後標案 5 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 2 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 3 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 48.41%，較平均預算達成率 35.30%高出 13.11 個百分點，執行情形良好。文化經費(38.22%)、道路養護及道安計畫(7.00%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 5 件落後標案，分屬新北市政府水利局水利行政科(1 件)、新北市政府水利局污水設施科(1 件)、新北市政府水利局抽水站管理科(1 件)、新北市政府農業局農業工程科(1 件)、環保局循環資源科(1 件)執行案件。請新北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新北市 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設											1		1
c007. 農業建設				1									1
c008. 公有建物 及設施				1									1
c009. 其他建設				1						1			2

新北市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新北市	c006-1-1	抽水站及水門設施工程	新北市政府水利局	新北市政府水利局抽水站管理科	10,000	1,000	384	0	0	38	1080331	1080318	1080430	1080501	1080507	1080508	1081015		1081130		1081231		廠商108年6月25日提送計價資料送至會計室，因廠商提供存摺影本頁面共有3間銀行，請廠商確認銀行，並重新提送僅需一間銀行存摺影本，廠商於108年6月28日重新提送，本局已於108年7月1日送至會計室。	本次計價金額為215萬4,672元，於108年7月1日送至會計室審查，爾後將提醒廠商存摺影本頁面僅需提供一間銀行，避免請款進度落後。
新北市	c007-1-8	烏來區西羅岸路135-2號附近道路改善工程	新北市政府農業局	新北市政府農業局農業工程科	3,000	930	0	0	0	0	1080531	1080530	1080630		1080715		1080930		1081015		1081115		本案於6/12經費核准，6/28第一次開標未達法定家數未能決標，目前7/8辦理第二次開標，已決標	決標後將督促廠商加緊趕工以符工進。
新北市	c008-2-3-1	汰換垃圾清運及環境衛生維護機具	新北市政府環境保護局	環保局循環資源科	80,000	0	0	0	0	0	1080129	1080129	1080430		1080531		1080930		1081130		1081231		本局車輛採購契約業於108年3月20日流標，查總統府108年2月27日發布新聞稿，表示第5期環保標準車輛增加2年緩衝期，本局函請環保署釋示「交通工具空氣汙染物排放標準」第5條規定修正案。環保署於108年3月27日環署空字第1080021678A號	將本局標案車輛引擎符合6期環保標準之規定調整為符合5期以上環保標準，並於108年5月17日上網重新公告招標，業於108年6月13日開標，預計將於108

																					函公告，交通工具空氣汙染物排放標準第5條備註9增訂緩衝期規定，明定108年8月31日前重型柴油車之既有引擎得生產、製造至110年8月31日，為因應法規之修正且衡酌市場行情，故致使招標作業進度落後。	年7月31日前完成招標作業。	
新北市	c0010-1-1	108年度補助無自來水地區簡易自來水(含延管)工程	新北市政府水利局	新北市政府水利局水利行政科	20,000	6,000	4,670	0	0	78	1080430	1080430	1080630	1080531	1080715	1080626	1080930		1081130		1081231	招標作業延誤	催請加速辦理
新北市	c0010-1-5	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用	新北市政府水利局	新北市政府水利局污水設施科	60,000	30,000	30,198	0	0	101	1080101	1080101	1080101	1080101	1080101	1080101	1080630		1080930		1081031	1.因連日有大豪雨無法施工，故影響施工進度。2.部份人力、機具投入防汛工作及抽水作業，暫緩施工進度。	1.加強施工進度，確實按期作業，作好工安要求。2.適度工作分配，提昇執行效率。

2. 臺北市

臺北市 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 12.64 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
39	11.17	1.47	1,043,620.838	118.52	82.58	39	39	39	37	38	36	13	23	10	18	9	12

本年度基本設施補助經費 12.64 億元(中央補助 11.17 億元，地方自籌 1.47 億元)，截至 6 月底止，共有標案 39 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 880,580.546 仟元，預算實際支用數 877,048.013 仟元，已執行應付未付數 161,611.961 仟元，發包結餘數 4,960.864 仟元，合計預算執行數 1,043,620.838 仟元，預算執行率 118.52%，預算達成率 82.58%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 1,263,816 仟元，直轄市執行率 118.52%，預算達成率 82.58%。
- 依標案執行情形進度區分：39 件標案，已設計完成者 39 件，已發包決標者 37 件，已開工者 36 件，施工進度已達 50%者 23 件，已完工者 18 件，已驗收完成者 12 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，39 件標案計有 2 件落後，落後比率 5.13%。

落後原因：

- 108 年 6 月落後標案 2 件，屬查核點進度落後者 2 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 2 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 82.58%，較平均預算達成率 35.30%高出 47.28 個百分點，執行情形良好。體育經費(40.28%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 2 件落後標案，分屬臺北市政府警察局(2 件)執行案件，請臺北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺北市 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施				2									2
c009. 其他建設													0

臺北市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺北市	c008-2-1-2	汰換偵防車	臺北市政 府警察局	臺北市政 府警察局	6,800	0	0	0	0	0	1080131	1071016	1080531		1080531		1080831		1080930		1081031		本案簽准以警政署委託臺灣銀行採購部共同供應契約下訂辦理，因警政署本年度變更採購方式，以異質評選最低標方式辦理採購，目前尚未決標，致無法下訂採購。	臺灣銀行採購部已於6月13日完成公開閱覽，俟警政署通知即辦理公告相關事宜，預計8月中旬完成標案。
臺北市	c008-2-1-4	汰換巡邏車	臺北市政 府警察局	臺北市政 府警察局	28,800	0	0	0	0	0	1080131	1071016	1080531		1080531		1080831		1080930		1081031		本案簽准以警政署委託臺灣銀行採購部共同供應契約下訂辦理，因警政署本年度變更採購方式，以異質評選最低標方式辦理採購，目前尚未決標，致無法下訂採購。	臺灣銀行採購部已於6月13日完成公開閱覽，俟警政署通知即辦理公告相關事宜，預計8月中旬完成標案。

3. 桃園市

桃園市 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案件數	總經費 9.71 億元		預算執行數 (千元)	預算執行率 (%)	預算達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
87	9.71	0	372,756.366	142.40	38.39	79	80	74	77	63	70	29	39	19	23	12	16

本年度基本設施補助經費 9.71 億元(中央補助 9.71 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 87 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 261,766.175 仟元，預算實際支用數 348,432.447 仟元，已執行應付未付數 19,601.333 仟元，發包結餘數 4,722.586 仟元，合計預算執行數 372,756.366 仟元，預算執行率 142.40%，預算達成率 38.39%。
 - 依執行機關區分：由縣(市)執行 970,861 仟元，縣(市)執行率 142.4%，預算達成率 38.39%。
 - 依標案執行情形進度區分：87 件標案，已設計完成者 80 件，已發包決標者 77 件，已開工者 70 件，施工進度已達 50%者 39 件，已完工者 23 件，已驗收完成者 16 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，87 件標案計有 6 件落後，落後比率 6.90%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 6 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 3 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
2. 落後原因分析：因招標作業落後者 5 件、其他因素落後者 1 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 38.39%，較平均預算達成率 35.30%高出 3.09 個百分點，執行情形良好。文化經費(36.58%)、體育經費(32.75%)、公有建物及設施經費(19.06%)等三類預算達成率較計畫平均值偏低，需積極執行；另有 6 件落後標案，分屬原住民族行政局(1 件)、桃園市立美術館(1 件)、環境保護局(1 件)、體育局(3 件)執行案件。請桃園市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

桃園市 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化				1									1
c002. 體育				2							1		3
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施				1									1
c009. 其他建設				1									1

桃園市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
桃園市	c001-1-5	辦公廳舍與相關設施保養及維護	文化局	桃園市立美術館	2,000	580	70	0	0	12	1080430	1080430	1080630	1080628	1080630	1080628	1080831		1081031		1081231		採購案招標方式變更	刻正辦理招標文件製作及陳核
桃園市	c002-1-11	運動設施管理業務用器材(具)、相關設備採購及改善等	體育局	體育局	800	200	47	0	0	24	1080222	1080222	1080322	1080322	1080628	1080628	1080730		1081125		1081225		部分器材採購及設備改善與廠商接洽估價作業中。	請承辦人把握作業時程。
桃園市	c002-1-21	辦理國際性或國內體育運動相關研討會議等	體育局	體育局	700	0	0	0	0	0	1080630		1080731		1080731		1080731		1081031		1081231		刻正規劃中。	儘速辦理。
桃園市	c002-1-22	所轄運動場館設施智慧應用(含場館資訊建置)計畫等	體育局	體育局	4,000	0	0	0	0	0	1080501		1080524		1080531		1080831		1081202		1081231		刻正辦理招標文件修正中	儘速辦理
桃園市	c008-2-3-3	資源回收車	環境保護局	環境保護局	15,800	0	0	0	0	0	1080430	1080423	1080610		1080625		1080930		1080930		1081020		因車輛設計規範及招標文件撰寫耗時較久，致延誤招標公告預定上網日期。	招標案已於108年6月13日上網公告，開標日期為108年7月16日。
桃園市	c0010-1-19	2019桃園市原住民族國際音樂節	原住民族行政局	原住民族行政局	5,000	2,000	0	0	0	0	1080415	1080507	1080501	1080710	1080515	1080710	1080907		1080922		1081115		業已於6月28日開標完畢，預定7月1日辦理評選會議，期程因前期作業延誤致作業延誤。	刻正速辦招標作業，預定7月1日辦理評選會議。

4. 臺中市

臺中市 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 15.92 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
96	15.92	0	507,511.871	769.41	31.89	96	96	96	94	47	74	9	40	2	25	1	22

本年度基本設施補助經費 15.92 億元(中央補助 15.92 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 96 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 65,961.428 仟元，預算實際支用數 423,984.16 仟元，已執行應付未付數 83,527.711 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 507,511.871 仟元，預算執行率 769.41%，預算達成率 31.89%。
 - 依執行機關區分：由直轄市執行 1,591,607 仟元，直轄市執行率 769.41%，預算達成率 31.89%。
 - 依標案執行情形進度區分：96 件標案，已設計完成者 96 件，已發包決標者 94 件，已開工者 74 件，施工進度已達 50%者 40 件，已完工者 25 件，已驗收完成者 22 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，96 件標案計有 2 件落後，落後比率 2.08%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 2 件，屬查核點進度落後者 2 件。
2. 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 31.89%，較平均預算達成率 35.30%落後 3.41 個百分點，執行情形欠佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)均未執行，體育經費(0.21%)、公有建物及設施經費(10.66%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 2 件落後標案，分屬農業局(1 件)、運動局(1 件)執行案件。請臺中市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺中市 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育											1		1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設				1									1
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設													0

臺中市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺中市	c002-1-5	本市優秀選手、教練及體育團體參加全國性及國際性賽事獎勵金(含全國運獎金)	運動局	運動局	37,652	0	0	0	0	0	1080430	1080429	1080630		1080830		1081030		1081130		1081215		因目前在收繳體育獎金之收據及匯款資訊中，故第一期經費尚未撥付。	加速催繳申請人之收據，請申請人盡速繳交，俾利完成撥付。
臺中市	c007-2-2	本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施規劃案維護興建工程	農業局	農業局	2,000	0	0	0	0	0	1080531	1080531	1080630	1080704	1080930		1081031		1081130		1081215		本案於108年6月26日辦理第一次公開開標，因投標家數未達3家，宣布流標。	本案已於108年7月4日決標

5. 臺南市

臺南市 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 27.11 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
184	27.11	0	858,186.746	341.84	31.65	176	177	169	170	119	139	38	65	24	40	12	31

本年度基本設施補助經費 27.11 億元(中央補助 27.11 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 184 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 251,049.5 仟元，預算實際支用數 582,737.395 仟元，已執行應付未付數 269,804.466 仟元，發包結餘數 5,644.885 仟元，合計預算執行數 858,186.746 仟元，預算執行率 341.84%，預算達成率 31.65%。
 - 依執行機關區分：由直轄市執行 2,711,435 仟元，直轄市執行率 341.84%，預算達成率 31.65%。
 - 依標案執行情形進度區分：184 件標案，已設計完成者 177 件，已發包決標者 170 件，已開工者 139 件，施工進度已達 50%者 65 件，已完工者 40 件，已驗收完成者 31 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，184 件標案計有 8 件落後，落後比率 4.35%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 8 件，屬查核點進度落後者 8 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因招標作業落後者 2 件、其他因素落後者 3 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 31.65%，較平均預算達成率 35.30%落後 3.65 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(39.32%)、水利建設經費(11.17%)、農業建設經費(2.11%)、其他建設經費(29.25%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 8 件落後標案，分屬工務局(2 件)、文化局(2 件)、水利局(2 件)、智慧發展中心(1 件)、經濟發展局(1 件)執行案件。請臺南市政府主動瞭解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺南市 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化											2		2
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設	1										1		2
c006. 水利建設				1									1
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	2			1									3

臺南市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺南市	c001-1-47	新營文化中心地坪牆面及空間等改善工程	文化局	文化局	2,450	0	0	0	0	0	1080430		1080630		1080815		1080901		1081215		1081231		本工程設計費用偏低，建築師投標意願不高	與他案合併發包，設計標案於5月14日決標。依據契約書規定，廠商須於108.07.04前完成細部設計書圖送機關審查。預定7月20日完成審查。
臺南市	c001-1-48	新營文化中心油漆及踢腳板等工程	文化局	文化局	1,520	0	0	0	0	0	1080430		1080630		1080815		1080901		1081215		1081231		本工程設計費用偏低，建築師投標意願不高	與他案合併發包，設計標案於5月14日決標。依據契約書規定，廠商須於108.07.04前完成細部設計書圖送機關審查。預定7月20日完成審查。
臺南市	c005-2-2	南區4-12-15m道路(後段)接4-71-15m道路至I-4-12m道路(前段)工程(新都路)	工務局	工務局	15,500	0	0	0	0	0	1080228	1080228	1080630		1080730		1081130		1081231		1081231		因南山公墓墳墓遷葬因素及文資調查，重新調整本案挖掘深度及設計後再行上網招標	簽核中
臺南市	c005-2-4	下營區4-14-8M(和平街)都市計畫道路開闢工程	工務局	工務局	2,000	0	0	0	0	0	1070713	1070713	1071218	1071218	1080501	1080422	1080630	1080708	1080731		1080930		台電電桿未遷移影響拆除作	台電於6月24日完成

																					業	遷移作業，廠商於6月25日進場施作(截至6月30日實際進度47.74%)。
臺南市	c006-1-17	永康水資中心興建跨橋工程及用地費	水利局	水利局	14,000	0	0	0	0	0	1080301	1070122	1080628		1080902		1081030		1081216	1081231	本業業經108年4月23日至108年5月14日共辦理四次公開招標皆流標，經詢投標廠商表示本業工區範圍內現地條件不佳，且市場鋼鐵及砂石、混凝土價格皆有波動，故投標意願低。	本業業經顧問公司於現地勘查評估工法及新增現地相關改善項目及數量，並於108年6月26日重新上網招標作業，7月11日開標流標，預計7月18日再次開標。
臺南市	c0010-1-3	公文管理系統相關硬體汰舊更換、資料備份中心建置等	智慧發展中心	智慧發展中心	8,850	0	0	0	0	0	1080430	1080604	1080515	1080611	1080531		1080831		1081031	1081231	因本案依現有民治、永華及IDC機房等地點有關之雲端虛擬環境、資料備份、系統備援等整體性維護規劃，因5月份公共工程委員修正多個招標文件範本，且本案涉及採購決標方式(最有利標決標)及後續採購範圍等，相關招標文件修正較久。	本案已於6月11日完成上網發包公告作業，7月11日開標流標，預計7月22日再次開標。
臺南市	c0010-1-36	辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程等經費	水利局	水利局	10,000	0	0	0	0	0	1080531	1080621	1080630		1080731		1081031		1081215	1081228	因廠商測量需配合海象作業致預算書送審延宕	已於6/21設計完成並辦理發包作業，7/9流標(2家)，預計

6. 高雄市

高雄市 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 37.10 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
148	37.1	0	1,808,775.768	121.39	48.76	139	143	134	138	127	138	46	83	30	38	24	32

本年度基本設施補助經費 37.1 億元(中央補助 37.1 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 148 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,490,097.502 仟元，預算實際支用數 1,630,589.671 仟元，已執行應付未付數 174,493.126 仟元，發包結餘數 3,692.971 仟元，合計預算執行數 1,808,775.768 仟元，預算執行率 121.39%，預算達成率 48.76%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 3,709,672 仟元，直轄市執行率 121.39%，預算達成率 48.76%。
- 依標案執行情形進度區分：148 件標案，已設計完成者 143 件，已發包決標者 138 件，已開工者 138 件，施工進度已達 50%者 83 件，已完工者 38 件，已驗收完成者 32 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，148 件標案計有 11 件落後，落後比率 7.43%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 11 件，屬預算執行未達 80%者 3 件，屬查核點進度落後者 6 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 2 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件、因人力需求落後者 2 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 3 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 48.76%，較平均預算達成率(35.30%)高出 13.46 個百分點，執行情形良好。水利建設經費(11.81%)、公有建物及設施經費(21.28%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 11 件落後標案，分屬高雄市政府水利局(6 件)、高雄市政府交通局(1 件)、高雄市政府海洋局(1 件)、高雄市政府環境保護局(1 件)、高雄市政府警察局(2 件)執行案件。請高雄市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

高雄市 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設										1			1
c006. 水利建設	1				1			1					3
c007. 農業建設								1					1
c008. 公有建物 及設施											2		2
c009. 其他建設				1	1	1					1		4

高雄市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
高雄市	c005-3-6	獨立式智慧型站牌	高雄市政府 府交通局	高雄市政府 府交通局	2,280	0	0	0	0	0	1070706	1070706	1070802	1070802	1070830	1070830	1080403	1080304	1080503	1080524	1080614		因雨季造成現地安裝施工不便	廠商已於5/24完成安裝，並於6/13確認竣工，將盡速完成驗收付款事宜。
高雄市	c006-1-4	梓官區中正路抽水站新建工程	高雄市政府 府水利局	高雄市政府 府水利局	14,801	7,000	7,000	0	0	100	1060914	1060914	1070110	1070110	1070124	1070124	1070822	1070822	1080630		1080930		配合現地辦理變更設計，致使工期增加	變更設計已完成，後續將盡速完成並加強施工進度管制，達成年度結案目標。
高雄市	c006-1-5	高雄市十全滯洪池工程	高雄市政府 府水利局	高雄市政府 府水利局	35,405	10,300	11,717	0	0	114	1060630	1060630	1060830	1060830	1060914	1060914	1070711	1070711	1080630		1081231		承商出工數不足及材料整備不齊，同時6月份連續多次降雨影響戶外工項無法接續施工，致施工進度落後。	持續督促承商增加出工人數及協調供料商配合優先供料，另天氣許可下增加施工面追趕進度。
高雄市	c006-3-6	排水興建工程	高雄市政府 府水利局	高雄市政府 府水利局	10,000	2,000	0	1,048	0	52	1080401	1080430	1080430	1080528	1080531	1080621	1080715		1080831		1080930		本案因顧問公司逾期修正設計圖說，致後續取得技師審查回條時間及簽辦預算書圖核定時間往後延宕。	本案已於108年6月21日開工，預計於108年10月底完工(工期:90工作天)將積極管控施工進度以達年度

高雄市	c007-2-1	高雄市漁業建設計畫	高雄市政府海洋局	高雄市政府海洋局	23,228	9,300	3,196	3,766	0	75	1080215	1080214	1080227	1080225	1080304	1080304	1080930		1081225	1081231	廠商人員調配人力不當，致進度落後	請廠商儘速完成人力調配，加速工程施工
高雄市	c008-2-1-1	汰換巡邏車17輛	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	12,206	0	0	0	0	0	1080401	1071106	1080415		1080731		1080930		1081015	1081031	台灣銀行共同供應契約額度不足，致無法下訂。	俟7月台銀新約上架後即可下單訂購，完成進度。
高雄市	c008-2-1-4	汰換高行性能偵防車2輛	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	1,946	0	0	0	0	0	1080401	1071106	1080415		1080731		1080930		1081015	1081031	台灣銀行共同供應契約額度不足，致無法下訂。	俟7月台銀新約上架後即可下單訂購，完成進度。
高雄市	c0010-1-10	高屏溪里嶺大橋下游河段疏濬作業	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	20,000	0	1,300	0	0	100	1080308	1080308	1080430		1080528		1080831		1081031	1081231	1. 原於5/14完成開資格審查標，4家投標，3家合格，1家不合格，原定5/28開評選會，因廠商提出異議，為使採購程序更具完備，避免日後爭議，故暫緩108年5月28日審查會議，待釐清相關疑義後再另行通知召開旨案會議。 2. 因目前臨汛期無法開工，需俟汛期過後再行辦理疏濬事宜。	1. 已於108年6月25日召開評選會議。目前正簽辦後續議約事宜 2. 因目前汛期，現場水漲狀況導致無法施工，需俟汛期過後現場河川渠道狀況穩定，確保施工安全，估約10月開始進場施工。
高雄市	c0010-1-20	107-108年資源回收廠垃圾焚化底渣再利用計畫	高雄市政府環境保護局	高雄市政府環境保護局	80,000	36,000	640	16,005	0	46	1080213	1080102	1080215	1080219	1080219	1080219	1080315	1080312	1081231	1081231	底渣再利用委託處理計畫，於108年2月19日決議正式處理底渣產製再生粒料，惟再生產品需先行熟化	已於108年5月22日辦理驗收審查會議，續將儘速辦理，並支

																					期與檢測後，才可去化至工程單位使用，故履約執行成效因此延宕。	付相關費用。	
高雄市	c0010-1-64	高雄市寶珠溝排水整治工程	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	48,669	48,669	20,000	3,591	0	48	1061101	1061101	1061213	1061213	1070105	1070105	1070731	1070731	1080531	1080930	1. 因地下管線年久不明及既有結構體未放樣開挖後遇抵觸，2. 污水推進過地下不明結構體增設工作井及人孔 3. 健橋橋開挖後抵觸地下污水管線調整位置及工法 4. 草坡開挖後抵觸地下箱涵調整工法	第二次變更設計簽辦中，預計108年7月中完成，變更完成後即可估驗剩餘款項。另外本案已與承商協議先行施工，截至108年6月30日進度已施作約92%，預計108年8月底完工	
高雄市	c0010-1-67	高雄市車行地下道機電設備更新工程	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	8,800	8,800	1,997	0	0	23	1070321	1070321	1070412	1070412	1070511	1070511	1071012	1071012	1080102	1080102	1080531	因部分設備初驗驗收缺失改善後需功能測試，又涉及其他機關協助配合，致使期程延誤；目前已辦理正式驗收。	加速後續驗收及結算付款作業

7. 宜蘭縣

宜蘭縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.93 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
77	10.93	0	490,526.427	111.70	44.90	75	74	72	71	62	63	25	27	15	18	12	17

本年度基本設施補助經費 10.93 億元(中央補助 10.93 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 77 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 439,129.122 仟元，預算實際支用數 446,628.579 仟元，已執行應付未付數 43,897.848 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 490,526.427 仟元，預算執行率 111.70%，預算達成率 44.90%。
 - 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,092,535 仟元，縣(市)執行率 111.7%，預算達成率 44.9%。
 - 依標案執行情形進度區分：77 件標案，已設計完成者 74 件，已發包決標者 71 件，已開工者 63 件，施工進度已達 50%者 27 件，已完工者 18 件，已驗收完成者 17 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，77 件標案計有 4 件落後，落後比率 5.19%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 4 件，屬查核點進度落後者 2 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 2 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因施工作業落後者 1 件、其他因素落後者 2 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 44.90%，較平均預算達成率 35.30%高出 9.60 個百分點，執行情形良好。體育經費均未執行，文化經費(5.87%)、道路養護及道安計畫(6.51%)等二類預算達成率相較於計畫平均值偏低，需積極執行；另有 4 件落後標案，分屬水利資源處(1 件)、交通處(2 件)、地政處(1 件)執行案件。請宜蘭縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

宜蘭縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	1				1						2		4

宜蘭縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
宜蘭縣	c0010-1-3	補助鄉鎮市公所辦理宜蘭縣農地重劃區農水路改善工程	地政處	地政處	1,600	800	0	0	0	0	1080430	1080507	1080531		1080531		1080731		1080731		1080731		本案係補助宜蘭市公所辦理農地重劃區農水路改善工程，因該所須全面彙整轄內待改善農路，致提報計畫書期程落後。	本案宜蘭市公所於108年3月12日函請本府補助，本處3月15日發辦上陳，5月8日簽准補助200萬元，該所工程於6月4日決標，6月26日請領補助款，因領款文件有遺漏，本府7月2日函請該所儘速補正資料。
宜蘭縣	c0010-1-6	無尾港環境教育解說中心修繕工程	水利資源處	水利資源處	3,200	0	0	0	0	0	1080630		1080731		1080831		1081031		1081231		1081231		規劃設計排程與合約時程有出入	減少初設及細設時程儘速發包趕上開工時程
宜蘭縣	c0010-1-15	辦理縣管道路溝盖板更新及改善工程	交通處	交通處	12,000	0	4,000	0	0	100	1080531	1080515	1080630		1080731		1081031		1081231		1081231		本案已設計完成，惟經評估後，與它案併案召開設計審查會及發包	預計8月份辦理發包，9月份開工
宜蘭縣	c0010-1-19	補助宜蘭市公所辦理道路維護管理工程	交通處	交通處	8,000	8,000	0	0	0	0	1080430	1080426	1080531	1080604	1080630		1080731		1080930		1081031		因決標時間較晚，致開工時間後延。	將請執行單位加速辦理後續作業。

8. 新竹縣

新竹縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案件數	總經費 9.61 億元		預算執行數 (千元)	預算執行率 (%)	預算達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
139	9.6	0	248,944.535	247.11	25.92	128	125	124	115	94	101	54	57	38	43	31	35

本年度基本設施補助經費 9.61 億元(中央補助 9.6 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 139 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 100,743.45 仟元，預算實際支用數 123,449.822 仟元，已執行應付未付數 125,397.944 仟元，發包結餘數 96.769 仟元，合計預算執行數 248,944.535 仟元，預算執行率 247.11%，預算達成率 25.92%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 960,601 仟元，縣(市)執行率 247.11%，預算達成率 25.92%。
- 依標案執行情形進度區分：139 件標案，已設計完成者 125 件，已發包決標者 115 件，已開工者 101 件，施工進度已達 50%者 57 件，已完工者 43 件，已驗收完成者 35 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，139 件標案計有 20 件落後，落後比率 14.39%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 20 件，屬查核點進度落後者 16 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 11 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 25.92%，較平均預算達成率 35.30%落後 9.38 個百分點，執行情形不佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、水利建設經費、農業建設經費等三類均未執行，體育經費(40.45%)、其他建設經費(20.14%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 20 件落後標案，分屬工務處(4 件)、地政處(2 件)、原住民族行政處(3 件)、國際產業發展處(1 件)、稅捐局(3 件)、衛生局(3 件)、警察局(4 件)執行案件。請新竹縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設											1		1
c007. 農業建設				1									1
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	5			1		1	1				10		18

新竹縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新竹縣	c006-1-4	補助鄉鎮公所辦理河川管理工作(獎補助費)	工務處	工務處	1,400	0	0	0	0	0	1080531	1080531	1080630		1080715		1080930		1081130		1081231		招標文件準備中。	本府將積極趕辦，期能達成進度。
新竹縣	c007-1-1	辦理農地重劃區農水路更新改善工程	地政處	地政處	3,000	0	0	0	0	0	1080430	1080531	1080628		1080830		1080930		1081031		1081231		108年5月2日府地劃字第1084211388號函簽訂委託設計契約通知廠商文到30日內規劃設計完成。	已於108年5月2日確認設計位置，廠商108年05月31日設計完成，刻正辦理工程發包簽核事宜。
新竹縣	c0010-1-8	原住民族部落特色道路改善計畫。(縣配合款)	原住民族行政處	原住民族行政處	2,500	0	0	0	0	0	1080630		1080630		1081231		1081231		1081231		1081231		本案原住民族委員會於108年5月30日核定，本府尚在研議行政委辦由尖石鄉公所辦理設計、施工及監造作業。	俟簽准結果辦理。
新竹縣	c0010-1-9	原住民族基礎建設工程補助款(獎補助費)	原住民族行政處	原住民族行政處	5,000	0	0	0	0	0	1080630		1080630		1081231		1081231		1081231		1081231		本案為尖石鄉公所與五峰鄉公所執行多項子計畫，本府於108年5月16日核定部分計畫，尖石鄉公所修正預算書中。	持續追蹤該案辦理情形。
新竹縣	c0010-1-10	原住民族部落聯絡道路養護費用(獎補助費)	原住民族行政處	原住民族行政處	3,500	0	0	0	0	0	1080630		1080630		1081231		1081231		1081231		1081231		本府尚未核定計畫給公所執行。	依各單位意見辦理。
新竹縣	c0010-1-12	辦理新竹縣國際AI智慧園區計畫。(縣配合款)	國際產業發展處	國際產業發展處	26,206	0	0	0	0	0	1080630		1080630		1081231		1081231		1081231		1081231		因本案各相關法定書件審議時程之不確性，已超出原定計劃預定期	超出原定計劃預定期程，後續未來配合經濟部

																					程，導致無法如期完成。後續未來配合經濟部工業局前瞻設計計畫109年10月31日完工期限，因此刪除部分工程項目。	工業局前瞻設計計畫109年10月31日完工期限，刪除部分工程項目。	
新竹縣	c0010-1-15	寬頻管道緊急維修工程	工務處	工務處	2,000	0	0	0	0	0	1080430	1080426	1080531		1080621		1081031		1081216		1081231	定於108年7月11日開標。	定於108年7月11日開標。
新竹縣	c0010-1-18	瀝青路面改善及無自來水地區路面修復工程。	工務處	工務處	169,540	0	0	0	0	0	1080630		1080731		1080831		1081122		1081216		1081231	勞務標於108年6月24日決標，工程預算書設計中。	勞務標於108年6月24日決標，工程預算書設計中。
新竹縣	c0010-1-21	推動騎樓整平計畫工程(縣配合款)	工務處	工務處	500	0	0	0	0	0	1080630		1080731		1080831		1081031		1081202		1081231	因本案預算是墊付案，108年6月20日議會通過墊付，才能辦理後續發包作業。	儘速辦理發包作業。
新竹縣	c0010-1-34	竹北地政一樓高架地板及線路重整	地政處	地政處	172	172	0	0	0	0	1080412	1080604	1080430	1080628	1080510		1080514		1080517		1080524	第一次流標，第二次已決標。	待合約製作完成後開工。
新竹縣	c0010-1-53	辦公室天花板整建工程	稅捐局	稅捐局	3,951	3,951	0	0	0	0	1080118	1080118	1080130	1080130	1080213	1080213	1080410	1080410	1080531	1080531	1080630	驗收缺失待改善。	請廠商於期限內改善完成並辦理複驗事宜。
新竹縣	c0010-1-54	辦公室消防設備及改善線路工程	稅捐局	稅捐局	940	0	0	0	0	0	1080501		1080525		1080525		1080625		1080731		1080831	目前已由消防技師規劃設計中。	請消防技師儘速辦理規劃設計作業，並積極推動後續事宜。
新竹縣	c0010-1-59	購置單槍投影機、液晶顯示器及汰換飲水機、冷氣機等辦公事務及廳舍所需各項設施、設備	稅捐局	稅捐局	717	567	353	0	0	62	1080115	1080115	1080120	1080120	1080120	1080120	1080131	1080131	1080630		1080731	監視器更新案目前正辦理招標前置作業中。	監視器更新案儘速辦理發包作業。
新竹縣	c0010-1-63	微生物檢驗室環境整修工程。(縣配合款)	衛生局	衛生局	288	0	0	0	0	0	1080531	1080522	1080630		1080715		1080831		1081215		1081231	1. C0010-1-64第二級生物安全櫃為微生物實驗室使用，因整體規劃考量	1. 積極尋找委託設計監造廠商:5月14日簽准、5

																					將兩案合併為同一標案，委託設計監造廠商原訂4月8日簽約時，廠商因故無法承作而放棄，故延遲進度 2. 預算書圖及招標文件審核時，考量本局建築物老舊恐無法符合室內裝修申請之相關規範且耗時及無該筆預算，故變更規劃設計。	月22日廠商已函送預算書圖及招標文件 2. 契約及規劃變更：6月10日函文廠商辦理契約及規劃變更、6月17日雙方同意用印完成、6月20日廠商函送變更後之預算書圖及招標文件、6月27日本局審核通過、6月27日招標文件簽核中。	
新竹縣	c0010-1-64	第二級生物安全櫃。(縣配合款)	衛生局	衛生局	93	0	0	0	0	0	1080501	1080627	1080531		1080630		1081130		1081215		1081231	1. 該項設備為微生物實驗室使用，因整體規劃考量將該設備與微生物實驗室環境改善合併為同一標案，委託設計監造廠商原訂4月8日簽約時，廠商因故無法承作而放棄，故延遲進度 2. 預算書圖及招標文件審核時，考量本局建築物老舊恐無法符合室內裝修申請之相關規範且耗時及無該筆預算，故變更規劃設計。	1. 積極尋找委託設計監造廠商：5月14日簽准、5月22日廠商已函送預算書圖及招標文件 2. 契約及規劃變更：6月10日函文廠商辦理契約及規劃變更、6月17日雙方同意用印完成、6月20日廠商函送變更後之預算

																						書圖及招標文件、6月27日本局審核通過、6月27日招標文件簽核中。	
新竹縣	c0010-1-66	原住民區醫療相關設備更新-巡迴醫療車。(縣配合款)	衛生局	衛生局	82	0	0	0	0	0	1080501	1080527	1080630	1080703	1080930		1081031		1081216		1081216	第一次開標流標，需重新招標。	加強追進度。
新竹縣	c0010-1-69	內政部前瞻計畫竹東分局地上4層廳舍耐震補強工程經費(後勤科)。(縣配合款)	警察局	警察局	1,653	0	0	0	0	0	1080531	1080627	1080628		1080731		1081011		1081115		1081231	因本案服務實施計畫書退還修正而花費較多時間，導致後續進度落後。	目前廠商已完成本案工程設計並提送該預算書圖，將儘速委託結構工程師公會審查設計成果，以利辦理上網招標事宜。
新竹縣	c0010-1-70	內政部前瞻計畫新工派出所廳舍耐震補強工程經費(後勤科)。(縣配合款)	警察局	警察局	259	0	0	0	0	0	1080531	1080627	1080628		1080731		1081011		1081115		1081231	因本案服務實施計畫書退還修正而花費較多時間，導致後續進度落後。	目前廠商已完成本案工程設計並提送該預算書圖，將儘速委託結構工程師公會審查設計成果，以利辦理上網招標事宜。
新竹縣	c0010-1-71	資訊機房不斷電系統汰換(資訊科)	警察局	警察局	528	0	0	0	0	0	1080516	1080515	1080603	1080621	1080618	1080701	1080701		1080731		1080815	原不斷電系統專案，因考量整體機房電路備援機制，原計畫重新擬訂，故略為延後總期程。	已於108年6月21日決標。
新竹縣	c0010-1-73	採購科技辦案設備(網路封包分析鑑識軟體、影像關聯分析	警察局	警察局	856	856	330	0	0	39	1080415	1080415	1080513	1080513	1080531	1080531	1080617		1080628		1080731	本案持續採購中。	本案持續採購中。

9. 苗栗縣

苗栗縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.93 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
118	10.93	0	357,617.961	96.44	32.71	116	100	102	93	77	79	33	36	16	20	14	17

本年度基本設施補助經費 10.93 億元(中央補助 10.93 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 118 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 370,809.6 仟元，預算實際支用數 179,202.542 仟元，已執行應付未付數 178,295.078 仟元，發包結餘數 120.341 仟元，合計預算執行數 357,617.961 仟元，預算執行率 96.44%，預算達成率 32.71%。
 - 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,093,321 仟元，縣(市)執行率 96.44%，預算達成率 32.71%。
 - 依標案執行情形進度區分：118 件標案，已設計完成者 100 件，已發包決標者 93 件，已開工者 79 件，施工進度已達 50%者 36 件，已完工者 20 件，已驗收完成者 17 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，118 件標案計有 44 件落後，落後比率 37.29%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 44 件，屬預算執行未達 80%者 21 件，屬查核點進度落後者 11 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 12 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因招標作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 36 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 32.71%，較平均預算達成率 35.30%落後 2.59 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(37.02%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(9.49%)、水利建設經費(10.74%)及農業建設經費(15.98%)等 4 類之預算達成率與計畫平均值相較偏低，需積極執行；另有 44 件落後標案，分屬工務處土木科(3 件)、工務處工程科(2 件)、工務處交通規劃科(1 件)、工務處養護科(1 件)、工商發展處使用管理科(1 件)、水利處下水道科(12 件)、水利處土石資源科(1 件)、水利處水土保持科(1 件)、水利處水利科(8 件)、水利處城鄉發展科(1 件)、地政處(1 件)、消防局行政科(2 件)、消防局搶救科(4 件)、農業處休閒農業科(1 件)及警察局後勤科(5 件)執行案件。請苗栗縣政

府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

苗栗縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫											2		2
c005. 交通建設											1		1
c006. 水利建設	2			1						1	8		12
c007. 農業建設											2		2
c008. 公有建物 及設施											12		12
c009. 其他建設	1			1		1	1				11		15

苗栗縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
苗栗縣	c004-2-4	辦理道路橋梁等設施養護作業	工務處	工務處養護科	6,000	3,000	2,167	0	0	72	1080101	1071203	1080131	1071228	1080228	1080101	1080930		1081231		1090131		旨計畫係依實辦理核銷，目前刻正執行中。	依實核銷
苗栗縣	c004-4-2	全縣道路規劃設計	工務處	工務處交通規劃科	2,500	500	0	346	0	69	1070615	1070615	1080531	1080410	1080628	1080419	1080930		1081231		1090228		本案第1款項(345,750)已支付，刻正辦理召開可行性研究中報告審查會議前置作業	俟可行性研究期中報告審查通過後，廠商依契約規定提送請款資料過府，俾利辦理後續請款作業
苗栗縣	c005-1-1	辦理全縣道路(含市區道路)及小型其他公共工程	工務處	工務處工程科	50,000	15,000	0	4,747	0	32	1080430	1080411	1080531	1080430	1080629	1080516	1080928		1081231		1090430		因部分計畫尚在委託規劃設計現勘，部分工程施工中尚未完工及部分工程公告招標中。	工程將繼續辦理招標作業，已發包之工程將儘速辦理驗收結算付款。
苗栗縣	c006-1-1	全縣區域排水水利零星相關工程	水利處	水利處水利科	29,991	8,997	0	2,879	0	32	1080405	1080403	1080628	1080620	1081031		1081129		1090115		1090331		本標案含多件小型工程，陸續依實際簽辦結果執行中。	後續加速辦理。
苗栗縣	c006-1-2	區域排水應急、疏濬清淤工程經費	水利處	水利處水利科	26,890	8,067	0	3,549	0	44	1080415	1080405	1080415	1080424	1080510	1080510	1080830		1081129		1081231		部份清淤委請公所代辦，部份辦理後續擴充作業；本府清淤分為北、中、南區，目前工程依進度施作中，北區18.97%、中區54.61%、南區27.82%。	加速辦理
苗栗縣	c006-1-3	全縣區域排水防救災暨自來水延管配合業務	水利處	水利處水利科	17,910	5,373	0	2,364	0	44	1080415	1080201	1080628	1080222	1080830	1080222	1081031		1081231		1090210		部份為勞務開口合約，依實際搶修搶險狀況請款。	依汛期搶修撥付廠商。

苗栗縣	c006-1-4	全縣區域排水水利建造物維護管理	水利處	水利處水利科	3,770	1,131	0	498	0	44	1080430	1080415	1080510	1080510	1080628	1080614	1080815		1081213		1090210		年度汛期後進行檢查	後續加速辦理
苗栗縣	c006-2-1	全縣縣管河川水利零星相關工程	水利處	水利處水利科	29,990	8,997	0	1,799	0	20	1080520	1080510	1080710		1080731		1080930		1081230		1090330		本標案含多件小型工程,陸續依實際發辦結果執行中。	後續加速辦理。
苗栗縣	c006-2-2	縣管河川應急、疏濬清淤工程經費	水利處	水利處水利科	20,000	6,000	0	2,640	0	44	1080320	1080308	1080430	1080417	1080530	1080503	1080930		1081230		1081231		部份清淤委請公所代辦,部份辦理後續擴充作業;本府清淤分為北、中、南區,目前工程依進度施作中,北區18.97%、中區54.61%、南區27.82%。	加速辦理
苗栗縣	c006-2-3	全縣縣管河川防救災暨自來水延管配合業務	水利處	水利處水利科	12,249	3,675	0	1,177	0	32	1080430	1080412	1080614	1080605	1080628	1080701	1081031		1081230		1090228		部份為勞務開口合約,依實際搶修搶險狀況請款。	依汛期搶修險撥付廠商。
苗栗縣	c006-2-4	全縣縣管河川水利建造物維護管理	水利處	水利處水利科	6,700	2,010	0	0	0	0	1080430	1080405	1080515	1080510	1080620	1080705	1080815		1081213		1090131		年度汛期後進行檢查	加速辦理
苗栗縣	c006-3-1	108年度苗栗縣雨下水道系統興建及改善工程(開口合約)	水利處	水利處下水道科	6,931	2,079	0	1,733	0	83	1080329	1080401	1080430		1080530		1081031		1090331		1090430		已於108年6月12日、19日、26日開標流標。	請廠商重新檢討單價中。
苗栗縣	c006-3-2	雨下水道清淤工程(開口合約)	水利處	水利處下水道科	15,000	4,500	0	0	0	0	1080329	1080315	1080430	1080507	1080520	1080524	1080830		1081231		1090228		顧問公司尚未提送第一次派工預算	已函催辦
苗栗縣	c006-3-3	苗栗縣雨下水道設施普查及空間資料庫建置	水利處	水利處下水道科	43	13	0	11	0	83	1061229	1060727	1080430		1080531		1080628		1080930		1081031		招標文件討論修正耗時	已於108年6月21日訂約,已函請廠商7月11日前提送工作計畫書(初稿)。
苗栗縣	c006-3-5	苗栗縣造橋鄉、三灣鄉及南庄鄉雨下水道系統檢討規劃	水利處	水利處下水道科	167	60	148	0	0	246	1080301	1080301	1080301	1080301	1080628		1080930		1081231		1090331		普查提供資料不足,故停工數月,現已復工	積極趕工中
苗栗縣	c007-1-1	治山防災及野溪坑溝整治工程	水利處	水利處水土保持科	30,000	9,000	364	1,673	0	23	1080628	1080627	1080830		1080930		1081231		1090331		1090630		目前發包10件施工中,施工部分請廠商在期限內完工,尚未發包部分已請設計公司將預算書送府審	督促廠商盡速施工,俟完工驗收後辦理結案。尚未發包部分已請

																					查,辦理發包事宜。	設計公司將預算書送府審查,辦理發包事宜。		
苗栗縣	c007-1-2	農路改善	農業處	農業處 休閒農業科	50,000	1,500	0	375	0	25	1080628	1080628	1080927		1081031	1081231	1090430	1090630		目前14件工程施工中,59件預算書審查中,請設計公司盡速將預算書送府審查,以利辦理發包。	請設計公司盡速將預算書送府審查,以利辦理發包。			
苗栗縣	c008-1-1-5	頭份市和平路員警宿舍拆除工程	警察局	警察局 後勤科	450	200	0	248	0	124	1080430	1080401	1080430	1080410	1080531	1080513	1080630		1080731	1080831	台電線路遷移影響施工	業向台電申請線路遷移,俟完成後即報復工		
苗栗縣	c008-1-1-6	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築	警察局	警察局 後勤科	800	240	44	196	0	100	1080630		1080915		1080930		1081130		1081216	1081231	細部設計尚未完成	將請設計單位修正及委外審查併行辦理		
苗栗縣	c008-1-1-7	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築	警察局	警察局 後勤科	313	94	24	70	0	100	1080630		1080915		1080930		1081031		1081215	1081231	委外設計修正時程較長	業於108年7月3日審查通過		
苗栗縣	c008-1-1-8	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築	警察局	警察局 後勤科	457	137	4	133	0	100	1080630		1080915		1080930		1081031		1081215	1081231	委外設計修正時程較長	業於108年7月3日審查通過		
苗栗縣	c008-1-1-9	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備計畫-公有危險建築補強重建計畫-警察機關辦公廳舍補強重建-公有建築	警察局	警察局 後勤科	654	196	16	180	0	100	1080630		1080915		1080930		1081031		1081215	1081231	委外設計修正時程較長	業於108年7月3日審查通過		
苗栗縣	c008-1-2-1	三灣消防分隊廳舍耐震補強工程	消防局	消防局 行政科	2,733	820	0	0	0	0	1080131	1080131	1080131	1080131	1080220	1080220	1080531	1080514	1080731	1080514	1081231	廠商為請款	已請廠商盡速請款	
苗栗縣	c008-1-2-2	苗栗分隊辦公廳舍耐震詳細評估	消防局	消防局 行政科	50	50	0	0	0	0	1080131	1080131	1080430	1080419	1080510	1080419	1080630	1080628	1080630	1080628	1080731	1080628	本案已辦理結算中	積極辦理結算
苗栗縣	c008-2-2-1	雲梯車1輛	消防局	消防局 搶救科	28,500	9,000	0	0	0	0	1080329	1080402	1080430	1080529	1080430	1080529	1090430		1090430	1090529		本案因修正規格,致執行進度落後。	為加強執行進度,將持續督促得標廠商積極趕工。	
苗栗縣	c008-2-2-2	小型水箱車1輛	消防局	消防局 搶救科	5,000	1,500	0	0	0	0	1080329	1080401	1080430	1080516	1080430	1080516	1090131		1090131	1090228		本案因修正規格,致執行進度	為加強執行進度,將	

																					落後。	持續督促標廠商積極趕工。	
苗栗縣	c008-2-2-3	水箱消防車1輛	消防局	消防局搶救科	6,500	2,000	0	0	0	0	1080329	1080401	1080430	1080516	1080430	1080516	1090131		1090131	1090228	本案因修正規格,致執行進度落後。	為加強執行進度,將持續督促標廠商積極趕工。	
苗栗縣	c008-2-2-4	水庫車1輛	消防局	消防局搶救科	9,000	2,700	0	0	0	0	1080329	1080401	1080430	1080516	1080430	1080516	1090131		1090131	1090228	本案因修正規格,致執行進度落後。	為加強執行進度,將持續督促標廠商積極趕工。	
苗栗縣	c008-5-1	全縣城鄉風貌興建等公共設施工程	水利處	水利處城鄉發展科	30,000	9,000	1,900	2,684	0	51	1080531	1080531	1080630	1080630	1080820		1081015		1081214	1081231	目前已核定,尚在辦理設計或發包中金額計1,900萬元,盡速完成規劃設計作業,續辦招標作業。	俟工程發核准後,盡速完成規劃設計作業,續辦招標作業。	
苗栗縣	c0010-1-3	中央管河川疏濬兼供土石作業	水利處	水利處土石資源科	35,000	15,000	0	11,405	0	76	1080131	1080131	1080228	1080226	1080329	1080315	1080731	1080531	1080930		1081101	工程已達一定進度,承商未提估驗計價致預算執行率低	承商已提報估驗作業,目前正辦理相關作業。
苗栗縣	c0010-1-4	提升道路品質-推動建築物騎樓整平計畫	工商發展處	工商發展處使用管理科	570	171	0	0	0	0	1080615		1080815		1080915		1081015		1090131	1090228	目前計畫尚未核定。	待核定後將儘速辦理發包作業。	
苗栗縣	c0010-1-6	歷年農地重劃區內農水路改善工程	地政處	地政處	10,000	3,000	0	3,000	0	100	1080531	1080614	1080630	1080705	1080731		1080930		1081215	1081231	因納入新工程案件,致設計未能如期完成,進而順延全部計畫期程。	預計9月底趕上原預定進度。	
苗栗縣	c0010-1-12	全縣用地補償費	工務處	工務處土木科	5,000	1,500	0	0	0	0	1080531		1080731		1080930		1081031		1081129	1081231	辦理全縣道路新核定補助案、已完工舊案協議價購(含一併、補辦)、徵收(含更正、補辦、一併徵收)補償費及作業費、依實際需求簽奉縣長核定	中央核定生活圈計畫-竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程用地配合款分年編列,部分不足款擬由	

																					後動支。	本項經費支應,目前辦理工程規劃設計中,並依用地取得時程辦理經費動支。
苗栗縣	c0010-1-13	中央補助相關計畫之縣配合款	工務處	工務處 土木科	9,550	2,865	2,199	0	0	77	1080628	1080930	1081031	1090529	1090930	1091231					中央補助相關計畫之縣配合款,依實際需求簽奉縣長核定後動支,已簽核4案,完成2案,另2案辦理規劃設計中。	積極辦理。
苗栗縣	c0010-1-14	雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程(62-1線)後續工程配合款	工務處	工務處 土木科	5,000	1,500	0	0	0	0	1080531	1080731	1090331	1091231	1100331	1100630					1.依據營建署修正預算審查會議結論,將第1.2標重新規劃。2.勞務招標原訂107.12.12辦理公開評選,因廠商提出疑義故於107.12.10取消招標,重新辦理委託專案管理招標,於108.5.15~108.5.23公開閱覽、108.6.20開標、108.6.21公開評選,經評選結果廢標。	1.依據營建署修正預算審查會議結論,將第1.2標重新規劃。2.勞務招標原訂107.12.12辦理公開評選,因廠商提出疑義故於107.12.10取消招標,重新辦理委託專案管理招標,於108.5.15~108.5.23公開閱覽、108.6.20開標、108.6.21公開評選,經評選結果廢標,簽辦第二次招標。

10. 彰化縣

彰化縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 17.66 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
250	17.66	0	458,749.705	259.01	25.98	235	241	220	223	147	190	68	97	30	49	17	33

本年度基本設施補助經費 17.66 億元(中央補助 17.66 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 250 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 177,115.301 仟元，預算實際支用數 300,649.714 仟元，已執行應付未付數 157,331.9 仟元，發包結餘數 768.091 仟元，合計預算執行數 458,749.705 仟元，預算執行率 259.01%，預算達成率 25.98%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,765,959 仟元，縣(市)執行率 259.01%，預算達成率 25.98%。
- 依標案執行情形進度區分：250 件標案，已設計完成者 241 件，已發包決標者 223 件，已開工者 190 件，施工進度已達 50%者 97 件，已完工者 49 件，已驗收完成者 33 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，250 件標案計有 4 件落後，落後比率 1.60%。

落後原因：

- 108 年 6 月落後標案 4 件，屬查核點進度落後者 4 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、其他因素落後者 3 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 25.98%，較 6 月底預定目標值 27%落後 1.02 個百分點，亦較平均預算達成率 35.30%落後 9.32 個百分點，預算執行率有待加強。其中補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、道路養護及道安計畫(16.21%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(14.04%)及水利建設經費(11.00%)、等預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另落後標案宜加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

彰化縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫	1												1
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施											3		3
c009. 其他建設													0

彰化縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
彰化縣	c004-4-4	交通安全宣導活動計畫	新聞處	新聞處	790	0	0	0	0	0	1080531		1080628		1080701		1080902		1081015		1081129		為擷節本府開支，本活動擬與社會處所舉辦雙十節活動合併辦理。	目前活動計畫研擬規劃中。
彰化縣	c008-2-1-4	汰購逾齡巡邏機車	警察局	警察局	9,000	0	0	0	0	0	1080430	1080309	1080531	1080531	1080531	1080704	1081031		1081031		1081120		本案須俟警政署完成共同供約契約招標上架後，才能配合下訂。7月4日決標	臺灣銀行完成共同供約契約招標，本案即刻下訂採購，並督促廠商配合進度交貨。
彰化縣	c008-2-2-11	購置空氣呼吸器50組	消防局	消防局	800	0	0	0	0	0	1080430	1080523	1080630		1080630		1080930		1080930		1080930		消防衣、帽、鞋及空氣呼吸器組(含面罩、肺力閥、擴音器)主要為消防人員進入火場，藉以防護高溫、維持呼吸功能的重要防護裝備，其裝備之功能及品質將直接影響救災人員之生命安全，鑑於現階段市場上種類眾多，不同廠牌所提供之產品均有其優劣，尚需比較適合本轄火災特性需求。	本案業已於5月23日規格簽准，預計7月9日第1次開標。
彰化縣	c008-2-2-16	購置災害搶救用面罩、面罩擴音器	消防局	消防局	2,400	0	0	0	0	0	1080430	1080523	1080630		1080630		1081231		1081231		1081231		消防衣、帽、鞋及空氣呼吸器組(含面罩、肺力閥、擴音器)主要為消防人員進入火場，藉	本案業已於5月23日規格簽准，預計7月9日第1次開標。

11. 南投縣

南投縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 16.70 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
197	16.7	0	377,472.653	99.22	22.61	194	190	189	173	111	128	39	52	14	28	10	24

本年度基本設施補助經費 16.7 億元(中央補助 16.7 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 197 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 380,431.982 仟元，預算實際支用數 261,438.981 仟元，已執行應付未付數 114,088.455 仟元，發包結餘數 1,945.217 仟元，合計預算執行數 377,472.653 仟元，預算執行率 99.22%，預算達成率 22.61%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,649,218 仟元，鄉鎮公所執行 20,548 仟元，縣(市)執行率 99.81%，預算達成率 22.69%；鄉鎮公所執行率 59.34%，預算達成率 16.02%。
- 依標案執行情形進度區分：197 件標案，已設計完成者 190 件，已發包決標者 173 件，已開工者 128 件，施工進度已達 50%者 52 件，已完工者 28 件，已驗收完成者 24 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，197 件標案計有 19 件落後，落後比率 9.64%。
落後原因：

- 108 年 6 月落後標案 19 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 8 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 9 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 7 件、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 6 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 22.61%，較平均預算達成率 35.30%落後 12.69 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市(49.95%)、道路養護及道安計畫(18.60%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(32.45%)、水利建設經費(2.49%)、農業建設經費(7.78%)、其他建設經費(23.86%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 19 件落後標案，分屬工務處(水利工程科)(3 件)、名間鄉公所(1 件)、竹山鎮公所(1 件)、建設處(使用管理科)(1 件)、風景區管理所(1 件)、原住民族行政局(2 件)、埔里鎮公所(1 件)、消防局(3 件)、草屯鎮公所(1 件)、農業處(1 件)、衛生局(1 件)、環境保護局(1 件)、警察局(總)(1 件)、觀光處(1 件)執行案件。請南投縣政府主動了解落後原

因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

南投縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設	2			2							2		6
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	1			2									3
c009. 其他建設	2			3		1					4		10

南投縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際 支用數	應付未 付數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
南投縣	c006-1-1	區域排水興(改)建、修復及維護等改善工程	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	66,400	17,928	0	0	0	0	1080528		1080628		1080728		1080928		1081128		1081228		水利經費施設工程需簽陳首長，據以辦理本年度水利經費施設工程	部分工程待首長勘查再議，部分工程委託設計監造發包辦理中，俟委託設計監造發包後，趕辦工程設計及工程發包
南投縣	c006-1-3	一般性補助款疏濬清淤經費(區域排水)	工務處 (水利工程科)	工務處 (水利工程科)	33,800	9,126	0	0	0	0	1080528		1080628		1080728		1080928		1081128		1081228		水利經費施設工程需簽陳首長，據以辦理本年度水利經費施設工程	部分工程待首長勘查再議，部分工程委託設計監造發包辦理中，俟委託設計監造發包後，趕辦工程設計及工程發包
南投縣	c006-1-5	108草屯鎮轄內區域排水河道整理工程	工務處 (水利工程科)	草屯鎮公所	3,000	810	0	0	0	0	1080528	1080501	1080628	1080702	1080728		1080928		1081128		1081228		招標作業因素	再次上網招標
南投縣	c006-1-8	108埔里鎮轄內區域排水河道整理工程	工務處 (水利工程科)	埔里鎮公所	4,000	1,080	0	0	0	0	1080528	1080628	1080628		1080728		1080928		1081128		1081228		配合6月豪雨設計	7/16工程決標
南投縣	c006-1-9	108名間鄉濁水排水河道整理工程	工務處 (水利工程科)	名間鄉公所	2,000	540	0	0	1,794	332	1080528	1080528	1080628	1080710	1080728		1080928		1081128		1081228		投標廠商低於標價80%	決標行政流程作業中
南投縣	c006-1-10	108竹山鎮崎腳、柯子坑、冷水坑排水河道整理工程	工務處 (水利工程科)	竹山鎮公所	5,000	1,350	0	0	0	0	1080528	1080621	1080628		1080728		1080928		1081128		1081228		原訂之設計範圍完成設計後，仍有經費剩餘，故增加設計範圍。	設計廠商申請展延工期，本所同意其展延20日曆天，預計於

																					108年6月21日完成設計。	
南投縣	c008-1-2	消防廳舍(第二大隊日月潭分隊)	消防局	消防局	20,000	10,000	0	10,000	0	100	1080102	1071126	1080430	1080319	1080531		1081031	1081231	1081231		增設無障礙電梯經費已於108.06.24核准。	俟完成變更設計後,請建設處辦理動工事宜。
南投縣	c008-1-3	消防廳舍(第二大隊魚池分隊)	消防局	消防局	15,200	7,600	0	7,600	0	100	1080430	1071015	1080630		1080731		1081231	1081231	1081231		發包作業正由建設處簽辦中。	已於108.06.25都市審查初審修正送大會審查,俟通過後即申請建築執照,俾辦理後續發包、動工事宜。
南投縣	c008-3-1	擴增及汰換數位式遠端網路即時監控錄影監視系統	警察局(總)	警察局(總)	22,000	5,940	0	5,940	0	100	1080219	1080219	1080430		1080515		1080715	1081115	1081215		未完成發包預定進度。	目前正辦理第3次上網招標。
南投縣	c0010-1-5	汰換消防局小型空氣灌充機3台	消防局	消防局	900	225	0	0	0	0	1080630	1080418	1080630	1080702	1080630		1081231	1081231	1081231		預訂108.07.10開標。	預訂108.07.10開標。
南投縣	c0010-1-31	流域綜合治理計畫外輸排水系統出口治理工程等3案增加用地作業費	工務處(水利工程科)	工務處(水利工程科)	1,000	270	0	0	0	0	1080528		1080628		1080928		1081028	1081128	1081228		用地徵收相關前製作業辦理中	目前尚辦理用地取得前置作業中(分區變更及區排公告),致未能如期完成,積極趕辦中
南投縣	c0010-1-41	南投縣休閒農場查核及輔導管理計畫	農業處	農業處	100	20	0	0	0	0	1080531	1080603	1080731	1080710	1080831		1080923	1081031	1081130		農委會核定計畫延誤致辦理查核作業延誤。	已辦理查核作業,進行輔導及管理工 作;彙送資料至中央機關(農委會)。
南投縣	c0010-1-47	108年流感疫苗計畫	衛生局	衛生局	4,350	26	0	18	0	70	1080131	1080131	1080630		1080630		1080731	1081231	1081231		流感疫苗經費係配合疾病管制署採購流感疫苗時,地方政	待疾病管制署採購流感疫苗時,儘速將

																				府需支付疫苗採購之分配款項，截至108年6月30日止，疾病管制署尚未採購流感疫苗，故無法撥付第一期經費給中央	款項撥付
南投縣	c0010-1-65	清境地區旅宿業建築物安全檢查作業	建設處 (使用管理科)	建設處 (使用管理科)	1,200	0	0	0	0	0	1080607	1080507	1080628		1080831		1081115	1081220	1081231	因適逢採購法令修正，致招標文件資料須重新修正發辦	本案已上網公告，資格審查已訂於7月17日辦理，評選委員會訂於7月25日辦理，並完成評選後盡速辦理議價。
南投縣	c0010-1-99	配合交通部觀光局補助工程配合款	觀光處	觀光處	10,000	0	0	0	0	0	1080629		1080630		1081031		1081129	1081223	1081231	交通部觀光局108.6.17觀技字第1084000801號函核定計畫	盡速趕辦
南投縣	c0010-1-123	南投縣仁愛鄉霧社風景區據點環境清潔維護管理工作	風景區管理所	風景區管理所	4,750	2,000	0	0	0	0	1080430	1080101	1080628		1080731		1080830	1081129	1081231	本府於6月27日進行現場會勘，仍有應改善事項	將發函請仁愛鄉公所改善，並後續提出改善報告及經費核銷資料
南投縣	c0010-1-130	南投縣108年垃圾處理計畫	環境保護局	環境保護局	185,250	50,018	4,297	0	0	9	1080531	1080101	1080630	1080101	1080930	1080101	1081031	1081130	1081231	本縣93年奉行政院命令停建焚化爐，垃圾處理需委由外縣市焚化廠處理，惟近幾年垃圾轉運困難，其中臺中市自106年底減少甚至停止收受本縣垃圾，107年自2月份至9月份完全停止收受本縣垃圾，以致本縣垃圾有堆置之情形，無法完	倘外縣市焚化廠有餘裕量可協助處理本縣垃圾，將儘速執行本案經費核銷。

12. 雲林縣

雲林縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 14.33 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
93	13.94	0.39	501,338.483	176.04	34.98	92	90	84	80	46	68	17	39	2	21	2	12

本年度基本設施補助經費 14.33 億元(中央補助 13.94 億元，地方自籌 0.39 億元)，截至 6 月底止，共有標案 93 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 284,794.5 仟元，預算實際支用數 364,471.653 仟元，已執行應付未付數 136,866.83 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 501,338.483 仟元，預算執行率 176.04%，預算達成率 34.98%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,427,036 仟元，鄉鎮公所執行 6,000 仟元，縣(市)執行率 174.93%，預算達成率 34.91%；鄉鎮公所執行率 100%，預算達成率 52.57%。
- 依標案執行情形進度區分：93 件標案，已設計完成者 90 件，已發包決標者 80 件，已開工者 68 件，施工進度已達 50%者 39 件，已完工者 21 件，已驗收完成者 12 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，93 件標案計有 10 件落後，落後比率 10.75%。
落後原因：

- 108 年 6 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 5 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 4 件、其他因素落後者 5 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 34.98%，較平均預算達成率 35.30%落後 0.32 個百分點，執行情形有待精進。其中文化經費(28.58%)、體育經費(37.19%)、補助貧瘠鄉鎮市(50.04%)、農業建設經費(3.44%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案(如「斗六派出所辦公廳舍新建工程」等)，分屬工務處(3 件)、水利處(1 件)、地政處(1 件)、教育處(3 件)、環保局(1 件)、警察局(1 件)，請持續強化執行。未填寫落後原因 1 件，請雲林縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

雲林縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育											3		3
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫				2							1		3
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設				1							1		2
c008. 公有建物 及設施				1								1	2
c009. 其他建設													0

雲林縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
雲林縣	c002-1-3	補助鄉鎮市辦理各項體育活動	雲林縣政府	教育處	180	0	0	0	0	0	1080531		1080628		1080726		1080830		1080927		1081129		鄉鎮公所尚未提出申請	鼓勵趕辦。
雲林縣	c002-1-7	補助國中小體育促進會、雲林縣體育會、各單項委員會及學校等參加原住民運動會、培訓、集訓、選拔、參賽、獎	雲林縣政府	教育處	1,500	1,500	240	0	0	16	1080221	1080221	1080322	1080322	1080323	1080323	1080324	1080324	1080325	1080325	1080531		因原住民運動會參賽人數較少。	請單項委員會多宣傳及招募選手參賽。
雲林縣	c002-1-8	全國性運動會本縣代表隊績優選手及教練獎勵金	雲林縣政府	教育處	8,000	3,500	1,817	0	0	52	1080426	1080708	1080628		1080830		1080927		1081025		1081227		每場賽事實際獎勵金不易預估。	積極鼓勵與協助申請。
雲林縣	C004-2-1	自養鄉道養護計畫及村里道路橋樑改善工程	工務處	工務處	11,750	1,763	844	381	0	70	1080101	1080101	1080601		1080630		1080930		1081231		1090229		補助公所辦理案件，招標作業延誤	已請公所積極趕辦招標
雲林縣	c004-2-2	轄內鄉道路面養護工程、交通設施改善及景觀植栽綠美化、行道樹、草坪修剪、路容維護	工務處	工務處	20,000	2,000	3	958	0	48	1080101	1080101	1080531		1080630		1081031		1081231		1090229		補助公所辦理案件尚未招標	待決標後立即開工
雲林縣	c004-2-3	轄內縣管公園、圓環、道路橋梁、聯外道路、各特定區、污水處理廠、區段徵收自辦市地重劃區範圍內等清潔整理	工務處	工務處	13,000	1,300	1,494	0	0	115	1080430	1080401	1080531		1080630		1081031		1081231		1090229		補助公所案件，因招標流標再次招標	決標後儘速趕辦施工
雲林縣	c007-1-1	雲林縣尖山(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程	雲林縣政府	地政處	3,415	0	0	0	0	0	1080531	1080430	1080630	1080710	1080920		1081115		1081205		1081231		發包決標日期預定日期應為108.8/31誤繕為6/30	本案於7/2開標
雲林縣	c007-2-2	加強辦理本縣治山防災計畫工程	水利處	水利處	2,820	0	0	0	0	0	1080531	1080530	1080630		1080831		1081122		1081231		1081231		修正預算書	修正完成後即辦理招標程序。
雲林縣	c008-2-1-6	汰換6403cc器材運輸車	警察局	警察局	3,780	3,780	0	0	0	0	1080430	1071204	1080615	1080321	1080615	1080321	1081215		1081215		1081231			
雲林縣	c008-2-3-1	垃圾車汰換計畫	環保局	環保局	15,000	0	0	0	0	0	1080430	1080513	1080630		1080731		1081130		1081130		1081231		補助與配合款分配進度落後	已於6/28簽准辦理採購中

13. 嘉義縣

嘉義縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 15.37 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
268	15.37	0	425,780.95	280.85	27.70	263	256	259	242	187	195	42	100	10	54	10	47

本年度基本設施補助經費 15.37 億元(中央補助 15.37 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 268 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 151,606.73 仟元，預算實際支用數 288,861.742 仟元，已執行應付未付數 130,852.908 仟元，發包結餘數 6,066.3 仟元，合計預算執行數 425,780.95 仟元，預算執行率 280.85%，預算達成率 27.70%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,537,030 仟元，縣(市)執行率 280.85%，預算達成率 27.7%。
- 依標案執行情形進度區分：268 件標案，已設計完成者 256 件，已發包決標者 242 件，已開工者 195 件，施工進度已達 50%者 100 件，已完工者 54 件，已驗收完成者 47 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，268 件標案計有 21 件落後，落後比率 7.84%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 21 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 17 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 3 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 4 件、因計畫變更落後者 2 件、因預算編列落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 12 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 27.70%，較平均預算達成率 35.30%落後 7.60 個百分點，執行情形欠佳。其中補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、道路養護及道安計畫(14.78%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(16.31%)、農業建設經費(23.86%)、公有建物及設施經費(16.36%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 21 件落後標案，分屬地政處重劃科(1 件)、建設處道路工程科(1 件)、建設處道路管理科(1 件)、建設處道路養護科(2 件)、消防局(11 件)、警察局(5 件)執行案件。請嘉義縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

嘉義縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫										1	1		2
c005. 交通建設							1				1		2
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設	1												1
c008. 公有建物 及設施				3							2		5
c009. 其他建設				1			1		1		8		11

嘉義縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
嘉義縣	c004-1-7	嘉義縣縣道橋梁檢測及維修作業	建設處	建設處道路工程科	4,500	0	0	0	0	0	1080601	1080531	1080630		1080801		1081001		1081201		1081231		本標案已於108年6月10日(星期一)啟動設計作業，並請顧問公司依契約規定於期限內完成設計交付本府審查，爰近期因橋梁作業承辦人頻於更換，致使設計作業延誤，俟後將注意檢討改進。	儘速辦理相關作業。
嘉義縣	c004-1-9	辦理本縣易致災路段及橋梁災害預警巡視、巡查等相關執勤業務	建設處	建設處道路養護科	4,000	1,500	0	0	0	0	1080101	1071201	1080101	1071226	1080101	1080101	1080831		1081231		1081231		依致災狀況，派工執勤，至今無需派工	依致災狀況，派工執勤
嘉義縣	c005-3-6	前瞻建設-城鄉建設-改善停車計畫問題(縣配合款)	建設處	建設處道路管理科	13,000	0	0	0	0	0	1080430		1080601		1080701		1081031		1081201		1081231		原訂布袋停車場計畫，因上級長官裁示不執行，另於108年6月17日奉准作為自籌款，由本府及民雄鄉公所分攤，向公總申請民雄停車場案。	已於6月19日發文函請交通部變更計畫。
嘉義縣	c005-3-12	辦理本縣轄內18鄉鎮市公所路燈新設及維護費用	建設處	建設處道路養護科	1,000	500	0	600	0	120	1080101	1080101	1080630		1081031		1081031		1081231		1081231		此案為補助公所，公所尚在施工中	已催辦公所
嘉義縣	c007-1-3	早期農地重劃區農水路更新改善	地政處	地政處重劃科	3,000	600	50	0	0	8	1080501	1080501	1080630		1080831		1081031		1081231		1081231		早期農水路更新改善工程預算書修改中	儘速修改預算書
嘉義縣	c008-1-1-1	老舊宿舍拆除及各分局、派出所圍牆整地	警察局	警察局	300	0	0	0	0	0	1080430	1080215	1080630	1080307	1080630		1080830		1080910		1080930		本案原訂拆除布袋分局過路派出所後方舊日式廳舍，因地方文史團體陳情保留，雖經本縣文化觀光局2	本案研議終止契約後再辦理其他項目拆除整地工作。

																				次審議均不具文化保存價值，惟經發陳縣府批示「研議」，爰無法依約開工拆除。	
嘉義縣	c008-1-1-2	朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程	警察局	警察局	11,500	0	43	0	0	100	1080430	1080426	1080630		1080630		1081101	1081201	1081220	本案工程迄今已辦理7次招標作業惟均流標，探究原因為營建物料飆漲及工資短缺所致，本局業召開建築面積檢討會縮減建物面積，並勻支他項經費新臺幣108萬至本案，惟仍無法決標。	再次檢討工項有無減項空間並積極邀請廠商投標。
嘉義縣	c008-1-2-1	太保消防分隊廳舍興建工程	消防局	消防局	11,263	0	0	0	0	0	1061011	1061011	1080531		1080628		1080930	1081231	1081231	本案俟取得建照及通過5大圖審後方辦理工程招標，以避免於施工過程中辦理變更設計，故造成後續之招標作業延遲辦理	已於108年5月24日上網招標，並於108年6月18日開標(流標)，將於108年7月10日第二次開標，後續將積極邀標，以儘快完成招標作業
嘉義縣	c008-1-2-2	東石消防分隊廳舍興建工程	消防局	消防局	4,000	0	0	0	0	0	1061220	1061220	1080531		1080731		1081031	1081231	1081231	本案原訂於108年4月12日辦理第一次招標，惟因該設計監造單位之設計監造費誤植，造成該次開標以廢標辦理，並依設計監造單位重新提送之預算書畫(修正版)重新發辦招標事宜	現於108年5月14日重新上網招標，並於108年6月4日開標(流標)，將於108年7月10日第二次開標，後續將持續積極邀

		救災應勤等裝備																			以利辦理採購業務	相關作業中	
嘉義縣	c0010-1-54	購置特種搜救隊救災裝備(含混凝土切割鏈鋸、充電式圓盤鋸、充電式砂輪機組等裝備)	消防局	消防局	518	0	0	0	0	0	1080531	1080531	1080614		1080628		1081129		1081220		1081231	搜集相關資料以利辦理採購作業	積極辦理中
嘉義縣	c0010-1-119	監視錄影系統網路使用費	警察局	警察局	10,376	0	0	0	0	0	1080430		1080630		1080630		1080830		1080910		1080930	本案需待本縣「107年第2期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」完成，始辦理本項網路租用採購。	待本縣「107年第2期轄內治安要點錄影監視系統建置整合案」完成後立即辦理採購。
嘉義縣	c0010-1-125	拉曼光譜分析儀費	警察局	警察局	1,200	0	0	0	0	0	1080430	1080430	1080630		1080630		1080830		1080910		1080930	業簽奉縣府核准勻支至本局朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程案使用。	配合至本局朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程案招標執行。

14. 屏東縣

屏東縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 21.62 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
133	21.6	0.02	769,146.577	123.15	35.57	129	129	127	125	78	81	52	57	43	48	41	45

本年度基本設施補助經費 21.62 億元(中央補助 21.6 億元，地方自籌 0.02 億元)，截至 6 月底止，共有標案 133 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 624,571.707 仟元，預算實際支用數 648,877.474 仟元，已執行應付未付數 120,269.103 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 769,146.577 仟元，預算執行率 123.15%，預算達成率 35.57%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 2,162,466 仟元，縣(市)執行率 123.15%，預算達成率 35.57%。
- 依標案執行情形進度區分：133 件標案，已設計完成者 129 件，已發包決標者 125 件，已開工者 81 件，施工進度已達 50%者 57 件，已完工者 48 件，已驗收完成者 45 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，133 件標案計有 6 件落後，落後比率 4.51%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 6 件，屬查核點進度落後者 3 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 3 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件。
管考建議：1. 截至 6 月預算達成率為 35.57%，較平均預算達成率 35.30%高出 0.27 個百分點，執行情形良好；惟文化經費(35.90%)、體育經費(35.49%)、補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、公有建物及設施經費(14.34%)、其他建設經費(39.59%)等五類預算達成率與該類計畫平均值比偏低，需積極執行。 2. 另有 6 件落後標案，分屬工務處(1 件)、水利處(1 件)、城鄉發展處(2 件)、警察局(2 件)執行案件；其中「辦理野溪整治及維護工程」僅設計完成，目前已屬汛期，宜儘早辦理發包及施工作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

屏東縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設	1												1
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施				1									1
c009. 其他建設	1	1					1		1				4

屏東縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
屏東縣	c006-2-2	辦理野溪整治及維護工程	水利處	水利處	17,000	5,000	0	0	0	0	1080430	1080614	1080531		1080630		1081031		1081220		1081231		因山區連日豪雨無法進場規劃	已上網公告預計7/11開標
屏東縣	c008-2-1-4	汰換大型重型機車	警察局	警察局	5,400	0	0	0	0	0	1080515	1080429	1080615	1080709	1080630	1080709	1081115		1081210		1081220		因招標流標致進度落後。	現已決標，積極辦理後續簽約、交貨、付款。
屏東縣	c0010-1-2	產業發展轉導事宜	城鄉發展處	城鄉發展處	1,500	0	0	0	0	0	1080531		1080731		1080831		1080930		1081231		1081231		本案因計畫內容尚在與規劃團隊商討細節中	本案將儘速與規劃團隊商討相關細節完成後，再行簽至一層核准辦理
屏東縣	c0010-1-3	屏東縣綠建築推廣計畫	城鄉發展處	城鄉發展處	2,400	0	0	0	0	0	1080419		1080531		1080628		1081031		1081129		1081231		原為配合經濟部108年度節能計畫並行設計標案，惟不符經濟部節能計畫補助精神，故全案調整方向，尚需時間蒐集資料	資料蒐集並彙整完畢儘速完成發包執行
屏東縣	c0010-1-10	車城鄉中山路24巷道路開闢工程(第二期)	工務處	工務處	21,982	5,935	0	0	0	0	1071219	1071219	1080418	1080402	1080630		1080831		1081031		1081231		因民眾抗爭用地取得困難導致工程無法如期開工	與民眾進行溝通協調
屏東縣	c0010-1-38	新購數位式免線圈路口闖紅燈測速照相系統	警察局	警察局	2,330	650	0	0	0	0	1080530	1080529	1080630	1080708	1080731		1080929		1081130		1081231		目前預算送屏東縣議會申請墊付中。	本案俟屏東縣議會完成墊付程序後，即進行後續採購作業。

15. 臺東縣

臺東縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 14.71 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
203	14.11	0.6	330,024.466	152.71	22.43	195	180	182	163	127	129	75	79	53	59	37	46

本年度基本設施補助經費 14.71 億元(中央補助 14.11 億元，地方自籌 0.6 億元)，截至 6 月底止，共有標案 203 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 216,109.179 仟元，預算實際支用數 326,815.194 仟元，已執行應付未付數 2,183.18 仟元，發包結餘數 1,026.092 仟元，合計預算執行數 330,024.466 仟元，預算執行率 152.71%，預算達成率 22.43%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,467,953.331 仟元，鄉鎮公所執行 3,320 仟元，縣(市)執行率 153.19%，預算達成率 22.35%；鄉鎮公所執行率 99.48%，預算達成率 57.83%。
- 依標案執行情形進度區分：203 件標案，已設計完成者 180 件，已發包決標者 163 件，已開工者 129 件，施工進度已達 50%者 79 件，已完工者 59 件，已驗收完成者 46 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，203 件標案計有 42 件落後，落後比率 20.69%。
落後原因：

- 108 年 6 月落後標案 42 件，屬預算執行未達 80%者 10 件，屬查核點進度落後者 20 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 12 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 4 件、因招標作業落後者 3 件、因計畫變更落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 25 件及未填寫落後原因 8 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 22.43%，較平均預算達成率 35.30%落後 12.87 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫均未執行，文化經費(20.17%)、水利建設經費(4.69%)、其他建設經費(28.12%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 42 件落後標案，分屬文化處(1 件)、民政處(1 件)、交通及觀光發展處(5 件)、行政處(3 件)、建設處(11 件)、原住民族行政處(5 件)、財政及經濟發展處(4 件)、國際發展及計畫處(2 件)、教育處(2 件)、農業處(3 件)、環保局(1 件)、警察局(3 件)、蘭嶼鄉公所(1 件)執行案件。未填寫

落後原因 8 件，請臺東縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺東縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育											2		2
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫	2										1	2	5
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設											2		2
c007. 農業建設											2	1	3
c008. 公有建物 及設施	1			1								1	3
c009. 其他建設	1			2			1		1		18	4	27

臺東縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
臺東縣	c002-1-1	田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用	教育處	教育處	10,996	5,400	3,367	0	0	62	1080430	1080101	1080630	1080101	1080731	1080101	1081031		1081130		1081231	田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用上半年養護數量較少	田徑場、體育館及棒球場等管理及養護費用上半年養護數量較少	
臺東縣	c002-1-2	田徑場、體育館及棒球場等設備汰換及增設建置	教育處	教育處	500	240	68	0	0	28	1080430	1080101	1080630	1080101	1080731	1080101	1081031		1081130		1081231	上半年需求較少	於下半年辦理相關採購	
臺東縣	c004-1-1	108年全縣縣鄉道路橋樑基本資料及目視安全檢測工作	建設處	建設處	3,000	0	0	0	0	0	1080531		1080630		1080831		1081031		1081231		1081231			
臺東縣	c004-1-2	道路交通秩序與交通安全改進方案號誌標線標誌增劃設工作	建設處	建設處	1,000	0	0	0	0	0	1080531		1080630		1080731		1080930		1081130		1081231	施作位置勘測中	儘速辦理	
臺東縣	c004-1-4	縣鄉道路及市區道路養護	建設處	建設處	49,481	1,450	0	0	0	0	1080630		1080731		1080820		1081001		1081130		1081220	規劃設計延誤	儘速辦理	
臺東縣	c004-1-5	市區路平專案計畫	建設處	建設處	38,000	0	0	0	0	0	1080430	1080112	1080531		1080630		1080930		1081130		1081231			
臺東縣	c004-1-6	全縣橋樑維修、維護工程	建設處	建設處	10,000	0	0	0	0	0	1080430		1080530		1080617		1080831		1081031		1081130	請監造設計公司修正工程預算書	儘速辦理	
臺東縣	c006-2-5	辦理108年度台東縣水情預警系統軟體及設備維護	建設處	建設處	3,000	1,180	0	0	0	0	1080101	1080101	1080630		1080630		1080830		1081231		1081231	目前提執行計畫書中	積極趕辦	
臺東縣	c006-2-8	辦理縣管河川、區排、堤防、排水之興建及新設照明設備等工程相關業務	建設處	建設處	91,292	4,000	1,214	0	0	30	1080226	1080226	1080329	1080319	1080430	1080412	1081231		1081231		1081231	本分案持續執行中	積極趕辦	
臺東縣	c007-2-5	強化山坡地違規使用查報與取締工作	農業處	農業處	1,347	539	525	0	0	98	1080515	1080402	1080630		1080930		1081110		1081220		1081231	計畫執行核銷中	積極辦理計畫工作	
臺東縣	c007-2-10	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫	農業處	農業處	3,600	0	0	0	0	0	1080331	1080306	1080531		1080710		1081231		1081231		1081231			
臺東縣	c007-2-11	108年度辦理農業各項公共設施水土保持維護改善	農業處	農業處	10,000	0	0	0	0	0	1080601		1080630		1080731		1080930		1081130		1081231	本計畫係辦理公所、議員、代表及民眾建議辦理之水土保持設施工程，因案件數眾多且分梯次辦理規劃設計，因此，前期之執行率	儘速辦理	

																					難以確實呈現		
臺東縣	c008-1-1-1	辦理成功分局待勤室整建工程	警察局	警察局	10,780	640	17	0	0	3	1080630	1080731	1081001	1081101	1081201	1081231					一、本案廠商於108年6月14日完成基本設計及預算書編列。 二、於108年6月26日同意核定基本設計及預算書。	責請廠商於期限內完成細部設計及預算書	
臺東縣	c008-3-1	重要路口裝設監視系統	警察局	警察局	4,000	0	0	0	0	0	1080315	1080220	1080415	1080312	1080531	1080403	1080630	1081031	1081130			因星朝科技有 限公司得標後 企標，本局須重 新辦理規劃招 標工作	已於7月2 日由中華 電信股份 有限公司 臺灣南區 電信分公 司臺東營 運處得 標，預計於 7月5日簽 約並積極 辦理後續 開工事宜
臺東縣	c008-3-2	購買MOPOLICE警用商規行動載具經費	警察局	警察局	1,500	0	0	0	0	0	1080601	1080307	1080630	1080502	1080630	1080830	1080830	1080930					
臺東縣	c0010-1-2	廳舍修繕	行政處	行政處	21,374	10,687	10,687	0	0	100	1080101	1080101	1080101	1080101	1080101	1080601	1080701	1081231	1081231		按進度辦理	按進度辦理	
臺東縣	c0010-1-5	本府辦公?舍建築物及設備使用安全維護、整修等相關費用	行政處	行政處	10,000	5,000	5,000	0	0	100	1080101	1080101	1080101	1080101	1080101	1080630	1080701	1081231	1081231		依進度辦理	依進度辦理	
臺東縣	c0010-1-7	臺東縣政府臺北辦公室	行政處	行政處	2,337	1,169	1,169	0	0	100	1080101	1080101	1080101	1080101	1080101	1080601	1081231	1081231		依進度辦理	依進度辦理		
臺東縣	c0010-1-12	108年度臺東縣政府TTPush及臺東金幣行銷推廣營運專案	國際發展及計畫處	國際發展及計畫處	2,000	0	0	0	0	0	1080610	1080630	1081231	1081231	1081231	1081231	1081231	1081231					
臺東縣	c0010-1-21	辦理本府資訊機房網路設備、伺服器及相關設備汰舊	國際發展及計畫處	國際發展及計畫處	500	0	9	0	491	100	1080531	1080628	1080830	1081031	1081129	1081231	1081231				經討論本案不與前騰資訊機房網路設備招標一併處理	本案預算屬臨時設備有問題時採購之	
臺東縣	c0010-1-23	藝文專業場館升級計畫	文化處	文化處	1,600	0	0	0	0	0	1080630	1080630	1080701	1080831	1080930	1081031	1081031				細部設計工項及經費調整，使場館整建更完善。	細部設計，簽核中	
臺東縣	c0010-1-28	議員建議補助政府機關學校辦理活動經費及辦理其他計畫	民政處	民政處	18,000	7,000	2,265	0	0	32	1080329	1080315	1080531	1080430	1080731	1080531	1080930	1080701	1081129	1081231		受補助單位未在期限內送府核銷結案	盡速於期限內改善
臺東縣	c0010-1-30-7	議員建議--108年度員工及文康活動-歲末聯誼暨年終業務	蘭嶼鄉公所	蘭嶼鄉公所	50	50	0	0	0	0	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080130	1080530			

																					程進行中。	
臺東縣	c0010-1-68	遊憩據點環境清潔與植栽維護案	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	5,000	3,327	1,410	0	0	42	1071206	1071206	1071225	1071225	1071228	1071228	1080205		1081231	1081231	廠商未達請款條件(契約規定當期工作進度完成後,於次月5日前檢附證明文件送府審查)	督促廠商完成工作及請款進度
臺東縣	c0010-1-69	魅力商店群機電通報、檢測保養	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	500	275	149	0	0	54	1080301	1080301	1080630	1080628	1080731		1080831		1081231	1081231	經費支用未達80%原因為本案決標金額較預算金額低,故經核算支用數未達標,但本案仍依照契約進度履行,並無落後。	依契約規定進度執行
臺東縣	c0010-1-74	2019獎勵包機入境旅遊暨國際推廣委託專業服務案	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	3,500	700	0	0	0	0	1080320		1080320		1080320		1080831		1080831	1081231	進行其他旅行社洽談包機作業	繼續接洽中
臺東縣	c0010-1-77	108年國內旅展計畫	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	2,000	1,010	792	0	0	78	1080429	1080501	1080506	1080630	1080506	1080630	1080527	1080630	1081203	1081203	未參加4/26-29台中國際旅展	參加5/24-27高雄國際旅展
臺東縣	c0010-1-80	臺東鐵馬輕旅行活動	交通及觀光發展處	交通及觀光發展處	1,000	200	0	0	0	0	1080301	1080301	1080430	1080628	1080503	1080628	1081115		1081115	1081231	7/4召開第一次工作會議	俟廠商修正後撥付第一期款
臺東縣	c0010-1-95	縣管公共區域環境清理維護計畫	環保局	環保局	10,000	4,000	2,234	0	0	56	1080131	1080125	1080228	1080227	1080831		1081031		1081231	1081231	因受梅雨季影響,天候狀況不佳,執行案件較危險,又因控管樹木修剪項目,及申請單位不符合本計畫執行規範,故影響本月執行率。	1.積極巡查三不管地帶的髒亂點或影響環境觀瞻之雜亂區。2.核定執行之申請案件,請廠商依通知完成標的工作。

16. 花蓮縣

花蓮縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 16.35 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
353	16.35	0	561,024.344	154.14	34.31	349	342	342	334	247	272	124	166	57	86	47	77

本年度基本設施補助經費 16.35 億元(中央補助 16.35 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 353 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 363,969.706 仟元，預算實際支用數 449,713.96 仟元，已執行應付未付數 100,579.007 仟元，發包結餘數 10,731.377 仟元，合計預算執行數 561,024.344 仟元，預算執行率 154.14%，預算達成率 34.31%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,635,284 仟元，縣(市)執行率 154.14%，預算達成率 34.31%。
- 依標案執行情形進度區分：353 件標案，已設計完成者 342 件，已發包決標者 334 件，已開工者 272 件，施工進度已達 50%者 166 件，已完工者 86 件，已驗收完成者 77 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，353 件標案計有 16 件落後，落後比率 4.53%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 16 件，屬預算執行未達 80%者 3 件，屬查核點進度落後者 9 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 2 件、因計畫變更落後者 2 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 6 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 34.31%，較平均預算達成率 35.30%落後 0.99 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(35.35%)、道路養護及道安計畫(13.02%)、水利建設經費(23.52%)、其他建設經費(40.13%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 16 件落後標案，分屬人事處(2 件)、文化局(4 件)、地方稅務局(2 件)、行政暨研考處(2 件)、建設處(2 件)、原住民行政處(1 件)、觀光處(3 件)執行案件。請花蓮縣政府主動瞭解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

花蓮縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化	1			1			1				1		4
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫											1		1
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	2										2		4
c009. 其他建設	2			1			1		1		2		7

花蓮縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
花蓮縣	c001-1-20	因公出國表演藝術觀摩計畫差旅費	文化局	文化局	90	90	58	0	0	64	1080329	1080329	1080401	1080503	1080503	1080503	1080507	1080628	1080515		1080531		本案經表演科簽准辦理計畫轉移,後續由視覺科以CU1080006576簽准與北京市中國地質博物館共同辦理「兩岸青少年地學科普和文化交流」活動,預計於8月6日至12日辦理,因配合計劃轉移後整體規劃期程延後,故致預算執行率落後。	配合計畫執行期,於本年度8月底前辦理經費核銷及結案程序。
花蓮縣	c001-1-31	空氣清淨機	文化局	文化局	128	128	0	0	26	20	1080402	1080402	1080412	1080621	1080419	1080621	1080419	1080701	1080426	1080701	1080430		經更改標的規格,標案已於6/21完成決標。	已於7/1完成交貨,盡速完成後續驗收付款項目。
花蓮縣	c001-1-53	檔案室修繕工程	文化局	文化局	900	0	0	0	0	0	1080601		1080630		1080715		1080831		1080930		1081031		因上月份進度期程落後導致本月進度仍落後	目前已進行細部預算書圖審查,將加速後續辦理招標作業
花蓮縣	c001-1-54	石雕及美術館屋頂採光罩砂利康填縫(2)	文化局	文化局	100	100	38	0	0	38	1080430	1080410	1080430	1080425	1080430	1080430	1080531	1080529	1080531	1080625	1080630	1080628	本項工程已施工完竣,執行經費未達本預算之百分之80	將利用剩餘經費流用至其他工程購置相關器材設備
花蓮縣	c004-4-2	辦理客運業者路線營運虧損補貼	觀光處	觀光處	5,000	3,000	0	3,750	0	125	1080531		1080531		1080531		1080930		1081231		1081231		第一期經費核銷尚在簽核中。	奉核後,儘速辦理第一期經費核銷。
花蓮縣	c008-5-1	108年花蓮縣政府及所屬機關員工識別背心採購實施計畫	人事處	人事處	200	0	0	0	0	0	1080415		1080628		1080708		1081031		1081031		1081129		首長指示變更取得方式	辦理設計競

17. 澎湖縣

澎湖縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 7.92 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
80	7.92	0	202,516.379	102.54	25.57	80	78	80	76	57	60	17	19	3	5	3	5

本年度基本設施補助經費 7.92 億元(中央補助 7.92 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 80 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 197,502 仟元，預算實際支用數 199,453.939 仟元，已執行應付未付數 3,062.44 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 202,516.379 仟元，預算執行率 102.54%，預算達成率 25.57%。
 - 依執行機關區分：由縣(市)執行 792,142 仟元，縣(市)執行率 102.54%，預算達成率 25.57%。
 - 依標案執行情形進度區分：80 件標案，已設計完成者 78 件，已發包決標者 76 件，已開工者 60 件，施工進度已達 50%者 19 件，已完工者 5 件，已驗收完成者 5 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，80 件標案計有 10 件落後，落後比率 12.50%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 6 件，屬查核點進度落後者 3 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
2. 落後原因分析：因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 9 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 25.57%，較平均預算達成率 35.30%落後 9.73 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(36.99%)、補助貧瘠鄉鎮市(44.59%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(11.00%)、水利建設經費(3.53%)、公有建物及設施經費(1.77%)、其他建設經費(35.91%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案，分屬工務處(1 件)、民政處(4 件)、林務公園管理所(1 件)、旅遊處(1 件)、消防局(1 件)、環保局(1 件)、警察局(1 件)執行案件。請澎湖縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

澎湖縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫											1		1
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施											2		2
c009. 其他建設										1	6		7

澎湖縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
澎湖縣	c004-2-3	辦理各鄉市村里道路、維護工程	工務處	工務處	10,773	0	0	0	0	0	1080605	1080605	1080630		1080831		1081031		1081130		1081231		本案正在上網公告，將於7月9日開標。	決標後，儘速辦理開工。
澎湖縣	c008-1-1-1	馬公分局虎井派出所辦公廳舍整建工程	警察局	警察局	8,000	0	9	0	0	100	1080430		1080630		1080815		1081115		1081215		1081231		目前建管處審核中。	積極列管辦理。
澎湖縣	c008-1-1-2	消防廳舍整建	消防局	消防局	18,000	3,000	0	0	0	0	1071210	1071203	1071231	1080108	1080430	1080529	1080930		1081210		1081231		因本工程位處三級離島，不論是施工材料或機具之運送、氣候環境因素或施工工序皆須詳加規劃，因事前的規劃時程稍有延遲，致使進度落後。	已請施工廠商依契約規定儘速施工，亦請監造單位依監造契約規定加強監造，確保工程施工品質。
澎湖縣	c0010-1-2	補助本縣天后宮等登記立案宗教團體辦理宗教文化推展及各項活動支出	民政處	民政處	5,300	2,120	705	0	0	33	1080531	1080101	1080628	1080212	1080830	1080212	1080930	1080703	1081129		1081231		1. 因廟宇活動時間不固定，某些月份會有活動集中或鬆散的情況。 2. 澎湖天后宮為配合宗教直航交流之大型活動，係訂於本(108)年7月3日至6日辦理「2019兩岸媽祖回香暨回訪活動」，雖然核定經費為400萬元，須俟活動結束後再核實撥付，導致6月份執行率未達預定支用金額之80%。	1. 仔細評估各廟宇活動之期程及每場次預定金額，詳實填列每月「預定支用金額」。 2. 督促各廟宇在期程內如期、如實舉行活動，活動後並請廟方盡速備齊相關表件，檢視其活動成果後，據以撥付款項、掌控預定進

18. 基隆市

基隆市 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 37.06 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
287	37.06	0	1,038,900.63	106.52	28.03	283	280	277	272	230	227	70	75	6	12	6	10

本年度基本設施補助經費 37.06 億元(中央補助 37.06 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 287 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 975,294.35 仟元，預算實際支用數 947,231.028 仟元，已執行應付未付數 90,875.687 仟元，發包結餘數 793.915 仟元，合計預算執行數 1,038,900.63 仟元，預算執行率 106.52%，預算達成率 28.03%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 3,352,750 仟元，區公所執行 353,669 仟元，縣(市)執行率 106.86%，預算達成率 26.87%；區公所執行率 104.38%，預算達成率 39.05%。
- 依標案執行情形進度區分：287 件標案，已設計完成者 280 件，已發包決標者 272 件，已開工者 227 件，施工進度已達 50%者 75 件，已完工者 12 件，已驗收完成者 10 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，287 件標案計有 34 件落後，落後比率 11.85%。
落後原因：

- 108 年 6 月落後標案 34 件，屬預算執行未達 80%者 18 件，屬查核點進度落後者 7 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 9 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 7 件、因招標作業落後者 4 件、因施工作業落後者 1 件、其他因素落後者 22 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 28.03%，較平均預算達成率 35.30%落後 7.27 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(6.40%)、道路養護及道安計畫(8.94%)、水利建設經費(4.92%)、公有建物及設施經費(11.71%)、其他建設經費(32.29%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 34 件落後標案，分屬工務處下水道科(1 件)、工務處土木工程科(1 件)、工務處公用事業科(2 件)、工務處河川水利科(4 件)、工務處養護工程科(1 件)、中正區公所(1 件)、公車處(1 件)、文化局(2 件)、民政處戶政科(1 件)、民政處自治行政科(1 件)、民政處原住民族行政科(1 件)、交通旅遊處交通規劃科(1 件)、交通旅遊處觀光工程科(1 件)、交通旅遊處觀光行政科(2 件)、地政處(1 件)、消

防局(2件)、財政處財務管理科(1件)、產業發展處海洋事務科(1件)、都市發展處公園管理科(1件)、都發處都市計畫科(1件)、都發處都市設計科(1件)、環境保護局(3件)、警察局保安科(1件)、警察局後勤科(2件)執行案件。請基隆市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

基隆市 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化	1										1		2
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設											1		1
c006. 水利建設	2			1									3
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	1			2							1		4
c009. 其他建設	3			1	1						19		24

基隆市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
基隆市	c001-1-4	文物展陳	文化局	文化局	8,676	1,202	797	0	0	66	1080430	1080430	1080531	1080531	1080831		1081031		1081130		1081231		本局辦理基隆潮藝術策展規劃案已發包執行，將儘速辦理結案。	將儘速辦理基隆潮藝術策展規劃案結案。
基隆市	c001-1-7	大基隆歷史現場再現整合計畫	文化局	文化局	144,819	4,000	212	0	0	5	1080430	1080430	1080515	1080515	1080630	1080628	1080830		1081020		1081230		各子計畫眾多且成立與討論耗時等，以致部份子計畫無法如期執行。	總共49個子計畫，目前有28個子計畫發包，已積極趕辦中。
基隆市	c005-2-4	中和路拓寬工程	工務處	工務處土木工程科	7,000	7,000	7,000	0	0	100	1060811	1060811	1060919	1060919	1070228	1070331	1070930	1070903	1080430		1080630		申報停工辦理變更設計	已積極辦理變更設計
基隆市	c006-1-1	基隆市區域排水改善工程(A)	工務處	工務處河川水利科	6,000	1,300	36	98	0	10	1080330	1080325	1080430	1080523	1080731	1080618	1081031		1081115		1081231		廠商提送細部設計資料延遲	108.05.07辦理第一次公開招標流標，108.05.23第二次公開招標決標，108.06.18開工，已請廠商積極趕工以提高工程進度及預算執行率。
基隆市	c006-1-2	基隆市區域排水改善工程(B)	工務處	工務處河川水利科	8,000	764	153	0	0	20	1080320	1080320	1080530	1080528	1080620	1080617	1080930		1081120		1081231		第一次開標未達法定家數流標	已於108.05.28決標，108.06.17開工，已請廠商積極趕工以提高工程進度及預算執行率。

基隆市	c006-3-1	基隆市都市排水疏濬工程(A)	工務處	工務處河川水利科	18,226	0	90	0	0	100	1080530	1080430	1080630	1080730	1080925	1081125	1081231	預算書圖多次修正,造成工程發包進度落後。	已完成預算成立作業,訂於108.07.09辦理第一次公開招標。		
基隆市	c008-1-1-1	深澳坑派出所原地增建整修	警察局	警察局後勤科	8,500	540	170	0	0	31	1080118	1080114	1080220	1080125	1080304	1080201	1080930	1081210	1081230	本案108年6月10日提送細部設計,為有效利用預算,且須符合使用單位需求,再次請承商修正,於108年6月28日再次提送細部修正,現正審查中,致進度落後。	持續督促承商履約,儘速申請建造執照。
基隆市	c008-1-2-1	中山消防分隊整修工程	消防局	消防局	3,230	8	8	0	0	100	1080531	1080516	1080630	1080731	1081031	1081231	1081231	1. 5月27日預算成立簽案送市府 2. 6月5日市長核准預算成立簽案 3. 6月11日攜招標資料至採購中心確認 4. 6月13日本局函發採購中心委請代辦採購事宜 5. 6月18日刊登公開招標公告 6. 訂於7月2日下午2時20分開標。	擬積極邀請廠商投標。		
基隆市	c008-3-2	建置本市重要路口監視系統	警察局	警察局保安科	2,000	0	0	0	0	0	1080331	1080329	1080430	1080430	1080531	1080815	1081031	1081130	第一次公告招標流標後,重新檢視、簽辦並變更規格設計,經市長於6月18日批示,6月27日簽核遴聘評選委員,已於7月1日重新公告招標。	本案7月1日重新公告招標,訂於7月22日完成決標開工。	
基隆市	c008-4-1	里民活動中心整修維護計畫	民政處	民政處自治行政科	2,835	1,016	269	0	0	26	1080331	1080331	1080531	1080531	1080630	1080930	1081130	1081215	因仁義里民活動中心4次流標,致執行率有	已請公所積極辦理中	

																					所延宕		
基隆市	c0010-1-33	原住民族學生獎學金	民政處	民政處原住民族行政科	1,584	760	532	0	0	70	1080331	1080329	1080430	1080430	1080531	1080513	1080628	1080628	1080930		1081130	獎學金申請人數不符預期,較往年少。	加強辦理。
基隆市	c0010-1-36	辦理發放婦女生育獎勵金計畫	民政處	民政處戶政科	49,000	24,500	24,420	0	0	100	1080102	1080102	1080102	1080102	1080102	1080102	1080630	1080704	1081231		1081231	因申請期限為60日,申請人得於新生兒出生當月或次月提出申請,致執行數無法於當月反映與分配數產生落差。	擬請各戶政事務所於辦理發放婦女生育獎勵金申請經費核銷作業時,預留作業時程,使執行數於當月反映,以避免發生執行落後情形。
基隆市	c0010-1-44	土地利用管理計畫	地政處	地政處	404	0	23	0	0	100	1080415		1080531		1080630		1080815		1081231		1081231	採購業務因涉及分工事宜,已於108年6月3日召開分工會議,並於108年6月27日函送會議記錄,確定都市發展處及本處之工作分工事宜,招標文件除配合修正另因政府採購法及相關表格有新修正,已儘速於有限人力狀況趕辦中。	相關表格修正完畢後,依規定陳核辦理後續招標事宜。
基隆市	c0010-1-46	財政業務檢討計畫	財政處	財政處財務管理科	461	218	22	0	0	10	1080131	1080131	1080227	1080227	1080630		1080930		1081231		1081231	本年度財政業務相關工作檢討會議預定於7月份辦理	將於辦理完妥後,儘速核銷
基隆市	c0010-1-55	長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程	產業發展處	產業發展處海洋事務科	24,298	4,860	0	0	0	0	1080331		1080430		1080510		1080831		1081220		1081231	因上位規劃案尚未執行完成。	已於5/1完成規劃成果期末審查及第一階段工程基本設計,於5/31召開第一

																					預算執行率未達80%。		
基隆市	c0010-1-80	全市道路、橋梁等各式照明設備電費計畫	工務處	工務處公用事業科	22,500	12,000	9,389	0	0	78	1080428	1080428	1080630	1080628	1080831		1080930		1081229		1081229	換裝節能LED路燈以致電費支出減少。	依台電公司電費單實支實付。
基隆市	c0010-1-81	六堵污水處理廠暨系統代操作營運	工務處	工務處下水道科	22,000	10,000	3,338	2,662	0	60	1080228	1080228	1080430	1080430	1080630		1080930		1081220		1081231	本案已完成發包並執行，執行率未達要求原因係因列管金額為預算金額，與實際發包後執行之契約金額差異，本案現每月均依契約辦理請款作業，故實際並無落後情形	本案每月均依契約辦理請款作業，故實際並無落後情形
基隆市	c0010-1-87	兩水下水道改善工程	工務處	工務處河川水利科	1,100	1,100	117	0	0	11	1061114	1061114	1061226	1061226	1070118	1070118	1070831	1070831	1071113	1071113	1080531	現發辦第二次變更設計中。	於發奉核可後，積極趕辦議定事宜及後續驗收請款。
基隆市	c0010-1-90	安和大街公寓大廈社區後方擋土牆工程	工務處	工務處養護工程科	4,500	1,000	11	0	0	1	1080331	1080327	1080430	1080425	1080531	1080610	1080630		1080920		1080930	因辦理施工前協調作業致進度落後	已於6月10日開工，目前施工進度30%，已請承包商積極趕工
基隆市	c0010-1-93	全市公園綠地及散步道再生計畫	都市發展處	都市發展處公園管理科	25,025	0	0	0	0	0	1080615		1080715		1080801		1080930		1081220		1081231	百福公園及希望之丘案規劃案已於108年1月17日與市長面報，百福公園請規劃設計單位依討論內容進行修正；另希望之丘案通過基本設計，請規劃設計單位進行該案細部設計。預計於七月底安排市長面報。	積極趕辦，百福公園及希望之丘案規劃案，分別積極趕辦基礎審查及細部審查。

基隆市	c0010-1-94	觀光事業管理	交通旅遊處	交通旅遊處觀光行政科	7,222	2,510	1,683	0	0	67	1080131	1080131	1080228	1080228	1080731		1080930		1081130	1081231	各風景據點、公廁設施等並無大規模毀壞，僅零星修繕，依實際情形核銷。	視實際情況進行維護及修繕更新。
基隆市	c0010-1-95	風景區設施管理及清潔維護	交通旅遊處	交通旅遊處觀光行政科	4,000	1,096	545	0	0	50	1080115	1080115	1080131	1080131	1080531	1080531	1080630	1080630	1081130	1081231	各風景據點公廁設施等並無大規模毀壞，僅零星修繕，依實際情形核銷。	視實際情況進行維護及修繕更新。
基隆市	c0010-1-101	望海藍帶鐵馬景觀棧道串連工程	交通旅遊處	交通旅遊處觀光工程科	5,357	1,500	0	0	0	0	1080331	1080329	1080430		1080531		1080831		1081130	1081231	設計監造採購案於108年6月17日原則修正後通過細部設計內容，該廠商於108年6月28日提送期中報告(核定版)，又該案工程案刻正辦理預算成立簽案，俟簽准後即辦理上網招標事宜。	俟審查通過辦理發包事宜。
基隆市	c0010-1-102	交通規劃業務	交通旅遊處	交通旅遊處交通規劃科	523	240	191	0	0	80	1080102	1080102	1080130	1080130	1080130	1080130	1080731		1081230	1081231	依委員實際出席人數支付出席費。	樽節支出。
基隆市	c0010-1-121	中正區區政建築及設備管理計畫	民政處	中正區公所	8,386	1,000	349	189	0	54	1080315	1080315	1080415	1080415	1080430	1080430	1080831		1081130	1081231	因零星工程款係視本區各里實際需求及各里什項設備各里無提出需求	持續改善調整以期符合實際
基隆市	c0010-1-188	警政業務設備	警察局	警察局後勤科	24,257	14,898	8,794	0	0	59	1080115	1080115	1080218	1080218	1080329	1080329	1080630	1080628	1081215	1081230	本案其中「本局暨所屬單位等7處建築物耐震補強工程」之規劃設計及監造技術服務，因辦理期未審查，請外聘委員協助本局審核，經多次修正，已於108年6月28日完成書面審查，現正辦理工程招標事宜。	請承商儘速提供工程招標文件，由本局儘速辦理工程招標事宜及完成第一期驗收付款。
基隆市	c0010-1-191	搶救救護	消防局	消防局	6,839	3,614	2,030	745	0	77	1080131	1080103	1080228	1080107	1080228	1080227	1080630	1080630	1081231	1081231	50萬救護貼片耗材等因素量	救護貼片耗材採購

																					現有救護耗材庫存數量致生落後情形。	案50萬元目前已發會各單位趕辦中。
基隆市	c0010-1-212	調查評估教育宣導	環境保護局	環境保護局	9,877	4,326	3,284	0	0	76	1080131	1080116	1080331	1080214	1080531	1080415	1080930		1081231	1081231	依各業務實際需求核銷。	依各業務實際需求核銷。
基隆市	c0010-1-218	一般廢棄物(廢電纜線)處理委託清除計畫	環境保護局	環境保護局	1,500	375	0	0	0	0	1080115	1071217	1080227	1080117	1080309	1080117	1080531		1081210	1081231	目前局場內廢電纜線量未達處理量	已連繫工務處及區公所盡速清除轄區電纜線
基隆市	c0010-1-219	環境清潔設備	環境保護局	環境保護局	45,309	1,919	235	29	0	14	1071231	1071231	1080331	1080331	1080430	1080430	1080930		1091231	1091231	「優質公廁及美質環境推動計畫」-「環境整潔提升及環境衛生改善計畫」旨案於4月9日上網公告、4月23日開標、5月29日簽約，履約期限為60個日曆天(108年7月29日)。「優質公廁及美質環境推動計畫」-「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」本案公廁整修工程執行單位為都發處、衛生局、交旅處，依環保署補助規定，工程決標俟得請款。	「優質公廁及美質環境推動計畫」-「環境整潔提升及環境衛生改善計畫」預計8月底前完成驗收及核銷撥款。「優質公廁及美質環境推動計畫」-「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」都發處及衛生局刻正辦理細部設計，交旅處已上網公告，倘工程決標即可辦理請領第一期款相關事宜。
基隆市	c0010-1-230	公車處營業客車委外保養及維修	交通旅遊處	公車處	31,600	15,800	4,830	0	0	31	1080227	1080227	1080301	1080606	1080301	1080606	1080630		1081231	1081231	廠商資料補正中	追蹤並提醒廠商儘快將相關資料補正後送交

19. 新竹市

新竹市 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 15.19 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
107	14.76	0.42	730,561.448	103.24	48.10	105	103	104	99	85	87	35	38	21	20	9	10

本年度基本設施補助經費 15.19 億元(中央補助 14.76 億元，地方自籌 0.42 億元)，截至 6 月底止，共有標案 107 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 707,648.025 仟元，預算實際支用數 636,566.758 仟元，已執行應付未付數 93,904.02 仟元，發包結餘數 90.67 仟元，合計預算執行數 730,561.448 仟元，預算執行率 103.24%，預算達成率 48.10%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,503,895 仟元，區公所執行 15,000 仟元，縣(市)執行率 103.23%，預算達成率 48.39%；區公所執行率 105.89%，預算達成率 19.06%。
- 依標案執行情形進度區分：107 件標案，已設計完成者 103 件，已發包決標者 99 件，已開工者 87 件，施工進度已達 50%者 38 件，已完工者 20 件，已驗收完成者 10 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，107 件標案計有 10 件落後，落後比率 9.35%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 4 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 5 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 3 件、因施工作業落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 4 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 48.10%，較平均預算達成率 35.30%高出 12.80 個百分點，執行情形良好。體育經費(37.06%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(27.98%)、公有建物及設施經費(9.49%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案，分屬工務處(1 件)、地政事務所(1 件)、城市行銷處(3 件)、產業發展處(1 件)、殯葬管理所(1 件)、警察局(3 件)執行案件。請新竹市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹市 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施											2		2
c009. 其他建設	1			3	1					1	2		8

新竹市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新竹市	c008-2-1-1	汰換警車	警察局	警察局	4,830	0	0	0	0	0	1080416		1080426		1080530		1081030		1081120		1081224		本案因採共同供應契約採購，目前採購網架後，立即辦理採購。標案尚未上架，經洽詢台灣銀行共同供應契約網查詢，逕車部分，預計在108年7月中才能決標上架，故俟上架後，始辦理採購。	於共同供應契約上架後，立即辦理採購。
新竹市	c008-3-3	老舊光纖、網路線路調查、重整及布建規劃服務	警察局	警察局	3,000	810	0	0	0	0	1080630	1080626	1080630		1080930		1080930		1080930		1081231		為配合前案第三分局網路調查重整案(於6月24日驗收)修訂招標文件	目前已辦理招標作業中
新竹市	c0010-1-4	新竹市客雅水資源中心設備功能提昇	工務處	工務處	3,000	810	0	0	0	0	1080430		1080531		1080630		1081031		1081130		1081231		本案已發包，目前辦理設計中。	已請設計公司儘速辦理。
新竹市	c0010-1-36	汰換地政資料庫及主機的備份軟硬體	地政事務所	地政事務所	3,500	1,925	0	0	0	0	1080531	1080507	1080630	1080522	1080630	1080522	1080831		1080930		1081231		標案為一次性付款，俟全案報驗後再辦理驗收付款。	請廠商儘早完成履約
新竹市	c0010-1-41	新竹市大庄、香山公園改善工程	城市行銷處	城市行銷處	3,400	3,400	0	0	0	0	1070706	1070706	1071011	1071011	1071024	1071024	1080113	1080113	1080416		1080515		辦理變更設計	盡速辦理變更設計相關事宜
新竹市	c0010-1-42	南大公園與頂竹圍公園公共地景整合與蔓生計劃	城市行銷處	城市行銷處	5,600	3,718	2,588	0	0	70	1070808	1070808	1071106	1071106	1071224	1071224	1080531		1080930		1081031		因雨天無法施工，導致施工進度稍落後。	請廠商採取有效之趕工對策。
新竹市	c0010-1-43	新竹市關新公園亮點改善工程	城市行銷處	城市行銷處	3,000	1,668	1,002	0	0	60	1070925	1070925	1071121	1071121	1080306	1080306	1080606		1081015		1081106		施工現場有隱蔽部分	將隱蔽部分納入討論及後續變更設計
新竹市	c0010-1-49	園區節能燈具、空調設備及監視系統汰換更新	殯葬管理所	殯葬管理所	3,500	1,660	1,652	0	0	99	1080417	1080411	1080425	1080418	1080516	1080507	1080617	1080617	1080630		1080715		依據契約第7條履約期限：工程	依據契約規範辦

																						之施工應於決標日起7日內開工，並於開工之日起45日(工作天)內竣工。本案於5月7日決標，預計竣工日期為108年7月17日。	理。
新竹市	c0010-1-58	漁港設施改善及港區環境維護	產業發展處	產業發展處	75,000	0	0	0	0	0	1080331	1080305	1080630		1080731		1081231		1090430		1090531	招標期間有廠商異議，並因採購評選委員會組織準則修正，委員遴選需配合異動。	已依新規定修正完成，並依延後預定工期開標及辦理後續評選作業
新竹市	c0010-1-72	義警、民防人員服裝、其他安全性協勤裝備	警察局	警察局	1,500	0	0	0	0	0	1080410	1080306	1080510		1080510		1081010		1081024		1081120	因採購標的不同，分別辦理採購。	已依採購標的，分別辦理採購。

20. 嘉義市

嘉義市 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 22.15 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
465	22.15	0	419,637.988	99.75	18.94	412	418	335	377	172	271	54	88	29	34	24	29

本年度基本設施補助經費 22.15 億元(中央補助 22.15 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 465 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 420,682.69 仟元，預算實際支用數 371,839.964 仟元，已執行應付未付數 44,259.228 仟元，發包結餘數 3,538.796 仟元，合計預算執行數 419,637.988 仟元，預算執行率 99.75%，預算達成率 18.94%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 2,115,840 仟元，區公所執行 99,454 仟元，縣(市)執行率 100.55%，預算達成率 18.09%；區公所執行率 92.21%，預算達成率 37.17%。
- 依標案執行情形進度區分：465 件標案，已設計完成者 418 件，已發包決標者 377 件，已開工者 271 件，施工進度已達 50%者 88 件，已完工者 34 件，已驗收完成者 29 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，465 件標案計有 54 件落後，落後比率 11.61%。
落後原因：

- 108 年 6 月落後標案 54 件，屬預算執行未達 80%者 35 件，屬查核點進度落後者 8 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 11 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 7 件、因招標作業落後者 12 件、因計畫變更落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 30 件及未填寫落後原因 3 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 18.94%，較平均預算達成率 35.30%落後 16.36 個百分點，執行情形欠佳。其中公有建物及設施經費均未執行，文化經費(22.51%)、體育經費(24.02%)、道路養護及道安計畫(2.46%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(7.58%)、水利建設經費(13.70%)、其他建設經費(20.84%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 54 件落後標案，分屬工務處土木工程科(1 件)、工務處水利工程科(12 件)、工務處污水下水道科(1 件)、工務處養護工程科(1 件)、文化局(7 件)、地政處(1 件)、西區區公所(3 件)、

東區區公所(2件)、建設處(2件)、財政稅務局(1件)、教育處特幼教育科(2件)、都市發展處都市更新科(1件)、都發處建管科(1件)、都發處都計科(1件)、智慧科技處(3件)、環保局(8件)、殯葬管理所(1件)、警察局(2件)、觀光新聞處(4件)執行案件。未填寫落後原因3件，請嘉義市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

嘉義市 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化	1			1							5		7
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設												1	1
c006. 水利建設				4									4
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	6			7			1		1		25	2	42

嘉義市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付款	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
嘉義市	c001-1-12	各項表演活動演出費	文化局	文化局	3,161	1,581	280	0	0	18	1080630	1080531	1080731	1080603	1080930	1080701	1081031			1081130		1081231	受補助團隊演出活動時間分布於各月,造成補助款落後核銷。	催促活動結束團隊盡速報請補助款核銷作業。
嘉義市	c001-1-13	藝術節等各項表演活動	文化局	文化局	5,000	5,000	3,500	0	0	70	1080228	1080228	1080331	1080331	1080415	1080415	1080430	1080430	1080530	1080530	1080630	1080610	本標案於108年6月10日結案驗收並請領第三期款。	於結案後盡速辦理撥款事宜。
嘉義市	c001-1-25	文化資產多元永續發展計畫、文化資產維護管理及再利用計畫、文化資產跨域發展計畫等	文化局	文化局	5,478	1,827	600	610	0	66	1080331	1080329	1080531	1080529	1080731	1080628	1080930			1081130		1081231	經費核撥作業中。	儘速趕辦。
嘉義市	c001-1-27	史蹟資料館、蘇周連宗祠等建物維護費	文化局	文化局	1,129	515	300	100	0	78	1080331	1080329	1080531	1080529	1080731	1080618	1080930			1081130		1081231	經費核撥作業中。	儘速趕辦。
嘉義市	c001-1-30	國際大型石猴雕刻創作營活動	文化局	文化局	2,500	750	0	0	0	0	1080531	1080531	1080731		1080831		1081031			1081125		1081225	刻正簽辦招標文件。	積極趕辦。
嘉義市	c001-1-35	文化資產多元永續發展計畫	文化局	文化局	844	212	0	106	0	50	1080331	1080329	1080531	1080529	1080731		1080930			1081130		1081231	經費核撥作業中。	儘速趕辦。
嘉義市	c001-1-45	音樂廳場館設備更新計畫	文化局	文化局	20,000	7,000	0	0	0	0	1080531	1080510	1080731	1080520	1080831		1080930			1081031		1081130	目前進行第一階段規劃設計,並進行規劃設計選核中。	盡速改正規劃設計不周延之處,並聘請委員審議核可後,進行細部規劃選查。
嘉義市	c005-2-3	各里道路養護	工務處	工務處 土木工程科	60,000	2,000	1,179	821	0	100	1080501	1080501	1080601	1080601	1080615		1081130			1081231		1090131		
嘉義市	c006-1-2	區域排水改善工程	工務處	工務處 水利工程科	10,000	3,000	0	0	0	0	1080301	1071225	1080331	1080212	1080530		1080930			1081130		1081231	招標作業延誤	盡快辦理招標
嘉義市	c006-3-1	雨水下水道建設及維護工程	工務處	工務處 水利工程科	19,781	0	0	0	0	0	1080506	1080503	1080603	1080613	1080628		1080930			1081231		1090228	招標二次流標	盡快辦理招標程序

嘉義市	c006-3-2	雨水下水道建設工程	工務處	工務處 水利工程科	10,000	1,000	0	0	0	0	1080430	1080429	1080530	1080522	1080630		1081015		1081215		1081230		決標作業延誤	決標已完成儘快辦理開工作業	
嘉義市	c006-3-3	疏浚清淤	工務處	工務處 水利工程科	4,200	10	0	0	0	0	1080430	1080429	1080530		1080630		1080930		1081231		1090228		招標二次流標	儘快辦理招標	
嘉義市	c0010-1-13	管考資訊系統	智慧科技處	智慧科技處	2,000	400	0	0	0	0	1080430	1080430	1080531	1080531	1080731		1081130		1081213		1081231		契約內容變更中。	儘速趕辦。	
嘉義市	c0010-1-16	網路運作維護	智慧科技處	智慧科技處	1,860	500	209	13	0	44	1080131	1080131	1080131	1080131	1080131	1080131	1080831	1080430	1081231		1081231		各系統定期維護合約依季及半年期核銷,及因資安系統防護一年授權更新分別於下半年度到期後再簽辦採購。	依合約儘速辦理簽辦採購核銷事宜。	
嘉義市	c0010-1-26	雲端身分驗證與存取管理系統	智慧科技處	智慧科技處	1,500	1,500	0	0	0	0	1080331	1080331	1080430	1080430	1080630	1080524	1080831		1080831		1080831		履約期限至8月31日,待驗收後再行付款。	儘速趕辦。	
嘉義市	c0010-1-47	地籍圖重測	地政處	地政處	1,723	517	378	0	0	73	1080615	1080401	1080715	1080703	1080815		1081031		1081215		1081231		廠商申請撥款所需附件不齊,待其補齊後儘速撥款。	儘速趕辦。	
嘉義市	c0010-1-55	宣導犬貓絕育	建設處	建設處	300	120	0	0	0	0	1080425	1080425	1080625	1080625	1080825		1081025		1081125		1081225		絕育活動於7月開始辦理。	儘速趕辦。	
嘉義市	c0010-1-65	各公園綠地水電費	建設處	建設處	8,916	4,200	2,480	0	0	59	1080131	1080131	1080531	1080514	1080630	1080603	1080831		1081031		1081231		辦理部分公園用電契約容量調整,與汰換部分節能燈具,致電費與水費支出節約	持續辦理節約能源資源事宜。	
嘉義市	c0010-1-73	路燈線路養護	工務處	工務處 養護工程科	2,000	1,100	800	0	0	73	1080301	1080227	1080401	1080328	1080415	1080415	1081031				1090228	1090430		經費核撥作業中。	儘速趕辦。
嘉義市	c0010-1-86	後湖抽水站等水電費	工務處	工務處 水利工程科	850	255	85	7	0	36	1080401	1080401	1080401	1080401	1080401	1080401	1080901				1081231	1090131		摺節經費。	來年度減編預算。
嘉義市	c0010-1-92	野溪、側溝維護等可行性評估	工務處	工務處 水利工程科	6,794	0	0	0	0	0	1080226	1080221	1080331	1080311	1080520		1081031		1081130		1081231		設計延誤	請顧問公司儘快設計	
嘉義市	c0010-1-93	雨水下水道建設工程	工務處	工務處 水利工程科	30,000	5,000	0	0	0	0	1080530	1080515	1080630		1080730		1081030		1081230		1090130		流標三次	儘快辦理招標作業	
嘉義市	c0010-1-94	區域排水改善工程	工務處	工務處 水利工程科	8,000	2,000	0	0	0	0	1080330	1080220	1080430		1080530		1080730		1081030		1081231		規劃作業延誤	請顧問公司儘快進	

				程科																		行規劃設計	
嘉義市	c0010-1-95	全國水環境清改善計畫	工務處	工務處 水利工程科	880	0	0	0	0	0	1080430	1080429	1080630		1080831		1081031		1081204		1081231	尚未招標	盡快辦理招標
嘉義市	c0010-1-97	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	工務處	工務處 水利工程科	8,885	0	0	0	0	0	1080530	1080529	1080630		1080730		1081030		1090130		1090228	流標	盡快辦理招標作業
嘉義市	c0010-1-98	雨水下水道系統規劃檢討	工務處	工務處 水利工程科	10,000	1,000	0	0	0	0	1080430	1080429	1080615	1080615	1080730		1081015		1081215		1081231	招標作業延誤	已上網招標
嘉義市	c0010-1-101	道將圳水環境改善	工務處	工務處 水利工程科	13,543	0	0	0	0	0	1080630		1081031		1081231		1090401		1090731		1091031	設計作業延誤	請顧問公司盡快設計
嘉義市	c0010-1-114	污水下水道建設計畫	工務處	工務處 污水下水道科	28,534	13,534	10,315	0	0	76	1080430	1080425	1080531	1080530	1080630	1080614	1080712		1081130		1081231	一、水資中心統包工程完成驗收,尚未完成決算。二、6月中旬申請營建署補助,尚未撥入。	一、盡速辦理工程決算。二、已洽詢營建署承辦人員,7月中旬中央補助將撥入,將盡速配合辦理分配及撥款事宜。
嘉義市	c0010-1-119	工業區研提發展策略與都市計畫變更	都市發展處	都發處 都計科	3,000	750	0	0	0	0	1080630	1080527	1080831	1080626	1080930		1081031		1081130		1081231	108/6/26完成議約,目前尚在進行簽約程序,需俟契約簽訂,廠商依約完成工作計畫書後,方能辦理第1期付款作業。	積極辦理簽約程序
嘉義市	c0010-1-124	市中心發展策略規劃研究案	都市發展處	都市發展處 都市更新科	2,000	500	0	0	0	0	1080630		1080831		1080930		1081031		1081130		1081231		
嘉義市	c0010-1-127	建管套繪系統升級與整合	都市發展處	都發處 建管科	2,000	0	0	0	0	0	1080531		1080731		1080831		1081031		1081130		1081231	需整合兩大系統	通知相關廠商開會研商
嘉義市	c0010-1-146	國外旅行社勘查觀光旅遊路線等	新聞科	觀光新聞處	1,000	400	0	0	0	0	1080531	1080531	1080630	1080620	1080831		1081031		1081210		1081231	已邀請香港旅遊及美食作家於6月20日至23	積極趕辦付款作業。

																					日至本市球線,現正辦理後續核銷作業。	
嘉義市	c0010-1-149	祭典節慶及多元族群特色觀光推廣活動	新聞科	觀光新聞處	3,500	900	97	0	0	11	1080430	1080506	1080531	1080531	1080630	1080610	1080731	1080613	1080831	1080930	本案契約尚未製作完成,俟契約製作完成後積極趕辦第一、二期款付款作業。	積極趕辦契約製作作業,俾利辦理後續付款作業。
嘉義市	c0010-1-150	自行車主題推廣活動	新聞科	觀光新聞處	2,500	0	0	0	0	0	1080531		1080630		1080831		1081015		1081215	1081231	招標文件內容經會辦單位糾正,現正重新發核中。	積極趕辦招標文件發核作業。
嘉義市	c0010-1-151	蘭潭風景區及嘉油鐵馬道水電費	新聞科	觀光新聞處	434	208	164	0	0	79	1080131	1080115	1080228	1080118	1080228	1080118	1080731		1081231	1081231	本案因係參考過去年度水電費支出情形編列每月支出數,惟因受蘭潭水位過低致噴泉設施無法使用,使得整體支出數降低,且本處各設施水電費支出本於撙節使用之原則,僅支出16萬3,933元。	於編列108年度預算時依照過去三年水電費支出狀況酌予減列年度預算額度,重新增減本科預算科目之名稱與數額。
嘉義市	c0010-1-165	推動學前教育業務及促進幼教發展等	教育處	教育處特幼教育科	7,407	3,000	449	0	0	15	1080630	1080628	1080630	1080628	1080731		1080831		1081231	1081231	本年度中央經費補助比率高於預算編列規劃	後續積極辦理計畫以提高經費使用率
嘉義市	c0010-1-169	身心障礙學生教育代金、學雜費及交通費	教育處	教育處特幼教育科	2,700	2,025	1,355	0	0	67	1080331	1080331	1080430	1080430	1080630	1080628	1080831	1080628	1081031	1081231	本案隨學校辦理情形撥付經費	將積極請學校辦理計畫以撥付經費
嘉義市	c0010-1-181	公務通訊費	人事處	東區區公所	466	176	114	0	0	65	1080101	1080101	1080430	1080430	1080731	1080531	1080930		1081130	1081231	辦理中	盡速執行
嘉義市	c0010-1-188	道路搶修及人行道等道路附屬設施維護工程	人事處	東區區公所	15,500	3,500	1,670	0	0	48	1080430	1080116	1080731	1080227	1081031	1080326	1081231		1090228	1090430		
嘉義市	c0010-1-194	公務通訊費	西區區公所	西區區公所	518	215	160	7	0	78	1080101	1080101	1080430	1080430	1080731	1080531	1080930		1081130	1081231	108年6月份各聯合里辦公處電話費因電信公司尚未出帳,上述金額未及於6月底前核銷。	聯合里辦公處電話費將配合電信公司出帳日期辦理預算匡列,按時辦理核

21. 金門縣

金門縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 6.12 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
224	6.1	0.02	218,443.533	153.73	35.66	213	204	207	190	189	182	114	134	105	123	98	114

本年度基本設施補助經費 6.12 億元(中央補助 6.1 億元，地方自籌 0.02 億元)，截至 6 月底止，共有標案 224 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 142,093.329 仟元，預算實際支用數 201,959.702 仟元，已執行應付未付數 12,442.97 仟元，發包結餘數 4,040.861 仟元，合計預算執行數 218,443.533 仟元，預算執行率 153.73%，預算達成率 35.66%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 543,896 仟元，鄉鎮公所執行 68,600 仟元，縣(市)執行率 153.29%，預算達成率 39.06%；鄉鎮公所執行率 171.43%，預算達成率 8.75%。
- 依標案執行情形進度區分：224 件標案，已設計完成者 204 件，已發包決標者 190 件，已開工者 182 件，施工進度已達 50%者 134 件，已完工者 123 件，已驗收完成者 114 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，224 件標案計有 33 件落後，落後比率 14.73%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 33 件，屬預算執行未達 80%者 3 件，屬查核點進度落後者 21 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 9 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 9 件、因施工作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、因預算編列落後者 3 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 12 件及未填寫落後原因 1 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 35.66%，較平均預算達成率 35.30%高出 0.36 個百分點。其中文化經費(24.31%)、道路養護及道安計畫(9.09%)、水利建設經費(19.59%)、其他建設經費(38.04%)等四類預算達成率較計畫平均值比落後，請積極執行；另有 33 件落後標案，分屬金門縣文化局(1 件)、金門縣水產試驗所(2 件)、金門縣立體育場(1 件)、金門縣林務所(5 件)、金門縣金寧鄉公所(1 件)、金門縣政府教育處(1 件)、金門縣政府觀光處(5 件)、金門縣消防局(2 件)、金門縣港務處(2 件)、金門縣農業試驗所(3 件)、金門縣衛生局(6 件)、金門縣養護工程

所(3件)、金門縣環境保護局(1件)執行案件。未填寫落後原因1件，請金門縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

金門縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化					1								1
c002. 體育												1	1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設	2												2
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	3			9			1		3	1	10		27
c009. 其他建設											2		2

金門縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
金門縣	c001-1-2	增加本縣各鄉鎮圖書館之圖書館藏	金門縣文化局	金門縣文化局	1,800	1,200	940	0	260	100	1080121	1080114	1080125	1080223	1080430	1080704	1080731		1080930		1081130		因原承?人在執行時進度落後，以致接手時無法按照上面的時間點進行。	會儘快趕上進度，以完成該完成的作業。
金門縣	c002-1-1	 2019金門馬拉松	金門縣政府教育處	金門縣政府教育處	19,500	19,500	8,995	0	0	46	1070726	1070726	1070917	1070917	1070917	1070917	1080217	1080217	1080217	1080217	1080430			
金門縣	c005-3-4	辦理小三通相關設施改善工程	金門縣港務處	金門縣港務處	2,000	0	0	0	0	0	1080430	1080527	1080630		1080731		1081030		1081231		1090228		因啟案時間落後，造成查核點進度落後。	108.06.28召開細部設計審查會議，設計單位預定108.7.8前提送修正後細部設計書圖，確認無誤後則可上網招標。
金門縣	c005-3-8	水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	3,000	0	0	0	0	0	1080430		1080630		1080731		1081030		1081130		1081231		尚待需求彙整及招標文件草擬	待彙整相關需求盡速上網招標作業
金門縣	c008-5-6	服務臺重新規劃施作	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	221	0	0	0	0	0	1080405	1080417	1080415	1080515	1080419		1080517		1080620		1080628		本案因工程預算僅22萬1000元整，對廠商無吸引力，故流標1次，且為周延，招標前洽多家廠商設計，故進度落後。	已招標完成，並已完成修正圖設審核，洽廠商儘速開工（預定於7月10日前開工）
金門縣	c008-5-19	運動場汰換司令臺上方複金屬燈	金門縣立體育場	金門縣立體育場	1,580	0	0	0	0	0	1080630	1080703	1080630	1080708	1080630		1080930		1080930		1080930		配電管路清查至6月中方完成，以至延後招標作業	7月初已上網招標，後續將督工如期完成
金門縣	c008-5-29	汰舊九人座公務汽車	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	1,400	1,400	0	0	0	0	1080503	1080502	1080517	1080502	1080531	1080503	1080614		1080614		1080621		車輛需自國外進口，尚有報關程序等，所需交貨期大於預期。	持續追蹤廠商目前運送進度。

金門縣	c008-5-44	購置木椅10張	金門縣 農業試驗所	金門縣 農業試驗所	16	16	0	0	0	0	1080502	1080502	1080531	1080531	1080603	1080603	1080603	1080603	1080607	1080607	1080614	1080614	核銷撥款恰達6月底，已於7月初完成撥款。	已於7月初完成撥款。
金門縣	c008-5-48	購置飲水機2組	金門縣 農業試驗所	金門縣 農業試驗所	72	72	0	0	0	0	1080510	1080419	1080524	1080419	1080531	1080423	1080614	1080614	1080614	1080614	1080621	1080621	核銷撥款恰達6月底，已於7月初完成撥款。	已於7月初完成撥款。
金門縣	c008-5-71	林務所全區配電改善工程	金門縣 林務所	金門縣 林務所	4,000	165	0	0	0	0	1080415	1080612	1080506		1080520		1080731		1080930		1081031		預算編列不足	經與承辦單位討論，先就急需處理部分進行規劃設計，並積極爭取其餘經費應因。
金門縣	c008-5-72	增設簡易停車場(含地坪及遮陽棚)	金門縣 林務所	金門縣 林務所	2,000	0	0	0	0	0	1080415	1080415	1080430	1080509	1080515	1080528	1080605	1080605	1080628		1080731		因六月份連續降雨，導致無法施工。	已符合契約規定部分，給予不計工期，但仍要求承商應把握好天氣，儘速施工。
金門縣	c008-5-83	汰換森林公園旅客服務中心及植物園中山室直立式冷氣4臺	金門縣 林務所	金門縣 林務所	307	0	0	0	0	0	1080415	1080612	1080430	1080612	1080430	1080612	1080628		1080628		1080731		另原編列預算為新台幣30萬7,000元，惟旨案總經費計需新台幣36萬9,188元。	已函報縣府將動支他案標餘款，並獲縣府以108年6月4日府建農字第1080043027號函核定在案，同意由「108年度施政計畫-一般建築及設備費-設備及工程-機械設備-設備及投資-機械設備費」及「108年度施政計畫-一般建築及設備費-設備及工程-其他設備-雜項設

																						備費」項下 動支標餘款 6萬4,153 元。
金門縣	c008-5-89	新購花園種子不銹鋼冰箱1臺	金門縣 林務所	金門縣 林務所	100	100	0	0	0	0	1080501	1080603	1080501	1080501	1080603	1080603	1080628		原規劃購買花 園之冷藏庫1 組,因本所今年 度另個委辦案 承商之提案內 容亦包含冷藏 庫1組,故重新 檢視需求與估 價,併另案 (c008-5-90)辦 理招標。	經重新訪 價,業於6 月3日奉核 辦理,已送 採購招標所 辦理公開取 得,履約期 限為決標日 後50天,預 計9月結 案。		
金門縣	c008-5-90	新購花園花卉用冰櫃1臺	金門縣 林務所	金門縣 林務所	100	100	0	0	0	0	1080501	1080603	1080501	1080501	1080603	1080603	1080628		1.本案原編列 10萬元,為本年 度再次訪價,合 於本所需求之 冷藏櫃估價後 最低價仍需12 萬元。2.因與 他案 (c008-5-89)採 購性質相同,故 併案辦理。	業於6月3日 奉核辦理,已 送採購招標 所辦理公開 取得,履約 期限為決標 日後50 天,預計9 月結案。		
金門縣	c008-5-99	建造漁業多功能艇1艘(含設 計監造)	金門縣 水產試驗所	金門縣 水產試驗所	7,000	260	0	260	325	225	1080531	1080624	1080614	1080628	1081011	1081227	1081231		因期末評審會 委員安排時間 機票協調導致 延誤。	後續已完成 相關評審會		
金門縣	c008-5-102	購置藻及菌類設備	金門縣 水產試驗所	金門縣 水產試驗所	400	0	0	0	0	0	1080430	1080412	1080519	1080513	1080616	1080611	1080630	1080714	1080731	其他設備已準 備完成 僅顯微 鏡尚需海外寄 送	已通知廠商 於履約期限 內完成交貨 與驗收	
金門縣	c008-5-115	大膽島環境清理及垃圾清運 計畫	金門縣 政府觀光處	金門縣 政府觀光處	2,700	0	0	0	0	0	1080531	1080630	1080716	1080831	1080930	1081031	1081031		計畫配合實際 需求修正中,完 成後即發辦採 購作業	計畫配合實際 需求修正 中,完成後 即發辦採購 作業		
金門縣	c008-5-116	大膽島發電機料購置及運 補計畫	金門縣 政府觀光處	金門縣 政府觀光處	4,000	0	0	0	0	0	1080630	1080630	1080831	1080930	1081031	1081130	1081130		配合軍方108年 度用油預估數 統計,以確認分 擔比例。	近期邀集軍 方開會討論 分擔比例 後,依程序 辦理採購作 業。		
金門縣	c008-5-119	景點暨辦公室設施修繕工程 計畫	金門縣 政府觀光處	金門縣 政府觀光處	6,000	0	481	0	0	100	1080531	1080630	1080731	1080930	1081130	1081231	1081231		觀光處室內裝 修及消防設施	觀光處室內 裝修及消防		

			光處	光處																改善工程配合實際需求修正簽辦中,核定後既上網辦理招標作業。	設施改善工程配合實際需求修正簽辦中,核定後既上網辦理招標作業。
金門縣	c008-5-120	 各景點設施、設備汰換更新	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	600	0	0	0	0	1080315	1080329	1080426	1080517	1081230	1081231				為景點常態性修繕,執行為全年度。	為景點常態性修繕,執行為全年度。
金門縣	c008-5-125	購置穩壓器2臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	300	0	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080510	1080710	1080710	1080731			6/28第一次開標因未達三家宣布流標,第二次招標訂於7/12.	繼續招標
金門縣	c008-5-126	購置零級空氣產生機1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	250	0	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080510	1080710	1080710	1080731			6/28第一次招標因未達三家宣布流標,第二次開標訂於7/12。	繼續招標
金門縣	c008-5-127	購置超高速低溫離心機1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	318	0	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080510	1080710	1080710	1080731			6/28第一次招標因未達三家宣布流標,第二次開標訂於7/12。	繼續招標
金門縣	c008-5-128	購置超音波震盪器2臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	130	0	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080510	1080710	1080710	1080731			6/28第一次招標因未達三家宣布流標,第二次開標訂於7/12。	繼續招標
金門縣	c008-5-129	購置直立式冷凍櫃3臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	180	0	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080510	1080710	1080710	1080731			6/28第一次招標因未達三家宣布流標,第二次開標訂於7/12。	繼續招標
金門縣	c008-5-132	購置加熱水浴槽1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	20	0	0	0	0	0	1080329	1080503	1080510	1080510	1080710	1080710	1080731			1.本項設備原規劃與其它設備合併招標,後因金額未達10萬元,為加速採購效率,逕行採購. 2.原規劃用途為化學檢驗用,後因前瞻計畫另行補助化學幾驗用支	已完成訪價

																					水浴槽，本案設備擬改為微生物用，規格略有不同，因重新搜及設備資訊及訪價，至期程延宕。		
金門縣	c008-5-141	購置小流量渦輪瞄子6支	金門縣消防局	金門縣消防局	95	0	0	0	0	0	1080405	1080701	1080630	1080701	1080730	1080702	1081130	1081130	1081231		因訪價及規格蒐集撰寫延誤，致與預計採購期程落後。	現已進行訪價及規格撰寫簽核中，較原定落後，但尚未影響整體採購效率。	
金門縣	c008-5-143	購置吹風式滅火機	金門縣消防局	金門縣消防局	90	0	0	0	0	0	1080531	1080701	1080731	1080701	1080731	1080702	1081031	1081031	1081231		因訪價及規格蒐集撰寫延誤，致與預計採購期程落後。	現已進行訪價及規格撰寫簽核中，較原定落後，但尚未影響整體採購效率。	
金門縣	c008-5-156	各公園設施整建美化工程及零星整修工程	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	1,000	143	0	0	51	36	1080601		1080630		1080715		1080930	1081130	1081231		民眾要求變更	與地方民眾溝通並依協調後意見修正設計內容	
金門縣	c008-5-157	金門縣道路路燈節能調光示範工程	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	1,500	429	0	0	0	0	1080531		1080619			1080628		1080917	1081105	1081220		因允許路燈調光相關法規尚未頒行，且案內資訊技術較為專業，仍需時間研議、參考台灣是否有案例再編撰需求說明書。	搜尋台灣是否有機關單位已有相關技術實施
金門縣	c008-5-161	汰換公園用駕駛式割草機乙臺(97年購置)	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	450	100	0	0	0	0	1080501		1080630		1080731		1080831	1080930	1081130		尚未完成簽約	已請廠商加速作業	
金門縣	c0010-1-7	金門縣金寧鄉鄉村整建工程	金門縣金寧鄉公所	金門縣金寧鄉公所	7,000	3,500	0	0	0	0	1071113	1071113	1071126	1071126	1080108	1080102	1080419	1080419	1080830	1081129		廠商未辦理計價	請廠商辦理計價查驗
金門縣	c0010-1-9	后麟營區用地取得計畫	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	10,000	0	0	0	0	0	1080430	1080313	1080531		1080630		1080731	1080930	1081130		本案用地取得因本縣尚有其他土地撥用作業處理中，致國產署要求先完成該項作業後再予續辦本案	已協請其他土地撥用機關儘完成土地撥用作業，俟其完成後依程序提報撥用計	

22. 連江縣

連江縣 108 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 4.22 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
75	3.38	0.84	170,706.347	158.46	40.45	67	66	63	63	49	52	17	18	6	6	6	6

本年度基本設施補助經費 4.22 億元(中央補助 3.38 億元，地方自籌 0.84 億元)，截至 6 月底止，共有標案 75 件。

108 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 107,726.664 仟元，預算實際支用數 166,489.128 仟元，已執行應付未付數 4,168 仟元，發包結餘數 49.219 仟元，合計預算執行數 170,706.347 仟元，預算執行率 158.46%，預算達成率 40.45%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 422,061 仟元，縣(市)執行率 158.46%，預算達成率 40.45%。
- 依標案執行情形進度區分：75 件標案，已設計完成者 66 件，已發包決標者 63 件，已開工者 52 件，施工進度已達 50%者 18 件，已完工者 6 件，已驗收完成者 6 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 108 年 6 月底止，75 件標案計有 10 件落後，落後比率 13.33%。
落後原因：
1. 108 年 6 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 6 件，屬查核點進度落後者 2 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 2 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因驗收作業落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 7 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 40.45%，較平均預算達成率 35.30%高出 5.15 個百分點，執行情形良好。各類計畫以文化經費(32.73%)、體育經費(40.52%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(15.00%)、水利建設經費(12.96%)、公有建物及設施經費(0.95%)等五類未達各類預算達成率計畫平均值，請加強督促執行；另有 10 件落後標案，分屬文化處(1 件)、民政處(1 件)、交通旅遊局(2 件)、地政局(1 件)、教育處(3 件)、衛生福利局(1 件)、環境資源局(1 件)執行案件。請連江縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

連江縣 108 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案										未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素			其他
c001. 文化											1		1
c002. 體育											3		3
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設	1												1
c006. 水利建設						1							1
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設										1	3		4

連江縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
連江縣	c001-1-3	文化設施計畫	文化處	文化處	200	0	0	0	0	0	1080615		1080630		1080715		1081130		1081130		1081231		為符合地區需求，統計數量調查時間較久，造成延誤。	刻正辦理採購中，預計可依進度完成。
連江縣	c002-1-4	二馬體育文化交流活動	教育處	教育處	1,000	1,000	123	0	0	12	1080312	1080312	1080402	1080402	1080426	1080426	1080501	1080501	1080531	1080531	1080628	1080625	辦理核結中	儘速辦理核結
連江縣	c002-1-6	補助各團體辦理運動競賽活動經費	教育處	教育處	2,500	1,500	164	0	0	11	1080206	1080206	1080306	1080306	1080607	1080605	1080912		1081113		1081205		本案俟各體育團體提報計畫後撥款	儘速辦理經費撥款事宜。
連江縣	c002-1-10	基層運動選手訓練站計畫	教育處	教育處	1,500	500	0	0	0	0	1080305	1080305	1080411	1080411	1080605	1080604	1080919		1081121		1081205		全縣基層運動選手培訓計畫，108年度設站共計4站，計有角力、桌球、籃球、羽球。	各站均依計畫執行中，並於學期結束(108年7月)辦理核結。
連江縣	c005-3-1	直昇機場養護工程	交通旅遊局	交通旅遊局	300	100	0	0	0	0	1080501	1080503	1080531	1080510	1080601	1080517	1080701	1080626	1080731		1080801		1. 西莒直升機飛行場修繕工程已委請廠商施工辦理 2. 東引直升機飛行場修繕工程已委託廠商並於6月19日完工	刻正辦理核銷作業
連江縣	c006-3-1	水資源回收中心維護費	環境資源局	環境資源局	68	10	0	0	0	0	1080603	1080603	1080614	1080614	1080621	1080621	1081129		1081231		1090131		1. 廠商提送驗收資料，經多次退回修正 2. 各廠電費及辦公大樓計費期間不同，須依實際天數計費	目前已進行撥款62,869元陳核中，核可後經費執行率即可跟上。
連江縣	c0010-1-8	補助各廟宇重、修建及零星修繕工程	民政處	民政處	600	200	60	0	0	30	1080415	1080415	1080415	1080415	1080628		1081031		1081129		1081220		此案為補助計畫，由廟宇申請修繕補助，今年度已核定補助新臺幣共58萬，目前一家廟宇申請完工核	請廟宇於完工後儘速報府結案。

																						發補助款，其他廟宇尚未完工，因此造成執行進度落後。			
連江縣	c0010-1-27	觀光設施零星修繕工程	交通旅遊局	交通旅遊局	400	100	0	98	0	98	1080430		1080531		1080612		1080930		1081129		1081220		規劃辦理中	確認後辦理採購	
連江縣	c0010-1-45	充實衛生福利局辦公設備	衛生福利局	衛生福利局	825	660	485	0	0	73	1080304	1080304	1080331	1080321	1080419	1080417	1080517	1080510	1080531	1080531	1080621	1080621	1080621	因天候(海象不佳)造成交貨延遲,致工班無法按預期時間安裝相關設備	目前貨物皆已達本局,且已安裝完成,待後續驗收核銷事宜
連江縣	c0010-1-47	充實地政局資訊及交通設備	地政局	地政局	559	199	99	0	0	50	1080430	1080614	1080531	1080628	1080630	1080704	1080731		1080731		1080830		已辦理變更為5部一般機車陳核中	已於6月15日決行辦理變更為5部一般機車採購中	
