


宜蘭縣政府

101 年度基本設施補助計畫
執行績效報告



宜蘭縣政府

中華民國 102 年 4 月

目錄

壹、前言	1
貳、績效目標達成情形	2
參、基本設施各計畫標案執行成效	12
肆、自辦評核、查證及獎懲情形	13
伍、基本設施補助計畫經費運用特色	16
陸、計畫實施效益	18
柒、落後項目檢討情形	36
附表 1	39
附表 2	45
附件 1	46
附件 2	47
附件 3	49

101 年度基本設施補助計畫執行績效報告

壹、前言

一、基本設施補助計畫先期評估作業機制：

(一)先期評估作業流程：

1、本府 101 年預算籌編會議於 100 年 8-10 月間由吳副縣長主持召開，並將行政院主計處所設算核列本府之一般性補助款基本設施補助款額度 8 億 3,923 萬 3,000 元納入，同時審查及評估可行性，俾利執行及交付列管。

2、複評及核定：

(1)101 年 2 月 18 日再由吳副縣長澤成主持召集本府各相關單位，就擬提報 101 年度基本設施補助計畫（含優先施政項目匡定及本府主計處所研提施政項目）予以檢視，並逐案討論評估其可行性，俾有效呈現本縣基本設施補助計畫執行績效。會中吳副縣長裁示補助計畫匡列原則，以完成用地取得及都市計畫變更等先期作業者優先列入，倘日後執行不力變更期程或註銷案件，將予以檢討並追究責任。

(2)本府主計處除依規定於 101 年 2 月 20 日函報行政院主計處，同時將 101 年度基本設施補助計畫之檢討會議決議事項，函送各相關單位據以辦理，以期提升本府基本設施補助計畫執行成效。

二、基本設施補助計畫管考機制

為有效列管基本設施補助計畫，除於 101 年 3 月請各計畫執行單位於行政院研考會「政府計畫管理資訊網」登錄工作計畫及執行情形俾利控管外，並針對落後及需協調案件，每月提重大工程督導會報檢討會議由副縣長主持，主計處、工程查核小組、計畫處列席，各相關執行單位出席報告不定期配合工程施工查核小組實地現勘查證，並協調解決各執行單位遭遇困難主席裁示會議紀錄均函送及通報相關單位，每月將情形提會報檢討並納入年終考核。

貳、績效目標達成情形

標案名稱	績效衡量標準	原訂目標值	達成目標值	目標達成度	績效衡量達成情形分析
1 文化經費部分(8.78%)				98.75%	
1.12012 宜蘭國際童玩藝術節活動園區佈置、展覽、表演、宣傳、團隊接待聯繫及票務行銷等相關活動費用	參觀人數	400,000	441,176	100%	活動共計有 441,176 人參加本次童玩節活動。
1.2 金馬獎影展暨週邊配合活動執行等相關費用	影展放映電影/部	50	86	100%	1. 原訂達到影展放映作品數 50 部，執行後達到 86 部。 2. 原訂達到影展放映場次數 70 場，執行後達到 79 場。 3. 原訂達到典禮參與人數 2000 人，執行後達到 4150 人。
	放映電影/場次	70	79	100%	
	頒獎典禮參與人數	2,000	4,150	100%	
1.3 文化局第二館區興建工程	工程進度	100%	100%	100%	工程進度達成 100%。
1.4 縣定古蹟二結穀倉地上物權移轉費	藝、文活動/場	10	10	100%	1. 辦理藝、文活動 10 場。 2. 辦理家政傳習 2 場。
	家政傳習/場	2	2	100%	
1.52012 宜蘭國際童玩節藝術節舞台、展館、票亭、遊戲、休憩及水電等各項設備費	工程進度/百分比	100%	100%	100%	工程進度達成 100%。
1.6 購置圖書館圖書及非圖書資料等	圖書約/冊	5,000	4247	85%	1. 購置圖書 4,247 冊。 2. 購置非書資料 664 件。
	非書資料/件	600	664	100%	
2 體育建設(2.57%)				90.6%	

標案名稱	績效衡量標準	原訂目標值	達成目標值	目標達成度	績效衡量達成情形分析
2.1 大進國小風雨操場新建工程經費	工程進度/百分比	100%	100%	100%	完成風雨操場 1 座。
2.2 廣興國小風雨操場新建工程經費	工程進度/百分比	100%	100%	100%	完成風雨操場 1 座。
2.3 人文國民中小學體育館興建工程經費	規劃設計進度/百分比	80%	50%	62.5%	1. 完成預算書圖並核備。 2. 取得建築執照。
2.4 竹林國民小學體育館興建工程經費	工程進度/百分比	100%	100%	100%	完成體育館 1 座。
3 補助貧瘠鄉鎮市 (1.69%)				100%	
3.1 補助本縣所轄貧瘠鄉鎮市優先償還退休人員優惠存款利息差額	經費達成率	100%	100%	100%	已完成撥付 4 個貧瘠鄉鎮市補助款事宜。
4 道路養護及道安計畫 (18.38%)				99.37%	
4.1 縣鄉道道路及其附屬設施養護工程	公尺	1,900	1,900	100%	完成 1,900 公尺之道路養護工作。
4.2 縣道及鄉道養護工程	公尺	409,888	409,888	100%	完成 409,888 公尺之道路養護工作。
4.3 道路橋樑維護改善檢修測設工作	座	684	684	100%	完成 684 座橋樑定期目視檢測工作。
4.4 道路植栽綠美化及養護工程	綠美化/平方公尺	500	500	100%	完成 500 平方公尺綠化面積。
4.5 公路及市區道路整修改善人手孔下地平齊配合及考評獎助	座	6,000	6,000	100%	完成 6000 座道路人手孔蓋減量下地工作。
4.6 北宜高側車道管理維護費	公尺	24,845	24,845	100%	完成 24,845 公尺之縣道養護工作。
4.7 補助公所辦理鄉道路路面路容養護及交通安全設施工程	公里	360	352	97.8%	完成道路修補 352 公里。
4.8 補助公所辦理市區道路路面路容養護及交通安全設施工程	公頃	670	656	95.9%	完成 656 公頃之道路養護工作。

標案名稱	績效衡量標準	原訂目標值	達成目標值	目標達成度	績效衡量達成情形分析
4.9 市區道路及附屬設施養護工程	公尺	1,200	1,200	100%	完成 1,200 公尺之道路養護工作。
4.10 道路交通秩序與交通安全改進方案設置交通號誌等	汰換老舊 LED 燈箱 / 組	200	200	100%	完成汰換老舊 LED 燈箱 200 組。
5 水利建設(24.63%)				94.16%	
5.1 委託辦理縣管水(閘)門管理及操作經費	水閘門/座	53	53	100%	已達成 53 座水(閘)門操作管理。
5.2 全縣水利建造物檢查	縣管河川、區域排水建造物安全檢查/條	80	80	100%	完成縣管河川、區域排水建造物安全檢查 80 條。
5.3 河川及防洪、防潮閘門等維護管理及相關費用	區排維管/條	70	70	100%	完成 70 條縣管河川及區排維護工作。
5.4 十三股排水等抽水站維護、管理費及相關費用	抽水站維管/座	5	5	100%	達成 5 座抽水站維護管理。
5.5 河川、區排及防潮閘(水)門維護改善工程	護岸改善約/公尺	1,700	1,275	75%	護岸改善完成 1,275 公尺。
	河道疏濬長度/公尺	4,000	4,000	100%	河道疏濬長度 4,000 公尺。
	河道護岸灌喬木種植/公尺。	15,000	15,000	100%	護岸種植 15,000 公尺。
5.6 閘門設備改善工程	閘門設備維護更新/座	30	15	50%	達成 15 座電動閘門更新。
5.7 易淹水地區水患治理工程用地費	徵收用地/公頃	1.5	1.5	100%	已完成用地取得約 1.5 公頃
5.8 本縣各鄉鎮雨水下水道清理疏浚維護及抽水站管理維護等工程	排水渠道清淤/公尺	1,500	1,500	100%	清疏濬雨水下水道 1500 公尺。
5.9 補助公所辦理雨水下水道系統(含抽水站)改善維護工程	雨水下水道工程/公尺	1,000	1,000	100%	建設雨水下水道 1000 公尺。

標案名稱	績效衡量標準	原訂目標值	達成目標值	目標達成度	績效衡量達成情形分析
5.10 補助辦理蘇澳(新馬地區)都市計畫 R 幹線雨水下水道工程	經費達成率	100%	100%	100%	經費達成率 100%。
6 公有建物及設施(6.41%)				100%	
6.1 礁溪分局四城派出所辦公廳舍新建工程(含設備)規劃設計費	規劃設計進度/百分比	100%	100%	100%	規劃設計進度 100%。
6.2 頭城分隊辦公廳舍新建工程	總工程進度/百分比	70%	70%	100%	完成結構體工程。
6.3 汰換警用車輛	購置巡邏車/輛	6	6	100%	本案計購置警用巡邏機車 12 輛，偵防車 3 輛，巡邏車 6 輛，小型警備車 2 輛。
	偵防車/輛	3	3	100%	
	小型警備車/輛	2	2	100%	
	巡邏機車/輛	12	12	100%	
6.4 救災用水箱消防車等相關救災車輛	消防車輛/輛	2	2	100%	購置消防水箱車 2 輛，業已配發救災單位使用。
6.5 補助各鄉(鎮、市)公所購置垃圾清運機具	垃圾車/輛	3	3	100%	共汰換 3 輛垃圾車。
6.6 治安要點監錄系統電費	經費達成率	100%	100%	100%	支應全縣 406 處治安與交通要點監錄系統電費，維護系統正常運作。
6.7 監錄系統網際網路費	經費達成率	100%	100%	100%	支應全縣治安與交通要點監錄系統 497 條電路網際網路及視訊管理平台租賃費，維護系統正常運作。
6.8 治安要點監錄系統維護費	經費達成率	100%	100%	100%	維護全縣 549 組治安與交通要點監錄系統費用，維護前端設備功能，使系統正常運作。
7 其他建設(37.54%)				99.33%	
7.1 行政大樓廁所門扇整修工程費用	更新廁所門扇/樑	35	35	100%	1. 完成更新廁所門扇 35 樑。 2. 增設女廁隱密設施 40 處。
	增設女廁隱密設施/處	40	40	100%	

標案名稱	績效衡量標準	原訂目標值	達成目標值	目標達成度	績效衡量達成情形分析
7.2 行政大樓空調設施整修工程費用	汰換氣冷式冰水主機/台	2	2	100%	汰換氣冷式冰水主機 2 台，並完成本府行政大樓中央空調系統投資效益評估。
7.3 話務中心建置計畫費用	汰換本府電話交換機/台	800	920	100%	汰換電話交換機 800 台，達成全府員工一人一話機及分機號碼。
	話務中心建置/間	1	1	100%	
7.4 社會福利資訊系統整合開發	福利業務系統模組/子系統	14	14	100%	完成 14 項福利業務子系統： <ol style="list-style-type: none"> 1. 急難救助。 2. 愛心卡、智慧卡(比對是否遷出縣籍)。 3. 獨居老人資料管理系統。 4. 老人機構管理(外點單位使用,含機構人員管理)。 5. 身障機構管理(外點單位使用) 6. 老人及身障者輔具管理(含二手輔具媒合)。 7. 老人及身障者居家服務(含居服員管理)。 8. 長期照顧資料管理。 9. 照顧服務員資料管理。 10. 房屋租金補助。 11. 房屋貸款利息補助。 12. 身障停車證。 13. 低收入戶產婦及新生兒營養品補助。 14. 低收入戶及中低收入老人住宅修繕。
	子系統上線	4	14	100%	
7.5 骨幹安全與無線網路建置案	無線網點/部	50	86	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成無線網點 86 部。 2. 完成防火牆設備 2 部。 3. 完成骨幹網路升速 1 式。 4. 完成建置網管系統。
	防火牆設備/部	2	2	100%	
	骨幹網路升速/式	1	1	100%	
	建置網管系統	1	1	100%	
7.6 共用虛擬主機設備建置案	實體虛擬主機/台	4	4	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建置實體虛擬主機 4 台。 2. 建置高速交換器 2 台。 3. 建置儲存伺服器 1 台。


標案名稱	績效衡量標準	原訂目標值	達成目標值	目標達成度	績效衡量達成情形分析
	高速交換器/台	2	2	100%	
	儲存伺服器/台	1	1	100%	
7.7 宜蘭縣公文管理整合系統硬體備援建置案	備援系統/式(含必要軟硬體)	1	1	100%	1. 備援系統1式。 2. 備份系統1式。 3. 7TB可用內容量儲存系統2套。
	備份系統/式(含必要軟硬體)	1	1	100%	
	7TB可用內容量儲存系統/套	1	2	100%	
7.8 建置影音資料庫及數碼化系統	系統建置/式	1	1	100%	完成縣政影音資料庫系統建置1式。
7.9 本府各單位資訊設備採購	伺服器2台	2	2	100%	採購伺服器2台、防火牆2台、優先採購綠色環保標章電腦主機69台、筆電1台、掃描器2台。
	防火牆2台	2	2	100%	
	電腦主機69/台	69	69	100%	
	筆記型電腦1台	1	1	100%	
	掃描器2台	2	2	100%	
7.10e 櫃台系統維護及建置擴充計畫	建立自然人憑證驗證功能	100%	100%	100%	1. 改良「瀏覽介面優化」、「多元分類瀏覽」、「完整訊息通知」、「多元線上繳款機制」、「APP進度查詢程式」等功能。 2. 提供404項線上申辦功能。(線上申辦：73項；表單下載案件331項)。
	建立多元線上繳費功能	100%	100%	100%	
	建立辦理進度通知功能	100%	100%	100%	
7.11 宜蘭縣孔廟修繕工程經費	總工程進度	100%	100%	100%	建築物修繕500平方公尺、喬木植栽16株、休閒椅8座、綠化草皮500平方公尺、遮雨碑亭2座、冷卻噴霧系統1套、電路照明修繕400公尺。
7.12 員山忠烈祠修繕工程經費	總工程進度	100%	100%	100%	建築物修繕300平方公尺、景觀路燈50座、休閒步道整平500公尺、電路照明修繕2,000公尺。

標案名稱	績效衡量標準	原訂目標值	達成目標值	目標達成度	績效衡量達成情形分析
7.13 101 年度農地重劃區農水路更新改善工程	農路路面鋪設 AC /公尺	2,500	2,601	100%	1. 農路鋪設 AC 級配路面總長 1,976 公尺。 2. 路肩擋土牆總長 625 公尺。
7.14 大溪漁港魚市場改建工程	總工程進度	100%	97.63%	97.63%	完成建築物主體及外牆裝修。
7.15 促進養殖漁業與環境和諧計畫	總工程進度	100%	100%	100%	總工程進度 100%。
7.16 南方澳第三魚貨拍賣場增設雨遮海水供水系統等相關設施計畫	總工程進度	100%	99.4%	99.4%	1. 警衛室 1 間。 2. 辦公室變更使用工程。 3. 增設雨遮長 138 公尺。 4. 一樓增設浴室工程。 5. 海水井挖鑿 2 座。
7.17100 年度「公路公共運輸發展計畫」羅東臨時轉運站建置案線配合款	完成轉運站月台/數	10	12	100%	完成羅東轉運站一座。
7.18 宜蘭臨時轉運站週邊人行環境改善工程計畫(第二期)縣配合款	景觀改善工程改善面積/平方公尺	1,500	1,500	100%	1. 景觀改善工程改善面積 1,500 平方公尺。 2. 施作人行道 500 公尺。 3. 施作自行車 500 公尺。
	施作人行道/公尺	500	500	100%	
	施作自行車/公尺	500	500	100%	
7.19 本局辦公廳舍建築物耐震能力補強工程經費(1)	經費達成率	100%	100%	100%	經費達成率 100%。

標案名稱	績效衡量標準	原訂目標值	達成目標值	目標達成度	績效衡量達成情形分析
7.20 生活圈道路交通系統建設計畫-國道5號側車道(宜蘭段)向南向北延伸新闢工程 100 年度增列經費縣配合款	經費執行率	100%	100%	100%	經費執行率 100%。
7.21 河川治理跨河橋涼引道工程及用地費	座	4	4	100%	進行 4 座橋梁引道工程。
7.22 縣市政府老舊及受損橋樑整建計畫(第二期計畫)	工程進度	100%	100%	100%	工程進度 100%。
7.23 縣市政府老舊及受損橋樑整建計畫(第二期計畫)-宜三十線義成橋拓寬工程 100 年度增列經費縣配合款	工程進度	100%	100%	100%	工程進度 100%。
7.24 振興經濟擴大公共建設加速生活圈道路交通系統建設計畫-宜蘭市 54 號道路(民權路)新闢工程	道路長度/公尺	300	300	100%	完成道路長度 300 公尺。
7.25 污水下水道建設計畫經費	經費達成率	100%	100%	100%	經費達成率 100%。
7.26 羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫建設費	用戶接管戶數/戶	2,000 戶	3,417 戶	100%	完成用戶接管 3,417 戶。
7.27 冬山河森林公園入口管理棟用地第三年有償撥用費(分三年三期付款)	撥用土地/平方公尺	971.52	971.52	100%	完成撥用冬山鄉富農段 1360 地號一筆土地，面積 971.52 平方公尺。
7.28 100 年度既有市區道路景觀與人本環境改善計畫-宜蘭市舊鐵路生活文化鐵馬道景觀工程	自行車道/公尺	1,000	1,000	100%	自行車道 1,000 公尺。
7.29 100 年度區域景觀光旗艦計畫-龍潭湖風景特定區環境整備工程	棧道/公尺	100	100	100%	完成步道 100 公尺。
7.30 100 年度區域景觀光旗艦計畫-冬山河森林公園水域活動遊憩設施工程	排水工程/公尺	1,000	1,060	100%	完成排水工程 1,060 公尺。
7.31 100 年度區域景觀光旗艦計畫-冬山河親水公園林蔭設施工程	景觀綠美化/公尺	800	800	100%	景觀綠美化 800 公尺。
7.32 整備觀光遊憩設施建設計畫-冬山河森林公	冬山河水岸護坡工程/公尺	100	60	60%	完成冬山河水岸護坡工程 60 公尺。

標案名稱	績效衡量標準	原訂目標值	達成目標值	目標達成度	績效衡量達成情形分析
園環境教育中心週邊景觀工程	水上活動碼頭/處	1	1	100%	完成水上活動碼頭1處。
7.33 轄屬風景遊憩景點設施設備、船舶修繕、新作及機電維修等相關費用	經費達成率	100%	100%	100%	經費達成率100%。
7.34 南澳農場、武荖坑風景區及頭城海水浴場汽車露營休閒區設施改善建置	經費達成率	100%	100%	100%	1. 武荖坑營區增設汽車露營周邊植栽約3000株。 2. 頭城海水浴場露營設備修繕約500才。 3. 親水公園環境綠美化約5,000平方公尺。
7.35 羅東運動公園棒球場設施整修工程	排水溝/公尺	15,000	15,926.6	100%	1. 新設毛細式透排水帶5,230公尺。 2. 新建排水溝B495.2公尺。 3. 新建排水溝C77公尺。 4. PVC污水管埋設25公尺。 5. 2英吋PVC管1850公尺。 6. 淋浴間排水溝26.4公尺。 7. 洗石子地坪前排水溝修整20公尺。 8. 廢水管橘色PVC管83公尺。 9. 原有排水溝挖除運棄120公尺。 10. 既有排水溝疏通約8,000公尺等排水改善工程。
7.36 宜蘭運動公園體育館空調主機2部汰舊更新工程	空調主機汰舊/部	2	2	100%	完成空調主機2部汰舊更新。
7.37 分期(10年)第4年償還資源回收(焚化)廠行政管理大樓興建工程。	經費達成率/百分比	100%	100%	100%	於年度預定期限完成預算分配，並進行撥款程序。
7.38 本局辦公廳舍及勤務宿舍等整修工程	經費達成率	100%	100%	100%	經費達成率100%。
7.39 交通隊勤務大樓整修工程	樓地板面積/平方公尺	1,160	1,160	100%	完成樓地板面積整修工程1,160平方公尺。
7.40 重要路口錄影監視系統建置費	新增治安與交通要點監錄系統/處	48	49	100%	新增治安與交通要點監錄系統49處。
7.41 交通隊汰換測速照相設備等	汰換及升級數位雷達系統/套	3	5	100%	計汰換台2線大溪段1處、台七線內城段1處、宜16線溪洲路1處、宜22線2處，合計5處測速照相設備。
7.42 本局(含慢性病防治所)辦公廳舍內部裝修設備工程	工程進度	100%	95%	95%	1. 各科室系統儲物櫃約100組，提高辦公效率。 2. 文化設施及文宣海報、資訊傳播等訊息宣導8座。 3. 會議室3間，未來可增加教育訓練及宣導活動場次。
績效目標平均達成率	97.84%				

101年基本設施補助計畫執行情形

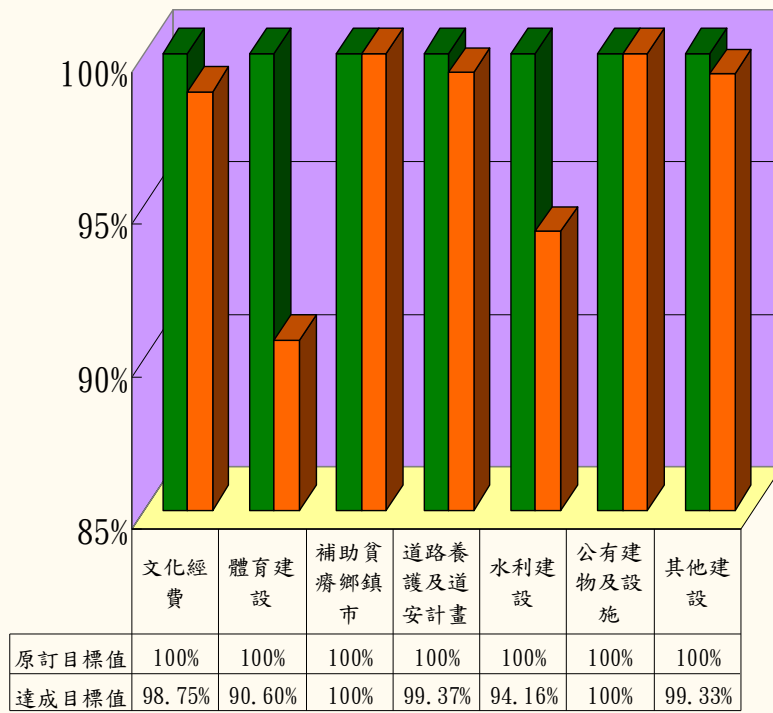

參、基本設施各計畫標案執行成效

- 一、101 年度基本設施補助計畫，原預定 82 件計畫標案，總經費 8 億 3,923 萬 3,000 元(包括中央補助 8 億 2,923 萬 3,000 元，本府自籌 1,000 萬元)，年度中註銷 1 件，變更作業計畫 1 件，實際執行 81 件，註銷及變更率為 2.4%。
- 二、截至 101 年 12 月底止，已發包者 81 件，發包率 100%，已完工者 74 件，完工率 91.3%，已完成驗收者 70 件，驗收完成率為 86.4%。
- 三、截至 101 年 12 月底止，標案查核點進度符合案件數 71 件，標案進度達成率為 87.65%，預算執行數(含實際支用數、應付未付數及節餘款)8 億 0,854 萬 5,780 元，預算達成率為 96.3%。
- 四、有關本府 101 年度各項基本設施補助計畫經費執行成效一覽表、計畫目標達成及執行進度控制情形整體成效表，詳如附表 1、2。

肆、自辦評核、查證及獎懲之情形

本府依據行政院研考會「基本設施補助計畫管制考核要點」、「行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)」及本府「列管計畫管制考核要點」、「重大工程督導會報實施要點」等相關規定管考、查證作業及獎懲，情形如下：

一、自辦評核：

(一)平時管考作業：

- 1、本府每四週召開一次由副縣長親自主持重大工程暨重要施政列管會報，會中除檢討落後原因外，並藉由會報平台協助解決問題。
- 2、會報中主席裁示事項均由專人紀錄，列管辦理情形，並提下次會報檢討，辦理情形亦列入年終考核。

(二)年終考核及獎懲作業：

- 1、為避免重覆考核，本府有關基本設施補助計畫「水利建設經費」、「廳舍整建」、「特種車輛汰換」、「治安防治」等屬中央指定施政項目及匡列專款專用項目執行績效，由本府主計處統一辦理評核作業。
- 2、本府 101 年度一般性補助款有關行政院指定施政項目列管計畫之考核及檢討會議，業由本府主計處主辦於 102 年 2 月 18 日由吳副縣長主持召開檢討會，並邀集各相關單位參與討論及提出申覆意見。評核結果：記功 1 次計 2 名、嘉獎 2 次計 38 名、嘉獎 1 次計 4 名，會議紀錄已於 102 年 2 月 21 日府主預字第 1020027375 號函發各單位，會中吳副縣長裁示事項略述如下：
 - (1)基本設施考核結果為全國第 1 名，主因為：事前積極於年度預算審核會議，要求各單位提列之計畫採以現金基礎精實編列預算，並於一般性補助款指定及專案匡列項目時，請各單位審慎詳實提報評估各計畫之達成率以為匡列項目。
 - (2)計畫執行之追蹤及管考：年度執行中按月就工作計畫實際執

行進度，提報於副縣長主持之重大工程會議，作切實之檢討，以採取必要之對策，管考及追蹤各計畫預算之執行進度，達成預訂之施政目標。

(3)各單位對於業務之推動，應以局處整體執行之計畫作為控管標的，不應任由承辦人獨自處理，且主管應適時主動追蹤相關案件之執行進度，才能即時發現問題並研議解決方法。

(4)各單位對於業務之推動，應以局處整體執行之計畫作為控管標的，不應任由承辦人獨自處理，且主管應適時主動追蹤相關案件之執行進度，才能即時發現問題並研議解決方法。

3、另本府計畫處 101 年所列管基本設施補助計畫排除主計處已評核行政院指定施政項目列管計畫 18 案共 63 案，業於 102 年 3 月 15 日，依「宜蘭縣政府列管計畫管制考核作業要點」，由主計處、計畫處及工程施工查核小組組成考評小組，分別就經費執行成效、計畫執行績效及工程品質，依權重予以評分，考評結果建議嘉獎乙次二件、申誠乙次三件、記過乙次二件，於 102 年 4 月 8 日簽陳首長，依規範辦理獎懲。

二、查證情形

為確保列管補助計畫執行成效、工程品質及促使縣政財源得以有效運用，除於本府定期重大工程暨重要施政事項列管會報中定期提出檢討外，並視案件需要性及必要性，安排由 縣長或副縣長親率相關單位進行實地巡視及查證，並就相關議題與當地議員、鄉鎮市民代、相關專家學者、監造單位及廠商代表討論，了解實做情形及協調解決問題；另工程品質由本府工程品質查核小組，依工程性質安排各專長委員進行實地查核，執行情形說明如下：

(一)本(101)年度提本府重大工程暨重要施政事項列管會報及工程實地查核，共計 57 場次，裁示事項 79 項及建議改善事項 117 項，均予追蹤列管，分述如下：

1、副縣長實地巡視 7 場次，裁示事項 23 項（如附件一）

2、重大工程督導會報 18 場次，裁示事項 56 項（如附件二）

3、工程查核小組實地現勘 32 件，建議改善事項 117 項（如附件三）

(二)縣長率副縣長及本府單位主管、一、二級所屬機關主管訪視 12 鄉鎮市公所並舉辦「地方聯繫座談會」計 12 場次，公所、民意代表、村(里)長、社區理事長等，就基礎建設、教育、觀光、環保及工商發展等各議題交換意見並提案共計 672 件，俾利本府年度施政之參考，至 101 年 12 月 31 日已結案件計 204 件。


伍、基本設施補助計畫經費運用特色

一、經費運用情形

101 年度基本設施補助計畫共獲補助 8 億 3,923 萬 3,000 元，其中：

經費類別	核定數 (千元)	佔總經費 百分比	累計實際支用 數(千元)	累計實際 支用比
1、文化建設	85,460	10.18%	85,460	100.00%
2、體育建設	21,533	2.57%	20,249	94.04%
3、補助貧瘠鄉鎮市	14,250	1.70%	14,250	100.00%
4、道路養護及道安計畫	154,217	18.38%	117,776	76.37%
5、水利建設	206,674	24.63%	181,348	87.75%
6、公有建物及設施	53,825	6.41%	53,599	99.58%
7、其他建設	323,274	36.14%	259,291	82.31%

基本設施補助計畫各類別核定數與實際執行成效表

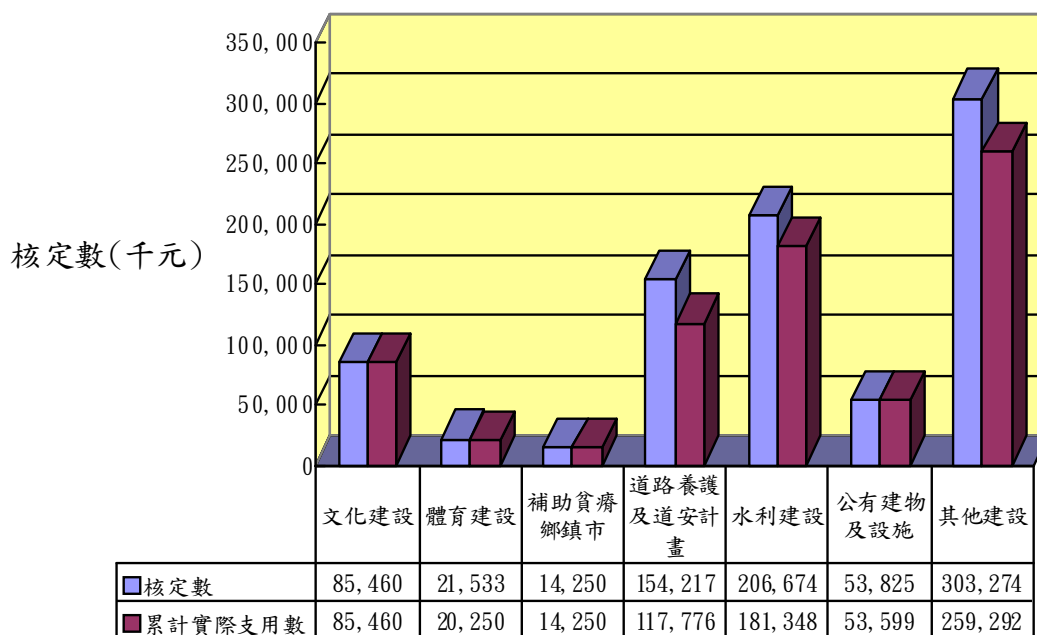


二、特色

本府 101 年度基本設施補助計畫 8 億 3,923 萬 3,000 元經費中：

- (一)除依中央指定之專款專用(不予移用)有「文化建設」8,546 萬 0,000 元文化傳承、「體育建設經費」2,153 萬 3,000 元興建體育館、「貧瘠鄉鎮市」1,425 萬元補助本縣四鄉鎮市公所、「道路養護經費(含道安計畫)」1 億 5,421 萬 7,000 元道路建設及維護及「水利建設」2 億 0,667 萬 4,000 元治災防洪，共 4 億 6,275 萬 4,000 元，佔總核定經費 55.14%。
- (二)另指定施政項目經費運用於「公有建物及設施」5,382 萬 5,000 元警消辦公廳舍興建、特種車輛汰換，佔總核定經費 6.41%。
- (三)其他建設經費 3 億 3,619 萬 6,000 元，佔總核定經費 36.13%。

101 年基本設施經費運用特色

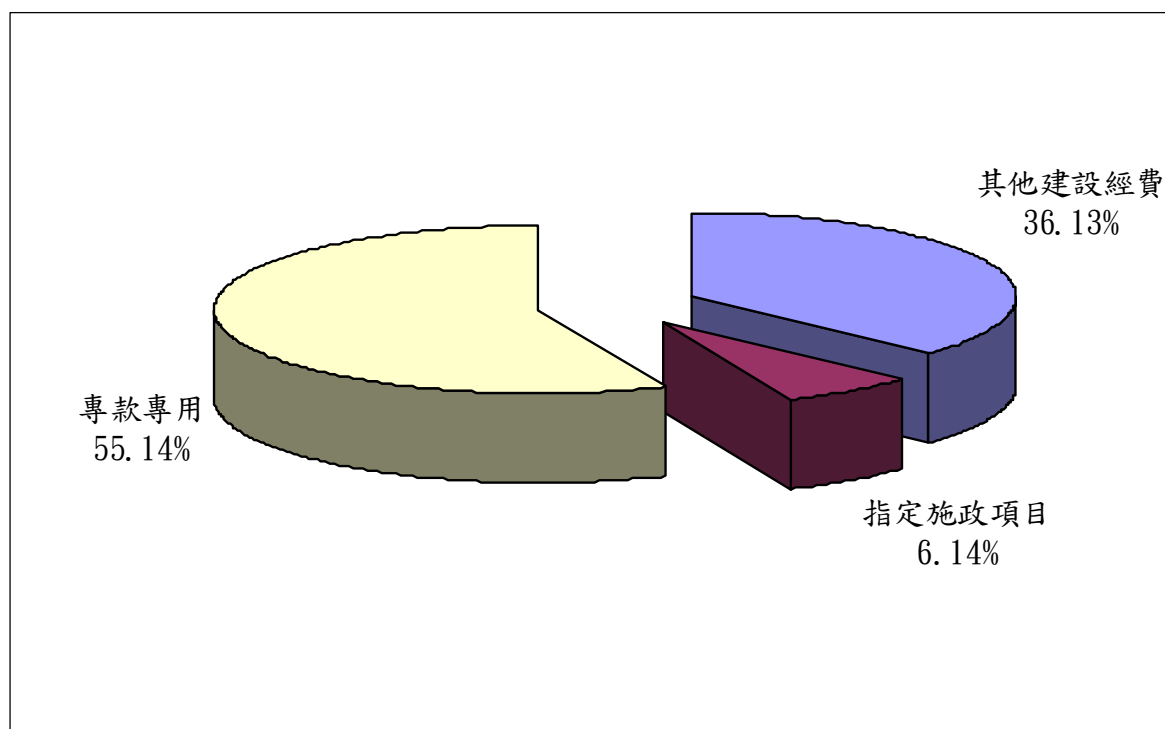

陸、計畫實施效益

一、效益

(一)文化建設:辦理國際性藝術活動及展演、採購視聽書籍、文化使用空間修繕及資產保存與活化

1. 2012 宜蘭國際童玩藝術節活動園區佈置、展覽、表演、宣傳、團隊接待聯繫及票務行銷等相關活動費用—
 - (1) 2012 宜蘭國際童玩藝術節活動自 7 月 7 日開幕自 8 月 19 日閉幕，活動期間總入園人數 44 萬 1,176 人次。
 - (2) 活動期間透過媒體的曝光率，除了加強宜蘭縣整體休閒旅遊行銷外，亦使縣內各飯店、民宿於活動期間，整體的住房率有明顯的提昇；活動辦理期間所延伸的各項其他周邊產業，相關經濟收益亦有顯著的成長。
2. 金馬獎影展暨週邊配合活動執行等相關費用—
 - (1) 將金馬影展參展影片引入本縣首映，作品數 86 部，放映場次 79 場，頒獎典禮參與人數達 4,150 人，並透過媒體行銷，將宣傳範圍擴至台北、基隆等週邊縣市，與本縣夏季至冬季之年度性活動聯盟宣傳，建立本縣新形象，厚植本縣影視產業潛力，助於活動之永續發展。
 - (2) 本計畫與主辦單位台北金馬影展執行委員會舉辦之第 49 屆金馬獎頒獎典禮活動產生加乘作用，主要效益反映於媒體露出，對於本縣形象及在地藝文人口提效果卓著，相關成果可見於「2012 金馬影展」成果報告及「金馬宜蘭影展」結案報告。
3. 文化局第二館區興建工程—完成文化二館主體工程，並已開館試營運及舉辦各項藝文活動，提供結合文化、休閒及運動的生活場域，充實民眾文化素養，提升溪南民眾生活休憩品質，並獲得 2008 台

灣建築獎首獎。

4. 縣定古蹟二結穀倉地上物權移轉費

(1)本計畫辦理二結穀倉地上物權移轉，經由前期建築修護、內部展示及委外經營管理，促使空間活化、權利金收入，並擷節公部門人力調度，符合開源與節流。

(2)本案權管合一，達成空間活化主導性，使歷史建築再生利用及空間活化，促進地方觀光及文化推動。

5. 2012 宜蘭國際童玩節藝術節舞台、展館、票亭、遊戲、休憩及水電等各項設備費—建構指標設施，達成永續資源運動效益，以演出、展覽、遊戲、交流為四大主軸，供給兒童們一個可以與父母同樂、與朋友同享、與世界文化交朋友的歡樂活動，提供更具優質的活動設施與環境。

6. 購置圖書館圖書及非圖書資料等—採購圖書計 4,247 冊及視聽資料計 664 件，供民眾閱覽，充分發揮公共圖書館教育民眾、傳播知識、充實文化、倡導休閒之功能。

(二)體育建設:興建體育館及多功能風雨操場，解決師生或社區居民室內教學及活動空間不足問題

1. 大進國小風雨操場新建工程經費—

(1) 完成興建風雨操場一座，提供全校師生(約 71 人)優質且不受氣候影響的教學場所，提升教學活動成效。

(2) 發揮學校設施社區化之功能，提供附近社區民眾風雨無阻之活動場所。

2. 廣興國小風雨操場新建工程經費—

(1) 完成興建風雨操場一座，提供全校師生(約 212 人)優質且不受氣候影響的教學場所，使師生於雨天運動無後顧之憂，並減少雨天積水，提升教學活動成效。

(2) 發揮學校設施社區化之功能，提供附近社區民眾風雨無阻之活

動場所。

3. 人文國民中小學體育館興建工程經費一

- (1) 規劃設計進度達 50%，完成預算書圖並核備，並取得建築執照。提供全校師生(約 419 人)優質且不受氣候影響的教學場所，提升教學活動成效。
- (2) 校園內有完善的室內空間，可讓師生不受日曬雨淋，正常進行各項教學活動。
- (3) 學校資源社區化，促進社區民眾從事休閒體育活動，提升體能、強健體魄。

4. 竹林國民小學體育館興建工程經費一

- (1) 完成興建體育館一座，提供全校師生及家長(約 1,200 人)優質且不受氣候影響的教學場所，提升教學活動成效。
- (2) 校園內有完善的室內空間，可讓師生不受日曬雨淋，正常進行各項教學活動。
- (3) 學校資源社區化，促進社區民眾從事休閒體育活動，提升體能、強健體魄。

(三) 解決貧瘠鄉鎮市財政困窘：補助貧瘠鄉鎮市

完成撥付補助本縣蘇澳鎮、員山鄉、壯圍鄉及三星鄉等四貧瘠鄉鎮市償還優惠存款利息差額。

(四) 道路養護及道安計畫：提升全縣道路安全及路容景觀，減少交通事故發生，提供民眾優質生活環境及行的安全

1. 縣鄉道道路及其附屬設施養護工程一完成 1,900 公尺之道路養護工作，有效改善道路平整，提升鄉縣道道路服務品質，以為用路人安全。
2. 縣道及鄉道養護工程一完成縣道 191、191 甲、192、196、宜蘭聯絡道 A、宜蘭聯絡道 B、羅東聯絡道共計 409,888 公尺之道路養護

- 工作，有效改進用路人通行品質，並獲得交通部辦理 101 年度公路養護作業養護績效考核第 1 名。
3. 道路橋樑維護改善檢修測設工作—完成 684 座縣轄內橋梁定期檢測及道路改善之測設工作，有效維護用路人通行安全，適時進行道路橋梁維修改善工作，延長道路及橋梁使用年限。
 4. 道路植栽綠美化及養護工程—完成 500 平方公尺綠化面積，提升縣境內各主要道路焦點，在區內擇選 14 處主要道路焦點，進行植栽綠美化工程之規化設計及監造工作，以春、夏、秋、冬四季輪替，選定適合當季之草花植栽種類，以利增加視覺色彩，營造整體環境的特色。
 5. 公路及市區道路整修改善人手孔下地平齊配合及考評獎助—完成 6,000 座人手孔蓋減量工作，有效辦理道路人手孔蓋減量下地工作，以維道路平整及服務品質，進而提升用路人安全。
 6. 北宜高側車道管理維護費—完成 24,845 公尺縣道 191 甲線道路附屬設施養護工作。
 7. 補助公所辦理鄉道路路面路容養護及交通安全設施工程—補助 12 鄉鎮市公所路面路容養護計 352 公里，有效改善道路平整，提升道路服務品質。
 8. 補助公所辦理市區道路路面路容養護及交通安全設施工程—補助縣內 12 鄉鎮市(不含大同鄉公所)公所路面路容養護計 656 公頃，有效改善道路平整，提升道路服務品質。
 9. 市區道路及附屬設施養護工程—完成 1,200 公尺道路養護工作，有效改善道路平整，有效提升道路服務品質。
 10. 道路交通秩序與交通安全改進方案設置交通號誌等—縣內重要路口或老舊優先汰換燈箱，改設 LED 燈箱，以節省能源、防止西曬及增加其亮度等，維護交通安全。交通標誌、標線改善號誌維修及施工，採單價標方式發包，辦理全年度養護及故障緊急搶修，

發現號誌故障或須改善標誌、標線路段，可立即派工於最短時間內改善設置完成，促進縣內道路交通安全與順暢。

(1) 號誌部分：汰換老舊 PC(塑膠)燈箱，改設鋁合金 LED 燈箱及其相關零組件，計 675 組。

(2) 標誌、標線部分：設標誌標線改善 142 處路段口。

(五) 水利建設：改善縣內防洪設施、及河川治理，加強區域排水功能，避免大雨積水，並確保極端氣候及洪汛期間民眾生命財產安全

1. 委託辦理縣管水(閘)門管理及操作經費—達成 53 座水(閘)門操作管理，機械和電氣設備及其相關設施已達定期檢查、維護、維持之正常功能，並配合正確操作、管理以達到防洪、禦潮效果，確保人民生命財產安全。
2. 全縣水利建造物檢查—辦理 80 條縣管水利建造物檢查工作，並完成工作計畫書、期初報告、期中報告及期末報告審查，並辦理經濟部水利署水利建造物檢查督導之簡報工作；另召開工作會議及現場監督工作進度均達成預定目標。透過檢查區域排水及水利建造物建置基礎資料，將爾後歷年檢測及評估結果，累積為歷史性資料，以供分析檢討，俾利日後維護管理之進行，並確保其功能正常，確實達成防災減災之目的。
3. 河川及防洪、防潮閘門等維護管理及相關費用—完成 70 條縣管河川及區排維護工作，使各區排維持良好排洪功能。
4. 十三股排水等抽水站維護、管理費及相關費用—達成 5 座抽水站維護管理，本工作完成後，各站機能得以彰顯，並使機組得以獲得妥善維護保養，落實抽水站管理制度及加強防搶險成效，確保防汛期間各項防洪設施能確實發揮功效、維護人民生命財產安全。
5. 河川、區排及防潮閘(水)門維護改善工程—

- (1)護岸整建完成 1,275 公尺及河道疏濬 4,000 公尺，改善水利設施，增加河道通洪斷面，減輕淹水情形及風險，降低淹水災情機率。
- (2)配合縣府植樹計畫之推動，河道護岸綠美化種植 15,000 公尺。
6. 閘門設備改善工程—淘汰舊有之油壓設備改為新制電動閘門，達成 15 座電動閘門更新，維持閘門正常運作，保護聚落安全，利於操作及管理，達到防洪、禦潮效果，確保人民生命財產安全。
7. 易淹水地區水患治理工程用地費—完成用地取得約 1.5 公頃，使易淹水地區水患治理計畫工程可順利開工，保障民眾安全。
8. 本縣各鄉鎮雨水下水道清理疏浚維護及抽水站管理維護等工程—補助本縣各鄉鎮市辦理清理疏浚雨水下水道 1,500 公尺，減少因淤積造成淹水情形。
9. 補助公所辦理雨水下水道系統(含抽水站)改善維護工程—建設雨水下水道 1,000 公尺，改善淹水地區淹水情形。
10. 補助辦理蘇澳(新馬地區)都市計畫 R 幹線雨水下水道工程—完成蘇澳(新馬地區)都市計畫 R 幹線雨水下水道工程預算書圖編製。

(六) 公有建物及設施：強化員警執勤及防救災效能，提升維安設施及維護縣民生命財產安全

1. 礁溪分局四城派出所辦公廳舍新建工程(含設備)規劃設計費—完成礁溪分局四城派出所辦公廳舍新建工程(含設備)規劃設計，並取得建造執照，改善派出所辦公環境，提高員警辦公品質與效率，為四城地區提供更良好之治安維護服務，並可為未來所面臨之交通、治安問題，奠定更厚實之基礎。
2. 頭城分隊辦公廳舍新建工程—完成結構體工程，解決消防分隊廳舍老舊狹隘問題，興建符合耐震功能之廳舍，改善辦公環境，以利充實轄內消防救災戰力，減少人民生命財產損失。
3. 汰換警用車輛—本案計購置警用巡邏機車 12 輛，偵防車 3 輛，巡

邏車 6 輛，小型警備車 2 輛，強化基層應勤裝備，有效提升基層員警執勤效能及機動性

治安防治成效

年別	刑事案件								
	全般刑案			暴力犯罪			竊盜		
	發生數 (件)	破獲數 (件)	破獲率(%)	發生數 (件)	破獲數 (件)	破獲率(%)	發生數 (件)	破獲數 (件)	破獲率(%)
100 年	5,484	4,735	86.34%	46	39	84.78%	1,462	1,018	69.63%
101 年	5,387	4,853	90.09%	64	55	85.94%	1,141	870	76.25%
101 年與 100 年比較	-97	+118	+3.75%	+18	+16	+1.16	-321	-148	+6.62

4. 救災用水箱消防車等相關救災車輛—購置消防水箱車 2 輛，業已配發救災單位使用，有效提升本局消防救災戰力，維護人民生命財產安全。

消防救災成效

年別	緊急救護服務 出勤次數	火災					財物估計損失(千元)
		發生件數	被毀房屋數	死傷人數			
				死亡	受傷		
100 年	20,157	55	5	4	2	8,475	
101 年	20,663	53	0	1	10	15,839	
101 年與 100 年比較	+506	-2	-5	-3	-8	+7364	

5. 補助各鄉（鎮、市）公所購置垃圾清運機具—共汰換 3 輛垃圾車，增加本縣垃圾清運效率，減少民眾抱怨，並減少老舊垃圾車維修費用。
6. 治安要點監錄系統電費—支應全縣 406 處治安與交通要點監錄系統電費，確保系統正常運作，有效維護全縣治安與交通，提昇預防犯罪與案件偵處效能。內政部警政署 101 年錄影監視系統督導評核，榮獲全國第 6 名。
7. 監錄系統網際網路費—支應全縣治安與交通要點監錄系統 497 條電路網際網路及視訊管理平台租賃費，確保系統正常運作，有效維護全縣治安與交通，提昇預防犯罪與案件偵處效能。內政部警政署 101

年錄影監視系統督導評核，榮獲全國第 6 名。

8. 治安要點監錄系統維護費—支應全縣 549 組治安與交通要點監錄系統費用，維護前端設備功能，確保系統正常運作，有效維護全縣治安與交通，提昇預防犯罪與案件偵處效能。內政部警政署 101 年錄影監視系統督導評核，榮獲全國第 6 名。

(七) 其他建設:加強基礎建設及遊憩環境建設，提升民眾生活品質及休閒空間，建構低碳家園及生態城市

1. 行政大樓廁所門扇整修工程費用—完成更新廁所門扇 35 樘及增設女廁隱密設施 40 處，有效改善廁所現有環境，並提供女廁使用隱密性。
2. 行政大樓空調設施整修工程費用—汰換氣冷式冰水主機 2 台，提高及供給監控中心、電信機房、第一、五會議室專用冷氣設備之能源效率及穩定冷氣環境，並完成本府行政大樓中央空調系統投資效益評估，作為後續改善依據。
3. 話務中心建置計畫費用—
 - (1)升級本府電信主體設施，達到數位語音功能，提升本府整體話務服務品質。
 - (2)強化本府整體語音線路品質及數量，全面更新公務電話，汰換電話交換機 800 台，達成全府員工一人一話機及分機號碼，加強為民服務時效。
4. 社會福利資訊系統整合開發—
 - (1)完成共 14 項福利業務子系統：急難救助、愛心卡、智慧卡(比對是否遷出縣籍)、獨居老人資料管理系統、老人機構管理(外點單位使用，含機構人員管理)、身障機構管理(外點單位使用)、老人及身障者輔具管理(含二手輔具媒合)、老人及身障者居家服務(含居服員管理)、長期照顧資料管理、照顧服務員資料管理、房屋租金補助、房屋貸款利息補助、身障停車證、低

收入戶產婦及新生兒營養品補助、低收入戶及中低收入老人住宅修繕。

(2)社會福利系統第一階段(救助業務類、高風險預警系統)及第二階段(老人、身障福利業務)系統全面上線。

(3)使以下各項業務承辦人能使用本案開發系統辦理社福業務，並進行以下工作：

- A. 交換社福業務所需檔案資料。
- B. 進行福利身分查核批次異動。
- C. 家戶經濟批次修正。
- D. 基本資料建檔與核對。
- E. 造冊及撥款新增異動確認。
- F. 媒體檔報送。
- G. 公務報表數據確認。
- H. 申請案件新增異動統計。

5. 骨幹安全與無線網路建置案一

(1)新設現有無線網路網點 86 部，並搭配現有 Thin AP 機制，以確保無線網路上網認證機制有效執行，達成資訊安全管制目標，而本次建置之無線網路佈及公部門及與風景區據點，使民眾洽公使用無線網路更為便利。

(2)達成本府機房內骨幹網路效能提升，並改善現有本府對外防火牆，及主動偵測防禦能力，強化本府網路通暢度，提升管理績效及能力。

6. 共用虛擬主機設備建置案一本府各單位業務資訊系統 46 台實體伺服器移轉為虛擬機器，摺節機房約 40 台主機之電力費用支出。摺節各單位業務資訊系統後續硬體設備保固維護成本。升級各單位業務資訊系統對外服務頻寬為 10Gbps，提高網路頻寬服務品質及整體系統可用性。確保各單位業務資訊系統服務於 4 小時內完成回復運

作提供服務，提高服務水準等級。

7. 宜蘭縣公文管理整合系統硬體備援建置案一

(1)完成備援系統、備份系統、7TB 可用內容量儲存系統各 1 式，資料庫主機由常態性 CPU loading80%下降至 20%，可用記憶體增加 4 倍，減少記憶體換頁作業，可用磁碟空間增加 7TB，整體提升公文系統效率。增加磁碟陣列為兩部，避免單點故障問題。

(2)原檔案備分一次需 14 天左右，提升為第一次約 4 天，後續每次 4 小時，另新增三樓異機房資料同步抄寫機制，更加強化備份、備援完整性。

8. 建置影音資料庫及數值化系統一提供數位媒體資料典藏(包含視訊、聲音、圖片、文字及附件等)，並提供多樣分類，方便民眾檢索，管理並整合多樣影音發佈(www、youtube)，提供跨平台多格式自動轉換，結合社群分享(facebook、plurk 等)，及提供多元裝置使用(網頁、手機、平板)，藉由建置文字、語音、圖片與影像之多媒體縣政資料庫，以利各單位檢索，作為未來施政參考。

9. 本府各單位資訊設備採購一優先採購綠色環保標章之電腦主機 69 台，筆記型電腦 1 台、伺服器 2 台、防火牆 2 台、掃描器 2 台，整體提高縣府同仁電腦運算執行速度及穩定度，相對地提昇同仁辦公之行政效益，進以提升本府為民服務之品質。

10. e 櫃台系統維護及建置擴充計畫一

有效改良「瀏覽介面優化」、「多元分類瀏覽」、「完整訊息通知」、「多元線上繳款機制」、「APP 進度查詢程式」等功能。提供線上申辦功能共 404 項。(線上申辦：73 項；表單下載案件 331 項)，改良本府現行線上申辦作業系統。

(1)導入線上繳費及憑證驗證機制 2 大功能，使民眾無須親臨櫃台繳費，避免舟車勞頓之苦，提升本府 e 櫃檯服務效率與品

質，增進民眾滿意度與增加民眾上網使用率，達成申辦作業無接縫。

(2)完成 e 櫃檯系統版型改版，提供更完善的多元分類瀏覽、待辦事項通知、個人化服務、線上資料補正與後臺管理等作業機制。

(3)e 櫃檯服務內容與範圍持續成長情況下，強化線上申辦後台勾稽及統計功能以維持本申辦系統各項便民服務全年穩定與正常運作，以提供縣民及本府各機關便捷與可靠之服務。

11. 宜蘭縣孔廟修繕工程經費—修繕建築物 500 平方公尺、喬木植栽 16 株，休閒椅 8 座，綠化草皮 500 平方公尺，建立遮雨碑亭 2 座，冷卻噴霧系統 1 套，電路照明修繕 400 公尺，整修及維護宜蘭市孔廟（崇聖殿），提高使用效率，便利民眾休閒旅遊，帶動宜蘭市孔廟文化觀光人潮，目前已有民間團體進駐配合孔廟活化。
12. 員山忠烈祠修繕工程經費—建築物修繕 300 平方公尺、景觀路燈 50 座、休閒步道整平 500 公尺、電路照明修繕 2,000 公尺，整修及維護忠烈祠，提高使用效率，便利民眾休閒旅遊，帶動員山公園觀光人潮，因照明及步道整修，晨昏健身運動人口持續增加。
13. 101 年度農地重劃區農水路更新改善工程—農路路面鋪設 AC 級配路面長 1,976 公尺及路肩擋土牆長 625 公尺，增進農民參與合作、委託、共同經營，增加農產品及肥料運輸方便性，促進農村交通之便利性，因此在經濟、產業、環境面都有極大改善。
14. 大溪漁港魚市場改建工程—完成建築物主體及外牆裝修，辦理大溪漁港魚市場改建工程，提升觀光旅遊品質，並提供優質漁民作業環境。
15. 促進養殖漁業與環境和諧計畫—完成 A、B、C、D 段排水溝、附屬道路改善、修繕鋼管漏水 3 處、造型洗石護欄 120 組、既有養殖區 B 站防洪抽水機系統恢復功能 1 座。改善宜蘭縣境內養殖漁業

生產區海水養殖環境，解決每逢颱風需關閉閘門，避免因海水倒灌，區內無法排水，致迅速漫淹養殖池，魚蝦流失情形，減緩漁民重大損失，加強養殖漁業對本縣維持漁村經濟安定之提升。

16. 南方澳第三魚貨拍賣場增設雨遮海水供水系統等相關設施計畫—完成警衛室 1 間、辦公室變更使用工程、增設 138 公尺雨遮、一樓增設浴室工程、海水井挖鑿 2 座，改善南方澳第三魚貨拍賣附屬設施，提升魚市場整體功能性。
17. 100 年度「公路公共運輸發展計畫」羅東臨時轉運站建置案線配合款—
 - (1) 完成羅東轉運站興建，整合溪南地區國道客運上、下客處，結合市區巴士轉乘，提供民眾無縫接駁旅遊服務。
 - (2) 羅東轉運站位於羅東後火車站傳藝路及站東路旁土地，總面積約為 6,509 平方公尺，已完成轉運站體、客運月台 12 座、停車場設施及周邊人行道改善。
 - (3) 羅東轉運站工程正式營運後，將成為溪南地區第一座複合式大眾運輸轉運場站，除進一步提升本縣大眾運輸品質及降低周邊地區路段交通衝擊外，亦將帶動地方發展及繁榮，創造友善及低碳之旅遊環境。
18. 宜蘭臨時轉運站週邊人行環境改善工程計畫(第二期)縣配合款—
 - (1) 完成景觀改善工程面積 1,500 平方公尺、施作人行道 500 公尺、施作自行車 500 公尺，改善林森路兩側道路及宜蘭火車站後站廣場整體空間，整體改善後火車站與臨時轉運站之間人行空間品質。
 - (2) 藉由改善人行步道空間，提升整體市鎮居民生活與環境品質，提供自行車道空間，吸引部分機車旅次改用自行車，減輕空氣污染與碳排放。
19. 本局辦公廳舍建築物耐震能力補強工程經費(1)—公有建築物因

部分材料老化造成建築物傾斜，基礎沈陷，特委請全國建築師公會辦理建築物耐震力評估，宜蘭分局、民權派出所耐震能力未達評估標準要求，作結構性耐震補強，以維安全，改善員警辦公環境之耐震能力。

20. 國道 5 號側車道(宜蘭段)向南向北延伸新闢工程 100 年度增列經費縣配合款—撥付國道 5 號側車道延伸新闢工程縣府配合款，建構全縣路網系統，提供順暢、舒適與便捷之整體用路環境，並可結合觀光資源，提升遊憩品質，進而帶動社區發展。
21. 河川治理跨河橋涼引道工程及用地費—進行四座橋樑引道工程，提供跨河橋樑引道供通行。
22. 縣市政府老舊及受損橋樑整建計畫(第二期計畫)—辦理橋樑改建，有效紓解當地擁塞之交通車流，確保民眾行的安全。
23. 宜三十線義成橋拓寬工程 100 年度增列經費線配合款—改善宜三十線義成橋瓶頸路段，增加行車流暢性，健全冬山河堤防洪功能，保障附近兩岸居民生命財產安全，對於目前台九線該路段穿越性車流交通擁擠之現象，亦可得相當程度之改善。
24. 宜蘭市 54 號道路(民權路)新闢工程—完成 300 公尺道路，有效紓解宜蘭市校舍路、東港路及中山路之交通壅塞狀況，減少國道客運對於校舍路及東港路之衝擊。配合未來陽明大學醫院之興建，促進周邊新興區之都市發展。
25. 污水下水道建設計畫經費—經費達成率達 100%，完成污水下水道系統建設，以達到兩污水分流及提高用戶接管率，改善水體污染問題、市區環境衛生，提升民眾生活環境品質。
26. 羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫建設費—完成用戶接管 3,417 戶，解決都市污水排放，改善市區環境衛生，提升民眾生活環境品質。
27. 冬山河森林公園入口管理棟用地第三年有償撥用費(分三年三期

- 付款)一完成撥用冬山鄉富農段 1360 地號一筆土地，撥用土地後，興建冬山河森林公園入口廣場管理棟新建工程，施設項目有冬山舊河道護岸工程、興建管理棟、自行車道及景觀綠美化，提供遊客多元化旅遊空間及形態。
28. 宜蘭市舊鐵路生活文化鐵馬道景觀工程一完成延長高架鐵路下自行車步道 1,000 公尺，增加綠廊空間，營造在地居民優質的生活空間，建立以人本為導向的健康綠色示範路網。
 29. 龍潭湖風景特定區環境整備工程一完成步道 100 公尺，保護龍潭湖原有自然生態，提供生態教育解說環境，串連礁溪、宜蘭地區自然、人文、地方特色等，旅遊景點，提供遊客基本舒適的遊憩環境。
 30. 冬山河森林公園水域活動遊憩設施工程一完成排水工程 1,060 公尺，提供居民高品質之生態自然環境、研究學區及休閒遊覽場所，確保冬山河風景區遊憩資源永續利用。
 31. 冬山河親水公園林蔭設施工程一辦理景觀綠美化 800 公尺，提供無障礙步行環境，提昇營運品質及遊客滿意度。
 32. 冬山河森林公園環境教育中心週邊景觀工程一完成冬山河水岸護坡工程 60 公尺，並完成水上活動碼頭 1 處，可提供宜蘭地區居民及遊客高品質之生態自然環境、研究學區及休閒遊覽場所，確保冬山河風景區遊憩資源永續利用。
 33. 轄屬風景遊憩景點設施設備、船舶修繕、新作及機電維修等相關費用一本案主要工項為設施之修繕，以機具及人力之僱用為主要經費支出項目，藉由改善轄屬風景遊憩景點設施，提升整體遊客遊憩品質及安全。
 34. 南澳農場、武荖坑風景區及頭城海水浴場汽車露營休閒區設施改善建置一武荖坑營區增設汽車露營周邊植栽約 3,000 株、頭城海水浴場露營設備修繕約 500 才、親水公園環境綠美化約 5,000 平

方公尺，配合縣轄風景點辦理「宜蘭露營季」整合行銷推廣活動，辦理相關設備修繕及增設，透過本計劃提升露營遊客便利性及提升各風景區環境品質。

101 年觀光遊憩區遊客人次									
總計	冬山河親水公園	大湖風景區	五峰旗風景區	梅花湖風景區	龍潭湖風景區	蘇澳冷泉	頭城海水浴場	武荖坑風景區	蘭陽博物館
441 萬 6, 205	80 萬 0, 145	3 萬 3, 680	44 萬 0, 270	116 萬 7, 563	43 萬 3, 964	15 萬 3, 675	9 萬 6, 196	44 萬 6, 472	84 萬 4, 240

101 年大型活動遊客人次

宜蘭國際童玩藝術節	宜蘭情人節	宜蘭露營季	宜蘭慢活節	冬戀宜蘭溫泉季	台灣單車節	宜蘭綠色博覽會
44 萬 1, 176	8 萬	16 萬	11 萬, 5533	8 萬	1 萬 2, 000	39 萬 3, 000

35. 羅東運動公園棒球場設施整修工程—完成排水溝 15, 926. 6 公尺，改善羅東運動公園棒球場積水問題，提供民眾及球員更優質的運動休閒空間。
36. 宜蘭運動公園體育館空調主機 2 部汰舊更新工程—完成空調主機 2 部汰舊更新，有效改善宜蘭運動公園體育館老舊空調高故障率及降低耗能達 10% 以上。
37. 分期(10 年)第 4 年償還資源回收(焚化)廠行政管理大樓興建工程—於年度預定期限完成預算分配，並進行撥款程序，償還行政管理大樓配合款，營造優質辦公環境及提升行政效率。
38. 本局辦公廳舍及勤務宿舍等整修工程—含油漆、水電、土木、鋁門窗及防漏等，依各單位實際需求確實辦理，改善員警辦公環境及提升行政效益。
39. 交通隊勤務大樓整修工程—整修地上 3 樓，總樓地板面積約 1, 160 平方公尺，提升交通隊業務、勤務工作效能及便利民眾洽公良好之辦公處所。
40. 重要路口錄影監視系統建置費—101 年新增治安要點監錄系統 49 處路口、80 組 Video-Server、299 支攝影機，建構全縣具「區塊

連鎖」功能之治安與交通要點基礎監控防護網，並可運用網際網路雲端科技進行錄影資料管理、整合、調閱、蒐證及線上報修，以先進科技設備有效嚇阻不法，提昇偵辦刑案效能，有效預防犯罪，維護社會治安與交通安全。

41. 交通隊汰換測速照相設備等—計汰換台 2 線大溪段 1 處、台七線內城段 1 處、宜 16 線溪洲路 1 處、宜 22 線 2 處，合計 5 處測速照相設備，以符合檢驗、檢定標準，提升交通執法品質。
42. 本局(含慢性病防治所)辦公廳舍內部裝修設備工程—辦理約 100 組各科室系統儲物櫃、建立文化設施及文宣海報、資訊傳播等訊息宣導 8 座、設立會議室 3 間，以增加未來辦理教育訓練及宣導活動場次，建立友善民眾服務空間，提供優良辦公環境，建置公共衛生專業設備空間，提升公共衛生的專業性及為民服務的便利性，有效提高辦公效率。

二、最具績效或創新案例

(一)文化建設經費：

- 1、2012 宜蘭國際童玩藝術節，7 至 8 月活動住宿人數約 8 萬 1 千多人，根據調查，縣外遊客每位平均支出為 1,647 元，非宜蘭縣民占入園人數 83.3%，故本次活動由外縣市帶來的經濟效益約 6 億 5 佰多萬元。
- 2、文化局第二館區興建工程—完成文化二館主體工程，並已開館試營運及舉辦各項藝文活動，提供結合文化、休閒及運動的生活場域，充實民眾文化素養，提升溪南民眾生活休憩品質，並獲得 2008 台灣建築獎首獎。

(二)公有建物及設施：

- 1、新建礁溪分局四城派出所及頭城消防分隊等辦公廳舍，以強化治安功能、消防救災設備及戰力。
- 2、汰換老舊傳統白織燈箱，改設 LED 燈箱，以節省能源、增加亮度，防止陽光照射反光致無法辨識燈號等，維護交通安全。
- 3、交通號誌修復採單價標方式緊急搶修及養護，本招標將其他單位委託代辦、災害準備金或補助經費等均納入適用範圍，依照契約項目、單價實做數量付款。使故障號誌均能在最短時間內修復完成，明顯改善本縣交通安全與順暢，大幅提昇道路交通機能及行政效率，且節省公帑。

(三)縣道及鄉道養護工程：完成縣道 191、191 甲、192、196、宜蘭聯絡道 A、宜蘭聯絡道 B、羅東聯絡道，共計 409,888 公尺之道路養護工作，獲得交通部辦理 101 年度公路養護作業養護績效考核第 1 名。

(四)其他建設經費：

- 1、101 年度農地重劃區農水路更新改善工程—對重劃區之農路及

其併行之給、排水路、建造物一併辦理拓寬改善，解決部分低區之淹水問題，同時就居民出入頻繁之農路，全面加封瀝青，增設相關安全設施，期能彰顯重劃效益，厚植農村基礎建設。

2、治安要點監錄系統電費、監錄系統網際網路費、治安要點監錄系統維護費—確保系統正常運作，有效維護全縣治安與交通，獲內政部警政署 101 年錄影監視系統督導評核，榮獲全國第 6 名。

柒、落後項目檢討情形

一、落後項目原因分析

(一)道路橋樑維護改善檢修測設工作

本案刻正進行期末成果審查及現勘作業後之相關成果資料修正，俟修正完成後即可辦理驗收作業。

(二)委託辦理縣管水(閘)門管理及操作經費

前五次流標，目前辦理驗收中，預計一月底完成。

(三)河川、區排及防潮閘(水)門維護改善工程

因所匡列之相關工程及規劃案涉及跨年度之執行，需配合契約規定辦理撥款，導致無法達成原計畫於 101 年底完成撥款之目標。

(四)河川治理跨河橋梁引道工程及用地費

101 年度預算除義成橋拓寬工程其餘已執行完成，義成橋拓寬工程因設計變更辦理展延工期，於完工後，辦理估驗後付款。預定 102 年 4 月完工撥款。

(五)宜蘭市 54 號道路(民權路)新闢工程

部分路段地上物拆遷補償作業延誤，目前主要工項已完成，辦理後續查驗作業。

(六)閘門設備改善工程

原本自辦設計，因考量專業性，現已委託設計公司設計監造。現有 4 處閘門設備迫切需要改善，因修繕經費有限，設計後選擇一處閘門設備進行改善。

(七)101 年度農地重劃區農水路更新改善工程

本縣因受東北季風環流影響，近期持續降雨，肇致路基回填土方含水量較高，泥濘鬆軟，無法鋪設 AC。俟天候放晴路基穩定後，請承包廠商加派機具人力進場施工。

(八)大溪漁港魚市場改建工程

1. 承攬廠商提送材料設備送審時程延宕，責成監造單位善盡督促協調之責，並儘速協助承攬廠商提送相關送審資料，另請承包商提送月進度表作為趕工依據。
2. 外牆磁磚材料進場數量不足，導致需再追加磁磚數量，另因外牆裝修工程，間接影響室內裝修及機水電等進度及 1F 週邊聯外道

路施作進度，承包商未依約提送趕工依據，工程款依約無法撥付，造成進度嚴重落後。

3. 爭議工項(光電帷幕框料)，因契約圖說及相關規範說明，承包商及設計監造單位未能充分協調，另承包商於訂料後，經材料廠商整批銷單，致使現階段該材料設備尚未確認，導致相關收尾工項延後施工。
4. 另配合使用單位調整修改，以至趕工進度稍稍落後。執照請領相關事宜，未依原建照增戶變更辦理，造成相關執照請領前置應予修正；另有關一樓地坪裝修工程，承包商未依契約規定檢附相關佐證資料申請辦理契約變更，未能依原送審核定之材料派員進場施作。
5. 地坪 Epoxy 因天候因素影響，造成施工延遲。另使用執照、綠建築標章及事業性廢排放許可申請延遲。

(九)衛生局辦公廳舍內部裝修設備工程

承包商所提之送審規格及樣品，經監造審查其內容尚需修正後並再提送，故期程無法配合預定施工進度。另配合需求部份調整與追加文化設施工程及設備調整，完成第一次變更設計，因新增施工項目而追加工期，並於 12 月 18 日申報竣工，因施工項目內容繁多，已完成正式驗收程序，目前函文廠商限期改善完成，辦理缺失改善複驗。

(十)轄屬風景遊憩景點設施設備、船舶修繕、新作及機電維修等相關費用—因報驗作業緩慢，且多次驗收不符，目前辦理驗收中。

(十一)頭城分隊辦公廳舍新建工程

本案於辦理預算分配時因工程尚未發包，無法按施工進度合理分配預算，致本案實際支用金額低於預算分配金額。

二、解決對策

(一)道路橋樑維護改善檢修測設工作

本案刻正辦理驗收作業，俟驗收作業完成後即可辦理撥款。

(二)委託辦理縣管水(閘)門管理及操作經費

已於102年1月21日驗收完成。

(三)河川、區排及防潮閘(水)門維護改善工程

相關工程屬跨年度工程，依各規劃案及工程案契約規定儘速辦理執行。預計四月底完工。

(四)河川治理跨河橋梁引道工程及用地費—辦理估驗後付款。

(五)宜蘭市54號道路(民權路)新闢工程

目前地上物已完成遷移作業，調整相關工項進度，增加出工數積極趕工因應，積極趕辦後續查驗及工程款項估驗作業。

(六)閘門設備改善工程

已更改作業期程，目前於工廠進行機械組立中，已與委辦廠商協商並積極趕工執行，預計4月完工。

(七)101年度農地重劃區農水路更新改善工程

俟天候放晴路基穩定後，加派機具人力進場施工。

(八)大溪漁港魚市場改建工程

積極協調、釐清問題癥結點，並定時督促監造單位及承攬廠商，俾利工進順利推展。依重大工程會報副縣長裁示，每週進行專案報告，及每週召開工務會議追蹤列管趕工成效及辦理進度，並不定期電話稽催及詢問確認；另有關材料疑義部分，已責由設計監造單位進行協調，倘未依契約相關規定妥處，將依契約之履約規定辦理，違失部分為考量社會公益，將於工程完竣後另案簽辦。

(九)辦公廳舍內部裝修設備工程

俟改善完成後，辦理缺失複驗程序後，撥付尾款費用。

(十)轄屬風景遊憩景點設施設備、船舶修繕、新作及機電維修等相關

費用—加速辦理驗收及核銷作業。

(十一)頭城分隊辦公廳舍新建工程—儘速辦理施工及估驗作業。

附表 1

宜蘭縣政府 101 年度基本設施補助計畫執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款增辦數(E)	節餘款繳庫數(F)	預算執行數(G=C+D+E+F)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達 50%日期		完工日期		完成驗收日期	
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c001-1-1	2012 宜蘭國際童玩藝術節活動園區佈置、展覽、表演、宣傳、團隊接待聯繫及票務行銷等相關活動費用	41,760	41,760	41,760	0	0	0	41,760	100	100	1010315	1010315	1010707	1010707	1010707	1010707	1010819	1010819	1010819	1010819	1011015	1010903
c001-1-2	金馬獎影展暨週邊配合活動執行等相關費用	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	100	100	1010102	1000518	1010222	1010222	1010504	1010521	1011022	1011120	1011125	1011125	1011215	1011228
c001-1-3	文化局第二館區興建工程	30,000	30,000	30,000	0	0	0	30,000	100	100	1010103	1010103	1010110	1010110	1010123	1010123	1010131	1010131	1010331	1010422	1010601	1010601
c001-1-4	縣定古蹟二結穀倉地上物權移轉費	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500	100	100	1010430	1010425	1010531	1010515	1010630	1010618	1010731	1010731	1010831	1010731	1010831	1010731
c001-1-5	2012 宜蘭國際童玩藝術節舞台、展館、票亭、遊戲、休憩及水電等各項設備費	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100	100	1010418	1010418	1010525	1010521	1010525	1010521	1010706	1010706	1010706	1010706	1010713	1010706
c001-1-6	購置圖書館圖書及非圖書資料等	1,200	1,200	1,200	0	0	0	1,200	100	100	1010102	1001208	1010115	1010112	1010120	1010117	1010215	1010214	1011210	1011210	1011220	1011220
c002-1-1	大進國小風雨操場新建工程經費	5,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	100	100	1010102	1010102	1010110	1010110	1010229	1010229	1010409	1010426	1010815	1010815	1011001	1011002
c002-1-2	廣興國小風雨操場新建工程經費	5,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	100	100	1010102	1010102	1010131	1010131	1010229	1010229	1010409	1010428	1010901	1011020	1011015	1011113
c002-1-3	人文國民中小學體育館興建工程經費	2,033	2,033	1,587	0	0	446	2,033	100	100	1010102	1010102	1010131	1010131	1010229	1010229	1010301	1010301	1010415	1010415	1011231	1011228
c002-1-4	竹林國民小學體育館興建工程經費	9,500	9,500	9,450	0	0	50	9,500	100	100	1010102	1010102	1010131	1010131	1010229	1010229	1010330	1010330	1010417	1010330	1010615	1010430
c003-1-1	補助本縣所轄貧瘠鄉鎮市優先償還退休人員優惠存款利息差額	14,250	14,250	14,250	0	0	0	14,250	100	100	1010630	1010612	1010630	1010615	1010630	1010615	1010630	1010615	1010731	1010615	1010731	1010615
c004-1-1	縣鄉道道路及其附屬設施養護工程	30,982	30,982	27,627	0	0	0	27,627	89.2	89.2	1010430	1010427	1010531	1010531	1010630	1010629	1011031	1011030	1011215	1011214	1011231	1011231

c004-1-2	縣道及鄉道養護工程	40,000	40,000	40,000	0	0	0	40,000	100	100	1010430	1010430	1010531	1010531	1010630	1010601	1010930	1010928	1011130	1011130	1011231	1011224	
c004-1-3	道路橋樑維護改善檢修測設工作	6,000	6,000	4,400	1,600	0	0	6,000	100	100	1010116	1010116	1010116	1010116	1010116	1010116	1010930	1010925	1011210	1011210	1011231		
c004-1-4	道路植栽綠美化及養護工程	5,559	5,559	5,559	0	0	0	5,559	100	100	1010430	1010430	1010630	1010615	1010715	1010620	1010831	1010831	1011215	1011215	1011230	1011220	
c004-1-5	公路及市區道路整修改善人手孔下地平齊配合及考評獎助	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	100	100	1010331	1010331	1010415	1010413	1010430	1010430	1010831	1010831	1011215	1011214	1011231	1011231	
c004-1-6	北宜高側車道管理維護費	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	100	100	1010102	1010102	1010111	1010111	1010111	1010111	1010111	1010111	1010111	1010430	1010330	1010430	1010330
c004-2-1	補助公所辦理鄉道路路面路容養護及交通安全設施工程	11,000	11,000	10,568	0	0	432	11,000	100	100	1010229	1010229	1010331	1010331	1010331	1010331	1010831	1010831	1011215	1011214	1011231	1011231	
c004-2-2	補助公所辦理市區道路路面路容養護及交通安全設施工程	11,000	11,000	10,501	0	0	499	11,000	100	100	1010229	1010229	1010331	1010331	1010331	1010331	1010831	1010831	1011215	1011214	1011231	1011231	
c004-3-1	市區道路及附屬設施養護工程	23,550	23,550	537	23,013	0	0	23,550	100	100	1010430	1010430	1010531	1010531	1010630	1010629	1011031	1011025	1011215	1011214	1011231	1011231	
c004-4-1	道路交通秩序與交通安全改進方案設置交通標誌等	6,126	6,126	6,126	0	0	0	6,126	100	100	1010103	1001012	1010131	1001129	1010201	1010105	1010629	1010629	1011228	1011128	1011231	1011226	
c006-1-1	委託辦理縣管水(閘)門管理及操作經費	10,000	10,000	5,358	2,650	0	0	8,008	80.1	80.1	1010720	1010316	1010808	1010910	1010815	1010921	1011015	1011015	1011214	1020116	1011231	1020121	
c006-1-2	全縣水利建造物檢查	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500	100	100	1010330	1010330	1010430	1010430	1010430	1010430	1010928	1010903	1011130	1011129	1011228	1011129	
c006-1-3	河川及防洪、防潮開門等維護管理及相關費用	21,674	21,674	21,674	0	0	0	21,674	100	100	1010330	1010330	1010430	1010430	1010515	1010501	1010928	1010531	1011220	1011130	1011231	1011130	
c006-1-4	十三股排水等抽水站維護、管理費及相關費用	5,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	100	100	1010101	1001209	1010101	1001209	1010101	1010101	1010810	1010801	1011224	1011215	1011231	1011225	
c006-1-5	河川、區排及防潮開(水)門維護改善工程	58,500	58,500	48,989	7,284	0	0	56,273	96.2	96.2	1010315	1010301	1010402	1010315	1010420	1010330	1010831	1010831	1011231		1011231		
c006-1-6	閘門設備改善工程	9,000	0	2,679	0	0	0	2,679	100	29.8	1010725	1010430	1010825	1011108	1010905	1011114	1020205		1020412		1020414		
c006-1-7	易淹水地區水患治理工程用地費	70,000	70,000	70,000	0	0	0	70,000	100	100	1010330	1010330	1010430	1010430	1010629	1010620	1010731	1010620	1011031	1010627	1011217	1010829	
c006-3-1	本縣各鄉鎮雨水下水道清理疏浚維護及抽水站管理維護等工程	6,500	6,500	6,325	0	0	175	6,500	100	100	1010430	1010430	1010630	1010628	1010831	1010830	1011031	1011030	1011130	1011129	1011231	1011228	

c006-3-2	補助公所辦理兩 水下水道系統 (含抽水站)改善 維護工程	23,500	23,500	19,312	0	0	4,188	23,500	100	100	1010430	1010430	1010531	1010531	1010831	1010830	1011031	1011030	1011130	1011129	1011231	1011228
c006-3-3	補助辦理蘇澳 (新馬地區)都市 計畫R幹線雨水 下水道工程	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100	100	1010430	1010430	1010630	1010628	1010831	1010830	1011031	1011030	1011130	1011129	1011231	1011224
c008-1-1-1	礁溪分局四城派 出所辦公廳舍新 建工程(含設備) 規劃設計費	537	537	537	0	0	0	537	100	100	1010331	1010329	1010430	1010405	1010630	1010629	1010930	1010930	1011031	1011031	1011130	1011130
c008-1-2-1	頭城分隊辦公廳 舍新建工程	12,000	12,000	11,918	82	0	0	12,000	100	100	1010110	1010110	1010120	1010120	1010331	1010316	1010831	1010831	1011220	1011205	1011231	1011225
c008-2-1-1	汰換警用車輛	7,500	7,500	7,426	0	0	74	7,500	100	100	1010209	1010209	1010224	1010224	1010224	1010224	1010427	1010427	1010727	1010531	1010810	1010618
c008-2-2-1	救災用水箱消防 車等相關救災車 輛	9,000	9,000	8,930	0	0	70	9,000	100	100	1010105	1010105	1010206	1010206	1010217	1010217	1011115	1011011	1011115	1011011	1011115	1011029
c008-2-3-1	補助各鄉(鎮、 市)公所購置垃 圾清運機具	5,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	100	100	1010102	1010102	1010131	1010131	1010229	1010229	1011031	1010928	1011130	1011126	1011231	1011126
c008-3-1	治安要點監錄系 統電費	3,600	3,600	3,600	0	0	0	3,600	100	100	1010102	1010102	1010102	1010102	1010314	1010214	1010914	1010816	1011230	1011206	1011230	1011206
c008-3-2	監錄系統網際網 路費	10,984	10,984	10,984	0	0	0	10,984	100	100	1010102	1010102	1010102	1010102	1010106	1010106	1010630	1010331	1011231	1011231	1011231	1011231
c008-3-3	治安要點監錄系 統維護費	5,204	5,204	5,204	0	0	0	5,204	100	100	1010102	1010102	1010102	1010102	1010105	1010105	1010330	1010131	1011231	1011030	1011231	1011115
c009-1-1	行政大樓廁所門 扇整修工程費用	494	494	252	0	0	242	494	100	100	1010330	1010321	1010430	1010413	1010510	1010423	1010610	1010514	1010710	1010605	1010810	1010619
c009-1-2	行政大樓空調設 施整修工程費用	900	900	876	0	0	24	900	100	100	1010330	1010305	1010430	1010430	1010531	1010509	1010629	1010519	1010731	1010725	1010831	1010807
c009-1-3	話務中心建置計 畫費用	12,700	12,700	12,641	0	0	59	12,700	100	100	1010102	1000830	1010102	1001101	1010301	1001124	1010501	1010427	1010705	1010611	1010720	1010829
c009-1-4	社會福利資訊系 統整合開發	1,200	1,200	1,200	0	0	0	1,200	100	100	1010102	1010102	1010201	1010201	1010229	1010229	1010530	1010229	1010620	1010620	1010629	1010716
c009-1-5	骨幹安全與無線 網路建置案	9,000	9,000	9,000	0	0	0	9,000	100	100	1010531	1010425	1010615	1010529	1010630	1010529	1011031	1010703	1011231	1010913	1011231	1010921
c009-1-6	共用虛擬主機設 備建置案	5,400	5,400	5,400	0	0	0	5,400	100	100	1010531	1010402	1010630	1010518	1010713	1010518	1010930	1010622	1011130	1010831	1011231	1011210
c009-1-7	宜蘭縣公文管理 整合系統硬體備 援建置案	5,100	5,100	5,100	0	0	0	5,100	100	100	1010501	1010413	1010601	1010516	1010615	1010516	1010815	1010815	1011001	1010927	1011031	1011025
c009-1-8	建置影音資料庫 及數值化系統	2,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000	100	100	1010715	1010627	1010830	1010730	1010901	1010730	1011231	1011130	1011231	1011130	1011231	1011228
c009-1-9	本府各單位資訊 設備採購	2,100	2,100	2,100	0	0	0	2,100	100	100	1010315	1010309	1010413	1010330	1010413	1010330	1010630	1010514	1010630	1010608	1010731	1010626
c009-1-10	e 櫃台系統維護 及建置擴充計畫	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100	100	1010331	1010315	1010515	1010503	1010516	1010504	1010731	1010731	1010930	1010831	1011031	1010913
c009-1-11	宜蘭縣孔廟修繕 工程經費	3,000	3,000	2,980	0	0	20	3,000	100	100	1010731	1010726	1010820	1010904	1010831	1010919	1010920	1010928	1011015	1011022	1011115	1011107

c009-1-12	員山忠烈祠修繕工程經費	3,500	3,500	3,500	0	0	0	3,500	100	100	1010315	1010315	1010417	1010621	1010510	1010703	1010611	1010710	1010630	1010803	1010717	1010910
c009-1-13	101年度農地重劃區農水路更新改善工程	5,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	100	100	1010531	1010524	1010715	1010717	1010815	1010815	1011015	1011015	1011215	1020129	1011231	1020206
c009-1-14	大溪漁港魚市場改建工程	4,840	4,840	4,598	242	0	0	4,840	100	100	1010301	0990721	1010301	0990908	1010301	0991015	1010301	1010113	1011015	1010929	1011231	
c009-1-15	促進養殖漁業與環境和諧計畫	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500	100	100	1010430	1010426	1010814	1010814	1010831	1010903	1011031	1011019	1011220	1011210	1011231	1011224
c009-1-16	南方澳第三魚貨拍賣場增設兩遮海水供水系統等相關設施計畫	3,200	3,200	3,200	0	0	0	3,200	100	100	1010102	1010102	1010131	1010131	1010229	1010229	1010315	1010315	1010410	1010427	1010430	1010430
c009-1-17	100年度「公路公共運輸發展計畫」羅東臨時轉運站建置案線配合款	5,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	100	100	1010105	1010105	1010206	1010206	1010215	1010215	1010622	1010615	1011024	1011024	1011231	1011031
c009-1-18	宜蘭臨時轉運站週邊人行環境改善工程計畫(第二期)縣配合款	2,800	2,800	2,800	0	0	0	2,800	100	100	1010116	1010116	1010203	1010203	1010229	1010229	1010301	1010301	1010313	1010525	1010413	1010731
c009-1-19	本局辦公廳舍建築物耐震能力補強工程經費(1)	9,240	9,240	9,240	0	0	0	9,240	100	100	1010420	1010419	1010503	1010503	1010510	1010510	1010625	1010625	1010810	1010810	1010830	1010830
c009-1-20	生活圈道路交通系統設計計畫-國道5號側車道(宜蘭段)向南向北延伸新闢工程100年度增列經費縣配合款	34,000	34,000	34,000	0	0	0	34,000	100	100	1010630	1010611	1010930	1010611	1010930	1010611	1010930	1010611	1011231	1010611	1011231	1010611
c009-1-21	河川治理跨河橋涼引道工程及用地費	20,000	20,000	15,500	4,500	0	0	20,000	100	100	1010102	1010102	1010301	1010301	1010402	1010402	1010801	1010801	1011001	1011001	1011231	
c009-1-22	縣市政府老舊及受損橋樑整建計畫(第二期計畫)	8,500	8,500	8,500	0	0	0	8,500	100	100	1010116	1010116	1010222	1010222	1010330	1010330	1010531	1010531	1011130	1011130	1011231	1011130
c009-1-23	縣市政府老舊及受損橋樑整建計畫(第二期計畫)-宜三十線義成橋拓寬工程100年度增列經費縣配合款	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100	100	1010118	1010118	1010229	1010229	1010330	1010302	1010531	1010531	1011130	1011130	1011231	1011130
c009-1-24	振興經濟擴大公共建設加速生活圈道路交通系統設計計畫-宜蘭市54號道路(民權路)新闢工程	10,000	10,000	6,117	3,383	0	0	9,500	95	95	1010105	1010105	1010202	1010202	1010229	1010229	1010731	1010731	1011130		1011231	

c009-1-25	污水下水道建設計畫經費	23,000	23,000	23,000	0	0	0	23,000	100	100	1010331	1010331	1010531	1010531	1010731	1010731	1010930	1010930	1011130	1011130	1011231	1011130
c009-1-26	「羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫」建設費	25,000	25,000	23,681	0	0	1,319	25,000	100	100	1010430	1010430	1010630	1010630	1010731	1010731	1010930	1010930	1011130	1011130	1011231	1011211
c009-1-27	冬山河森林公園入口管理棟用地第三年有償撥用費(分三年三期付款)	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100	100	1010229	1010210	1010331	1010319	1010331	1010319	1010331	1010319	1010331	1010319	1010331	1010319
c009-1-28	100年度既有市區道路景觀與人文環境改善計畫-宜蘭市舊鐵路生活文化鐵馬道景觀工程	2,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000	100	100	1010117	1010117	1010215	1010215	1010301	1010301	1010523	1010316	1010605	1010406	1010630	1010425
c009-1-29	100年度區域景觀光旗繼計畫-龍潭湖風景特定區環境整備工程	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100	100	1010110	1010110	1010222	1010222	1010302	1010302	1010731	1010731	1011130	1011105	1011231	1011130
c009-1-30	100年度區域景觀光旗繼計畫-冬山河森林公園水域活動遊憩設施工程	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100	100	1010104	1010104	1010215	1010215	1010222	1010222	1010630	1010331	1011031	1010331	1011231	1010331
c009-1-31	100年度區域景觀光旗繼計畫-冬山河親水公園林蔭設施工程	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100	100	1010105	1010105	1010203	1010203	1010224	1010224	1010320	1010320	1010620	1010516	1010629	1010629
c009-1-32	整備觀光遊憩設施建設計畫-冬山河森林公園環境教育中心週邊景觀工程	8,000	8,000	8,000	0	0	0	8,000	100	100	1010531	1010531	1010630	1010629	1010712	1010712	1010930	1010930	1011130	1011130	1011231	1011231
c009-1-33	轄屬風景遊憩景點設施設備、船舶修繕、新作及機電維修等相關費用	17,000	17,000	11,280	5,720	0	0	17,000	100	100	1010105	1010105	1010222	1010222	1010305	1010222	1010731	1010731	1011230	1011228	1011230	
c009-1-34	南澳農場、武荖坑風景區及頭城海水浴場汽車露營休閒區設施改善建置	2,400	2,400	1,540	0	0	860	2,400	100	100	1010315	1010315	1010331	1010424	1010401	1010424	1010831	1010831	1011231	1011228	1011231	1020108
c009-1-35	羅東運動公園棒球場設施整修工程	5,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	100	100	1010102	1000930	1010120	1001128	1010201	1001205	1010229	1001224	1010430	1010430	1010531	1010514
c009-1-36	宜蘭運動公園體育館空調主機2部汰舊更新工程	15,000	15,000	13,362	1,319	0	0	14,681	97.9	97.9	1010415	1010417	1010515	1010502	1010530	1010528	1010928	1010710	1011231	1010912	1011231	1011016

c009-1-37	分期(10年)第4年償還資源回收(焚化)廠行政管理大樓興建工程。	1,800	1,800	1,800	0	0	0	1,800	100	100	1010202	1010202	1010220	1010220	1010220	1010220	1010229	1010229	1010320	1010319	1010331	1010320
c009-1-38	本局辦公廳舍及勤務宿舍等整修工程	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500	100	100	1010320	1010320	1010410	1010410	1010410	1010410	1010720	1010720	1011030	1011030	1011220	1011115
c009-1-39	交通隊勤務大樓整修工程	1,400	1,400	1,374	0	0	26	1,400	100	100	1010420	1010420	1010630	1010524	1010720	1010530	1010831	1010831	1010930	1010930	1011031	1011029
c009-1-40	重要路口錄影監視系統建置費	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	100	100	1010104	1010104	1010131	1010131	1010224	1010224	1010831	1010718	1011231	1011210	1011231	1011225
c009-1-41	交通隊汰換測速照相設備等	3,700	3,700	3,680	0	0	20	3,700	100	100	1010331	1010315	1010430	1010430	1010501	1010501	1010731	1010731	1010831	1010731	1010930	1010831
c009-1-42	衛生局(含慢性病防治所)辦公廳舍內部裝修設備工程	32,000	32,000	28,677	3,323	0	0	32,000	100	100	1010716	1010716	1010831	1010828	1010910	1010917	1011031	1011124	1011130	1011213	1011231	

附表 2

宜蘭縣政府 101 年度基本設施補助計畫目標達成整體成效表

計畫目標達成情形	原計畫標案件數 (a)	註銷件數 (b)	作業計畫調整件數 (c)	節餘款增辦件數(d)		實際執行件數 (e=a-b+d)	註銷及變更率 (%) (f=(b+c)/a)	6月發包件數 (g)	6月發包率 (%) (h=g/e)	9月發包件數 (i)	9月發包率 (%) (j=i/e)	12月發包件數 (k)	12月發包率 (%) (l=k/e)	實際完工件數 (m)	完工率 (%) (n=m/e)	已驗收完成件數 (o)	驗收完成率 (%) (p=o/e)	查核點進度符合案件數 (q)	標案進度達成率 (%) (r=q/e)
		82	1	1	0		81	2.44	73	90.12	80	98.77	81	100	74	91.36	70	86.42	71
計畫執行控制情形	原計畫核定總經費 (千元)(A)	節餘款增辦總數 (千元) (B)	增辦計畫核定總經費 (千元) (C)	原計畫累計預定支用數 (千元) (D)	9月原計畫累計預定支用數 (千元) (E)	增辦計畫累計預定支用數(千元)(F)	12月累計預定支用數 (千元) (G)	累計實際支用數 (千元) (H)	已執行應付未付數 (千元) (I)	節餘款繳庫數 (千元) (J)	預算執行數 (千元) K=(H+I+J)	9月年度預算分配比(%) L=E/(A-B+C)	12月年度預算分配比 (%M=G/(A-B+C)	預算執行率 (%) N=K/(D-B+F)	預算達成率 (%) O=K/(A-B+C)				
	839,233	0.000	0.000	830,233	451,574.36	0.000	830,233	731,976.044	68,995.491	7,574.245	808,545.780	53.81	98.93	97.39	96.34				

備註 1 本表由管考系統自動產製，請各縣市政府於次一年度 1 月 15 日前完成計畫標案各項資料填報作業。

備註 2 欄位名稱說明：(1)註銷及變更率：註銷與作業計畫調整件數占原計畫標案件數之百分比。(2)發包率：實際發包件數占預定發包件數之百分比。(3)完工率：實際完工件數占預定完工件數之百分比。(4)驗收完成率：實際完成驗收件數占預定完成驗收件數百分比。(5)標案進度達成率：標案查核點進度符合案件數占所有標案之百分比。(6)預算執行數：所有計畫標案(含增辦)之累計實際支用數、已執行應付未付數及節餘款繳庫數之加總金額。(7)預算分配比例：所有計畫標案累計預定支用總數占所有計畫標案預算數之百分比(8)執行率：所有計畫標案之預算執行總數占累計預定支用總數之百分比。(9)達成率：所有計畫標案預算執行總數占計畫標案核定總經費之百分比。

附件 1

副縣長實地現勘案件表

項次	查證時間	計畫名稱	主席裁(指)示事項	缺失改善 發文日期	改善情形	改善完成 日期
1	1010602	十三股抽水站維護工程	無	無		
2	1010721	宜三十線義成橋拓寬工程	人行步道應再行檢討施作高程，請確實針對相關因素檢討調整。	1010726	已改善	1010817
3	1010721	冬山河水域活動遊憩設施工程第一期	管理中心迴廊處之落水管應調整，避免遊客經過絆倒形成意外，請一併檢討改善。	1010726	已改善	1010815
4	1010721	宜蘭縣冬山鄉大進國民小學『風雨操場新建工程	該工程現場仍見部分缺失，請辦理改善。 1 混凝土表面殘留模板。 2 混凝土表面殘留鐵件。 3 混凝土養護不佳，塑性收縮造成裂縫。 4 練習牆之PVC管凸出未切與牆面平整。 5 鋼構桁架孔位放樣位置不符標準。 6 於高差2公尺以上，施作人員未佩帶安全索或場所張設安全網。 請依契約規範全面檢視該工程施作情形，如經本府複查仍有未改善者，將追究相關失職人員行政責任；有關監造不實相關責任請依技術服務契約相關罰責確實檢討辦理，併依缺失改善回復。	1010724	已改善	1010827
5	1010721	宜蘭生物醫學產業特定專用區市地重劃及54號計畫道路工程暨代辦管線工程	該工程現場仍見部分缺失，請辦理改善。 1 排水溝步道板破損。 2 工區發現含酒精性飲料。 3 緣石(0+210k處)未倒角及兩側模板未拆除。 4 混凝土表面殘留模板(多處)。 5 混凝土表面殘留雜物(鐵絲、鐵件)。 6 工區現場營建廢棄物未清理，影響環境。 請依契約規範全面檢視該工程施作情形，如經本府複查仍有未改善者，將追究相關失職人員行政責任；有關監造不實相關責任請依技術服務契約相關罰責確實檢討辦理，併依缺失改善回復。	1010724	已改善	1010821
6	1010915	宜蘭縣政府消防局頭城消防分隊新建工程	工程現場仍見部分缺失，請辦理改善。 1 現場營建材料或廢棄物堆置凌亂。 2 工區鋼筋堆置凌亂且直接與地面接觸。 3 一樓樓梯間預留鋼筋突出，未彎曲或未做防護措施(多處)。 請依契約規範全面檢視該工程施作情形，如經本府複查仍有未改善者，將追究相關失職人員行政責任；有關監造不實相關責任請依技術服務契約相關罰責確實檢討辦理，併依缺失改善回復。	1010919	已改善	1011009
7	1011215	宜蘭市歡樂鐵馬道景觀工程	工程現場仍見部分缺失，請辦理改善。 1 現勘入口處任意堆置營建廢棄物及人行步道上殘留部分餘土。 2 出入口安全警告標誌及夜間警示不足。 3 人行步道磚部分混凝土澆置不實。 4 開挖作業時，營建用機械未裝設旋轉警示燈。 5 為整體美觀性，避免二次施工，有關工區東側未納入本工程之農業用地，請儘速與相關單位協商用地取得事宜。 6 工區西側綠美化工程，植栽樹種是否依該自行車路線作整體規劃，請釐清。 請依契約規範全面檢視該工程施作情形，如經本府複查仍有未改善者，將追究相關失職人員行政責任；有關監造不實相關責任請依技術服務契約相關罰責確實檢討辦理，併依缺失改善回復。	1011221	已改善	1020109

附件 2

宜蘭縣政府重大工程各次督導會報一覽表

項次	會報次別	查證、督導會報時間	主席裁示	發文日期及文號
1	597	101112	工程查核缺失通報資料中，施工品質、品質管理作業及施工安全衛生等三項應予分開序列。	101120 府計管字第 1010012254
2	597	101112	請檢討成立工程履約爭議諮詢小組（窗口），以協調、溝通方式協助單位並諮詢履約爭議事宜。	101120 府計管字第 1010012254
3	597	101112	有關 100 年度各國中小學營養午餐採購案全面稽核事宜，請速分配各稽核委員執行稽核作業。	101120 府計管字第 1010012254
4	597	101112	各單位於評選技術服務廠商之採購案件時，請確實提供「廠商公共工程履歷資料」供評選委員參考。	101120 府計管字第 1010012254
5	597	101112	請查核小組主動了解並研討如何事前發現各工程履約執行之異常情形。	101120 府計管字第 1010012254
6	597	101112	建業分洪道及蘭陽抽水站設計委託技術服務案—請工務處掌控進度，倘有困難，應速提出，尋求解決對策，以利工進。	101120 府計管字第 1010012254
7	598	101118	路平專案：本專案辦理情形已由道安全會報列管，本會報解除列管。	101202 府計管字第 1010014793
8	599	101216	未依「工程規劃設計審查諮詢作業辦法」辦理規劃設計之各單位(含機關學校)，請查明列冊要求提出說明。	101301 府計管字第 1010030050
9	599	101216	預備參選公共工程金質獎之工程除由單位推薦外，查核小組亦應查核選擇優秀案件一併簽報陳核。被提報列為預備參加金質獎之工程，如經查核發現尚未達推薦標準時，請即提出分析說明。	101301 府計管字第 1010030050
10	599	101216	建立宜蘭品牌，應加強不良廠商篩選，從源頭控管至末端查核管理。	101301 府計管字第 1010030050
11	600	101223	請於下次會報時分別列出 100 年度各單位總預算及本預算、追加預算執行情形。	101305 府計管字第 1010032969
12	600	101223	針對 100 年度本預算執行率低於 80%之單位，請主計處於縣務會議中提出報告，並請執行單位檢討原因並提出因應對策。	101305 府計管字第 1010032969
13	600	101223	請主計處研議對預算執行成效良好之單位辦理敘獎。	101305 府計管字第 1010032969
14	601	101315	本人日前查核三件工程，品質均不理想，相關缺失請通報各工程主辦單位參考，並請全面查察類似缺失是否存在。對於品質不佳之工程，除要求監造做好品質把關的責任、依契約相關罰責來課予承商責任外，主辦單位亦應負起責任，以確保工程品質。	101323 府計管字第 1010044439
15	601	101315	有關工程標案管理系統請依權責督導做好檢核工作，並請提供帳號密碼予本人，俾利上網查核。	101323 府計管字第 1010044439
16	601	101315	請速建立廠商履歷資料，確實掌握運用，以供評選擇商之參考。	101323 府計管字第 1010044439
17	601	101315	各單位應依工程規劃設計審查內控機制確實辦理，並請採購科就決標案件追蹤管制。	101323 府計管字第 1010044439
18	602	101328	請原民所、消防局、警察局、體育場、文化局、衛生局、社會處、秘書處、民政處、農業處、教育處、工商旅遊處等單位，審慎處理預算分配，並應於年度開始確實執行。	101409 府計管字第 1010053564
19	602	101328	倘有不依合約估驗請款，俟完工時才一次估驗者，應通知廠商書立切結書，否則應依規定辦理估驗及請款作業。	101409 府計管字第 1010053564
20	602	101328	落後案件請確實檢討原因，並修正工作計畫，以利控管。	101409 府計管字第 1010053564
21	603	101411	針對查核所見鋼筋工項施工常見缺失無法有效遏止，爾後查核案件所發現缺失內容如涉及結構施工之工項（如鋼筋間距、彎鉤、錨定、綁紮固定及保護層等施工情形未符規範標準），應要求受查單位於缺失改善完成即通知查核小組勘，查俟確認後才可以進行下一階段封模灌漿工作。如因再查核確認有人力不足情形，請速檢討簽辦人力增聘作業。	101424 府計管字第 1010062174
22	603	101411	查核所見施工缺失如經查核小組勘查仍未依規範標準完成改善者，除依約追究監造及承商責任外，主辦單位未善盡督促責任請簽辦議處。	101424 府計管字第 1010062174
23	603	101411	有關 101 年提昇工程品質暨施工管理教育訓練，課程內容以實務為主，常發生的工程缺失應列入課程內容，並以工程實際從業人員、監造及廠商人員參訓。	101424 府計管字第 1010062174
24	603	101411	「大溪漁港魚市場改建工程」—除掌控施工品質外，監工日誌應要求確實記載，估驗請款時要求廠商備妥文件，並請農業處確實查核。	101424 府計管字第 1010062174
25	603	101411	「南澳農場、武荖坑風景區及頭城海水浴場汽車露營休閒區設施改善建置」—請工旅處積極趕辦。	101424 府計管字第 1010062174
26	603	101411	「宜蘭縣孔廟修繕工程」—請民政處積極趕辦。	101424 府計管字第 1010062174
27	603	101411	「文化局第二館區興建工程」—請文化局列出本案尚有那些工程應做而未施作及完成期程，先報告局長後，向本人說明。	101424 府計管字第 1010062174
28	604	101425	請主計處督促各單位檢討預算分配數是否務實，及執行不力原因，並請各單位確實配合辦理。	101502 府計管字第 1010066999
29	605	101510	「孔廟修繕工程經費」：請民政處確實掌握期程，再確認是否仍有問題未解決，並調整作業計畫。	101522 府計管字第 1010077774
30	605	101510	「宜蘭臨時轉運站週邊人行環境改善工程計畫(第二期)」：請建設處如期如質於五月底前完成。	101522 府計管字第 1010077774
31	605	101510	「消防局辦公廳舍建築物耐震能力補強工程」：本案工程標的物為五個消防分隊而非消防局，計畫名稱應修正以符實際，以免誤導，另落後部分並請消防局積極趕辦。	101522 府計管字第 1010077774
32	605	101510	「員山忠烈祠修繕工程」—本案請民政處注意，趕工計畫應縮短設計及行政程序時間，而非壓縮施工時間，以免影響施工品質。	101522 府計管字第 1010077774
33	605	101510	「大進國小風雨操場新建工程」—請教育處注意估驗程序，確實估驗。	101522 府計管字第 1010077774
34	605	101510	「宜蘭運動公園體育館空調主機 2 部汰舊更新工程」—請計畫處再釐清確認本案是否落後及為何進度符合、經費卻落後之原因。	101522 府計管字第 1010077774

35	606	101615	「孔廟修繕工程經費」—請民政處確實掌握期程，如有需協調溝通應立即提出。	101705 府計管字第 1010104101
36	606	101615	「促進養殖漁業與環境和諧計畫」—有關部分工程款須俟追加預算通過後始能決標部分，請農業處於合約或投標須知內敘明發包施工部分項目即可，勿因部分預算尚未通過而全案保留決標，致工程無法進行。	101705 府計管字第 1010104101
37	606	101615	針對落後案件請計畫處設警示值，達落後警示值案件，先行了解問題及原因，必要時安排專案檢討會議，不必等到召開會報時才檢討。	101705 府計管字第 1010104101
38	606	101615	有關頭城鎮鎮長於縣務會議提案頭城鎮合興里崩塌案，請農業處安排本人現勘。	101705 府計管字第 1010104101
39	607	101713	請工程查核小組查明，廣興、大進、新南、岳明及同樂等五間國小風雨操場興建工程鋼構屋頂板均委由同一間廠商提供，規格訂定是否有綁標情形、及縣內鋼材供料廠商是否僅有一家具防火認證，並請教育處配合調查。	101716 府計管字第 1010109767
40	608	101727	大溪漁港魚市場改建工程—有關本案一樓混凝土強度不足部分，請農業處儘速確認結構安全是否有問題，並召集承商、設計、監造及議員協調解決對策，切勿再拖延。	101731 府計管字第 1010118195
41	608	101727	「十六結農地重劃區農水路工程暨相關改善工程」—有關計畫檢討變更情形請地政處向本人報告。	101731 府計管字第 1010118195
42	609	101820	「宜蘭三星羅東馬賽員山消防分隊辦公廳舍建築物耐震能力補強工程」—請向局長報告辦理情形，如有困難應儘速提出協調解決，並請總顧問予以協助。	101822 府計管字第 1010129980
43	609	101820	「話務中心建置計畫」—請秘書處依規定辦理驗收，該要求即應要求，並應注意掌握作業時間。	101822 府計管字第 1010129980
44	609	101820	「員山忠烈祠修繕工程」—請民政處依規定辦理驗收，該要求即應要求，並應注意掌握作業時間。	101822 府計管字第 1010129980
45	609	101820	「大溪漁港魚市場改建工程」—本工程爭議部分，請農業處妥速檢討，提出解決對策。	101822 府計管字第 1010129980
46	610	101831	「大溪漁港魚市場改建工程」—本案請賴處長負責處理解決，並請農業處逐項列出所遭遇問題及預定完成工作時程表，考量漁民及攤商生計，儘速完成，改為按周列管，如有困難應立即提出。	101905 府計管字第 1010137683
47	611	101101	經工程查核發現監造不實，如僅對監造扣點罰款，處罰強度顯然不足，無法達到積極改進效果，應研議修正契約條文加重罰款，並應正式行文要求監造立即改善，必要時應依契約規定予以終止合約。	101104 府計管字第 1010157873
48	611	101101	「農業處大溪漁港魚市場改建工程案」—本案有爭議項目，請賴處長務必親自了解提出解決對策。	101104 府計管字第 1010157873
49	612	1011026	請本府工程施工查核小組於縣務會議提出「本府對縣內公共工程推動及管控規劃設計、施工機制報告」，針對本府目前所訂定設計規劃審查、工程進度管制(含計畫處管控機制)、品質查核、採購稽核、履約爭議諮詢等機制，如何追蹤列管、管理、協助解決情形及各個機制管控件數，提出整套的完整報告。	1011031 府計管字第 1010172045
50	613	1011130	請工程施工查核小組通函各機關學校，承辦工程均應設置「工程督導小組」，邀請專業人士參與協助提供專業意見，並應定期查核。	101125 府計管字第 1010192387
51	613	1011130	大陸進口之淡化海砂恐影響公共工程品質，請工程查核小組通函各機關學校，將骨材試驗全面納入設計、監造、施工加強檢驗項目，並列入應辦事項，落實執行及多重確認，另請工程查核小組將此項目列為必要抽查項目。	101125 府計管字第 1010192387
52	613	1011130	宜蘭臨時轉運站周邊人行環境改善工程計畫案— 1 中央款未撥入部分，請建設處再查明是否有程序未完成，才導致未撥款。 2 有民眾反應宜蘭轉運站風雨走廊燈光不足部分，請建設處改善。	101125 府計管字第 1010192387
53	614	1011221	宜蘭市 54 號道路(民權路)新闢工程—請工務處在通車前舉辦通車典禮，惟通車前應全面檢視路燈、指示標誌、號誌、植栽綠美化等工項，設置完成後再對外開放。外線申請部分，請工務處持續追蹤台電公司辦理進度並專案協調儘速辦理，期能於 1 月底前通車。12 月底前安排本人先去現場檢查。	1011226 府計管字第 1010205412
54	614	1011221	衛生局辦公廳舍內部裝修設備工程—請衛生局要求裝修主建築師整合各工項，務必於 2 月底 3 月初完成搬遷作業。近期安排本人現勘，確認何時可取得使用執照、何時能完成搬遷。	1011226 府計管字第 1010205412
55	614	1011221	有民眾反應宜蘭轉運站風雨走廊燈光不足部分，請建設處改善：請建設處再至現場訪問民眾確認亮度是否足夠。	1011226 府計管字第 1010205412
56	614	1011221	道路養護及綠美化工程—本案為配合 102 年全中運計畫，請工務處積極辦理，應於農曆過年前呈現綠美化成果。農業處百萬植樹計畫要注意時程，並與 102 年全中運相互配合。」	1011226 府計管字第 1010205412

附件 3

工程施工查核小組查核情形一覽表

序號	工程名稱	主辦單位	查核日期	通知方式	內聘委員	外聘委員	參與人員	評分	檢討與建議	發文日期文號	回文日期文號	查核建議處置
1	宜 16 線等鄉道路面改善工程	工務處	1010104	不預先	陳志誠	吳澤雄、鄭安	簡淑美	76	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簡報未說明主要工程圖說內容讓查核人員充分瞭解，請注意改進。 2. 依相同設計強度之混凝土抗壓強度試驗結果，顯示其強度差異極大，品質均勻性應檢討加強。 3. 剛性路面之施工縫及伸、縮縫、縱縫等留設與現場路寬、長度及施工條件有關，故應要求承包商依設計圖繪製施工大樣圖據以辦理放樣施工，以確保其品質及功能均能符合設計要求。 4. 加強勞工安全宣導與相關訓練。 	1010112 府查字第 1010007648 號函	1010308 主辦單位便簽檢送改善結果。	對廠商辦理扣款
2	宜蘭縣文化局第二館區北區後續工程	工務處	1010106	不預先	張謙祥	銘 升賢清、區志	黃奕凱	78	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工程同時有兩個不同標案之承商履約施工中，建議主辦單位督促監造單位積極協調注意工區內勞安事宜。 2. 主辦單位及監造應要求區內各標承商臨時用電使用安全，尤其電源線路應架空勿放置於積水中。 3. 承商文件管理應加強。 4. 承商矯正預防措施應落實。 5. 安全衛生協議組織會議未健全。 6. 連日下雨，工進管制應特別注意。 	101113 府查字第 1010007939 號函	1010217 府工建字第 1010022411 號函改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
3	宜蘭縣冬山鄉廣興國民小學『風雨操場新建工程』	宜蘭縣冬山鄉廣興國民小學	1010214	不預先	薛佰壽	何武璋、曾浩豐	簡淑美	76	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案工程進度未作 S 曲線之規劃，進度之釐定及估驗恐無依據；另外施工過程須定期更新新實際進度並進行追蹤，惟目前並無相關之作業資料，請加強進度之控管並製作進度管控所須之相關圖表資料。 2. 鋼管接頭應謹慎處理，確保結構安全。 3. 舊有排水管是否仍具功能需確認，以接通新設集水井。 4. 混凝土地坪高程應精準規劃排水方向。 	1010223 府查字第 1010027443 號函	1010316 廣小總字第 1010000741 號函改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
4	冬山鄉、五結鄉、三星鄉道路養護工程	工務處	1010221	不預先	譚德林	明 開坤成、黃光	黃奕凱	79	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專任工程人員請確依營造業法第 35 條及公共工程施工品質管理作業要點第 7 點切實執行。 2. 有關道路養護施工區多屬開放性工區，其 AC 施工時相關交維及工地安衛管制尤為困難；請施工廠商應妥慎規劃做好相關安衛工作，安衛管理人員並應在場督導執行。 3. 主辦單位及施工團隊應加強與管線單位針對人孔蓋調整密切協調以利工進。 	101229 府查字第 1010029452 號函	1010321 主辦單位便簽檢送缺失改善結果	對廠商辦理扣款

5	南方澳第三魚貨拍賣場增設雨遮、海水供水系統等相關設施(土木工程)	農業處	1010221	不預先	譚德林	明 阿坤府、黃光	黃奕凱	76	1. 建議設計單位對設計單價應合理，如本工程苦楝植栽之單價，即顯不合理。 2. 施工日誌應依各欄位重要內容充分記錄。 3. 工程告示牌請依本府建管單位規範之建築公共工程內容設置，應包含公共工程告示牌設置要點內規定之內容。	101229 府查字第 1010029453 號函	1010322 主辦單位便箋檢送缺失改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
6	宜蘭縣冬山鄉大進國民小學『風雨操場新建工程』	宜蘭縣冬山鄉大進國民小學	1010222	不預先	薛佰壽	張慶雲、簡崇濯	簡淑美	76	1. 風雨操場鋼構柱施工方式改變，建議設計及施工廠商儘速依契約變更程序，重新進行結構核算及價金檢討，以及繪製接合處之施工詳圖，以利工進。 2. 請注意門禁管制，避免閒雜人進出，並注意機具車輛動線，以維學童安全。	1010229 府查字第 1010029731 號函	1010320 大進小總字第 1010000751 號函改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
7	大溪漁港魚市場改建工程	農業處	1010223	不預先	張謙祥	碑 利賢河、邱賢	袁立群	76	本工程施工進度嚴重落後，應為頂板防水無法施工所造成，自去年 10 月底連續下雨迄 1 月底高達 100 天以上，請主辦單位召集施工趕工會議，擬定權責劃分，並請施工廠商提趕工計畫，明訂完工日期，以免延誤完工日期。	1010302 府查字第 1010031094 號函	1010321 主辦單位便箋檢送改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
8	冬山河水域活動遊憩設施工程第一期	工商旅遊處	1010314	不預先	譚德林	聖 吳清財、曹泮	黃奕凱	76	1. 混凝土配比設計，如係引用年度工程配合(比)設計資料，應於送審資料上註明其來源。 2. B 工區自行車道景觀橋橋台兩側翼牆上部連接胸牆段無配筋剖面圖，應請設計單位補充以憑施工。	1010321 府查字第 1010042776 號函	1010413 主辦單位便箋檢送改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
9	宜蘭地區污水下水道用戶接管第 14 標工程	工務處	1010327	預先	薛佰壽	雲 江海全、邱慶	黃奕凱	82	1. 品質計畫書目錄頁，應附在封面頁後，以易於查閱。其內容應落實執行，如內部稽核、缺失預防矯正等，未依計畫書內容執行。 2. 卷宗資料多時，宜整理該卷宗資料目錄，以利查閱，如:材料檢驗資料文件。 3. 本工程後巷段施工，採原土回填，因現場常見大粒徑石塊，易被施工人員混入使用，故宜在自主檢查表項目對粒徑太大的石粒有管控。 4. 工程相關人員異動時應於工程標案管理系統內完成修正。	1010403 府查字第 1010050092 號函	1010425 主辦單位便箋檢送改善結果	

10	代辦國道5號31K+900-33K+700側車道延伸新聞工程	交通部公路總局第四區養護工程處頭城工務段	1010328	預先	許文貴 張智奇、蔣鑫如、戴岳志 張志尚	82	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工程已施工348天，占本工程工期610日曆天之5705%，其實際進度僅4870%，所剩工期多係梅雨季與防汛期，勢將影響施工，建議主辦機關督促監造單位確實負起監造責任，督導承商以預定完工日期逆推方式，就人、機、料、增加工作面或工時等，研提具體趕工計畫報核後確實趕工進。尤其水利主管機關許可跨越水道設施施工構台部分應盡速趕辦，於許可期限（五月底）前完成，將水道內施工構台撤離，以免阻礙水流，造成氾濫。 2. 本工程契約金額4億8千餘萬元，雖已設置混凝土技術士，惟鋼構工程達5314%，請依內政部、勞委會99年5月25日會銜令頒修正「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定，檢討須否增設鋼構工程相關職類技術士。 3. 依施工廠商簡報p30，「材料檢驗及試驗頻率管制表」，高拉力螺栓尚未提送審查，惟p20，橋梁上構工程高拉力螺栓已完成數量122T，完成率677%，是否有誤植，請再加檢核、妥處。 4. 本工程為重點防汛工程，汛期將屆請施工團隊注意各項防汛作為，俾確保人員、機具及材料之安全。 5. 已在吊掛完成之現場鋼梁，不宜放置過久，應儘速完成組裝，避免因其他外力因素而影響。 	1010403 交重字第1015004953 號函	101517 路養護字1010023610 號函改善結果	
11	龍潭湖風景特定區環境整備工程	工商旅遊處	1010426	不預先	莊振德 銘 冒泮璧、國志 黃奕凱	77	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案設計變更部分應盡速完成，其相關之工期、施工計畫與品質計畫之調整亦須盡快配合辦理，以利工程施作。 2. 本案工程進度未作S曲線之規劃，進度之釐定及估驗計價恐無依據；另外施工過程須定期更新實際進度並進行追蹤，惟目前並無相關之作業資料，請加強進度之控管並製作進度管控所須之相關圖表資料。 3. 建議業主、監造、承商三方就設計變更後續公文核定事項並積極完成修正進度。 4. 鋼構廠驗請依相關計畫及契約規定確實執行及建立相關紀錄內容。 5. 施工現場為風景區，於工程車輛進出頻繁時應注意交管等措施。 	10153 府查字第1010067714 號函	1010528 主辦單位便箋檢送改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
12	宜蘭地區污水下水道第15標工程	工務處	1010523	預先	江漢全、吳澤雄、趙紹錚 黃奕凱	80	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主辦機關簡報之估驗進度建議增列累計計價進度百分比之說明。 2. 辦機關簡報之三級品管架構圖將「內政部營建署」列為三級，應屬有誤，建議修正為「內政部」。 3. 承包商簡報建議增列有無重大工安事件之說明。 4. 施工照片建議按照施工流程及檢驗停留點完整呈現，以證明施工團隊有確切落實品管工作。 5. 材料試驗報告之審核判定，如TAF認證之試驗報告未列有合格標準時，建議於審核判定文件上加簽契約圖說規定之合格標準或於其後檢附合格標準之契約圖說規定，以利查閱。 6. 混凝土圓柱或鑽心試體之抗壓試驗，建議參與會驗人員應共同檢視試體破壞情況，檢討混凝土骨材、混凝土緻密性及均勻性等之良窳，並記錄於其審核判定報告上，以供改進混凝土品質之參考。 7. 建議可應用柏拉圖法則及魚骨特性要因圖辦理品管統計分析。 8. 品質計畫書內容，應落實執行。如內部稽核，仍未依計畫書內容執行。 9. 承攬廠商文件，缺表單總表及材料檢驗總表等，查閱不易，宜予以改善。 10. 侷限空間許可申請書紀錄不確實，如O2均為209%，CO、H2S均為0ppm，顯為不合理，建議應落實儀器校正、現場量測及加強相關訓練。 	1010530 府查字第1010082971 號函	1010621 主辦單位便箋檢送改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款

13	宜蘭地區污水下水道用戶接管第15標工程	工務處	1010523	預先	江漢全、吳澤雄、趙紹錚	黃奕凱	80	<ol style="list-style-type: none"> 品質計畫書內容，宜持續努力落實執行。如內部稽核、缺失預防矯正等，現況與計畫書內容仍有不符合處。 加強與住戶溝通，釐清低窪區淹水與本工程無關，勿引起民怨。 缺失預防矯正資料表單，宜編入文件總表。 主辦機關簡報工程督導及召開工務會議情形，建議增列說明實際執行成果內容。 承包商簡報內容建議增列有無重大工安事件之說明。 施工照片建議按照施工流程及檢驗停留點完整呈現，以證明施工團隊有確切落實品管工作。 材料試驗報告之審核判定，如 TAF 認證之試驗報告未列有合格標準時，建議於審核判定文件上加簽契約圖說規定之合格標準或於其後檢附合格標準之契約圖說規定，以利查閱。 混凝土圓柱或鑽心試體之抗壓試驗，建議參與會驗人員應共同檢視試體破壞情況，檢討混凝土骨材、混凝土緻密性及均勻性等之良窳，並記錄於其審核判定報告上，以供改進混凝土品質之參考。 建議可應用柏拉圖法則及魚骨特性要因圖辦理品管統計分析。 	101530 府查字第1010082972 號函	1010622 主辦單位便箋檢送改善結果	對廠商辦理扣款
14	宜蘭縣羅東鎮雨下水道清淤工程	宜蘭縣羅東鎮公所	1010612	不預先	譚德林	林寬沛、趙紹錚	80	<p>垃圾丟入渠道之習慣造成下水道系統阻塞，導致清理困難及淹水之災損，建議貴所召集相關單位加強宣導或重罰違規人（非業主或權責機關），以杜絕不法習慣。</p>	1010619 府查字第1010094320 號函	1010704 羅鎮工字第1010011954 號函檢送改善結果	
15	宜三十線義成橋拓寬工程	工務處	1010625	預先	譚德林	吳澤雄、陳坤成	87	<ol style="list-style-type: none"> 廠商辦理安全衛生教育訓練之相關課程，建議以涉及後續施作工項為優先。 簡報內容字體較小，清晰度不足，建議將字體調整適中，以利審閱。 主辦機關審核核定監造計畫情形，宜於簡報中摘要說明。 工程進度 S 曲線圖顯示實際進度曲線有由大幅超前漸趨縮減至接近預定進度曲線之趨勢，建議檢討原因加以改善，以避免實際進度轉向落後。 建議工地施作之所有結構設施或工項，均應有通道銜接或交通工具通達，以利施工查核。 承包商簡報內容建議增列有無重大工安事件之說明。 施工照片建議按照施工流程及檢驗停留點完整呈現，以彰顯施工團隊有確切落實品管工作。 混凝土圓柱或鑽心試體之抗壓試驗，建議參與會驗人員應共同檢視試體破壞情況，檢討混凝土骨材、混凝土緻密性及均勻性等之良窳，並記錄於其審核判定報告上，以供改進混凝土品質之參考。 混凝土 7 天強度試驗報告之審核判定，如不屬施工規範規定之查驗標準時，建議於審核判定文件上勿以「符合」表示，宜改以符合其試驗目的之適當用語表示。 建議可應用柏拉圖法則及魚骨特性要因圖辦理品管統計分析。 	1010702 府查字第10110100762 號函	1010727 主辦單位便簽改善結果	

16	宜蘭縣冬山鄉廣興國民小學『風雨操場新建工程』	宜蘭縣冬山鄉廣興國民小學	1010705	不預先	黃金鋒	陳宏榮、歐志銘	簡淑美	72	1. 請監造單位釐清鋼構相關施工標準據以監造及施工；如切割面品質、焊接品質、焊接縫容許寬度…等。 2. 建議將後續施作工項詳細列表，並配合提出趕工進度表積極趕工。 3. 承商勞安人員因故請假，請主辦單位確實依不預先查核之行程表內請假規定詳實審查該員請假相關資料，如未符合規定則請依約做出處置。	1010712 府查字第 1010108222 號函	1010803 廣小總 字第 1010002171 號 函改善結果	對廠商 辦理扣 款 對監 造辦理 扣款
17	宜蘭生物醫學產業特定專用區市地重劃及54號計畫道路工程	工務處	1010706	不預先	黃順昌	陳泮賢、徐得	沈恆光	81	1. 計畫書內核章表各相關人員僅簽章，並無簽署日期。 2. 建議於施工照片中標註日期。	101713 工程管字第 10100262740 號函	10186 府查字第 1010120693 號	
18	羅東運動公園棒球場整修工程第二期工程	宜蘭縣立體育場	1010724	不預先	張謙祥	吳元廷、陳坤成	黃奕凱	77	1. 應建立完整施工過程照片，照片中並應標示日期。 2. 主辦機關針對洗石子地坪已有要求改善之處，監造及承商請確實再予檢討改善。	1010731 府查字第 1010117680 號函	1010822 宜場總 字第 1010001744 號 函改善結果	對廠商 辦理扣 款 對監 造辦理 扣款
19	消防局頭城消防分隊新建工程	消防局	1010810	不預先	薛佰壽	生 曾泮賢、廖聖	簡淑美	76	1. 本案進度度落後，施工廠商除應依規定提出趕工計畫之外，各相關單位亦應盡速辦理工期展延及進度修正之程序。 2. 建議主辦單位應加強查核、督導或查驗之缺失追蹤改善情形，並詳實記錄。	1010820 府查字第 1010128584 號函	1010912 宜消企 字第 1010010051 號 函改善結果	對廠商 辦理扣 款
20	宜蘭地區污水下水道用戶接管第14標工程	工務處	1010814	不預先	曾樹根、戴岳志	黃中戴勝鵬	黃中戴勝鵬	81	1. 連接管坡度規劃設計 $\geq 1\%$ ，不能只有下限，亦應該有上限（誤差允許值）。 2. 施工廠商可施工部分已完成，尚有 20%之工程待施工，不能報『竣工』要求驗收，只能報停工，超過 6 個月（視合約規定），始能要求終止契約中途結算驗收。 3. 施工遭遇困難，科長不能解決，應該向上級報告，提升層次，尋求解決；如非依下水道法『公告接管區域』無法解決者，亦應斷然作為。 4. 下水道用戶接管工程縣政府為地方主管機關，施工遭遇困難應由高階長官主事協商相關事宜，積極尋求解決之道。 5. 縣府應加強宣導並請營建署下工處確實督導且作為爾後補助之依據。 6. 如遇地方百姓不願配合接管工程應有開會協商，切結並發文通知之程續。 7. 工程期內如遇不可抗拒之因素承商應依約先報停工，各方積極尋求解決之道，一定期間內仍無法解決承商方可依約終止契約。 8. 本工程無規定之大型工程告示牌，應速設置。 9. 本工程列入複查工程名單。	1010821 台內總字 第 1010287248 號函	宜蘭縣府 1010913 府工下 字第 1010142778 號 函改善結果	對廠商 辦理扣 款 對監 造辦理 扣款

21	宜蘭市歡樂鐵馬道景觀工程	工商旅遊處	1010821	不預先	譚德林	吳澤雄、李彤	簡淑美	78	1. A 工區廣場因居民抗爭阻撓施工且屢經溝通無效，建議主辦機關宜協助排除施工障礙，期使工程順利進行早日完工，以發揮工程應有的效益。 2. 混凝土圓柱或鑽心試體之抗壓試驗，建議參與會驗人員應共同檢視試體破壞情況，檢討混凝土骨材、混凝土緻密性及均勻性等之良窳，並記錄於其審核或判定報告上，以供改進混凝土品質之參考。	1010828 府查字第 1010132815 號函	1010919 主辦單位便箋改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
22	宜蘭地區污水下水道用戶接管第 17 標工程	工務處	1010907	預先	吳榮發	江漢全、鄭安	簡淑美	78	本工程監造由主辦機關自辦，監造計畫書製作及審查，建議建立內部審查機制，以免球員兼裁判。	1010917 府查字第 1010144763 號函	1011009 主辦單位便箋檢送改善結果	
23	宜蘭地區污水下水道第 14 標工程	工務處	1010907	預先	吳榮發	江漢全、鄭安	簡淑美	81	1. 本工程之圓形工作井位於地下 10 米深以上，承攬廠商雖有辦理勞工教育訓練及協議組織 12 次，亦於每日施工前告知危害及舉開工具箱會議，建議施作實際演練，俾於災害發生時熟悉救災方式。 2. 承攬廠商內部稽核目前作業係以承攬廠商一位經理稽核，建議應成立小組，由承攬廠商高層督導，並至少有二位成員。 3. 卷宗資料多時，宜整理該卷宗資料目錄，以利查閱，如：材料檢驗資料文件。	1010917 府查字第 1010144764 號函	1011005 主辦單位便箋改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款
24	龍潭湖風景特定區環境整備工程	工商旅遊處	1010912	不預先	林福壽	黃奕凱	黃奕凱	81	1. 公廁開關盒應注意臨時封口處置，避免雨水侵入管線。 2. 本案位於風景區，應加強工區管制與安全警示標誌以維遊客安全。 3. 樹穴回填土施作應注意高度。	101919 府查字第 1010146766 號函	1011012 主辦單位便箋檢送改善結果	
25	宜蘭市文化中心周邊人行環境三期改善工程	工務處	1010926	不預先	薛佰壽	吳澤雄、陳宏榮	簡淑美	77	1. 文化路人行道局部牆體可考慮與社區大學合作，作為藝術作品展示廊道。 2. 人行道上既有水溝清潔孔格柵蓋板建議改採透水混凝土鋪面蓋版施工。 3. 舊有水溝溝牆於澆置溝蓋板前應注意加強連結（打毛）。 4. 靠文化路側之人行道，大王椰子樹既有植栽穴高出人行道鋪面甚多，恐完成後覆土厚度不足，影響其穩定及生長，宜注意防範。 5. 混凝土圓柱或鑽心試體之抗壓試驗，建議參與會驗人員應共同檢視試體破壞面情況，檢討混凝土骨材、混凝土緻密性及均勻性等之良窳，並記錄於其審核或判定報告上，以供改進混凝土品質之參考。 6. 混凝土圓柱試體 7 天強度不應做合格與否之判斷，宜改以敘述強度合理性方式表達。 7. 抵石子顏色部分可再跟校方討論整體校園的一致性。	1011004 府查字第 1010156005 號函	1011026 主辦單位便箋檢送缺失改善結果	對廠商辦理扣款
26	宜蘭生物醫學產業特定專用區市地重劃及 54 號計畫道路工程	工務處	1010927	預先	吳清結	袁立群	袁立群	80	本工程道路附屬設施：號誌、標誌或指示牌等，建請考量採”共桿”方式辦理，避免道路完成後各項標誌林立(交通號誌、觀光指標或其他告示牌等)，嚴重影響都市景觀，建議主辦單位先行召集相關單位研商需求，儘可能採用共桿理念，減少標誌、號誌或指示牌等桿件過多之窘境。	1011004 府查字第 1010157016 號函	1011029 府工建字第 1010166598 號函改善結果	
27	101 年度宜蘭縣農地重劃區第一期農水路改善工程	地政處	1011026	不預先	譚德林	明	簡淑美	78	1 本工程有 5 處工區，分佈全縣各鄉鎮，惟預算僅編列 2 面工程告示牌，明顯不足，建議依實際需求編列。 2 建議拒馬橫材應加註施工單位及電話號碼。	1011102 府查字第 1010173419 號函	1011122 主辦單位便箋改善結果	對廠商辦理扣款 對監造辦理扣款

28	員山鄉、礁溪鄉、頭城鎮道路養護工程	工務處	1011114	不預先	吳榮發	吳澤財、陳宏	簡淑美	79	1. 本工程監造由主辦機關自辦，監造計畫書製作及審查，建議建立內部審查機制，以免球員兼裁判。 2. 查核當日之交通維護管制措施不足，建議道路工程施工時應確實執行交維措施，以維安全。	1011122 府查字第 1010185159 號函	1011213 主辦單位便箋改善結果	
29	冬山及利澤地區污水下水道用戶接管第 1 標工程	工務處	1011130	不預先	譚德林	譚鴻賢、游桂	袁立群	80	無	1011210 府查字第 1010194924 號函	1011225 工務處下水道科便箋改善結果	對廠商辦理扣款
30	台二線外環道（頭城鎮烏 1 號）新闢工程	工務處	1011207	預先	譚德林	譚鴻明、周崇	簡淑美	75	1. 預鑄自行車步道板表層混凝土因配合顏色，採用不同材質分層澆築，其厚度僅數公分，造成冷縫，建議辦理混凝土鑽心強度檢驗。 2. 預力拉線機校正報告為 100 年 4 月 11 日，迄今尚未施拉預力，是否超過有效期限，請查明。 3. 施工進度落近 20%，工期僅餘 3 個月，如何趕辦，應有積極作為。	1011217 府查字第 1010198697 號函	1020104 主辦單位便箋改善結果	對廠商辦理扣款
31	冬山及利澤地區污水下水道用戶接管第 2 標工程	工務處	1011213	預先		陳	黃奕凱	81	1. 夜間交維措施、相關警示應確實檢查並執行以維安全。 2. 校園內高壓地磚與人孔蓋介面應修整美觀為主。 3. 施工相片建立應有明確日期及執行內容標示。 4. 坡度調整如遇特殊環境下未依標準須有調整應有明確紀錄說明。	1011220 府查字第 1010201439 號函	1020111 主辦單位便箋檢送改善結果	
32	宜蘭地區污水下水道用戶接管第 18 標工程	工務處	1011213	預先		明、陳坤成	黃奕凱	79	1. 夜間交維措施、相關警示應確實檢查並執行以維安全。 2. 本案承商品管人員未依契約相關規定出席查核且未提出相關請假佐證資料，請主辦機關確實依約處置。	1011220 府查字第 1010201438 號函	1020115 主辦單位便箋檢送改善結果	
