

103 年度行政院列管案件進度季報

103 年 1 月至 3 月

國家發展委員會 彙編

資料來源：各計畫主管機關

目次

壹、概述.....	1
貳、列管案件執行情形一覽表	11
參、列管落後案件執行情形及原因分析表.....	24
肆、行政院及所屬一級機關公文時效分類統計表	35
一、一般公文時效統計表	38
二、立法委員質詢案件時效統計表.....	41
三、人民申請案件時效統計表	44
四、訴願案件時效統計表	47
五、人民陳情案件時效統計表	50
六、專案管制案件時效統計表	53
七、監察案件時效統計表	56

壹、概述

一、政院管制計畫

(一) 概況說明

1.為落實院屬各機關個案計畫執行，提升管理績效及施政品質，本院將各機關個案計畫分為行政院管制（簡稱政院管制）、部會管制及部會所屬機關自行管制（簡稱自行管制）三級納管。院屬各機關 103 年度截至 3 月底止計有 1,324 件個案計畫，年度可支用預算約新臺幣（以下同）8,977.24 億元，其中政院管制計畫 113 件（如圖 1），年度可支用預算 3,071.46 億元（如圖 2）。

圖1 三級管制計畫件數－依管制級別
-截至103年3月底止


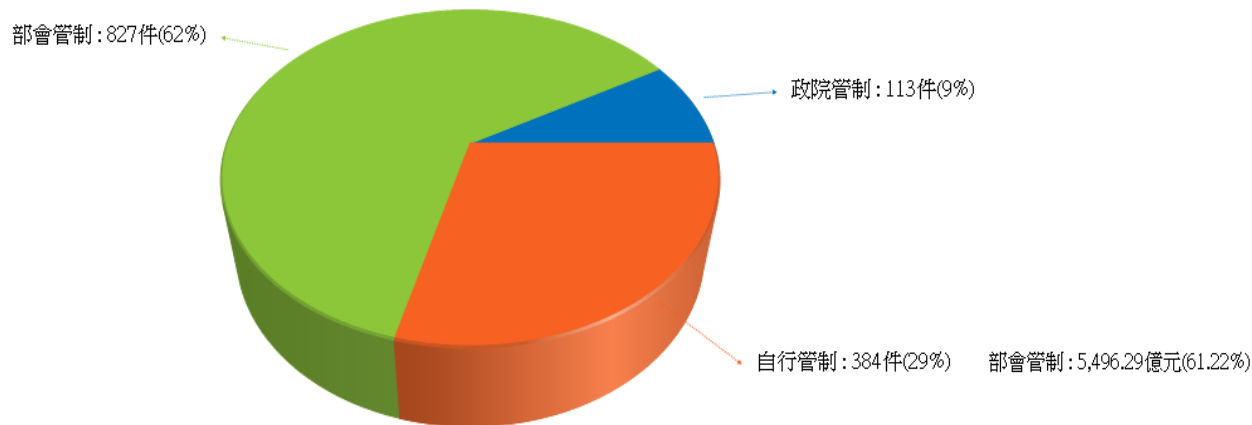


圖2 三級管制計畫年度可支用預算數－依管制級別
-截至103年3月底止

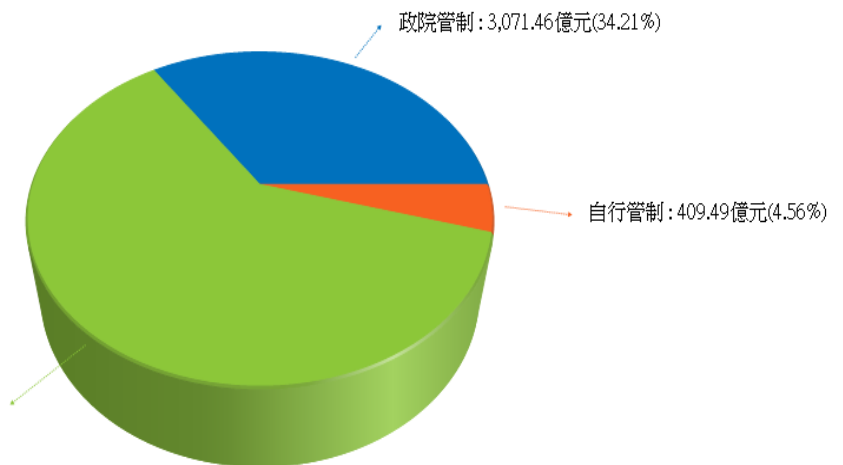

2. 行政院管制計畫以計畫類別區分如次（如圖 3 及圖 4）：

(1) 社會發展計畫計 29 件，年度可支用預算數計 1,447.73 億元，由國發會管制。

(2) 公共建設計畫計 37 件，年度可支用預算數計 1,162.82 億元，由國發會管制。

(3) 經濟發展計畫計 22 件，年度可支用預算數計 267.61 億元，由國發會管制。

(4) 科技發展計畫計 25 件，年度可支用預算數計 193.3 億元，由科技部管制。

圖3 行政院管制計畫件數－依計畫類別
-截至103年3月底止


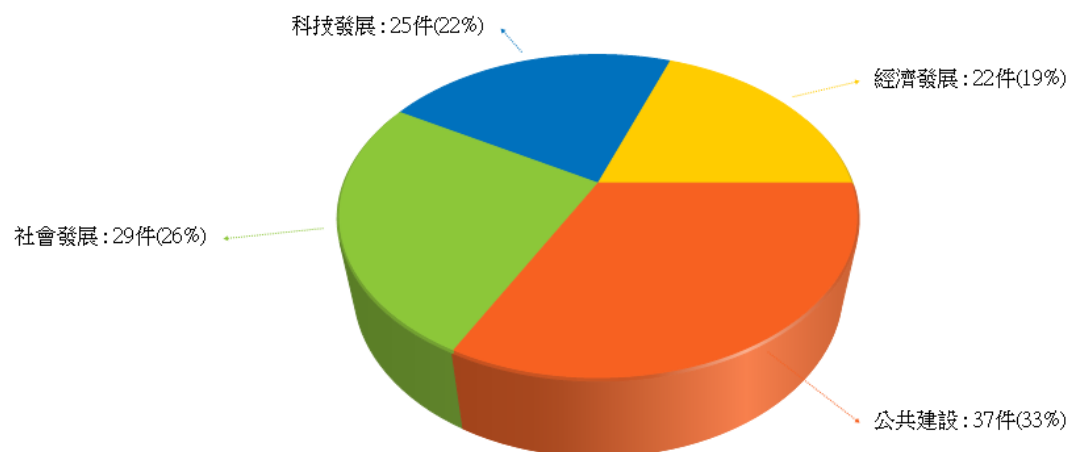



圖4 行政院管制計畫年度可支用預算數－依計畫類別
-截至103年3月底止

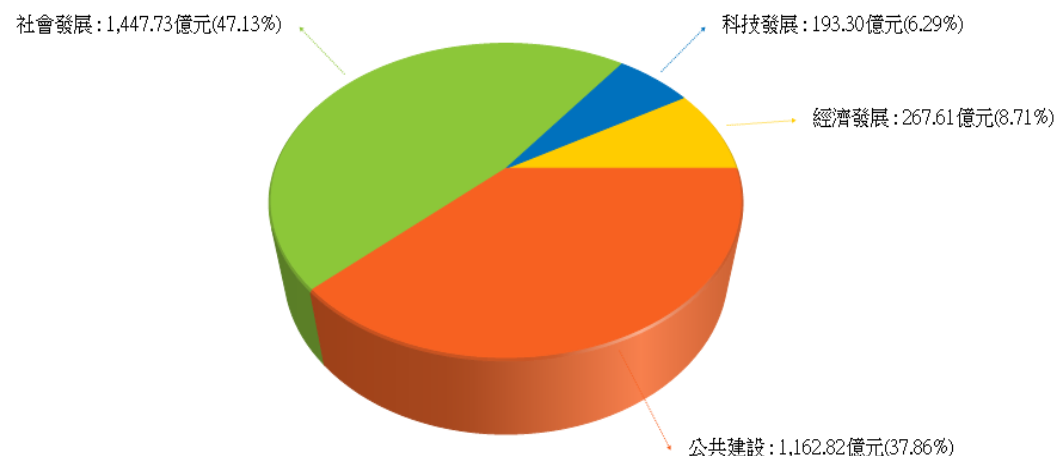

3. 政院管制計畫以機關別區分如次：


(1) 交通部主管 23 件政院管制計畫占大宗，其餘依序為經濟部（22 件）、衛福部（14 件）、農委會（14 件）、教育部（9 件）、文化部（8 件）、科技部（6 件）、內政部（5 件）、原民會（3 件）、客委會（3 件）、故宮（2 件）、勞動部（2 件）、環保署（1 件）及臺灣省諮議會（1 件）（如圖 5）。

圖5 政院管制計畫件數(截至103年3月底止)－依機關別

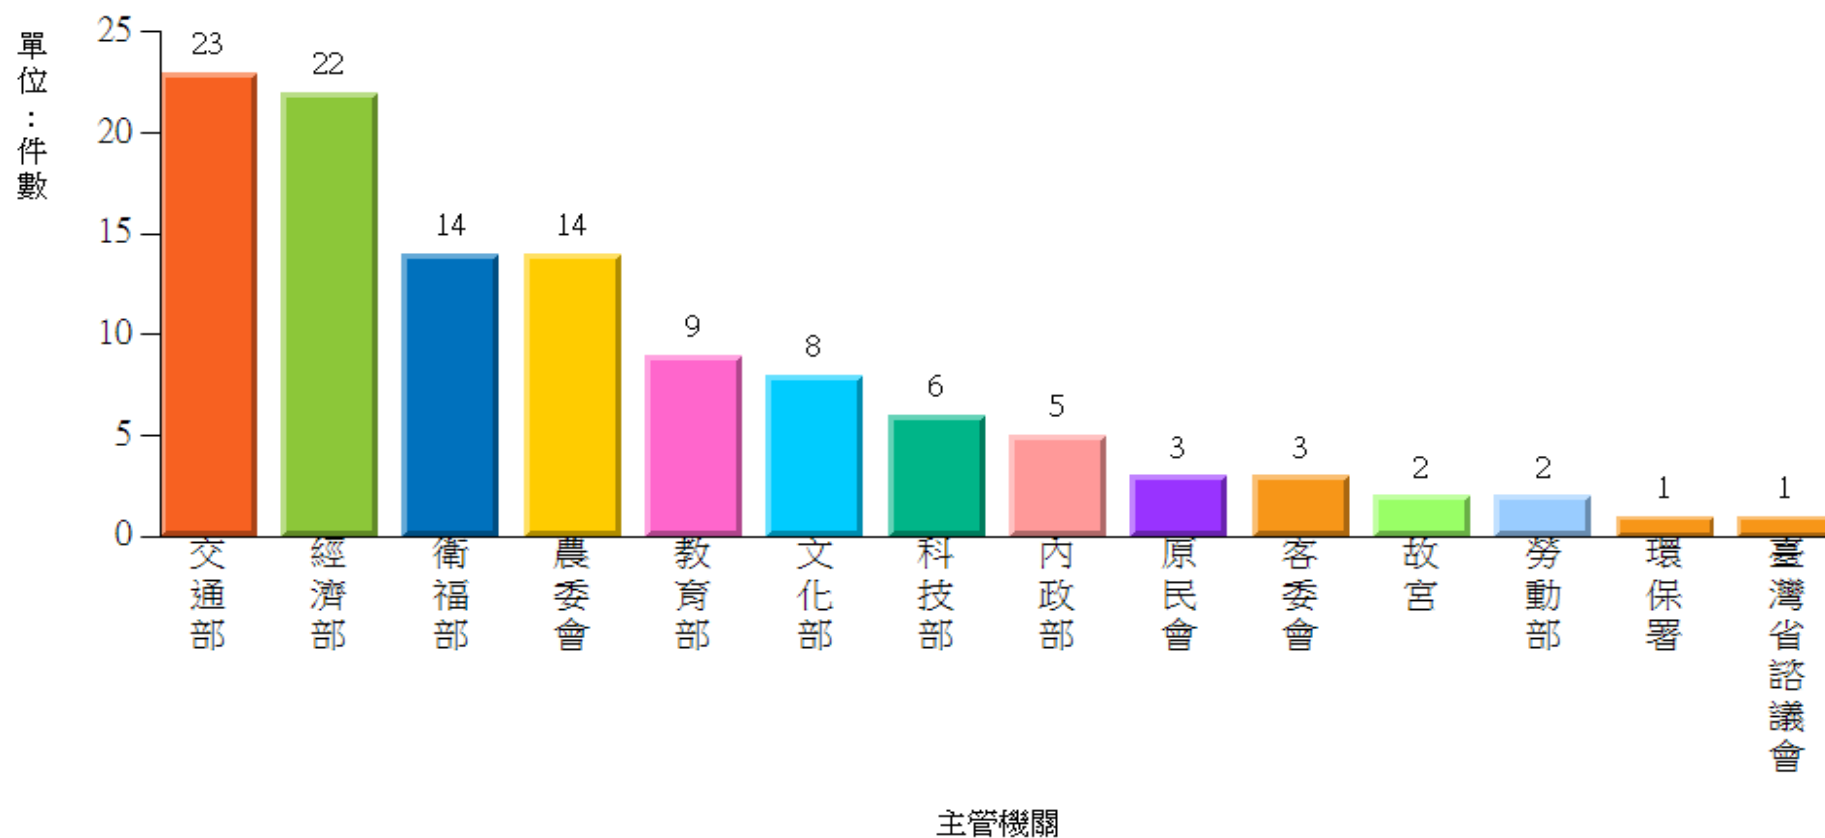

(2)衛福部政院管制計畫年度可支用預算數約 805.02 億元最多，其餘依序為交通部（706.14 億元）、教育部（564.19 億元）、經濟部（249.94 億元）、農委會（191.86 億元）、科技部（190.06 億元）、內政部（162.08 億元）、文化部（89.48 億元）、勞動部（41.8 億元）、原民會（31.98 億元）、客委會（17.83 億元）、故宮（16.7 億元）、環保署（4.34 億元）及臺灣省諮議會（0.04 億元）（如圖 6）。

圖6 政院管制計畫年度可支用預算數(截至103年3月底止)－依機關別

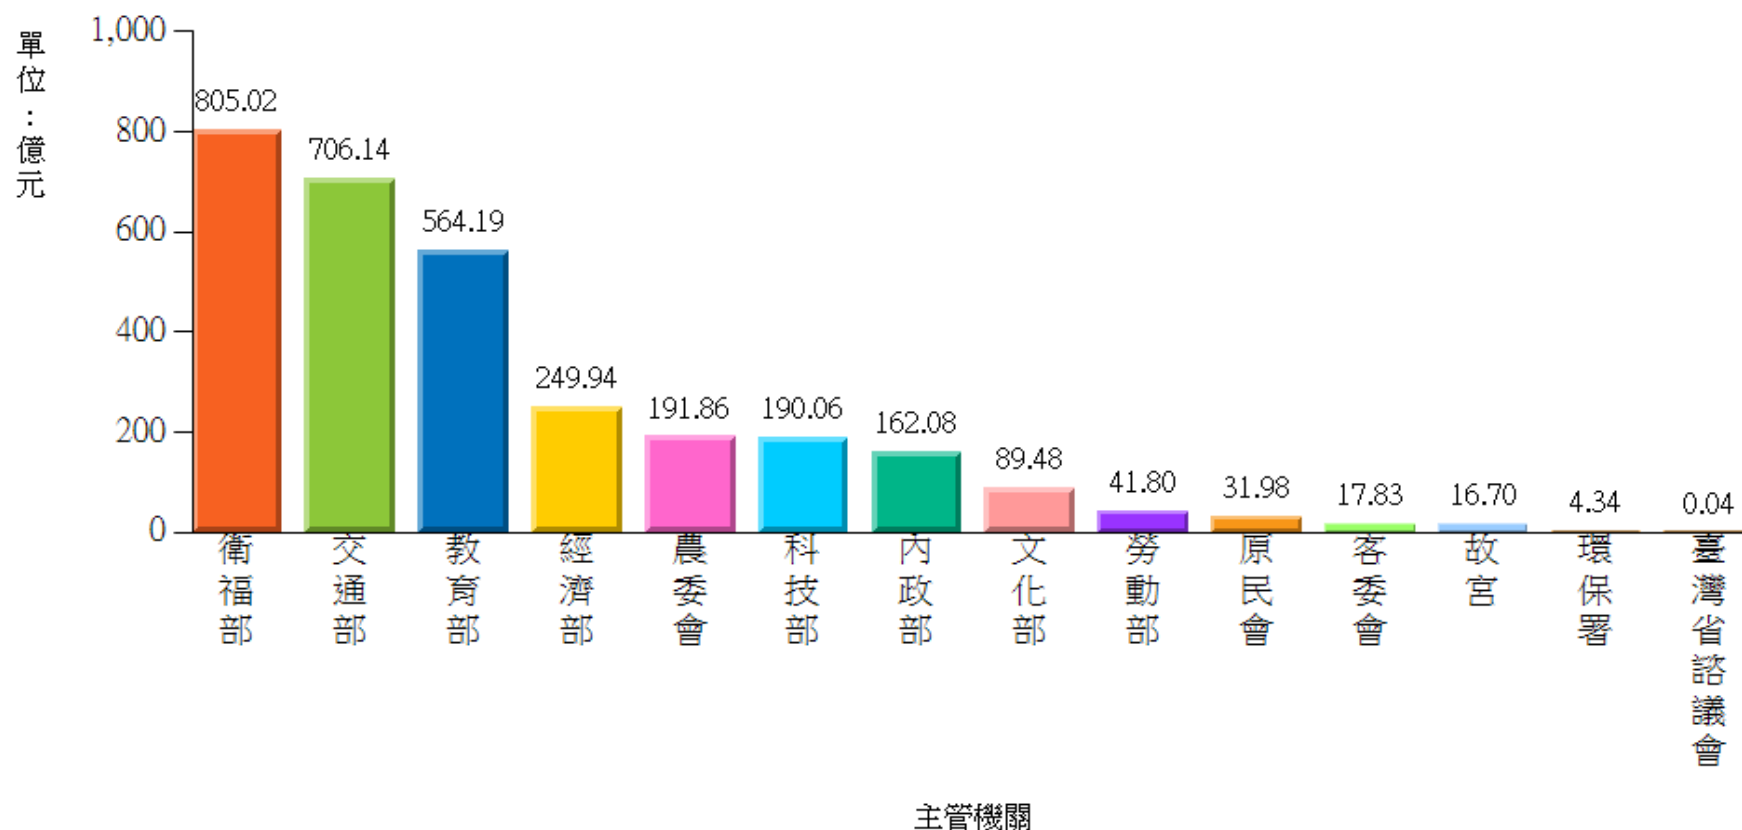

(二) 執行進度(如表 1)(列管案件執行情形詳如第 11 頁至第 23 頁)

1.總累計執行進度「超前」(實際進度較預定進度超前 1 個百分點)者 9 件,占 7.96%。

2.總累計執行進度「符合」(實際進度在預定進度 ± 1 個百分點範圍內)者 98 件,占 86.73%。

3.總累計執行進度「落後」(實際進度較預定進度落後逾 1 個百分點)者 6 件,占 5.31%,主要落後原因之比率以「規劃設計」占 33.34%最多,其次「行政作業」、「土地取得」、「拆遷補償」、「招標作業」、「法令規章」及「其他」等原因均占 11.11%(如表 2)(列管落後案件執行情形及原因分析詳如第 24 頁至第 34 頁)。

表 1 政院管制計畫總累計執行進度狀態統計表(截至 103 年 3 月底止)

項次	主管機關	管制案件數	執行進度		
			超前	符合	落後
1	內政部	5	0	5	0
2	教育部	9	0	9	0
3	經濟部	22	1	21	0
4	交通部	23	2	19	2
5	文化部	8	4	4	0
6	衛福部	14	0	14	0
7	環保署	1	0	1	0
8	故宮	2	0	1	1
9	科計部	6	0	6	0
10	農委會	14	0	12	2
11	勞動部	2	1	1	0
12	原民會	3	1	1	1
13	客委會	3	0	3	0
14	臺灣省諮議會	1	0	1	0
合計		113	9	98	6
百分比		100%	7.96%	86.73%	5.31%


表 2 政院管制計畫落後原因分析表(截至 103 年 3 月底止，總累計落後幅度：實際進度較預定進度落後逾 1 個百分點)

項次	主管機關	計畫名稱	總累計落後幅度 (個百分點)	落後原因													合計
				行政作業	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗工作業	計畫變更	人力需求	預算編列	法令規章	天然因素	其他	
1	交通部	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第 1 階段路線)	25.21		*		*										2
2	交通部	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	5.07			*		*									2
3	故宮	故宮南部院區籌建	5.16		*												1
4	農委會	漁業多元化經營建設	1.82		*											*	2
5	農委會	流域綜合治理計畫-上游坡地水土保持及治山防洪	1.01											*			1
6	原民會	原住民族住宅改善計畫	3.27	*													1
小 計				1	3	1	1	1						1		1	9
落後原因之比率(%)				11.11	33.34	11.11	11.11	11.11						11.11		11.11	100

(三) 預算支用情形 (截至 103 年 3 月底止)


1. 預算支用比 (年累計實際支用數/年累計預定支用數)：各機關政院管制計畫年累計預定支用數合計約 575.78 億元，年累計實際支用數合計約 459.09 億元，整體預算支用比平均約為 80%。其中以經濟部(146%)最高，惟仍有支用比未達 80%者，依序為文化部(67%)、故宮(57%)及交通部(37%)等 3 個機關 (如圖 7)。

圖7 政院管制計畫年累計預算支用比(截至103年3月底止)－依機關別

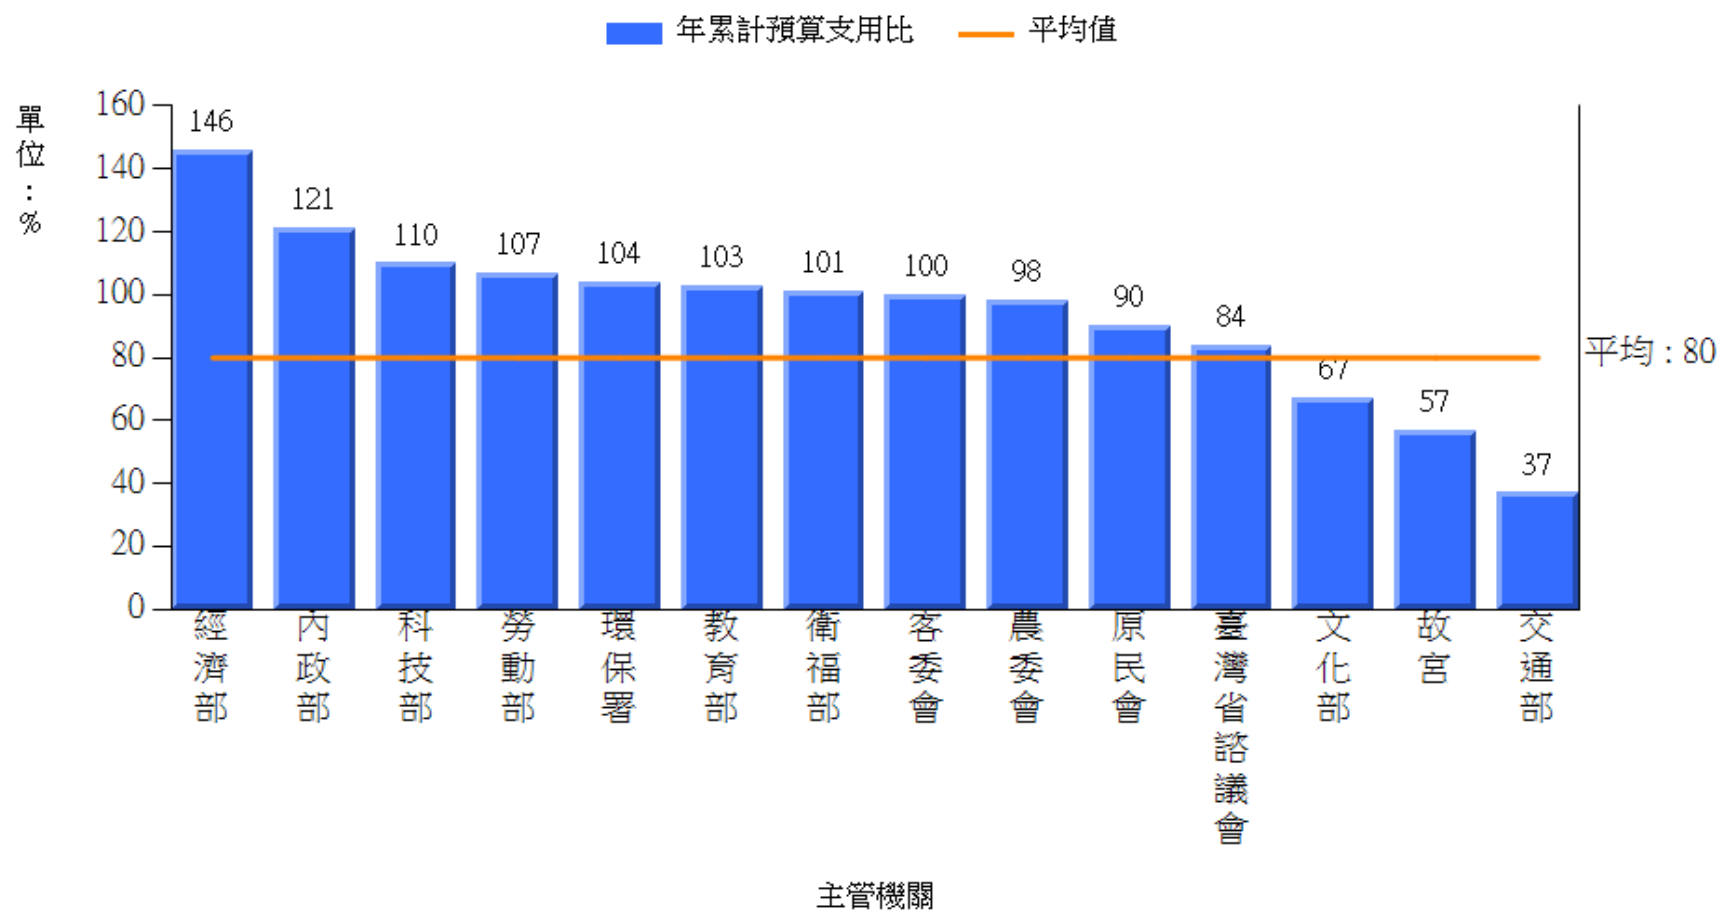


2.預算執行率（年累計實際執行數/年累計預定支用數）：各機關政院管制計畫年累計預定支用數合計約 575.78 億元，年累計實際執行數合計約 586.96 億元（含實際支用數 459.09 億元、已執行應付未付數 53.05 億元、節餘數 0.44 億元及工程預付數 74.38 億元），整體預算執行率平均為 102%。其中以經濟部(216%)最高，惟仍有預算執行率未達 102%者，依序為衛福部(101%)、臺灣省諮議會(98%)、文化部(96%)、原民會(90%)、交通部(86%)及故宮(86%)等 6 個機關（如圖 8）。

圖8 政院管制計畫年累計預算執行率(截至103年3月底止)－依機關別

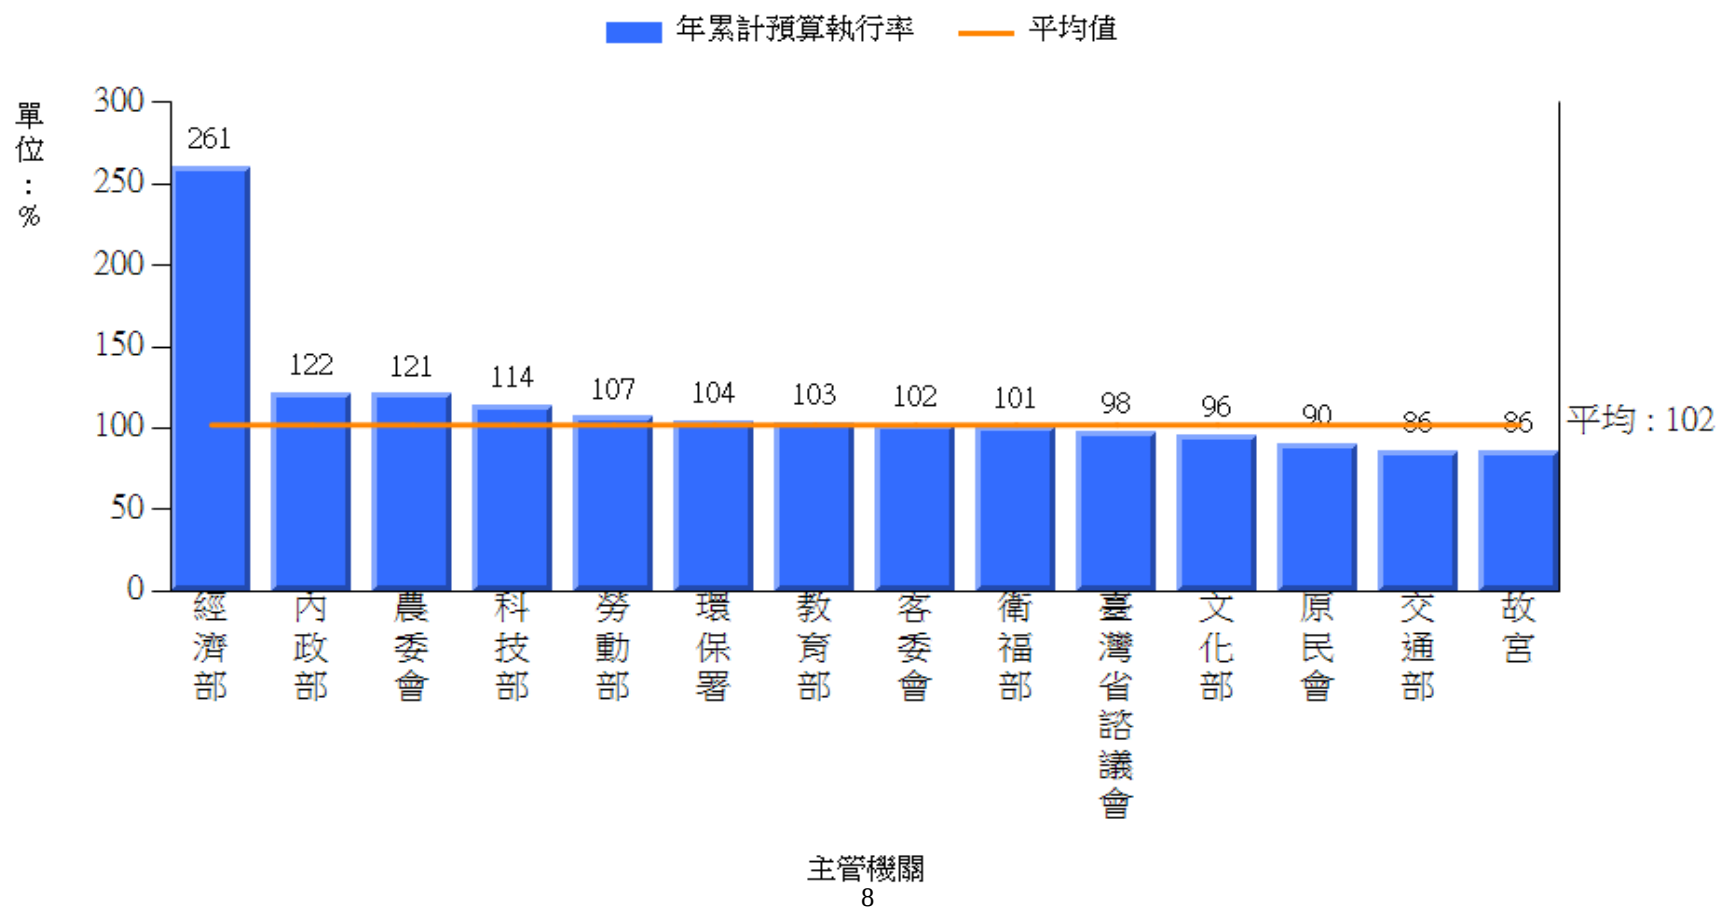

3.年度預算達成率（年累計實際執行數/年度可支用預算數）：各機關政院管制計畫年度可支用預算數 3,071.46 億元，年累計實際執行數合計約 586.96 億元（含實際支用數 459.09 億元、已執行應付未付數 53.05 億元、節餘數 0.44 億元及工程預付數 74.38 億元），整體預算達成率平均為 19%。其中以原民會(31%)最高，惟仍有預算執行率未達 19%者，依序為臺灣省諮議會(12%)、客委會(11%)、科技部(10%)、環保署(9%)、內政部(6%)、文化部(6%)、勞動部(6%)、農委會(5%)及故宮(1%)等 9 個機關（如圖 9）。

圖9 政院管制計畫年度預算達成率(截至103年3月底止)－依機關別

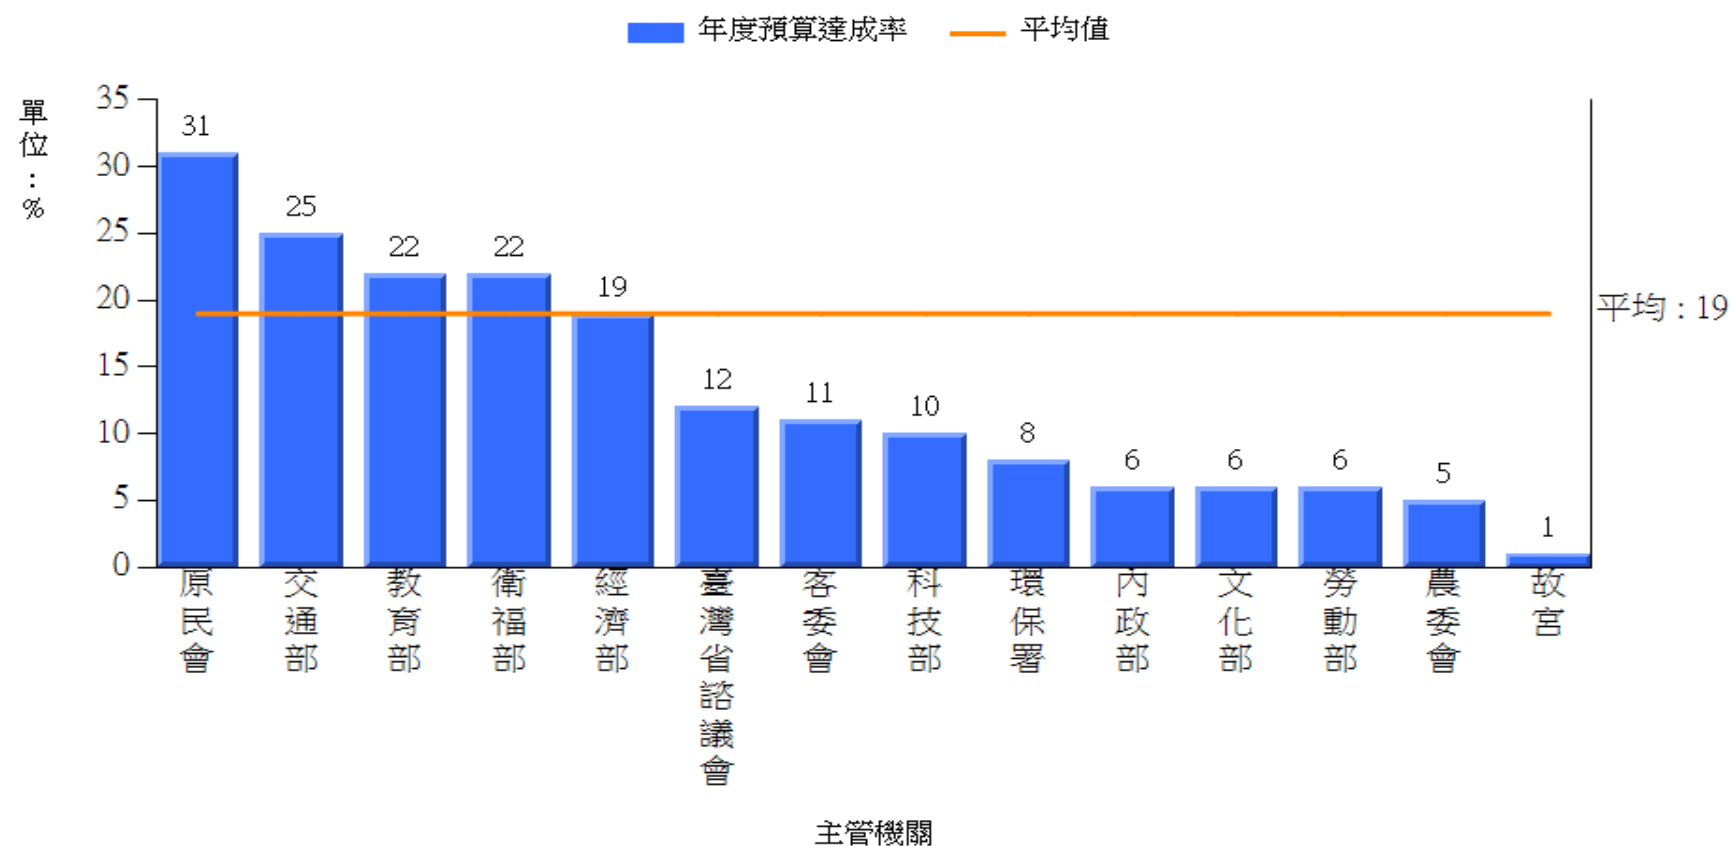

二、院屬各一級機關 103 年第 1 季 7 類公文處理時效（詳如第 35 頁至第 58 頁）

- （一）一般公文發文平均使用日數之平均值為 2.30 日，較上一季月平均值 2.24 日，增加 0.06 日。
- （二）立法委員質詢已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 97.01%，較上一季月平均值 97.85%，減少 0.84 個百分點。
- （三）人民申請案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 98.64%，較上一季月平均值 98.84%，減少 0.20 個百分點。
- （四）訴願案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 99.34%，較上一季月平均值 99.58%，減少 0.24 個百分點。
- （五）人民陳情案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 95.37%，較上一季月平均值 96.13%，減少 0.76 個百分點。
- （六）專案管制案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 99.50%，較上一季月平均值 99.15%，增加 0.35 個百分點。
- （七）監察案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 82.80%，較上一季月平均值 86.08%，減少 3.28 個百分點。

貳、列管案件執行情形一覽表 (截至 103 年 3 月底止)

※執行進度比較：實際進度小於預定進度時，以負號(-)表示。

※進度燈號：○代表超前(總累計執行進度超前 1 個百分點)；◎代表符合(總累計執行進度在±1 個百分點範圍內)；⊙代表落後(總累計執行進度落後逾 1 個百分點)。

※預算執行率=(實際支用數+已執行應付未付數+節餘數+工程預付數)/預定支用數。

※預算達成率=(實際支用數+已執行應付未付數+節餘數+工程預付數)/本年度可支用預算數。

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可支用預算數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定(%) (A)	實際(%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
1	內政部	污水下水道建設計畫 (98/01/01~103/12/31)	公共建設	13,184,230	總累計	86.12	86.31	0.19	72,700,470	72,200,040	99.31	99.31	7.30	◎
					年累計	6	7.3	1.30	791,054	962,155	121.63			
2	內政部	智慧綠建築推動方案 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	207,314	總累計	54.09	54.09	符合	404,184	404,184	100.00	100.00	1.32	◎
					年累計	16.35	16.35	符合	2,742	2,742	100.00			
3	內政部	城鎮風貌型塑整體計畫 (102/01/01~105/12/31)	經濟發展	2,722,400	總累計	31.41	31.41	符合	2,230,583	2,223,245	99.67	100.02	1.14	◎
					年累計	25.62	25.62	符合	30,414	23,076	75.87			
4	內政部	災害防救深耕第 2 期計畫 (103/01/01~106/12/31)	社會發展	65,817	總累計	4	4	符合	2,805	3,623	129.16	166.63	7.10	◎
					年累計	20	20	符合	2,805	3,623	129.16			
5	內政部	地籍清理第 2 期實施計畫 (103/01/01~108/12/31)	社會發展	28,446	總累計	3.12	3.52	0.40	3,447	10,518	305.13	305.51	37.02	◎
					年累計	19.5	22	2.50	3,447	10,518	305.13			
6	教育部	5 歲幼兒免學費教育計畫 (99/01/01~104/12/31)	社會發展	7,494,264	總累計	82.08	82.08	符合	29,232,044	29,230,044	99.99	99.99	27.74	◎
					年累計	20.75	20.75	符合	2,080,800	2,078,800	99.90			
7	教育部	邁向頂尖大學計畫 (100/04/01~105/12/31)	社會發展	8,608,660	總累計	61	61	符合	35,981,319	29,524,824	82.06	82.06	25.00	◎
					年累計	30	30	符合	2,152,165	2,152,165	100.00			
8	教育部	十二年國民基本教育實施計畫 (100/09/20~103/12/31)	社會發展	28,729,890	總累計	76.97	77.49	0.52	76,598,988	78,130,840	102.00	102.00	21.70	◎
					年累計	23.23	24.99	1.76	5,884,095	6,233,768	105.94			

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
9	教育部	獎勵大學教學卓越計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	4,500,000	總累計	30.63	30.63	符合	6,063,580	1,605,579	26.48	26.48	35.68	◎
					年累計	22.5	22.5	符合	1,563,580	1,605,579	102.69	102.69		
10	教育部	優質教保發展計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	2,331,600	總累計	23	23	符合	2,069,100	2,079,004	100.48	100.48	10.14	◎
					年累計	15	15	符合	226,500	236,404	104.37	104.37		
11	教育部	第二期技職教育再造計畫 (102/01/01~106/12/31)	社會 發展	4,050,000	總累計	25.6	25.6	符合	42,650	38,950	91.32	91.32	0.25	◎
					年累計	28	28	符合	13,700	10,000	72.99	72.99		
12	教育部	推動對外華語教育 (103/01/01~109/12/31)	社會 發展	200,000	總累計	0.01	0.01	符合	340	300	88.24	88.24	0.15	◎
					年累計	0.17	0.15	-0.02	340	300	88.24	88.24		
13	教育部	2017 臺北世界大學運動會場 館興整建計畫 (103/01/01~106/08/31)	公共 建設	394,000	總累計	1.5	1.5	符合	0	0	符合	0.00	0.00	◎
					年累計	15	15	符合	0	0	符合	0.00		
14	教育部	教育學術研究骨幹網路頻寬 效能提升計畫 (103/01/01~103/12/31)	科技 發展	110,780	總累計	15	15	符合	0	0	符合	0.00	0.00	◎
					年累計	15	15	符合	0	0	符合	0.00		
15	經濟部	石門水庫及其集水區整治計 畫--穩定供水設施及幹管改 善(95/01/01~104/12/31)	公共 建設	868,861	總累計	95.13	95.13	符合	6,377,725	6,303,331	98.83	99.58	6.18	◎
					年累計	12.21	14.66	2.45	49,600	5,791	11.68	108.25		
16	經濟部	石門水庫及其集水區整治計 畫-緊急供水工程暨水庫更 新改善(95/01/01~104/06/30)	公共 建設	1,627,456	總累計	85.84	86.06	0.22	7,392,245	7,020,686	94.97	99.57	32.62	◎
					年累計	7.42	9.22	1.80	369,630	191,184	51.72	143.60		
17	經濟部	易淹水地區水患治理計畫- 河川排水及事業海堤改善 (95/07/01~103/12/31)	公共 建設	4,337,904	總累計	99.05	99.35	0.30	73,828,331	70,613,034	95.64	97.82	63.74	◎
					年累計	4.6	11.7	7.10	200,000	1,157,404	578.70	1,382.59		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
18	經濟部	曾文南化烏山頭水庫治理及 穩定南部地區供水計畫(經 濟部水利署部分) (99/05/12~105/05/11)	公共 建設	3,209,757	總累計	40.46	40	-0.46	4,628,240	4,662,287	100.74	101.65	11.75	◎
					年累計	19.69	20.56	0.87	301,000	335,047	111.31	125.33		
19	經濟部	曾文南化烏山頭水庫治理及 穩定南部地區供水計畫-台 水公司部分 (99/07/01~105/04/30)	公共 建設	3,117,000	總累計	20.63	19.83	-0.80	2,918,855	2,363,786	80.98	83.62	5.63	◎
					年累計	5.7	5.71	0.01	137,922	98,506	71.42	127.25		
20	經濟部	因應貿易自由化加強輔導型 產業之共通性輔導計畫 (100/01/01~103/12/31)	科技 發展	164,915	總累計	80.13	80.13	符合	640,855	665,592	103.86	103.86	15.00	◎
					年累計	20.51	20.51	符合	0	24,737	符合	0.00		
21	經濟部	南部新興產業發展關鍵技術 計畫 (4/4)(100/01/01~103/12/31)	科技 發展	164,813	總累計	81.25	81.25	符合	740,670	743,225	100.34	100.43	23.76	◎
					年累計	25	25	符合	36,000	38,555	107.10	108.76		
22	經濟部	智慧型自動化產業推動計畫 (101/04/01~104/12/31)	科技 發展	132,200	總累計	33.69	33.69	符合	317,720	317,937	100.07	100.07	11.32	◎
					年累計	12.3	12.3	符合	14,400	14,971	103.97	103.97		
23	經濟部	數位內容創新與整合推動計 畫(101/01/01~104/12/31)	科技 發展	206,321	總累計	55.36	55.36	符合	707,408	705,532	99.73	99.91	11.57	◎
					年累計	21.42	21.42	符合	24,522	22,646	92.35	97.38		
24	經濟部	雲端運算系統及軟體技術研 發計畫 (101/01/01~103/12/31)	科技 發展	211,822	總累計	75.25	75.25	符合	649,752	656,632	101.06	101.06	20.59	◎
					年累計	25	25	符合	36,738	43,618	118.73	118.73		
25	經濟部	傳統產業加值轉型推動計畫 (3/3)(101/01/01~103/12/31)	科技 發展	172,480	總累計	69.64	69.65	符合	476,630	481,035	100.92	100.92	8.43	◎
					年累計	10.72	10.72	符合	10,139	14,544	143.45	143.45		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可支用預算數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定(%) (A)	實際(%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比(%) (D/C)			
26	經濟部	機械與系統領域工業基礎技術研究計畫 (2/4)(102/01/01~105/12/31)	科技發展	181,503	總累計	31.25	31.25	符合	240,678	255,796	106.28	106.28	18.06	◎
					年累計	25	25	符合	17,663	32,781	185.59	185.59		
27	經濟部	民生福祉領域工業基礎技術研究計畫 (2/4)(102/01/01~105/12/31)	科技發展	281,916	總累計	31.25	31.25	符合	378,708	389,444	102.83	104.38	19.98	◎
					年累計	25	25	符合	39,726	50,462	127.03	141.78		
28	經濟部	小型企業創新研發計畫 (SBIR)(102/01/01~105/12/31)	科技發展	684,813	總累計	28.75	28.75	符合	739,802	739,771	100.00	100.00	9.49	◎
					年累計	15	15	符合	65,000	64,969	99.95	99.95		
29	經濟部	A+企業創新研發淬鍊計畫 (102/01/01~105/12/31)	科技發展	2,062,983	總累計	27.5	27.5	符合	2,721,351	2,720,143	99.96	99.96	9.64	◎
					年累計	10	10	符合	200,000	198,792	99.40	99.40		
30	經濟部	台灣產業形象廣宣計畫 (103/01/01~103/12/31)	經濟發展	830,000	總累計	5	5	符合	0	0	符合	0.00	0.00	◎
					年累計	5	5	符合	0	0	符合	0.00		
31	經濟部	服務業創新研發計畫 (SIIR)(103/01/01~106/12/31)	科技發展	159,158	總累計	3.3	3.3	符合	0	0	符合	0.00	0.00	◎
					年累計	16.5	16.5	符合	0	0	符合	0.00		
32	經濟部	提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫 (103/01/01~103/12/31)	經濟發展	3,876,866	總累計	23.2	28.8	5.60	0	0	符合	0.00	0.00	○
					年累計	23.2	28.8	5.60	0	0	符合	0.00		
33	經濟部	協助傳統產業技術開發計畫 (103/01/01~106/12/31)	科技發展	217,098	總累計	3.78	3.78	符合	51,154	60,362	118.00	118.00	27.80	◎
					年累計	15.75	15.75	符合	51,154	60,362	118.00	118.00		
34	經濟部	標竿新產品創新研發輔導計畫 (103/01/01~106/12/31)	科技發展	1,358,997	總累計	8.36	8.36	符合	114,847	140,850	122.64	122.64	10.36	◎
					年累計	33.45	33.43	-0.02	114,847	140,850	122.64	122.64		
35	經濟部	智慧手持裝置核心技術攻堅計畫 (1/4)(103/01/01~106/12/31)	科技發展	813,522	總累計	3.47	3.47	符合	137,668	152,565	110.82	121.31	20.53	◎
					年累計	17.35	17.35	符合	137,668	152,565	110.82	121.31		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率 (%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
36	經濟部	石化產業高值化系統技術與應用發展計畫 (1/4)(103/01/01~106/12/31)	科技發展	313,386	總累計	5.88	5.88	符合	48,655	54,115	111.22	116.25	18.05	◎
					年累計	23.5	23.5	符合	48,655	54,115	111.22	116.25		
37	交通部	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線 (88/07/01~103/12/31)	公共建設	3,697,521	總累計	99.24	99.1	-0.14	132,865,882	132,863,882	100.00	100.00	18.74	◎
					年累計	24.33	24.33	符合	694,872	692,872	99.71	99.71		
38	交通部	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 (92/06/01~106/12/31)	公共建設	6,873,588	總累計	92.34	92.34	符合	88,024,881	85,280,668	96.88	99.05	47.17	◎
					年累計	24.01	24	-0.01	4,019,252	1,329,910	33.09	80.67		
39	交通部	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫松山線 (93/01/01~105/12/31)	公共建設	3,724,655	總累計	94.75	94.8	0.05	38,918,574	38,894,164	99.94	99.94	18.53	◎
					年累計	26.91	27.29	0.38	714,667	690,257	96.58	96.58		
40	交通部	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第1階段路線)(93/01/01~103/12/31)	公共建設	8,713,000	總累計	100	74.79	-25.21	24,104,941	24,105,383	100.00	100.00	8.97	◎
					年累計	17.57	15.96	-1.61	781,256	781,698	100.06	100.06		
41	交通部	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 (94/01/01~105/10/31)	公共建設	9,499,672	總累計	48.26	43.19	-5.08	9,949,486	4,137,592	41.59	89.78	51.59	◎
					年累計	19	16.72	-2.28	5,917,859	105,965	1.79	82.82		
42	交通部	臺北機廠遷建建設計畫 (94/06/01~104/12/31)	公共建設	1,077,305	總累計	86.05	85.86	-0.19	13,071,088	12,487,153	95.53	95.53	0.84	◎
					年累計	22.38	22.09	-0.29	30,000	9,083	30.28	30.28		
43	交通部	高雄市區鐵路地下化計畫 (94/07/01~106/12/31)	公共建設	6,084,454	總累計	84.87	84.87	符合	22,743,780	21,739,526	95.58	99.22	33.90	◎
					年累計	26.6	26.6	符合	2,062,850	1,236,835	59.96	100.00		
44	交通部	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫(95/02/13~106/03/31)	公共建設	5,480,387	總累計	67.05	67.34	0.29	18,270,000	16,528,907	90.47	98.70	28.21	◎
					年累計	23.51	25.65	2.14	1,693,969	42,294	2.50	91.28		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率 (%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
45	交通部	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫 (97/04/01~104/03/31)	公共建設	5,899,348	總累計	90.47	89.69	-0.78	19,095,774	17,880,906	93.64	98.59	28.71	◎
					年累計	37.22	36.3	-0.92	1,813,348	748,480	41.28	93.40		
46	交通部	西濱快速公路後續建設計畫 (98/01/01~108/12/31)	公共建設	5,996,377	總累計	43.83	43.4	-0.43	23,078,984	22,864,510	99.07	99.07	8.36	◎
					年累計	16.66	13.25	-3.41	625,278	500,635	80.07	80.18		
47	交通部	東西向快速公路健全路網改善計畫(98/01/01~105/12/31)	公共建設	1,984,274	總累計	61.19	63.29	2.10	17,506,163	17,150,791	97.97	98.39	16.51	○
					年累計	29.45	35.78	6.33	599,533	253,568	42.29	54.64		
48	交通部	環島鐵路整體系統安全提昇計畫(98/01/01~103/12/31)	公共建設	729,637	總累計	100	99.82	-0.18	14,949,000	14,245,071	95.29	95.29	3.52	◎
					年累計	20.37	22.2	1.83	1,455	25,708	1,766.87	1,766.87		
49	交通部	基隆火車站都市更新站區遷移計畫(98/04/01~104/04/30)	公共建設	1,320,670	總累計	86.55	85.87	-0.68	2,473,533	1,254,899	50.73	55.82	17.26	◎
					年累計	14.68	14.68	符合	196,420	102,036	51.95	116.04		
50	交通部	台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫(99/12/16~106/12/31)	公共建設	7,017,175	總累計	28.09	27.2	-0.89	10,921,415	10,084,192	92.33	92.72	13.02	◎
					年累計	18.27	16.51	-1.76	1,281,727	871,792	68.02	71.27		
51	交通部	災害性天氣監測與預報作業建置計畫 (99/01/01~104/12/31)	科技發展	296,122	總累計	69.43	69.43	符合	1,082,395	1,082,395	100.00	100.00	4.12	◎
					年累計	25	25	符合	12,212	12,212	100.00	100.00		
52	交通部	曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(交通部公路總局部份)(99/01/01~104/12/31)	公共建設	50,000	總累計	85.84	85.84	符合	566,000	566,000	100.00	100.00	12.00	◎
					年累計	12	12	符合	6,000	6,000	100.00	100.00		
53	交通部	整備觀光遊憩設施建設計畫(101/01/01~104/12/31)	經濟發展	650,000	總累計	51.13	51.13	符合	1,299,992	1,299,992	100.00	100.00	0.00	◎
					年累計	4.5	4.5	符合	0	0	符合	0.00		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率 (%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
54	交通部	北海岸及觀音山國家風景區 建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	196,300	總累計	50.84	51.68	0.84	291,440	286,611	98.34	98.34	11.93	◎
					年累計	30.48	33.39	2.91	28,240	23,411	82.90	82.90		
55	交通部	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	204,317	總累計	45.17	45.17	符合	263,198	255,076	96.91	97.06	4.54	◎
					年累計	6.87	6.85	-0.02	9,000	8,895	98.83	103.14		
56	交通部	大鵬灣國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	216,000	總累計	53.75	53.75	符合	540,334	539,980	99.93	99.93	16.93	◎
					年累計	15	15	符合	36,930	36,576	99.04	99.04		
57	交通部	日月潭國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	284,274	總累計	55.75	56.76	1.01	571,481	562,272	98.39	98.39	5.33	○
					年累計	23	27.03	4.03	14,990	15,155	101.10	101.10		
58	交通部	阿里山國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	352,948	總累計	61.42	62.41	0.99	557,646	543,078	97.39	98.30	19.68	◎
					年累計	41.67	45.65	3.98	64,688	64,368	99.51	107.40		
59	交通部	茂林國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	265,800	總累計	59.61	59.49	-0.12	342,546	327,537	95.62	95.85	13.14	◎
					年累計	20.33	19.91	-0.42	54,050	34,141	63.17	64.62		
60	文化部	臺中大都會歌劇院興建計畫 (92/01/01~104/12/31)	公共建設	1,270,000	總累計	68	97.75	29.75	3,078,500	2,540,000	82.51	82.51	15.04	○
					年累計	15	15	符合	191,000	191,000	100.00	100.00		
61	文化部	北部流行音樂中心計畫 (94/01/01~105/12/31)	公共建設	747,178	總累計	10.93	41.82	30.89	323,602	277,043	85.61	91.79	2.68	○
					年累計	24.9	24.9	符合	0	0	符合	0.00		
62	文化部	衛武營藝術文化中心興建計畫 (94/01/01~105/10/31)	公共建設	3,188,003	總累計	80.69	82.79	2.10	6,341,247	4,553,979	71.82	73.18	4.48	○
					年累計	5.99	3.35	-2.64	155,827	56,562	36.30	91.75		
63	文化部	文化創意產業發展(第二期) 第三次修正計畫 (97/01/01~103/12/31)	經濟發展	672,199	總累計	90.87	94.98	4.10	7,072,766	6,126,448	86.62	86.68	2.30	○
					年累計	8.67	2.62	-6.05	55,582	11,485	20.66	27.86		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
64	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫 (98/10/01~104/12/31)	公共 建設	1,257,443	總累計	48.82	48.82	符合	463,835	171,330	36.94	45.56	3.51	◎
					年累計	15	15	符合	51,000	4,157	8.15	86.58		
65	文化部	歷史與文化資產維護發展 (第二期)計畫 (99/01/11~104/12/31)	經濟 發展	755,806	總累計	55.93	55.92	-0.01	2,335,756	2,345,730	100.43	100.78	7.96	◎
					年累計	6.13	8.14	2.01	41,979	51,953	123.76	143.25		
66	文化部	高畫質電視推展計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	408,003	總累計	55	55	符合	1,324,037	1,324,037	100.00	100.00	0.00	◎
					年累計	20	20	符合	0	0	符合	0.00		
67	文化部	價值產值化-文創產業價值 鏈建構與創新 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	649,083	總累計	19.52	19.51	-0.01	295,369	256,708	86.91	86.91	8.80	◎
					年累計	31.73	31.7	-0.03	59,699	57,115	95.67	95.67		
68	衛福部	父母未就業家庭育兒津貼實 施計畫 (101/01/01~104/12/31)	社會 發展	4,184,743	總累計	56	56	符合	10,324,869	10,424,863	100.97	100.97	27.69	◎
					年累計	24	24	符合	1,004,000	1,158,840	115.42	115.42		
69	衛福部	推動長期照顧服務機制 (101/01/01~104/12/31)	社會 發展	3,272,546	總累計	57.25	57.25	符合	5,140,195	5,140,195	100.00	100.00	21.35	◎
					年累計	29	29	符合	698,635	698,635	100.00	100.00		
70	衛福部	重建食品藥物安全(清雲行 動五五方案)計畫 (101/01/01~105/12/31)	社會 發展	317,784	總累計	24.63	24.63	符合	337,672	336,485	99.65	99.65	5.69	◎
					年累計	9.3	9.3	符合	18,991	18,095	95.28	95.28		
71	衛福部	開創全民均等健康照護計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	1,075,020	總累計	29.38	29.16	-0.22	2,094,124	1,201,375	57.37	57.37	16.96	◎
					年累計	17.52	16.88	-0.64	187,011	182,271	97.47	97.47		
72	衛福部	食品安全管制科技發展計畫 (102/01/01~105/12/31)	科技 發展	214,429	總累計	28.37	28.37	符合	303,545	298,998	98.50	98.50	16.31	◎
					年累計	13.49	13.49	符合	36,497	34,966	95.81	95.81		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率 (%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
73	衛福部	台灣環境毒物健康危害之監測、評估及對策研究 (102/01/01~105/12/31)	科技發展	163,619	總累計	25.88	25.88	符合	216,438	217,036	100.28	100.28	19.68	◎
					年累計	21	21	符合	31,610	32,208	101.89	101.89		
74	衛福部	國民心理健康促進計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會發展	595,068	總累計	28.81	28.81	符合	598,225	543,741	90.89	90.89	13.49	◎
					年累計	15.25	15.25	符合	83,746	80,290	95.87	95.87		
75	衛福部	長照服務網計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會發展	363,575	總累計	13	13	符合	147,870	60,897	41.18	41.18	0.00	◎
					年累計	15	15	符合	0	0	符合	0.00		
76	衛福部	第三期國家癌症防治計畫 (103/01/01~107/12/31)	社會發展	3,369,989	總累計	2.25	2.25	符合	23,800	23,649	99.37	99.37	0.70	◎
					年累計	11.25	11.25	符合	23,800	23,649	99.37	99.37		
77	衛福部	強化國民年金保險制度 (103/01/01~103/12/31)	社會發展	62,334,670	總累計	23.17	22.99	-0.18	14,597,446	14,547,440	99.66	99.66	23.34	◎
					年累計	23.17	22.99	-0.18	14,597,446	14,547,440	99.66	99.66		
78	衛福部	預防保健服務計畫 (103/01/01~106/12/31)	社會發展	2,722,769	總累計	1.95	1.95	符合	100,209	100,209	100.00	100.00	3.68	◎
					年累計	7.8	7.8	符合	100,209	100,209	100.00	100.00		
79	衛福部	推動國內醫藥衛生研究 (103/01/01~105/12/31)	科技發展	425,041	總累計	12	12	符合	106,260	119,862	112.80	112.80	28.20	◎
					年累計	30	30	符合	106,260	119,862	112.80	112.80		
80	衛福部	友善關懷老人服務方案第二期計畫 (103/01/01~105/12/31)	社會發展	442,220	總累計	4.5	4.5	符合	66,333	77,150	116.31	116.31	17.45	◎
					年累計	15	15	符合	66,333	77,150	116.31	116.31		
81	衛福部	保母托育管理與托育費用補助(103/01/01~103/12/31)	社會發展	1,020,860	總累計	10	10	符合	807,190	807,190	100.00	100.00	79.07	◎
					年累計	10	10	符合	807,190	807,190	100.00	100.00		
82	環保署	資源永續循環利用推動計畫 (102/01/01~106/12/31)	社會發展	434,220	總累計	9.37	9.37	符合	249,145	229,448	92.09	92.09	7.70	◎
					年累計	18.45	18.39	-0.06	32,045	33,419	104.29	104.29		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
83	故宮	故宮南部院區籌建 (92/01/01~104/12/31)	公共 建設	1,665,193	總累計	43.27	38.11	-5.16	3,049,281	3,009,608	98.70	98.85	0.84	◎
					年累計	1.38	0.89	-0.49	16,383	9,378	57.24	85.86		
84	故宮	大故宮計畫 (103/01/01~103/12/31)	公共 建設	5,000	總累計	16	16	符合	0	0	符合	0.00	0.00	◎
					年累計	16	16	符合	0	0	符合	0.00		
85	科技部	中部科學工業園區建設計畫 (92/07/01~110/12/31)	公共 建設	8,057,111	總累計	74.56	74.11	-0.45	76,908,654	76,514,787	99.49	99.53	2.55	◎
					年累計	2.56	2.55	-0.01	206,540	171,002	82.79	99.56		
86	科技部	奈米國家型科技計畫 (98/01/01~103/12/31)	科技 發展	2,536,651	總累計	85.65	85.98	0.33	15,187,876	12,495,888	82.28	82.28	26.83	◎
					年累計	18.01	19.88	1.87	518,805	680,677	131.20	131.20		
87	科技部	中興新村高等研究園區計畫 (99/01/01~108/12/31)	公共 建設	385,635	總累計	59.87	59.84	-0.03	6,378,047	6,361,338	99.74	99.77	9.09	◎
					年累計	9.91	9.09	-0.82	38,200	33,126	86.72	91.72		
88	科技部	生技醫藥國家型科技計畫 (100/01/01~105/12/31)	科技 發展	1,512,815	總累計	46.74	46.66	-0.09	5,454,351	4,613,788	84.59	84.59	5.55	◎
					年累計	17.4	16.55	-0.85	80,158	84,004	104.80	104.80		
89	科技部	智慧電子國家型科技計畫 (100/01/01~104/12/31)	科技 發展	1,674,882	總累計	65.04	64.49	-0.55	5,889,052	5,598,665	95.07	95.38	11.67	◎
					年累計	25.19	22.62	-2.57	200,127	176,920	88.40	97.69		
90	科技部	第二期能源國家型科技計畫 (103/01/01~107/12/31)	科技 發展	4,838,609	總累計	2.71	2.82	0.11	548,998	612,663	111.60	111.82	12.69	◎
					年累計	13.55	14.09	0.54	548,998	612,663	111.60	111.82		
91	農委會	屏東農業生物科技園區 (92/02/25~103/12/31)	經濟 發展	168,619	總累計	98.01	98.01	符合	8,141,690	8,083,913	99.29	99.36	5.58	◎
					年累計	0.51	0.43	-0.08	17,679	3,412	19.30	53.24		
92	農委會	曾文南化烏山頭水庫治理及 穩定南部地區供水計畫(農 委會水土保持局部分)」 (99/05/12~104/12/31)	公共 建設	233,811	總累計	80.9	81.35	0.45	1,345,482	1,323,071	98.33	98.67	8.49	◎
					年累計	9	13.5	4.50	16,000	15,400	96.25	124.06		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率 (%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
93	農委會	「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(農委會林務局部分)」 (99/05/12~104/12/31)	公共建設	171,337	總累計	81.3	81.92	0.62	1,555,731	1,536,153	98.74	98.88	4.95	◎
					年累計	13	17.5	4.50	8,500	6,286	73.95	99.84		
94	農委會	漁業多元化經營建設 (102/01/01~105/12/31)	經濟發展	1,000,600	總累計	27.46	25.64	-1.82	1,383,790	109,601	7.92	10.98	15.18	◎
					年累計	9.83	20.77	10.94	59,891	109,601	183.00	253.62		
95	農委會	加強農田水利建設 (102/01/01~105/12/31)	經濟發展	3,137,519	總累計	26.51	26.51	符合	3,052,580	2,545,210	83.38	85.31	8.11	◎
					年累計	6.05	6.05	符合	193,971	195,384	100.73	131.18		
96	農委會	調整耕作制度活化農地計畫 (102/01/01~105/12/31)	經濟發展	7,170,941	總累計	27.5	27.5	符合	6,987,220	7,954,543	113.84	113.84	0.00	◎
					年累計	10	10	符合	0	0	符合	0.00		
97	農委會	生態旅遊系統建置發展 (102/01/01~105/12/31)	經濟發展	388,262	總累計	28.75	28.75	符合	507,966	424,228	83.52	83.53	10.10	◎
					年累計	15	15	符合	31,530	39,125	124.09	124.41		
98	農委會	植樹造林計畫 (102/01/01~105/12/31)	公共建設	1,376,168	總累計	26.14	25.61	-0.53	1,698,815	1,670,879	98.36	102.47	13.97	◎
					年累計	5.7	5.7	符合	55,260	122,232	221.19	347.81		
99	農委會	休閒農業加值發展 (102/01/01~104/12/31)	經濟發展	491,150	總累計	37.95	37.85	-0.10	333,000	321,208	96.46	96.72	0.75	◎
					年累計	15	14.7	-0.30	3,000	2,825	94.17	122.80		
100	農委會	強化農產品全球市場深耕計畫(103/01/01~103/12/31)	經濟發展	191,605	總累計	11	11	符合	20,200	20,190	99.95	99.95	10.54	◎
					年累計	11	11	符合	20,200	20,190	99.95	99.95		
101	農委會	穩定肥料及相關資材供需計畫(103/01/01~103/12/31)	經濟發展	2,569,745	總累計	26.4	26.4	符合	205,700	192,955	93.80	93.80	7.51	◎
					年累計	26.4	26.4	符合	205,700	192,955	93.80	93.80		
102	農委會	流域綜合治理計畫-農田排水(103/01/01~108/12/31)	公共建設	255,000	總累計	0.86	0	-0.86	12,750	0	0.00	0.00	0.00	◎
					年累計	5	0	-5.00	12,750	0	0.00	0.00		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度			支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)		
103	農委會	流域綜合治理計畫-上游坡地水土保持及治山防洪 (103/01/01~108/12/31)	公共建設	1,600,000	總累計	1.01	0	-1.01	96,000	0	0.00	0.00	◎
					年累計	6	0	-6.00	96,000	0	0.00		
104	農委會	推動農業科技產業全球運籌 (103/01/01~106/12/31)	科技發展	431,491	總累計	5.11	5.11	符合	86,601	81,878	94.55	94.55	◎
					年累計	20.43	20.43	符合	86,601	81,878	94.55		
105	勞動部	辦理職業訓練，協助勞工提升職場所需之能力 (103/01/01~103/12/31)	社會發展	2,855,991	總累計	15.5	19.3	3.80	208,000	159,957	76.90	76.90	○
					年累計	15.5	19.3	3.80	208,000	159,957	76.90		
106	勞動部	辦理多元就業開發方案及推動培力就業計畫，促進社會企業的發展 (103/01/01~103/12/31)	社會發展	1,324,219	總累計	18	19	1.00	23,734	87,806	369.96	369.96	◎
					年累計	18	19	1.00	23,734	87,806	369.96		
107	原民會	原住民族社會安全發展第二期四年計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會發展	2,681,745	總累計	32	32	符合	3,648,850	3,645,622	99.91	99.91	◎
					年累計	28	28	符合	994,942	991,714	99.68		
108	原民會	輔導原住民產業發展 (102/01/01~105/12/31)	社會發展	332,200	總累計	11.75	28.37	16.62	58,277	134,210	230.30	230.30	○
					年累計	15	14.25	-0.75	2,277	859	37.73		
109	原民會	原住民族住宅改善計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會發展	183,760	總累計	35.85	32.58	-3.27	249,637	152,734	61.18	61.18	◎
					年累計	43.4	43.4	符合	119,158	12,331	10.35		
110	客委會	客家文化發展中心南北園區設施管理及擴充計畫 (101/01/01~104/12/31)	公共建設	420,293	總累計	50.05	49.06	-0.99	1,092,609	1,328,678	121.61	121.90	◎
					年累計	10.27	9.66	-0.61	29,236	30,179	103.23		
111	客委會	客家傳播行銷計畫 (103/01/01~108/12/31)	社會發展	599,726	總累計	4.22	4.22	符合	106,364	106,105	99.76	99.76	◎
					年累計	26.4	26.37	-0.03	106,364	106,105	99.76		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率 (%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
112	客委會	客家文化生活環境營造計畫 (103/01/01~108/12/31)	公共建設	762,608	總累計	1.27	1.24	-0.03	63,600	63,132	99.26	99.59	8.31	◎
					年累計	12.68	12.36	-0.32	63,600	63,132	99.26	99.59		
113	臺灣省諮議會	研究發展及諮詢 (103/01/01~103/12/31)	社會發展	3,746	總累計	25	25	符合	475	399	84.00	97.68	12.39	◎
					年累計	25	25	符合	475	399	84.00	97.68		

參、列管落後案件執行情形及原因分析表
(截至 103 年 3 月底止)

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支出			預算執行率 (%)	年度預算達成率 (%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
臺北捷運系統環狀線 建設計畫(第 1 階段路 線)	交通部	總累計	100	74.79	-25.21	24,104,941	24,105,383	100.00	100.06	8.97
		年累計	17.57	15.96	-1.61	781,256	781,698	100.06		
執行情形	一、土木細設標各項細設作業：進行土木細部設計施工中服務。 二、土木工程施工： （一）CF640 區段標：管線遷移、連續壁、潛盾隧道、基礎、墩柱及橋梁工程，機廠則進行土方開挖、結構及鋼構吊裝等工作。 （二）CF650 區段標：管線遷移、車站出入口結構體、高架橋基樁、基礎墩柱及帽梁結構及鋼構件吊裝等工作。 （三）CF660A 區段標：管線遷移、車站站體結構施作地改、高架橋基樁基礎及預埋螺栓檢測等工作。 （四）CF660B 區段標：補充地質鑽探、排水箱涵、基樁施作等工作。 三、機電工程細部設計及文件審查 （一）機電系統標細部設計文件送審。 （二）電聯車子系統合格測試、機電系統設備製造、廠測。 四、土地取得作業：穿越用地市價查估作業已辦理完成，後續將邀請土地所有權人召開協議價購及設定地上權會議，持續推動用地取得相關事宜。 五、工務行政及準備金支付。									
重要成果	電聯車車體壓縮測試於 103 年 3 月 7 日完成。									
落後原因	一、本計畫南機廠斯馨祠(碑)(土地公廟)歷史建物遷移問題致主體工程 CF640 區段標工程進度落後。 二、本計畫板橋民生路 3 段居民及當地民意代表反映受台 64 線通車後振動噪音影響，以及路線受限於台 64 線高架橋位置，而陳情要求 CF660 區段標變更線形設計，致 CF660 區段標工程進度落後。 三、中和景平路段管線遷移困難等原因，致主體工程 CF650 區段標工程進度落後。									

	四、機電廠商提送文件時程落後，並受土建 CF640、CF650 標發包進度落後，造成本標進度落後。 五、CF650 區段標:(1)因高架橋工程特性須於道路施工，施工交通動線更動易影響交通流暢，且施工圍籬架設後影響居民進出，致需分多段施工，無法全面開展。(2)基礎位置位於未徵收之私有地上，需進行土地徵收，在未完成徵收前地主不同意原規劃之 $\phi 1000\text{mm}$ 自來水臨時遷移經過其土地。 六、CF660B 區段標部分基礎結構與台電高低壓、161KV 特高壓、自來水 $\phi 1000$、$\phi 1200$ 管路衝突。
因應對策	一、本計畫南機廠斯馨祠(碑)(土地公廟)歷史建物拆遷異地重組作業已辦理完成，南機廠工程已全面開展。 二、板橋民生路段因民眾陳情要求變更線形案，臺北市政府捷運局變更線形細部設計已辦理完成，CF660A 區段標已於 102 年 6 月 3 日決標，7 月 16 日開工。 三、本計畫中和景平路段管線遷移困難，臺北市捷運局已逐步積極協調解決管線遷移問題，包括協調台電撥遷路線，另須配合新北市水利局進行景平路易淹水路段整體改善。 四、機電標已於 100 年起陸續發文要求得標廠商趕工，另針對廠商整體進度已落後超過 10% 部分，於 101 年 10 月 5 日發函廠商依契約規定處置，目前捷運局已依廠商提出電聯車追趕計畫，要求廠商改善並追趕 DDR 文件送審進度，每月檢討廠商追趕成效。 五、CF650 區段標:(1-1)工程期間改變路型皆經報請新北市交通局交維計畫核定，相關交維調整自開工迄今已發佈 81 次新聞稿並由廠商發送宣導傳單。(1-2)經與當地民眾積極協調，目前已採避開巷道、公車停靠站方式，擴大施工區域圍設作業範圍進行施工，將於完成新建箱涵後，進行中央區既有箱涵破除及後續基樁基礎作業。(2-1)臺北市捷運局路權室訂於 103 年 5 月 16 日辦理設定地上權協議。(2-2)有關自來水管線避開私地改遷處理，臺北市捷運局東工處已協調臺北自來水工程總隊配合改採避開私人土地進行管遷作業，完成自來水管改接作業，P0827 基樁可進場施工，惟 P0828 基樁及基礎工程仍需待用地取得方得施作。 六、(一)迴避 161KV 特高壓衝突，調整基樁或墩柱位置，台電高低壓管線委由台電公司遷入共同管溝。 (二)加強協調台電與自來水公司協助加速配合遷移作業，基樁機組先調整至其餘基樁趕工進。
管考建議(國發會)	一、本計畫年累計進度落後 1.61 個百分點，落後幅度較上月擴大，請針對進度落後工項積極檢討辦理。 二、本計畫已逾 102 年 12 月之核定期程，修正計畫刻由交通部進行審查，請儘速循序報核修正計畫。 三、查核點「CF660B 區段標新設排水箱涵施工」進度落後，請加強管控後續執行進度。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算達成率 (%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
故宮南部院區籌建	故宮	總累計	43.27	38.11	-5.16	3,049,281	3,009,608	98.70	85.86	0.84
		年累計	1.38	0.89	-0.49	16,383	9,378	57.24		
執行情形	一、建築工程（營建署代辦）：博物館主體工程進行廠內鋼構加工及現場吊裝，施工進度為 21.06%；景觀橋工程進行全套管基樁施作，進度為 10.92%。 二、景觀工程：辦理開工動土典禮及五大管線申請獲准，目前已展開現場測繪、放樣等作業。 三、展示工程：設計發展階段各小組工作會議及專案討論，目前已有條件通過設計發展階段進入細設作業。 四、促參招商：重啟促參招商案前置規劃作業並辦理委託技術服務案履約期限展延。 五、軟體建置：持續辦理南院圖書加工。 六、行政管理及雜項： （一）辦理委託專案管理服務變更契約。 （二）持續辦理大地安全及環境監測作業。									
重要成果	一、建築工程-景觀橋工程通過下構危評審查。 二、景觀工程-辦理開工動土典禮及完成五大管線申請。 三、展示工程-規劃設計公司提交設計發展階段工作成果報告書（第三版）。 四、促參招商-核定規劃廠商履約期限展延。 五、博物館軟體建置-累計完成圖書登錄 6,670 冊、編目 6,410 冊、本年度累計購得圖書 554 冊。 六、行政管理及雜項-完成 103 年 3 月環境及大地安全監測工作。									
落後原因	本月份年累計進度（落後 0.49 個百分點）及預算執行率（85.86%）均尚符合預期。總累計進度現階段落後 5.16 個百分點，主要原因為 102 年度展示工程及景觀工程設計作業延誤所致。									
因應對策	102 年度主要落後之展示工程與景觀工程均已順利推動中，其中展示工程已於 102 年 12 月核定方案設計階段，景觀工程已於 102 年 12 月完成工程發包，並於 103 年 3 月 1 日開工。									
管考建議（國發會）	一、因景觀工程於執行上仍有落後情形，請於 103 年 4 月執行情形提報工程進度達 15%之預定完成日期，並完成後續撥款事宜，俾如期如質達成年度目標。 二、因展示工程已有條件通過進入細部設計階段，請於 4 月執行情形提報工程進度達 58%之預定完成日期，並說明查核點中「優先考量發包策略調整」之原因與作法。									

三、目前本季執行情形僅呈現 102 年度部份工作/標案層之後續執行進度與預算執行有落後情形，請重新確認各工作項目之標案資料(3.41、工作/標案資料及預定里程碑及 3.42 工作/標案總累計分月預定進度及分配數)正確性，並於 4 月執行情形進一步修正及補填標案執行情形。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算達成率 (%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	交通部	總累計	48.26	43.19	-5.07	9,949,486	4,137,592	41.59	82.82	51.59
		年累計	19	16.72	-2.28	5,917,859	105,965	1.79		
執行情形	一、用地取得 因內政部 101 年 9 月 25 日函知臺中市政府本計畫（原臺中市）徵收工程失效。經該府 10 月 19 日提出申復，惟內政部復於 10 月 31 日函復仍維持徵收失效之決議。將於 102 年重新依法辦理用地取得作業，並於 102 年 1 月 9、2 月 21 日、6 月 4 日、6 月 25 日分別辦理 4 場公聽會，102 年 7 月 16 日辦理一般場站路線段之協議價購會、102 年 8 月 15 日辦理土地開發區之協議價購會，並分別於 102 年 8 月 23 日及 9 月 27 日報送徵收計畫書予內政部，其中一般場站及路線段徵收計畫已於 102 年 11 月 13 日經審議核准並辦理公告，12 月發放補償費，預計於 103 年 4 月完成用地取得作業。									
	二、土木工程 （一）CJ910 區段標(北屯機廠、G0 站及全線軌道區段標工程)： 1、101 年 12 月 31 日開工，惟開工後施工廠商進場施工受居民阻撓且工區內尚有住戶未遷出，致辦理工程停工至 102 年 7 月 22 日(雖未全數完成搬遷，然暫無影響施工)，並於 102 年 7 月 23 日復工。 2、CJ910A 標雜照雖已獲台中市政府核定在案，惟本標建照尚未取得，致無法向主管機關申報開工，遂於 102 年 11 月 11 日申報北屯機廠建物部分停工。 3、為降低停工影響，本標目前積極辦理廠區開挖、污水管、排水箱涵、擋土牆、明隧道及高架橋等施工作業中。 4、本標因前述 1.項停工案影響計 202 天，目前辦理工期展延中。 （二）CJ920 區段標(G03 至 G09 站及全線環控監控系統區段標工程)：102 年 3 月 15 日開工，目前進行井基、墩柱、帽梁及預鑄 U 型梁生產及吊裝等施工工項；另施工廠商所提送之綱要施工計畫及施工網圖，本局將詳細檢討施工作業順序(出入口與道路上主線站體下構及上構施工順序)與工率，以降低對提供機電標進場時間之影響。 （三）CJ930 區段標(G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程)：102 年 3 月 1 日開工，目前進行圍籬佈設含交維設施、地質補充鑽探調查、全套管基樁、基礎開挖擋土支撐、下部結構(墩柱、帽梁)、筏子溪箱涵段等施工及預鑄場設置完成並開始 U 梁生產作業中；另施工廠商所提送之綱要施工計畫已核可，施工網圖本局將詳細檢討施工作業順序(出入口與道路上主線站體下構及上構施工順序)與工率，降低對提供機電標進場時間之影響。									
	三、機電工程									

	(一) 機電系統工程標歷經 3 次流、廢標後終於 100 年 3 月 9 日 決標 (較原預訂時程亦落後約 23 個月), 並於 100 年 4 月 21 日開工, 機電系統設計參數均已完成提供土木細設顧問作業, 並持續進行契約文件送審作業。 (二) 100.07.14 支付機電工程第一期預付款; 101.12.19 支付第二期預付款; 102.12.24 支付第三期預付款。 四、修正 102 年 12 月總累計實際支用數 4,174,191 千元, 故截至 103 年 3 月總累計實際支用數修正為 4,280,156 千元。
重要成果	一、一般場站及路線段用地補償費轉保管專戶於 103.1.21 完成移轉登記。 二、103.01.15CJ920 區段標預鑄 U 型梁開始生產。 三、103.3.16CJ930 區段標全跨預鑄 U 梁開始量產。 四、通訊系統細部設計文件-直線電話 G0 車站設備位置圖已於 103.03.17 開始送審。 五、103.03.18CJ920 區段標預鑄 U 型梁吊裝。
落後原因	一、北屯機廠(含 G0 車站)用地取得原定於 98 年底完成, 實際於 101 年 8 月完成徵收作業, 其後又因民眾抗爭、住戶尚未搬遷等因素已較原計畫 98 年 12 月交付落後 43 個月。 二、另場站及轉彎段範圍內私有土地部分: 因臺中市政府用地徵收工程失效, 較原計畫 98 年 12 月交付落後 51 個月。 三、本計畫機電系統標案於 99 年 8 月 26 日開啟標封, 因投標家數不足三家, 宣告流標, 流標後依採購法檢討相關規定, 99 年 9 月 17 日辦理第 2 次招標、99 年 11 月 30 日均無廠商符合資格標規定, 當場宣佈廢標。99 年 12 月 6 日重新辦理第 3 次招標作業, 目前機電工程已於 100 年 3 月 9 日由川崎重工業株式會社/法商阿爾斯通運輸股份有限公司/中鼎工程股份有限公司共同投標商得標, 並於 100 年 4 月 21 日開工, 較原計畫 98 年 5 月開工落後約 23 個月。
因應對策	一、北屯機廠(含 G0 車站)用地取得迄 102 年 7 月 23 日復工。另場站及轉彎段範圍內私有土地部分: 因臺中市政府用地徵收工程將於 102 年重新依法辦理, 已於 103 年 4 月取得用地。 二、本局已採各項積極作為如規劃先期工程, 調整原計畫里程碑等方式因應, 惟因計畫時程目前已大幅度落後, 勢已無法依原訂計畫時程於 104 年 10 月通車, 經本局於交通部重大工程督導會報提報並依高鐵局 102 年 6 月 17 日專案會議紀錄, 以 103 年 4 月取得用地為基礎評估對整體計畫時程之影響, 已於 102 年 7 月 22 日將評估後之修正時程提報高鐵轉交通部, 依現況完工時程為 107 年 12 月, 將配合交通部高鐵局、臺中市政府檢討修正內容與時機, 以利整體計畫時程合理之控管。
管考建議 (國發會)	一、本計畫年累計進度落後 2.28 個百分點, 總累計進度落後 5.07 個百分點, 請持續加強辦理用地取得、建造取得等事宜, 追趕已落後工程進度。 二、本計畫年累計支用比為 1.79%, 請督促承商儘速提出請款, 將預付款實支轉正, 並完成經費核撥作業。 三、主辦機關已提出須修正完工期程, 請交通部加強督促所屬(管)儘速提報修正計畫, 並儘速循序報核修正計畫。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算達成率 (%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
原住民族住宅改善計畫	原民會	總累計	35.85	32.58	-3.27	249,637	152,734	61.18	10.35	6.71
		年累計	43.4	43.4	符合	119,158	12,331	10.35		
執行情形	一、中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助： （一）業於 3 月 25、27 日辦理 103 年度中低業務研習會，並與各地方政府承辦人員交換業務意見。 （二）業於 103 年 3 月 19 日調查中低收第一季(1-3 月)執行數，回報如下:建購 16 戶、修繕 22 戶，合計 38 戶，實際支用數 8036 千元。 二、補助「新北市三峽原住民族文化福利園區公共基礎設施」：新北市政府刻正處理農損戶補償事宜，預定 4 月底開工。 三、花東新村原住民臨時安置住所維護管理業務： （一）已完成駐衛保全服務勞務採購案(116,980 元)、九臺電梯保養維護勞務採購案(36,900 元)、CD 區地下停車場機械式停車設備保養維護勞務採購案(每一季請款)。 （二）4 月 10 日至臺灣銀行汐止分行領取 3 月份房屋、車位租金繳費明細表，倘逾繳二個月份以上之住戶，將依規函催(限期雙掛號郵寄)。 四、補助南投縣仁愛鄉翠巒、瑞岩及臺中市和平區松茂三個部落遷建作業(規劃作業、興辦事業計畫、遷居地公共設施測設作業等)：辦理第 6 次專案會議，協助南投縣政府辦理翠巒部落及臺中市政府辦理松茂部落遷建作業用地問題。 五、補助南投縣政府辦理瑞岩部落擴充計畫可行性評估-先期規劃設計(以前年度保留案)：南投縣政府 103 年 3 月 19 日府授原建字第 1030050513 號函申領「南投縣仁愛鄉發祥村瑞岩部落 32 戶擴充計畫規劃及可行性評估報告－先期規劃設計案」第 2 期款補助經費計新臺幣 210 萬元整，本會刻正審理中。 六、補助新竹縣政府辦理 103 年度新竹縣五峰鄉勒俄勒(R'ra)部落建築文化語彙執行計畫：已受理本案家戶 39 戶(新增 3 戶)，並於 3 月 25 日至部落辦理本案說明會。 七、補助臺東縣政府辦理臺東原鄉部落風貌暨文化地景營造發展計畫：已於 103 年 3 月 11 日核定本案，臺東縣政府刻正辦理招標作業，預定 4 月底前完成簽約，致使預定工作期程延遲。									
重要成果	尚無重要執行成果。									
落後原因	因補助南投縣仁愛鄉發祥村瑞岩部落 32 戶擴充計畫規劃及可行性評估報告－先期規劃設計案(以前年度保留)4,900 千元尚未撥付，查目前南投縣政府刻正辦理結案相關行政作業，並於 3 月 20 日前提報本會辦理後續結案事宜。									

因應對策	一、辦理第 6 次專案會議，持續管考南投縣政府執行情形。 二、南投縣政府 103 年 3 月 19 日以府授原建字第 1030050513 號函申領「南投縣仁愛鄉發祥村瑞岩部落 32 戶擴充計畫規劃及可行性評估報告—先期規劃設計案」第 2 期款補助經費計新臺幣 210 萬元整，本會刻正審理中。
管考建議（國發會）	本計畫總累計執行進度落後 3.27 個百分點，年累計支用比僅 10.35%。相關款項未撥付者，請儘速辦理後續結案。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算達成率 (%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
漁業多元化經營建設	農委會	總累計	27.46	25.64	-1.82	1,383,790	109,601	7.92	253.62	15.18
		年累計	9.83	20.77	10.94	59,891	109,601	183.00		
執行情形	一、沿近海漁業永續經營： (一) 魚苗放流計畫已核定，續辦理後續事宜。 (二) 已核定沿近海漁業之監控、管制及調查計畫，刻正辦理計畫相關工作推動事宜。 (三) 有關 102 年度第 2 階段漁船筏收購辦理情形，已核定「103 年度漁船筏收購及處理計畫（一）」計畫，請新北市等 11 縣市續辦搗毀事宜。 (四) 餘各工作計畫依預定工作項目辦理中，相關補助計畫正由地方政府、漁業團體依需求研擬計畫，俟研提後由執行單位按必要性及優先性分別審核補助辦理；並由執行機關推動執行中。 二、促進養殖漁業與環境和諧： (一) 有關縣市政府委託辦理養殖漁業生產環境改善細部工程規劃設計 12 件，已於 3 月 31 日前完成發包訂約工作，刻正積極推動中。 (二) 102 年度保留 21 件工程，目前均施工中，預定 5 月可完工 5 件。 三、振興漁港設施機能： (一) 103 年度部分至 103 年 3 月底止已同意辦理：資本門工作 44 項(本署自辦 7 項，委辦及補助 37 項)，其中已核定 37 項(本署自辦 4 項，委辦及補助 33 項)；另經常門工作已同意辦理 13 項(本署自辦 11 項，委辦及補助 2 項)，其中已核定 11 項(本署自辦 9 項，委辦及補助 2 項)。 (二) 102 年度保留 62 件工程計畫，現階段均已完成設計發包，已開工 59 件，竣工 36 件，驗收 19 件，結案 10 件。 四、加速漁產品運銷通路相關設施建設： (一) 102 年度保留 15 件工程，持續推動中，其中因氣候因素停工者亦已於 3 月初復工，並辦理變更設計及會勘作業。 (二) 103 年度預定辦理工程項目已排定優先順序，並通知執行單位研提計畫。其中，第一優先工程計畫共 5 件，已核定 3 件計畫，1 件審查中，1 件與執行單位協商補助比例。另完成 1 件優先順序三之計畫核定及 1 件新增計畫核定。 五、石斑魚及其他養殖產業： (一) 本(103)年 1-3 月石斑魚出口量(值)統計 5,979.45 公噸(19.7 億元)，另截至本年 3 月底輔導活魚運搬船運搬至大陸及香港地區 275 航次。									

	(二) 本署已於本年 3 月 28 日公告「輸大陸地區石斑魚養殖場及中轉養殖場登錄管理作業要點」，將積極輔導輸大陸地區石斑魚養殖示範場，以及完成本年度 1,017.6 公頃(2.3%)養殖漁業放養量申(查)報資料。
重要成果	沿近海漁業永續經營-辦理漁業之監控、管制及調查 5 萬筆；沿近海漁業永續經營-辦理魚苗放流 700 萬尾；沿近海漁業永續經營-辦理漁船筏收購 65 艘。
落後原因	一、因部分執行單位尚未將工程預算書圖送署審查，致查核點稍有落後。 二、本年度漁船筏收購標準及程序配合本署政策調整，刻正研議中，俟定案後儘速辦理。 三、加速漁產品運銷通路現代化： (一) 102 年尚未完工之工程合計 15 件，因氣候因素停工(現已復工施作中)，或因請照進度延誤及舊有攤商之搬遷等事，致工程進度落後，另因輔導導入危害分析重要管制點(HACCP)之魚貨拍賣場，致工程需變更設計等事延誤。 (二) 囿於本年度預算有限，且各單位所提需求龐大，需謹慎評估其優先順序辦理，爰相關計畫之優先順序於 2 月底始核定。目前已請執行單位研提計畫，並核定 5 件，1 件尚在審查中，另 1 件因與執行單位協商補助比例致核定延誤。
因應對策	一、已請各承辦人督促各執行單位加緊趕辦，以符合原預訂目標。 二、本年度漁船筏收購標準及程序已召開內部會議討論，刻正簽辦，已於 103 年 4 月 29 日完成公告並受理登記。 三、加速漁產品運銷通路現代化： (一) 102 年未完工之工程其中 1 件已於 2 月 7 日辦理完工驗收，另因氣候因素停工者已視氣候狀況開工(於 3 月 1 日開工施作)；因請照進度延誤及舊有攤商之搬遷等事需視執行單位與承包商或縣市政府間之狀況而定；計畫變更導入 HACCP 部分，因目前已現場會勘多次，尚待規劃完成後辦理變更。 (二) 第 1 優先順序之工程尚未核定者，除加速審核速度外，補助比例也依原則持續與執行單位協商。
管考建議(國發會)	請主辦機關儘速辦理相關工程審查、核定事宜，並請儘速研訂本年度漁船收購標準及程序，俾達成績效目標。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算達成率 (%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
流域綜合治理計畫-上游坡地水土保持及治山防洪	農委會	總累計	1.01	0	-1.01	96,000	0	0.00	0.00	0.00
		年累計	6	0	-6.00	96,000	0	0.00		
執行情形	本計畫預算經費尚待立法院審核通過。									
重要成果	一、103 年度土石流防治、崩塌地處理、坡地保育工程-崩塌地處理 0 處。 二、103 年度野溪治理、坡面沖蝕控制工程-水土保持及農路設施 0 處。									
落後原因	本計畫預算經費尚待立法院審核通過，故本計畫目前無法執行，實際執行進度為 0%。									
因應對策	俟立法院審核通過，積極趕辦。									
管考建議（國發會）	一、本計畫受立法院會期審議延誤影響，無法評核。 二、本計畫農委會申請撤案中。									

肆、行政院及所屬一級機關公文時效分類統計表

103年1月份統計分析

期間／類別		1月份 (1)	上季月平均值 (2)	增減值 (1)-(2)	尚待改進機關
一般公文	各機關平均辦結率(%)	90.64	90.03	0.61	文化部(84.99) 行政院陸委會(85.76) 行政院工程會(86.42)
	發文平均使用日數	2.31	2.24	0.07	行政院陸委會(4.51) 外交部(3.80) 金融監督管理委員會(3.64)
	待辦公文之逾限率(%)	12.64	13.39	-0.75	交通部(38.38) 外交部(33.86) 行政院陸委會(28.45)
立法委員質詢案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		97.84	97.85	-0.01	外交部(33.33) 國家通訊傳播委員會(75.00) 勞動部(86.36)
人民申請案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.57	98.84	-0.27	原民會(53.19) 外交部(74.01) 行政院原能會(87.87)
訴願案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.60	99.58	0.02	行政院農委會(94.74) 外交部(95.12) 內政部(99.48)
人民陳情案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		96.09	96.13	-0.04	外交部(80.82) 勞動部(86.68) 行政院陸委會(87.84)
專案管制案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.67	99.15	0.52	外交部(33.33) 財政部(66.67) 行政院農委會(88.46)
監察案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		87.47	86.08	1.39	外交部(33.33) 內政部(83.87)

103年2月份統計分析

期間／類別		2月份 (1)	上季月平均值 (2)	增減值 (1)-(2)	尚待改進機關
一般公文	各機關平均辦結率(%)	87.10	90.03	-2.93	文化部(79.13) 國家發展委員會(80.95) 國防部(82.50)
	發文平均使用日數	2.29	2.24	0.05	行政院陸委會(4.57) 金融監督管理委員會(3.74) 教育部(3.33)
	待辦公文之逾限率(%)	16.33	13.39	2.94	外交部(45.29) 交通部(36.56) 國防部(31.97)
立法委員質詢案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.41	97.85	0.56	行政院環保署(93.33)
人民申請案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.62	98.84	-0.22	外交部(57.80) 行政院原能會(86.86) 原民會(90.48)
訴願案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.56	99.58	-1.02	外交部(78.00) 行政院農委會(84.62)
人民陳情案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		95.97	96.13	-0.16	行政院陸委會(75.00) 外交部(77.01) 衛生福利部(82.86)
專案管制案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.28	99.15	0.13	行政院陸委會(0.00) 金融監督管理委員會(0.00) 國立故宮博物院(50.00)
監察案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		78.85	86.08	-7.23	外交部(53.33) 行政院農委會(56.25) 衛生福利部(71.43)

103年3月份統計分析

期間／類別		3月份 (1)	上季月平均值 (2)	增減值 (1)-(2)	尚待改進機關
一般公文	各機關平均辦結率(%)	90.39	90.03	0.36	國防部(84.97) 文化部(85.86) 行政院陸委會(85.89)
	發文平均使用日數	2.29	2.24	0.05	行政院陸委會(4.65) 外交部(4.01) 金融監督管理委員會(3.58)
	待辦公文之逾限率(%)	11.09	13.39	-2.30	國家發展委員會(52.42) 交通部(38.42) 外交部(23.94)
立法委員質詢案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		95.30	97.85	-2.55	行政院農委會(75.00) 行政院環保署(80.00) 勞動部(85.71)
人民申請案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.72	98.84	-0.12	外交部(65.90) 行政院原能會(84.86) 內政部(95.28)
訴願案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.70	99.58	0.12	外交部(96.15) 行政院農委會(97.56) 內政部(99.66)
人民陳情案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		94.21	96.13	-1.92	行政院陸委會(46.08) 外交部(64.38) 法務部(78.98)
專案管制案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.49	99.15	0.34	國立故宮博物院(0.00) 行政院陸委會(40.00) 行政院環保署(50.00)
監察案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		80.71	86.08	-5.37	外交部(60.00) 行政院農委會(78.57)

一、一般公文時效統計表

103 年 1 月份

項 目 數 量 機 關	應辦公文統計				已 辦 結 公 文 統 計										待辦公文統計					
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	本月 創稿數 (3)	案件總數 (1)+(2)+(3) (4)	發 文 統 計							存查 件數 (10)	辦 結 公 文 合 計 (8)+(10) (11)+(14)		待辦公文 (4)-(11) (12)+(13)		未逾辦理 期限件數 (13)	已逾辦理期限 (14)-(12) (14)+(15)		
					6日以內辦結		6日以上至30日辦結		30日以上辦結	小 計	發文平均		件數 (11)	件數 (12)	件數 (13)	件數 (14)		件數 (15)		
					件數 (5)	% (5)/(8)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)	(5)+(6)+(7) (8)	使用日數 (9)									
行政院	6,110	619	2,104	8,833	1,996	95.87	86	4.13	0	2,082	1.63	6,205	8,287	93.82	546	6.18	501	45	8.24	
內政部	56,456	5,573	12,551	74,580	19,715	92.40	1,550	7.26	71	21,336	2.48	47,467	68,803	92.25	5,777	7.75	5,330	447	7.74	
外交部	23,176	3,757	5,243	32,176	5,455	82.40	1,103	16.66	62	6,620	3.80	22,174	28,794	89.49	3,382	10.51	2,237	1,145	33.86	
國防部	26,324	3,271	4,612	34,207	13,639	87.99	1,862	12.01	0	15,501	1.82	14,978	30,479	89.10	3,728	10.90	2,988	740	19.85	
財政部	3,173	306	824	4,303	1,128	98.43	18	1.57	0	1,146	1.63	2,818	3,964	92.12	339	7.88	333	6	1.77	
教育部	11,859	2,629	5,262	19,750	8,516	88.43	1,095	11.37	19	9,630	3.21	7,517	17,147	86.82	2,603	13.18	2,576	27	1.04	
法務部	5,886	605	957	7,448	1,782	94.29	105	5.56	3	1,890	2.82	5,014	6,904	92.70	544	7.30	462	82	15.07	
經濟部	13,783	1,770	2,458	18,011	5,035	96.55	177	3.39	3	5,215	1.69	11,182	16,397	91.04	1,614	8.96	1,420	194	12.02	
交通部	10,106	1,906	1,407	13,419	3,259	87.84	428	11.54	23	3,710	2.87	8,031	11,741	87.50	1,678	12.50	1,034	644	38.38	
文化部	2,728	1,169	2,159	6,056	1,933	92.05	167	7.95	0	2,100	2.71	3,047	5,147	84.99	909	15.01	868	41	4.51	
衛生福利部	7,689	1,339	3,594	12,622	4,438	90.91	438	8.97	6	4,882	2.42	6,676	11,558	91.57	1,064	8.43	948	116	10.90	
蒙藏委員會	379	40	192	611	84	97.67	2	2.33	0	86	2.30	475	561	91.82	50	8.18	50	0	0.00	
僑務委員會	2,500	559	919	3,978	1,501	90.20	163	9.80	0	1,664	2.75	1,983	3,647	91.68	331	8.32	276	55	16.62	
中央銀行	3,649	506	1,368	5,523	761	99.87	1	0.13	0	762	1.84	4,152	4,914	88.97	609	11.03	609	0	0.00	
行政院主計總處	2,854	342	670	3,866	602	99.50	3	0.50	0	605	1.32	2,980	3,585	92.73	281	7.27	281	0	0.00	
行政院人事行政總處	2,558	316	1,037	3,911	1,193	97.07	36	2.93	0	1,229	1.61	2,401	3,630	92.82	281	7.18	281	0	0.00	
行政院環保署	10,377	1,992	2,758	15,127	3,659	96.88	112	2.97	6	3,777	2.03	9,776	13,553	89.59	1,574	10.41	1,573	1	0.06	
國立故宮博物院	810	210	946	1,966	421	90.15	46	9.85	0	467	2.75	1,299	1,766	89.83	200	10.17	198	2	1.00	
行政院陸委會	2,001	599	805	3,405	512	79.75	127	19.78	3	642	4.51	2,278	2,920	85.76	485	14.24	347	138	28.45	
國家發展委員會	2,464	216	676	3,356	589	89.24	71	10.76	0	660	3.05	2,389	3,049	90.85	307	9.15	307	0	0.00	
金融監督管理委員會	730	181	726	1,637	369	86.62	57	13.38	0	426	3.64	1,017	1,443	88.15	194	11.85	194	0	0.00	
國軍退除役官兵輔導委員會	5,678	800	1,068	7,546	2,190	94.52	127	5.48	0	2,317	2.87	4,531	6,848	90.75	698	9.25	698	0	0.00	
行政院原能會	988	214	518	1,720	563	95.26	26	4.40	2	591	2.33	985	1,576	91.63	144	8.37	126	18	12.50	
行政院國科會	2,667	290	639	3,596	2,116	98.56	30	1.40	1	2,147	1.67	1,036	3,183	88.52	413	11.48	405	8	1.94	
行政院研考會	2,702	480	485	3,667	443	98.88	5	1.12	0	448	1.68	3,203	3,651	99.56	16	0.44	16	0	0.00	
行政院農委會	5,766	876	1,013	7,655	2,187	94.88	115	4.99	3	2,305	2.41	4,686	6,991	91.33	664	8.67	592	72	10.84	
行政院勞委會	4,346	633	2,524	7,503	3,400	92.39	280	7.61	0	3,680	2.24	3,259	6,939	92.48	564	7.52	483	81	14.36	
公平交易委員會	1,615	38	689	2,342	410	100.00	0	0.00	0	410	1.40	1,756	2,166	92.49	176	7.51	176	0	0.00	
行政院工程會	1,746	271	303	2,320	698	95.62	32	4.38	0	730	2.52	1,275	2,005	86.42	315	13.58	315	0	0.00	
行政院原民會	3,752	673	1,928	6,353	2,675	91.39	252	8.61	0	2,927	1.95	2,931	5,858	92.21	495	7.79	471	24	4.85	
行政院海巡署	1,506	269	874	2,649	861	97.73	20	2.27	0	881	2.37	1,508	2,389	90.18	260	9.82	260	0	0.00	
客家委員會	1,119	369	1,062	2,550	1,100	94.58	63	5.42	0	1,163	2.45	1,180	2,343	91.88	207	8.12	202	5	2.42	
國家通訊傳播委員會	2,579	475	1,013	4,067	1,334	94.14	78	5.50	5	1,417	1.99	2,357	3,774	92.80	293	7.20	290	3	1.02	
中央選舉委員會	856	33	181	1,070	342	100.00	0	0.00	0	342	1.12	699	1,041	97.29	29	2.71	29	0	0.00	
臺灣省政府	524	32	266	822	373	97.64	9	2.36	0	382	1.30	427	809	98.42	13	1.58	13	0	0.00	
福建省政府	370	36	93	499	84	97.67	2	2.33	0	86	2.15	392	478	95.79	21	4.21	21	0	0.00	
總 計	231,826	33,394	63,924	329,144	95,363	91.47	8,686	8.33	207	104,256	2.31	194,084	298,340	90.64	30,804	9.36	26,910	3,894	12.64	

附註：1.配合組織改造，國家發展委員會自 103 年 1 月 22 日起成立(整併行政院經建會、研考會、工程會及主計處)、有關行政院研考會公文時效資料，係該會裁撤前(1 月 1 日至 21 日)統計資料。

2.公文時效管理作業係以分層方式管制統計，表列數字為機關內部單位處理數量，以下各表均同。

103 年 2 月份

項 目 數 量 機 關	應辦公文統計				已 辦 結 公 文 統 計											待辦公文統計				
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	本月 創稿數 (3)	案件總數 (1)+(2)+(3) (4)	發 文 統 計							存查 (10)	辦 結 公 文 合 計 (8)+(10)		待辦公文 (4)－(11)		未逾辦理 期限件數 (13)	已逾辦理期限		
					6日以內辦結		6日以上至30日辦結		30日以上辦結	小 計	發文平均		件數 (11)	％ (11)/(4)	件 數 (12)	％ (12)/(4)		期限件數 (14)	件數 (14)/(12)	
					件數 (5)	％ (5)／(8)	件數 (6)	％ (6)／(8)	件數 (7)	(5)+(6)+(7) 使用日數 (9)										
行政院	4,284	546	1,561	6,391	1,401	94.92	75	5.08	0	1,476	1.66	4,342	5,818	91.03	573	8.97	503	70	12.22	
內政部	43,086	5,565	9,768	58,419	16,172	92.89	1,234	7.09	4	17,410	2.28	35,382	52,792	90.37	5,627	9.63	5,335	292	5.19	
外交部	18,721	3,516	3,825	26,062	3,777	87.39	525	12.15	20	4,322	3.17	18,077	22,399	85.95	3,663	14.05	2,004	1,659	45.29	
國防部	21,293	3,278	5,540	30,111	10,402	86.26	1,624	13.47	33	12,059	1.89	12,782	24,841	82.50	5,270	17.50	3,585	1,685	31.97	
財政部	2,761	339	743	3,843	1,017	98.17	19	1.83	0	1,036	1.62	2,445	3,481	90.58	362	9.42	358	4	1.10	
教育部	9,086	2,614	4,207	15,907	6,845	88.97	832	10.81	17	7,694	3.33	5,517	13,211	83.05	2,696	16.95	2,667	29	1.08	
法務部	4,150	537	804	5,491	1,424	93.75	94	6.19	1	1,519	2.93	3,406	4,925	89.69	566	10.31	457	109	19.26	
經濟部	11,521	1,591	1,949	15,061	4,163	96.54	147	3.41	2	4,312	1.74	9,158	13,470	89.44	1,591	10.56	1,375	216	13.58	
交通部	7,725	1,663	1,075	10,463	2,414	89.77	255	9.48	20	2,689	2.67	6,007	8,696	83.11	1,767	16.89	1,121	646	36.56	
文化部	2,224	898	1,622	4,744	1,225	89.68	141	10.32	0	1,366	3.12	2,388	3,754	79.13	990	20.87	949	41	4.14	
衛生福利部	5,783	1,052	2,191	9,026	2,873	90.01	311	9.74	8	3,192	2.58	4,844	8,036	89.03	990	10.97	893	97	9.80	
勞動部	1,980	462	1,205	3,647	1,192	95.97	50	4.03	0	1,242	1.97	1,881	3,123	85.63	524	14.37	440	84	16.03	
蒙藏委員會	291	44	131	466	72	94.74	4	5.26	0	76	2.49	332	408	87.55	58	12.45	58	0	0.00	
僑務委員會	1,971	333	619	2,923	1,084	90.64	112	9.36	0	1,196	2.59	1,354	2,550	87.24	373	12.76	343	30	8.04	
中央銀行	2,844	600	1,066	4,510	659	100.00	0	0.00	0	659	1.99	3,241	3,900	86.47	610	13.53	610	0	0.00	
行政院主計總處	2,684	275	579	3,538	595	97.86	13	2.14	0	608	1.43	2,567	3,175	89.74	363	10.26	363	0	0.00	
行政院人事行政總處	2,006	279	997	3,282	986	97.82	22	2.18	0	1,008	1.32	1,979	2,987	91.01	295	8.99	293	2	0.68	
行政院環保署	7,742	1,574	2,320	11,636	2,757	96.98	79	2.78	7	2,843	1.77	7,170	10,013	86.05	1,623	13.95	1,621	2	0.12	
國立故宮博物院	651	196	917	1,764	359	87.35	52	12.65	0	411	3.06	1,122	1,533	86.90	231	13.10	231	0	0.00	
行政院陸委會	1,503	483	604	2,590	360	78.60	96	20.96	2	458	4.57	1,743	2,201	84.98	389	15.02	278	111	28.53	
國家發展委員會	3,872	1,053	1,297	6,222	819	83.06	167	16.94	0	986	2.80	4,051	5,037	80.95	1,185	19.05	906	279	23.54	
金融監督管理委員會	559	186	495	1,240	259	84.92	45	14.75	1	305	3.74	745	1,050	84.68	190	15.32	190	0	0.00	
國軍退除役官兵輔導委員會	4,381	700	756	5,837	1,575	94.54	90	5.40	1	1,666	2.81	3,235	4,901	83.96	936	16.04	936	0	0.00	
行政院原能會	781	141	461	1,383	456	94.02	28	5.77	1	485	2.29	689	1,174	84.89	209	15.11	192	17	8.13	
行政院國科會	2,362	390	528	3,280	2,049	98.70	26	1.25	1	2,076	1.64	956	3,032	92.44	248	7.56	235	13	5.24	
行政院農委會	4,131	664	871	5,666	1,621	96.09	66	3.91	0	1,687	2.05	3,243	4,930	87.01	736	12.99	665	71	9.65	
公平交易委員會	1,170	176	599	1,945	413	99.52	2	0.48	0	415	1.45	1,519	1,934	99.43	11	0.57	11	0	0.00	
行政院工程會	1,477	267	221	1,965	555	97.71	13	2.29	0	568	2.39	1,142	1,710	87.02	255	12.98	255	0	0.00	
行政院原民會	2,749	496	2,203	5,448	2,663	95.24	133	4.76	0	2,796	1.75	2,086	4,882	89.61	566	10.39	538	28	4.95	
行政院海巡署	1,097	248	731	2,076	676	96.71	23	3.29	0	699	2.51	1,102	1,801	86.75	275	13.25	275	0	0.00	
客家委員會	722	207	592	1,521	593	98.50	9	1.50	0	602	1.73	788	1,390	91.39	131	8.61	130	1	0.76	
國家通訊傳播委員會	1,784	355	756	2,895	1,012	92.93	74	6.80	3	1,089	2.02	1,552	2,641	91.23	254	8.77	250	4	1.57	
中央選舉委員會	547	29	118	694	233	100.00	0	0.00	0	233	1.05	419	652	93.95	42	6.05	42	0	0.00	
臺灣省政府	266	13	138	417	187	98.42	3	1.58	0	190	1.33	217	407	97.60	10	2.40	10	0	0.00	
福建省政府	180	20	70	270	60	98.36	1	1.64	0	61	2.37	187	248	91.85	22	8.15	21	1	4.55	
總 計	178,384	30,790	51,559	260,733	72,948	91.83	6,365	8.01	121	79,434	2.29	147,668	227,102	87.10	33,631	12.90	28,140	5,491	16.33	

附註：配合組織改造，行政院勞工委員會自 103 年 2 月 17 日起名稱異動為勞動部。

103 年 3 月份

項 目 數 量 機 關	應辦公文統計				已 辦 結 公 文 統 計										待辦公文統計					
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	本月 創稿數 (3)	案件總數 (1)+(2)+(3) (4)	發 文 統 計							存 查 件數 (10)	辦 結 公 文 合 計 (8)+(10)		待辦公文 (4)-(11)		未逾辦理 期限件數 (13)	已逾辦理期限		
					6日以內辦結		6日以上至30日辦結		30日以上辦結	小 計	發文平均		件數 (11)	％ (11)/(4)	件 數 (12)	％ (12)/(4)		期限件數 (14)	件數 (14)	％ (14)/(12)
					件數 (5)	％ (5)/(8)	件數 (6)	％ (6)/(8)	件數 (7)	(5)+(6)+(7) (8)	使用日數 (9)									
行政院	5,818	570	1,994	8,382	1,903	95.15	95	4.75	2	2,000	1.58	5,810	7,810	93.18	572	6.82	490	82	14.34	
內政部	54,192	5,522	11,797	71,511	20,051	93.20	1,455	6.76	8	21,514	2.27	44,159	65,673	91.84	5,838	8.16	5,374	464	7.95	
外交部	24,434	3,664	5,009	33,107	5,094	83.36	922	15.09	95	6,111	4.01	24,678	30,789	93.00	2,318	7.00	1,763	555	23.94	
國防部	24,939	5,270	4,046	34,255	12,014	86.86	1,818	13.14	0	13,832	2.42	15,275	29,107	84.97	5,148	15.03	4,351	797	15.48	
財政部	3,323	354	798	4,475	1,177	98.82	14	1.18	0	1,191	1.63	2,913	4,104	91.71	371	8.29	368	3	0.81	
教育部	12,279	2,688	5,212	20,179	8,672	88.83	1,076	11.02	15	9,763	3.12	7,819	17,582	87.13	2,597	12.87	2,568	29	1.12	
法務部	5,557	556	910	7,023	1,727	92.60	136	7.29	2	1,865	2.95	4,649	6,514	92.75	509	7.25	432	77	15.13	
經濟部	14,987	1,521	2,707	19,215	5,491	96.91	172	3.04	3	5,666	1.66	12,027	17,693	92.08	1,522	7.92	1,394	128	8.41	
交通部	10,421	1,752	1,349	13,522	3,314	90.25	344	9.37	14	3,672	2.45	7,997	11,669	86.30	1,853	13.70	1,141	712	38.42	
文化部	2,852	969	2,431	6,252	2,000	91.95	175	8.05	0	2,175	3.32	3,193	5,368	85.86	884	14.14	865	19	2.15	
衛生福利部	7,772	986	3,140	11,898	3,885	90.48	393	9.15	16	4,294	2.56	6,547	10,841	91.12	1,057	8.88	988	69	6.53	
勞動部	2,683	524	1,773	4,980	1,798	90.44	190	9.56	0	1,988	2.59	2,516	4,504	90.44	476	9.56	379	97	20.38	
科技部	2,808	235	457	3,500	1,915	98.26	32	1.64	2	1,949	1.92	1,124	3,073	87.80	427	12.20	410	17	3.98	
蒙藏委員會	384	57	171	612	95	90.48	10	9.52	0	105	2.69	458	563	91.99	49	8.01	48	1	2.04	
僑務委員會	2,983	378	744	4,105	1,259	92.51	102	7.49	0	1,361	2.50	2,357	3,718	90.57	387	9.43	353	34	8.79	
中央銀行	3,717	600	1,230	5,547	816	99.88	1	0.12	0	817	1.81	4,228	5,045	90.95	502	9.05	502	0	0.00	
行政院主計總處	2,885	356	690	3,931	726	98.51	11	1.49	0	737	1.41	2,845	3,582	91.12	349	8.88	348	1	0.29	
行政院人事行政總處	2,654	294	1,503	4,451	1,519	98.57	22	1.43	0	1,541	1.16	2,625	4,166	93.60	285	6.40	282	3	1.05	
行政院環保署	9,388	1,621	2,981	13,990	3,521	96.60	118	3.24	6	3,645	1.85	8,640	12,285	87.81	1,705	12.19	1,699	6	0.35	
國立故宮博物院	877	230	1,030	2,137	421	91.52	39	8.48	0	460	2.53	1,423	1,883	88.11	254	11.89	254	0	0.00	
行政院陸委會	1,995	380	807	3,182	450	76.66	134	22.83	3	587	4.65	2,146	2,733	85.89	449	14.11	357	92	20.49	
國家發展委員會	3,581	1,154	1,334	6,069	892	89.47	105	10.53	0	997	2.69	4,742	5,739	94.56	330	5.44	157	173	52.42	
金融監督管理委員會	742	179	647	1,568	315	86.78	47	12.95	1	363	3.58	1,008	1,371	87.44	197	12.56	197	0	0.00	
國軍退除役官兵輔導委員會	5,867	939	1,004	7,810	2,229	94.77	121	5.14	2	2,352	2.83	4,802	7,154	91.60	656	8.40	656	0	0.00	
行政院原能會	1,043	195	560	1,798	620	93.23	45	6.77	0	665	2.28	952	1,617	89.93	181	10.07	168	13	7.18	
行政院農委會	6,414	736	1,078	8,228	2,492	96.03	101	3.89	2	2,595	2.20	4,851	7,446	90.50	782	9.50	703	79	10.10	
公平交易委員會	3,047	11	710	3,768	490	98.79	6	1.21	0	496	1.47	3,254	3,750	99.52	18	0.48	18	0	0.00	
行政院工程會	1,850	213	309	2,372	717	97.68	17	2.32	0	734	2.25	1,357	2,091	88.15	281	11.85	281	0	0.00	
行政院原民會	4,664	566	2,462	7,692	2,881	94.80	158	5.20	0	3,039	1.69	4,144	7,183	93.38	509	6.62	489	20	3.93	
行政院海巡署	1,503	272	946	2,721	912	97.75	21	2.25	0	933	2.14	1,508	2,441	89.71	280	10.29	280	0	0.00	
客家委員會	1,114	131	810	2,055	787	98.75	10	1.25	0	797	1.61	1,061	1,858	90.41	197	9.59	192	5	2.54	
國家通訊傳播委員會	3,147	184	963	4,294	1,305	93.01	97	6.91	1	1,403	1.99	2,583	3,986	92.83	308	7.17	307	1	0.32	
中央選舉委員會	840	41	135	1,016	377	100.00	0	0.00	0	377	1.20	598	975	95.96	41	4.04	41	0	0.00	
臺灣省政府	398	10	190	598	305	98.71	4	1.29	0	309	1.33	271	580	96.99	18	3.01	18	0	0.00	
福建省政府	258	23	61	342	58	96.67	2	3.33	0	60	1.82	262	322	94.15	20	5.85	19	1	5.00	
總 計	231,416	33,181	61,988	326,585	92,228	91.87	7,993	7.96	172	100,393	2.29	194,822	295,215	90.39	31,370	9.61	27,892	3,478	11.09	

附註：配合組織改造，自 103 年 3 月 3 日起行政院國家科學委員會名稱異動為科技部；103 年 3 月 26 日起行政院原住民族委員會名稱異動為原住民族委員會。

二、立法委員質詢案件時效統計表

103年1月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已 辦 結 案 件 統 計										待 辦 案 件 統 計			
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	案件總數 (1)+(2) (3)	屆期應辦案件 之依限辦結率 (5) (3)-(14) (4)	依限辦結		逾 限 辦 結					辦結案件		發文平 均使用 日數 (12)	待辦案件		未逾 辦理 期限 件數 (14)	已逾 辦理 期限 件數 (15)
							逾限5日 以內辦結	逾限5以上 至10日辦結	逾限10以上 至15日辦結	逾限15日 以上辦結	小 計 (6)+(7)+(8)+(9)	合 計 (5)+(10)	(3)-(11)					
					件數	%	件數	件數	件數	件數	件數	件數	%					
(5)	(5)/(11)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(3)	(13)	(13)/(3)	(14)	(15)						
行政院	186	36	222	100.00	181	100.00	0	0	0	0	0	181	81.53	4.00	41	18.47	41	0
內政部	21	4	25	100.00	25	100.00	0	0	0	0	0	25	100.00	4.88	0	0.00	0	0
外交部	2	1	3	33.33	1	33.33	0	2	0	0	2	3	100.00	10.70	0	0.00	0	0
財政部	13	0	13	100.00	13	100.00	0	0	0	0	0	13	100.00	3.31	0	0.00	0	0
教育部	13	2	15	100.00	15	100.00	0	0	0	0	0	15	100.00	4.27	0	0.00	0	0
法務部	6	0	6	100.00	6	100.00	0	0	0	0	0	6	100.00	2.50	0	0.00	0	0
經濟部	25	1	26	100.00	26	100.00	0	0	0	0	0	26	100.00	5.31	0	0.00	0	0
交通部	28	3	31	96.77	30	96.77	1	0	0	0	1	31	100.00	5.97	0	0.00	0	0
衛生福利部	9	2	11	100.00	11	100.00	0	0	0	0	0	11	100.00	5.73	0	0.00	0	0
中央銀行	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	100.00	5.25	0	0.00	0	0
行政院主計總處	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	3.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	13	5	18	93.33	14	93.33	1	0	0	0	1	15	83.33	5.50	3	16.67	3	0
行政院陸委會	2	1	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	6.33	0	0.00	0	0
行政院國科會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	4.80	0	0.00	0	0
行政院研考會	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	4.50	0	0.00	0	0
行政院農委會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	2.00	0	0.00	0	0
行政院勞委會	19	5	24	86.36	19	86.36	3	0	0	0	3	22	91.67	5.95	2	8.33	2	0
公平交易委員會	5	0	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100.00	3.20	0	0.00	0	0
行政院工程會	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	3.10	0	0.00	0	0
國家通訊傳播委員會	3	1	4	75.00	3	75.00	1	0	0	0	1	4	100.00	6.38	0	0.00	0	0
中央選舉委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	0.50	0	0.00	0	0
總 計	354	63	417	97.84	363	97.84	6	2	0	0	8	371	88.97	4.63	46	11.03	46	0

附註：1.本表期限計算係以行政院及所屬各機關辦理答復立法委員質詢案件處理原則及其相關規定之日數為基準。

2.行政院所列資料係代表該院自立法院提出質詢至函復之時效統計，其發文平均使用日數即為結案平均使用日數。

103 年 2 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已 辦 結 案 件 統 計											待 辦 案 件 統 計			
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	案件總數 (1)+(2) (3)	屆期應辦案件 之依限辦結率 (5) (3)-(14) (4)	依限辦結		逾 限 辦 結					辦結案件		發文平 均使用 日數 (12)	待辦案件		未逾 辦理 期限 件數 (14)	已逾 辦理 期限 件數 (15)	
							逾限5日 以內辦結 (6)	逾限5以上 至10日辦結 (7)	逾限10以上 至15日辦結 (8)	逾限15日 以上辦結 (9)	小 計 (6)+(7)+(8)+(9) (10)	合 計 (5)+(10) (11)	(3)-(11) (13)		件數 (13)／(3)				
																件數 (5)			% (5)／(11)
行政院	26	41	67	100.00	41	100.00	0	0	0	0	0	41	61.19	6.00	26	38.81	26	0	
內政部	4	0	4	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	100.00	4	0	
財政部	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	3.50	0	0.00	0	0	
教育部	3	0	3	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3	100.00	3	0	
經濟部	1	0	1	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	1	0	
交通部	7	0	7	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	28.57	4.00	5	71.43	5	0	
衛生福利部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	5.00	0	0.00	0	0	
勞動部	2	2	4	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	50.00	9.00	2	50.00	2	0	
中央銀行	1	0	1	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	1	0	
行政院環保署	13	5	18	93.33	14	93.33	1	0	0	0	1	15	83.33	5.50	3	16.67	3	0	
行政院陸委會	1	0	1	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	1	0	
國家發展委員會	4	0	4	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	100.00	4	0	
行政院農委會	1	0	1	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	1	0	
總 計	66	48	114	98.41	62	98.41	1	0	0	0	1	63	55.26	2.54	51	44.74	51	0	

103 年 3 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已 辦 結 案 件 統 計											待 辦 案 件 統 計			
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	案件總數 (1)+(2) (3)	屆期應辦案件 之依限辦結率 (5) (3)-(14) (4)	依限辦結		逾 限 辦 結					辦結案件		發文平 均使用 日數 (12)	待辦案件		未逾 辦理 期限 件數 (14)	已逾 辦理 期限 件數 (15)	
												合 計			(3)-(11)				
							逾限5日 以內辦結	逾限5以上 至10日辦結	逾限10以上 至15日辦結	逾限15日 以上辦結	小 計 (6)+(7)+(8)+(9)	(5)+(10)	件數		件數				
					件數	% (5)/(11)	件數	件數	件數	件數	件數	件數	% (11)/(3)		件數	% (13)/(3)			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(3)	(12)	(13)	(13)/(3)	(14)	(15)							
行政院	117	26	143	100.00	74	100.00	0	0	0	0	0	74	51.75	10.00	69	48.25	69	0	
內政部	15	4	19	100.00	19	100.00	0	0	0	0	0	19	100.00	4.47	0	0.00	0	0	
外交部	2	0	2	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	100.00	2	0	
財政部	8	0	8	100.00	8	100.00	0	0	0	0	0	8	100.00	2.38	0	0.00	0	0	
教育部	11	3	14	100.00	14	100.00	0	0	0	0	0	14	100.00	5.36	0	0.00	0	0	
法務部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	5.00	0	0.00	0	0	
經濟部	14	1	15	93.33	14	93.33	1	0	0	0	1	15	100.00	5.33	0	0.00	0	0	
交通部	20	5	25	92.00	23	92.00	2	0	0	0	2	25	100.00	5.40	0	0.00	0	0	
文化部	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	3.00	0	0.00	0	0	
衛生福利部	10	0	10	100.00	10	100.00	0	0	0	0	0	10	100.00	4.60	0	0.00	0	0	
勞動部	20	2	22	85.71	18	85.71	3	0	0	0	3	21	95.45	6.48	1	4.55	1	0	
科技部	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	1.52	0	0.00	0	0	
中央銀行	2	1	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	3.67	0	0.00	0	0	
行政院人事行政總處	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	1.00	0	0.00	0	0	
行政院環保署	5	1	6	80.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	66.67	4.88	2	33.33	1	1	
行政院陸委會	5	1	6	100.00	6	100.00	0	0	0	0	0	6	100.00	6.00	0	0.00	0	0	
國家發展委員會	11	4	15	86.67	13	86.67	2	0	0	0	2	15	100.00	5.00	0	0.00	0	0	
行政院農委會	7	1	8	75.00	6	75.00	2	0	0	0	2	8	100.00	2.81	0	0.00	0	0	
公平交易委員會	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	2.00	0	0.00	0	0	
國家通訊傳播委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	2.00	0	0.00	0	0	
總 計	258	49	307	95.30	223	95.71	10	0	0	0	10	233	75.90	4.04	74	24.10	73	1	

三、人民申請案件時效統計表

103 年 1 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦	已逾辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	12	2	14	92.86	13	92.86	1	7.14	14	100.00	0	0.00	0	0
內政部	2,957	1,124	4,081	94.94	2,892	95.86	125	4.14	3,017	73.93	1,064	26.07	1,035	29
外交部	152	88	240	74.01	131	74.86	44	25.14	175	72.92	65	27.08	63	2
國防部	47	14	61	100.00	25	100.00	0	0.00	25	40.98	36	59.02	36	0
法務部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
經濟部	18,170	409	18,579	99.96	18,342	99.97	6	0.03	18,348	98.76	231	1.24	229	2
交通部	6	1	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	0	0.00	0	0
文化部	148	10	158	100.00	142	100.00	0	0.00	142	89.87	16	10.13	16	0
衛生福利部	7,731	24,204	31,935	97.78	4,538	98.82	54	1.18	4,592	14.38	27,343	85.62	27,294	49
僑務委員會	62	2	64	96.77	60	96.77	2	3.23	62	96.88	2	3.13	2	0
中央銀行	240	12	252	100.00	242	100.00	0	0.00	242	96.03	10	3.97	10	0
行政院環保署	222	139	361	100.00	284	100.00	0	0.00	284	78.67	77	21.33	77	0
國立故宮博物院	55	4	59	100.00	58	100.00	0	0.00	58	98.31	1	1.69	1	0
國家發展委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	87	2	89	100.00	89	100.00	0	0.00	89	100.00	0	0.00	0	0
行政院原能會	701	356	1,057	87.87	645	94.44	38	5.56	683	64.62	374	35.38	323	51
行政院農委會	204	42	246	97.73	215	98.17	4	1.83	219	89.02	27	10.98	26	1
行政院勞委會	945	0	945	100.00	945	100.00	0	0.00	945	100.00	0	0.00	0	0
公平交易委員會	174	4	178	98.72	154	98.72	2	1.28	156	87.64	22	12.36	22	0
行政院工程會	287	174	461	100.00	404	100.00	0	0.00	404	87.64	57	12.36	57	0
行政院原民會	30	21	51	53.19	25	53.19	22	46.81	47	92.16	4	7.84	4	0
行政院海巡署	1	0	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0
客家委員會	249	31	280	100.00	230	100.00	0	0.00	230	82.14	50	17.86	50	0
國家通訊傳播委員會	458	178	636	99.77	427	99.77	1	0.23	428	67.30	208	32.70	208	0
總 計	32,940	26,817	59,757	98.57	29,870	99.01	299	0.99	30,169	50.49	29,588	49.51	29,454	134

附註：本表期限計算係以各類別申請案件項目之公告處理日數為基準。

103 年 2 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦	已逾辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	10	0	10	100.00	8	100.00	0	0.00	8	80.00	2	20.00	2	0
內政部	1,909	1,105	3,014	94.23	1,928	96.50	70	3.50	1,998	66.29	1,016	33.71	968	48
外交部	105	69	174	57.80	63	64.95	34	35.05	97	55.75	77	44.25	65	12
國防部	45	36	81	100.00	74	100.00	0	0.00	74	91.36	7	8.64	7	0
經濟部	15,130	231	15,361	99.94	15,099	99.95	7	0.05	15,106	98.34	255	1.66	253	2
交通部	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
文化部	169	16	185	100.00	134	100.00	0	0.00	134	72.43	51	27.57	51	0
衛生福利部	9,486	27,690	37,176	98.61	4,602	99.50	23	0.50	4,625	12.44	32,551	87.56	32,509	42
僑務委員會	62	2	64	100.00	64	100.00	0	0.00	64	100.00	0	0.00	0	0
中央銀行	187	10	197	100.00	183	100.00	0	0.00	183	92.89	14	7.11	14	0
行政院主計總處	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院人事行政總處	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	232	77	309	100.00	209	100.00	0	0.00	209	67.64	100	32.36	100	0
國立故宮博物院	73	1	74	100.00	67	100.00	0	0.00	67	90.54	7	9.46	7	0
國家發展委員會	2	0	2	100.00	1	100.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0
國軍退除役官兵輔導委員會	96	0	96	100.00	87	100.00	0	0.00	87	90.63	9	9.38	9	0
行政院原能會	616	379	995	86.86	562	92.13	48	7.87	610	61.31	385	38.69	348	37
行政院農委會	191	27	218	93.99	172	94.51	10	5.49	182	83.49	36	16.51	35	1
公平交易委員會	97	22	119	99.15	117	99.15	1	0.85	118	99.16	1	0.84	1	0
行政院工程會	189	56	245	100.00	160	100.00	0	0.00	160	65.31	85	34.69	85	0
行政院原民會	26	4	30	90.48	19	90.48	2	9.52	21	70.00	9	30.00	9	0
行政院海巡署	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
客家委員會	155	50	205	100.00	176	100.00	0	0.00	176	85.85	29	14.15	29	0
國家通訊傳播委員會	403	206	609	100.00	395	100.00	0	0.00	395	64.86	214	35.14	214	0
總 計	29,187	29,982	59,169	98.62	24,125	99.20	195	0.80	24,320	41.10	34,849	58.90	34,707	142

103 年 3 月份

機 關	項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
		本月新收	截至上	案件總	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未 逾 辦	已 逾 辦
			月待辦	數						(5)+(6)		(3)-(7)		理 期 限	理 期 限
		案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院		6	2	8	100.00	4	100.00	0	0.00	4	50.00	4	50.00	4	0
內政部		3,074	1,061	4,135	95.28	2,727	95.92	116	4.08	2,843	68.75	1,292	31.25	1,273	19
外交部		115	81	196	65.90	114	67.46	55	32.54	169	86.22	27	13.78	23	4
國防部		50	7	57	100.00	46	100.00	0	0.00	46	80.70	11	19.30	11	0
經濟部		20,459	490	20,949	99.49	20,291	99.55	91	0.45	20,382	97.29	567	2.71	554	13
交通部		4	0	4	100.00	3	100.00	0	0.00	3	75.00	1	25.00	1	0
文化部		273	51	324	100.00	252	100.00	0	0.00	252	77.78	72	22.22	72	0
衛生福利部		8,916	32,588	41,504	99.59	10,122	99.95	5	0.05	10,127	24.40	31,377	75.60	31,340	37
僑務委員會		97	0	97	100.00	96	100.00	0	0.00	96	98.97	1	1.03	1	0
中央銀行		248	14	262	100.00	239	100.00	0	0.00	239	91.22	23	8.78	23	0
行政院主計總處		1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署		318	100	418	100.00	276	100.00	0	0.00	276	66.03	142	33.97	142	0
國立故宮博物院		92	7	99	100.00	95	100.00	0	0.00	95	95.96	4	4.04	4	0
國家發展委員會		24	1	25	100.00	25	100.00	0	0.00	25	100.00	0	0.00	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會		107	9	116	100.00	113	100.00	0	0.00	113	97.41	3	2.59	3	0
行政院原能會		712	401	1,113	84.86	695	92.79	54	7.21	749	67.30	364	32.70	294	70
行政院農委會		185	36	221	95.34	184	96.84	6	3.16	190	85.97	31	14.03	28	3
公平交易委員會		199	1	200	100.00	195	100.00	0	0.00	195	97.50	5	2.50	5	0
行政院工程會		616	85	701	100.00	580	100.00	0	0.00	580	82.74	121	17.26	121	0
原住民族委員會		27	9	36	97.22	35	97.22	1	2.78	36	100.00	0	0.00	0	0
客家委員會		214	29	243	100.00	196	100.00	0	0.00	196	80.66	47	19.34	47	0
國家通訊傳播委員會		396	213	609	99.47	377	99.47	2	0.53	379	62.23	230	37.77	230	0
總 計		36,133	35,185	71,318	98.72	36,666	99.11	330	0.89	36,996	51.87	34,322	48.13	34,176	146

四、訴願案件時效統計表

103 年 1 月份

機 關	項 目	應辦案件統計				已辦結案件統計										待辦案件統計				
		本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結				逾限辦結				合 計		待辦案件		未逾辦理期限	已逾辦理期限	本月份被合併審議決定辦結案件數
						3個月內		3～5個月		3～5個月		逾5個月		(5)+(6)+(7)+(8)		(3)～(9)				
						件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)／(9)	(6)	(6)／(9)	(7)	(7)／(9)	(8)	(8)／(9)	(9)	(9)／(3)	(10)	(10)／(3)	(11)	(12)	(13)
行政院		211	517	727	100.00	163	84.46	30	15.54	0	0.00	0	0.00	193	26.55	534	73.45	534	0	
內政部		275	447	708	99.48	164	84.97	29	15.03	0	0.00	0	0.00	193	27.26	515	72.74	514	1	14
外交部		49	8	57	95.12	39	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	39	68.42	18	31.58	16	2	0
國防部		16	3	19	100.00	16	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	84.21	3	15.79	3	0	0
財政部		249	655	904	100.00	158	90.29	17	9.71	0	0.00	0	0.00	175	19.36	729	80.64	729	0	0
教育部		116	165	281	100.00	96	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	96	34.16	185	65.84	185	0	0
法務部		19	0	19	100.00	18	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	94.74	1	5.26	1	0	0
經濟部		119	482	601	100.00	71	59.17	49	40.83	0	0.00	0	0.00	120	19.97	481	80.03	481	0	0
交通部		35	54	89	100.00	28	93.33	2	6.67	0	0.00	0	0.00	30	33.71	59	66.29	59	0	0
文化部		1	1	2	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0	0
衛生福利部		61	116	177	100.00	46	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	46	25.99	131	74.01	131	0	0
行政院人事行政總處		0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院環保署		59	149	208	100.00	72	82.76	15	17.24	0	0.00	0	0.00	87	41.83	121	58.17	121	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會		0	2	2	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院國科會		4	1	5	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	80.00	1	20.00	1	0	0
行政院農委會		30	84	114	94.74	30	78.95	6	15.79	0	0.00	2	5.26	38	33.33	76	66.67	76	0	0
行政院勞委會		225	695	920	100.00	75	44.91	92	55.09	0	0.00	0	0.00	167	18.15	753	81.85	753	0	0
行政院工程會		2	1	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院原民會		1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院海巡署		3	1	4	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	0	0
國家通訊傳播委員會		0	2	2	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	0	0
中央選舉委員會		0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0
臺灣省政府		5	0	5	100.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0	0
總 計		1,480	3,385	4,850	99.60	994	80.42	240	19.42	0	0.00	2	0.16	1,236	25.48	3,614	74.52	3,611	3	15

附註：本表期限計算係以訴願法及其相關規定之處理期限為基準。

103 年 2 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計										待辦案件統計				
	本月新收 案件數 (1)	截至上 月待辦 案件數 (2)	案件總數 (1)+(2)-(13) (3)	屆期應辦案件 之依限辦結率 (5)+(6)/(3)-(11) (4)	依限辦結				逾限辦結				合 計		待辦案件 (3)-(9)		未 逾 辦	已 逾 辦	本月份被合 併審議決定 辦結案件數 (13)
					3 個月內		3 ~ 5 個月		3 ~ 5 個月		逾 5 個月		(5)+(6)+(7)+(8)		(3)-(9)		理 期 限	理 期 限	
					件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(9)	(6)	(6)/(9)	(7)	(7)/(9)	(8)	(8)/(9)	(9)	(9)/(3)	(10)	(10)/(3)	(11)	(12)	(13)
行政院	167	534	701	100.00	154	84.62	28	15.38	0	0.00	0	0.00	182	25.96	519	74.04	519	0	0
內政部	282	529	803	99.05	177	84.29	32	15.24	0	0.00	1	0.48	210	26.15	593	73.85	592	1	8
外交部	51	18	69	78.00	39	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	39	56.52	30	43.48	19	11	0
國防部	0	3	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0	0
財政部	257	729	986	100.00	135	81.33	31	18.67	0	0.00	0	0.00	166	16.84	820	83.16	820	0	0
教育部	90	167	257	100.00	64	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	64	24.90	193	75.10	193	0	0
法務部	18	1	19	100.00	13	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	68.42	6	31.58	6	0	0
經濟部	91	481	572	100.00	59	54.13	50	45.87	0	0.00	0	0.00	109	19.06	463	80.94	463	0	0
交通部	29	59	88	100.00	28	93.33	2	6.67	0	0.00	0	0.00	30	34.09	58	65.91	58	0	0
文化部	9	1	10	100.00	9	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	90.00	1	10.00	1	0	0
衛生福利部	39	131	170	100.00	53	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	53	31.18	117	68.82	117	0	0
勞動部	187	753	940	100.00	113	49.13	117	50.87	0	0.00	0	0.00	230	24.47	710	75.53	710	0	0
行政院環保署	43	116	159	100.00	20	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	12.58	139	87.42	139	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	1	1	2	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	0	0
行政院國科會	3	1	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院農委會	39	76	115	84.62	12	46.15	10	38.46	2	7.69	2	7.69	26	22.61	89	77.39	89	0	0
行政院工程會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院海巡署	0	3	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0	0
國家通訊傳播委員會	0	2	2	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0	0
臺灣省政府	6	0	6	100.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	0	0	0
總 計	1,313	3,605	4,910	98.56	894	76.48	270	23.10	2	0.17	3	0.26	1,169	23.81	3,741	76.19	3,729	12	8

103 年 3 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計										待辦案件統計				
	本月新收	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結				逾限辦結				合 計		待辦案件 (3)-(9)		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限	本月份被合 併審議決定 辦結案件數
	案件數	案件數	(1)+(2)-(13)	(5)+(6)/(3)-(11)	件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(9)	(6)	(6)/(9)	(7)	(7)/(9)	(8)	(8)/(9)	(9)	(9)/(3)	(10)	(10)/(3)	(11)	(12)	(13)
行政院	194	519	713	100.00	134	67.68	64	32.32	0	0.00	0	0.00	198	27.77	515	72.23	515	0	0
內政部	188	569	749	99.66	250	83.89	47	15.77	0	0.00	1	0.34	298	39.79	451	60.21	451	0	8
外交部	61	31	92	96.15	73	94.81	2	2.60	2	2.60	0	0.00	77	83.70	15	16.30	14	1	0
國防部	10	0	9	100.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	66.67	3	33.33	3	0	1
財政部	166	820	986	100.00	228	84.76	41	15.24	0	0.00	0	0.00	269	27.28	717	72.72	717	0	0
教育部	115	196	311	100.00	110	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	110	35.37	201	64.63	201	0	0
法務部	35	6	41	100.00	39	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	39	95.12	2	4.88	2	0	0
經濟部	116	463	579	100.00	66	46.81	75	53.19	0	0.00	0	0.00	141	24.35	438	75.65	438	0	0
交通部	26	58	84	100.00	33	89.19	4	10.81	0	0.00	0	0.00	37	44.05	47	55.95	47	0	0
文化部	8	1	9	100.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	55.56	4	44.44	4	0	0
衛生福利部	66	117	183	100.00	58	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	58	31.69	125	68.31	125	0	0
勞動部	194	710	904	100.00	171	52.78	153	47.22	0	0.00	0	0.00	324	35.84	580	64.16	580	0	0
科技部	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院環保署	50	110	160	100.00	43	81.13	10	18.87	0	0.00	0	0.00	53	33.13	107	66.88	107	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	1	2	3	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	1	0	0
行政院農委會	45	89	134	97.56	23	56.10	17	41.46	0	0.00	1	2.44	41	30.60	93	69.40	93	0	0
國家通訊傳播委員會	0	1	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0	0
臺灣省政府	10	0	10	100.00	10	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0	0
總 計	1,288	3,692	4,971	99.70	1,254	75.04	413	24.72	2	0.12	2	0.12	1,671	33.61	3,300	66.39	3,299	1	9

五、人民陳情案件時效統計表

103 年 1 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上 月待辦	案件總 數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未 逾 辦	已 逾 辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	484	30	514	100.00	493	100.00	0	0.00	493	95.91	21	4.09	21	0
內政部	1,412	147	1,559	99.38	1,441	99.72	4	0.28	1,445	92.69	114	7.31	109	5
外交部	146	0	146	80.82	118	80.82	28	19.18	146	100.00	0	0.00	0	0
國防部	91	10	101	92.68	76	96.20	3	3.80	79	78.22	22	21.78	19	3
財政部	26	4	30	91.30	21	91.30	2	8.70	23	76.67	7	23.33	7	0
教育部	876	186	1,062	99.25	922	99.68	3	0.32	925	87.10	137	12.90	133	4
法務部	815	87	902	87.96	716	89.72	82	10.28	798	88.47	104	11.53	88	16
經濟部	79	24	103	100.00	82	100.00	0	0.00	82	79.61	21	20.39	21	0
交通部	1,686	269	1,955	96.99	1,610	98.53	24	1.47	1,634	83.58	321	16.42	295	26
文化部	76	21	97	100.00	82	100.00	0	0.00	82	84.54	15	15.46	15	0
衛生福利部	37	23	60	97.96	48	97.96	1	2.04	49	81.67	11	18.33	11	0
僑務委員會	39	6	45	89.74	35	92.11	3	7.89	38	84.44	7	15.56	6	1
中央銀行	101	12	113	100.00	94	100.00	0	0.00	94	83.19	19	16.81	19	0
行政院主計總處	34	8	42	100.00	38	100.00	0	0.00	38	90.48	4	9.52	4	0
行政院人事行政總處	221	22	243	100.00	229	100.00	0	0.00	229	94.24	14	5.76	14	0
行政院環保署	39	12	51	97.56	40	97.56	1	2.44	41	80.39	10	19.61	10	0
國立故宮博物院	3	0	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	1	0
行政院陸委會	73	11	84	87.84	65	90.28	7	9.72	72	85.71	12	14.29	10	2
國家發展委員會	7	0	7	100.00	5	100.00	0	0.00	5	71.43	2	28.57	2	0
金融監督管理委員會	11	3	14	100.00	12	100.00	0	0.00	12	85.71	2	14.29	2	0
國軍退除役官兵輔導委員會	57	7	64	100.00	54	100.00	0	0.00	54	84.38	10	15.63	10	0
行政院國科會	10	2	12	100.00	9	100.00	0	0.00	9	75.00	3	25.00	3	0
行政院研考會	62	1	63	98.39	61	100.00	0	0.00	61	96.83	2	3.17	1	1
行政院農委會	153	32	185	98.20	164	99.39	1	0.61	165	89.19	20	10.81	18	2
行政院勞委會	968	205	1,173	86.68	898	89.44	106	10.56	1,004	85.59	169	14.41	137	32
行政院工程會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院原民會	29	4	33	100.00	32	100.00	0	0.00	32	96.97	1	3.03	1	0
行政院海巡署	42	8	50	100.00	43	100.00	0	0.00	43	86.00	7	14.00	7	0
客家委員會	8	0	8	100.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	0	0.00	0	0
國家通訊傳播委員會	1,740	1,024	2,764	99.14	1,726	99.25	13	0.75	1,739	62.92	1,025	37.08	1,023	2
中央選舉委員會	16	1	17	100.00	17	100.00	0	0.00	17	100.00	0	0.00	0	0
總 計	9,342	2,159	11,501	96.09	9,142	97.05	278	2.95	9,420	81.91	2,081	18.09	1,987	94

附註：本表期限計算係以行政院暨所屬各機關處理人民陳情案件要點規定之日數為基準。

103 年 2 月份

機 關 項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上 月待辦	案件總 數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未 逾 辦	已 逾 辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)／(3)－(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)／(7)	(6)	(6)／(7)	(7)	(7)／(3)	(8)	(8)／(3)	(9)	(10)
行政院	429	19	448	100.00	419	100.00	0	0.00	419	93.53	29	6.47	29	0
內政部	1,475	112	1,587	99.21	1,390	99.50	7	0.50	1,397	88.03	190	11.97	186	4
外交部	87	0	87	77.01	67	77.01	20	22.99	87	100.00	0	0.00	0	0
國防部	125	22	147	96.83	122	97.60	3	2.40	125	85.03	22	14.97	21	1
財政部	14	6	20	100.00	17	100.00	0	0.00	17	85.00	3	15.00	3	0
教育部	650	137	787	98.57	621	99.20	5	0.80	626	79.54	161	20.46	157	4
法務部	683	99	782	86.96	600	89.69	69	10.31	669	85.55	113	14.45	92	21
經濟部	70	21	91	100.00	61	100.00	0	0.00	61	67.03	30	32.97	30	0
交通部	1,135	321	1,456	94.84	1,139	96.44	42	3.56	1,181	81.11	275	18.89	255	20
文化部	71	15	86	98.08	51	100.00	0	0.00	51	59.30	35	40.70	34	1
衛生福利部	22	20	42	82.86	29	82.86	6	17.14	35	83.33	7	16.67	7	0
勞動部	710	130	840	90.54	651	95.59	30	4.41	681	81.07	159	18.93	121	38
僑務委員會	55	1	56	97.37	37	97.37	1	2.63	38	67.86	18	32.14	18	0
中央銀行	89	19	108	100.00	95	100.00	0	0.00	95	87.96	13	12.04	13	0
行政院主計總處	39	4	43	100.00	39	100.00	0	0.00	39	90.70	4	9.30	4	0
行政院人事行政總處	178	14	192	100.00	172	100.00	0	0.00	172	89.58	20	10.42	20	0
行政院環保署	32	10	42	93.55	29	96.67	1	3.33	30	71.43	12	28.57	11	1
國立故宮博物院	3	1	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
行政院陸委會	74	15	89	75.00	57	82.61	12	17.39	69	77.53	20	22.47	13	7
國家發展委員會	6	4	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0
金融監督管理委員會	10	2	12	100.00	10	100.00	0	0.00	10	83.33	2	16.67	2	0
國軍退除役官兵輔導委員會	53	10	63	100.00	55	100.00	0	0.00	55	87.30	8	12.70	8	0
行政院國科會	11	3	14	100.00	12	100.00	0	0.00	12	85.71	2	14.29	2	0
行政院農委會	106	20	126	96.30	104	100.00	0	0.00	104	82.54	22	17.46	18	4
公平交易委員會	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
行政院工程會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院原民會	41	1	42	96.88	31	100.00	0	0.00	31	73.81	11	26.19	10	1
行政院海巡署	41	7	48	100.00	38	100.00	0	0.00	38	79.17	10	20.83	10	0
國家通訊傳播委員會	1,511	1,023	2,534	99.63	1,341	99.70	4	0.30	1,345	53.08	1,189	46.92	1,188	1
中央選舉委員會	20	0	20	100.00	19	100.00	0	0.00	19	95.00	1	5.00	1	0
總 計	7,743	2,036	9,779	95.97	7,223	97.31	200	2.69	7,423	75.91	2,356	24.09	2,253	103

103 年 3 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上 月待辦	案件總 數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未 逾 辦 理 期 限	已 逾 辦 理 期 限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	573	29	602	99.82	564	99.82	1	0.18	565	93.85	37	6.15	37	0
內政部	1,768	187	1,955	99.42	1,726	100.00	0	0.00	1,726	88.29	229	11.71	219	10
外交部	146	0	146	64.38	94	64.38	52	35.62	146	100.00	0	0.00	0	0
國防部	106	22	128	88.99	97	95.10	5	4.90	102	79.69	26	20.31	19	7
財政部	13	3	16	100.00	14	100.00	0	0.00	14	87.50	2	12.50	2	0
教育部	818	161	979	99.25	789	99.62	3	0.38	792	80.90	187	19.10	184	3
法務部	916	112	1,028	78.98	669	81.68	150	18.32	819	79.67	209	20.33	181	28
經濟部	64	30	94	100.00	71	100.00	0	0.00	71	75.53	23	24.47	23	0
交通部	1,242	273	1,515	97.25	1,274	97.92	27	2.08	1,301	85.87	214	14.13	205	9
文化部	128	36	164	100.00	128	100.00	0	0.00	128	78.05	36	21.95	36	0
衛生福利部	58	8	66	100.00	52	100.00	0	0.00	52	78.79	14	21.21	14	0
勞動部	630	159	789	80.55	584	81.91	129	18.09	713	90.37	76	9.63	64	12
科技部	12	2	14	100.00	11	100.00	0	0.00	11	78.57	3	21.43	3	0
僑務委員會	58	9	67	90.38	47	92.16	4	7.84	51	76.12	16	23.88	15	1
中央銀行	111	13	124	100.00	102	100.00	0	0.00	102	82.26	22	17.74	22	0
行政院主計總處	40	4	44	100.00	36	100.00	0	0.00	36	81.82	8	18.18	8	0
行政院人事行政總處	243	20	263	100.00	237	100.00	0	0.00	237	90.11	26	9.89	26	0
行政院環保署	17	12	29	96.15	25	96.15	1	3.85	26	89.66	3	10.34	3	0
國立故宮博物院	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
行政院陸委會	334	18	352	46.08	100	82.64	21	17.36	121	34.38	231	65.63	135	96
國家發展委員會	42	0	42	92.86	39	92.86	3	7.14	42	100.00	0	0.00	0	0
金融監督管理委員會	14	2	16	100.00	13	100.00	0	0.00	13	81.25	3	18.75	3	0
國軍退除役官兵輔導委員會	43	8	51	100.00	49	100.00	0	0.00	49	96.08	2	3.92	2	0
行政院農委會	176	22	198	97.59	162	100.00	0	0.00	162	81.82	36	18.18	32	4
公平交易委員會	7	0	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	0	0.00	0	0
行政院工程會	6	0	6	100.00	6	100.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	0	0
原住民族委員會	40	11	51	100.00	47	100.00	0	0.00	47	92.16	4	7.84	4	0
行政院海巡署	66	10	76	100.00	70	100.00	0	0.00	70	92.11	6	7.89	6	0
客家委員會	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
國家通訊傳播委員會	2,289	1,177	3,466	99.95	2,186	99.95	1	0.05	2,187	63.10	1,279	36.90	1,279	0
中央選舉委員會	21	1	22	100.00	21	100.00	0	0.00	21	95.45	1	4.55	1	0
總 計	9,987	2,329	12,316	94.21	9,226	95.87	397	4.13	9,623	78.13	2,693	21.87	2,523	170

六、專案管制案件時效統計表

103 年 1 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計				待辦案件統計			
	本月新增	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結	逾限辦結	辦結案件合計		待辦案件		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	專 案 數	專案數			案 件 數	案 件 數	(5)+(6)		(3)-(7)		案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)			案件數	%	案件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	36	9	45	100.00	40	0	40	88.89	5	11.11	5	0
外交部	2	1	3	33.33	1	2	3	100.00	0	0.00	0	0
國防部	19	16	35	90.00	9	1	10	28.57	25	71.43	25	0
財政部	2	8	10	66.67	2	0	2	20.00	8	80.00	7	1
教育部	5	102	107	100.00	1	0	1	0.93	106	99.07	106	0
法務部	1	1	2	100.00	1	0	1	50.00	1	50.00	1	0
文化部	2	2	4	100.00	1	0	1	25.00	3	75.00	3	0
行政院人事行政總處	0	5	5	100.00	4	0	4	80.00	1	20.00	1	0
國立故宮博物院	0	2	2	--	0	0	0	0.00	2	100.00	2	0
行政院陸委會	1	3	4	100.00	1	0	1	25.00	3	75.00	3	0
國家發展委員會	8	21	29	96.30	26	1	27	93.10	2	6.90	2	0
金融監督管理委員會	0	4	4	100.00	2	0	2	50.00	2	50.00	2	0
行政院國科會	2,887	1,414	4,301	99.84	3,038	3	3,041	70.70	1,260	29.30	1,258	2
行政院農委會	49	26	75	88.46	23	1	24	32.00	51	68.00	49	2
行政院工程會	740	170	910	100.00	804	0	804	88.35	106	11.65	106	0
國家通訊傳播委員會	16	26	42	100.00	15	0	15	35.71	27	64.29	27	0
總 計	3,768	1,810	5,578	99.67	3,968	8	3,976	71.28	1,602	28.72	1,597	5

附註：本表期限計算係以各專案規定程序申請奉核之處理期限為基準。

103 年 2 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計				待辦案件統計			
	本月新增	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結	逾限辦結	辦結案件合計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	專 案 數	專案數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案 件 數	案 件 數	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	24	4	28	100.00	23	0	23	82.14	5	17.86	5	0
國防部	39	25	64	97.56	40	0	40	62.50	24	37.50	23	1
財政部	2	7	9	100.00	5	0	5	55.56	4	44.44	4	0
教育部	0	109	109	100.00	12	0	12	11.01	97	88.99	97	0
法務部	0	1	1	--	0	0	0	0.00	1	100.00	1	0
文化部	1	3	4	100.00	4	0	4	100.00	0	0.00	0	0
行政院人事行政總處	0	2	2	100.00	1	0	1	50.00	1	50.00	1	0
行政院環保署	1	0	1	--	0	0	0	0.00	1	100.00	1	0
國立故宮博物院	0	4	4	50.00	1	1	2	50.00	2	50.00	2	0
行政院陸委會	0	5	5	0.00	0	0	0	0.00	5	100.00	3	2
國家發展委員會	0	2	2	100.00	2	0	2	100.00	0	0.00	0	0
金融監督管理委員會	0	2	2	0.00	0	1	1	50.00	1	50.00	1	0
行政院國科會	2,154	1,280	3,434	99.41	2,188	4	2,192	63.83	1,242	36.17	1,233	9
行政院農委會	41	51	92	92.86	39	2	41	44.57	51	55.43	50	1
行政院工程會	634	138	772	100.00	576	0	576	74.61	196	25.39	196	0
國家通訊傳播委員會	11	33	44	100.00	10	0	10	22.73	34	77.27	34	0
總 計	2,907	1,666	4,573	99.28	2,901	8	2,909	63.61	1,664	36.39	1,651	13

103 年 3 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計				待辦案件統計			
	本月新增	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結	逾限辦結	辦結案件合計		待辦案件		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	專 案 數	專案數			案 件 數	案 件 數	(5)+(6)		(3)-(7)		案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)			案 件 數	%	案 件 數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	37	5	42	100.00	37	0	37	88.10	5	11.90	5	0
國防部	11	24	35	95.83	23	1	24	68.57	11	31.43	11	0
財政部	2	4	6	100.00	3	0	3	50.00	3	50.00	3	0
教育部	2	100	102	98.88	88	1	89	87.25	13	12.75	13	0
法務部	0	1	1	100.00	1	0	1	100.00	0	0.00	0	0
文化部	2	4	6	66.67	2	1	3	50.00	3	50.00	3	0
衛生福利部	2	0	2	100.00	2	0	2	100.00	0	0.00	0	0
科技部	3,100	1,276	4,376	99.68	2,812	6	2,818	64.40	1,558	35.60	1,555	3
行政院人事行政總處	0	5	5	100.00	3	0	3	60.00	2	40.00	2	0
行政院環保署	1	1	2	50.00	1	0	1	50.00	1	50.00	0	1
國立故宮博物院	0	2	2	0.00	0	1	1	50.00	1	50.00	1	0
行政院陸委會	1	5	6	40.00	2	1	3	50.00	3	50.00	1	2
金融監督管理委員會	1	1	2	100.00	2	0	2	100.00	0	0.00	0	0
行政院農委會	13	51	64	91.89	34	3	37	57.81	27	42.19	27	0
行政院工程會	844	226	1,070	100.00	899	0	899	84.02	171	15.98	171	0
國家通訊傳播委員會	29	38	67	100.00	23	0	23	34.33	44	65.67	44	0
總 計	4,045	1,743	5,788	99.49	3,932	14	3,946	68.18	1,842	31.82	1,836	6

七、監察案件時效統計表

103 年 1 月份

機 關 項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦	已逾辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	125	307	432	75.00	123	86.01	20	13.99	143	33.10	289	66.90	268	21
內政部	28	68	96	83.87	26	83.87	5	16.13	31	32.29	65	67.71	65	0
外交部	8	2	10	33.33	1	100.00	0	0.00	1	10.00	9	90.00	7	2
國防部	13	6	19	100.00	16	100.00	0	0.00	16	84.21	3	15.79	3	0
教育部	28	17	45	95.24	20	95.24	1	4.76	21	46.67	24	53.33	24	0
法務部	29	1	30	100.00	28	100.00	0	0.00	28	93.33	2	6.67	2	0
經濟部	24	53	77	100.00	30	100.00	0	0.00	30	38.96	47	61.04	47	0
交通部	17	2	19	93.75	15	93.75	1	6.25	16	84.21	3	15.79	3	0
文化部	3	1	4	100.00	1	100.00	0	0.00	1	25.00	3	75.00	3	0
衛生福利部	6	17	23	88.89	16	94.12	1	5.88	17	73.91	6	26.09	5	1
僑務委員會	1	1	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
行政院主計總處	19	0	19	100.00	16	100.00	0	0.00	16	84.21	3	15.79	3	0
行政院人事行政總處	2	0	2	100.00	1	100.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0
行政院環保署	16	25	41	100.00	28	100.00	0	0.00	28	68.29	13	31.71	13	0
行政院陸委會	1	0	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0
國軍退除役官兵輔導委員會	12	2	14	100.00	9	100.00	0	0.00	9	64.29	5	35.71	5	0
行政院國科會	2	5	7	100.00	5	100.00	0	0.00	5	71.43	2	28.57	2	0
行政院農委會	25	2	27	88.89	16	88.89	2	11.11	18	66.67	9	33.33	9	0
行政院勞委會	0	16	16	100.00	5	100.00	0	0.00	5	31.25	11	68.75	11	0
行政院工程會	11	1	12	100.00	7	100.00	0	0.00	7	58.33	5	41.67	5	0
行政院原民會	5	0	5	100.00	4	100.00	0	0.00	4	80.00	1	20.00	1	0
行政院海巡署	1	2	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	1	0
國家通訊傳播委員會	7	3	10	100.00	6	100.00	0	0.00	6	60.00	4	40.00	4	0
總 計	383	531	914	87.47	377	92.63	30	7.37	407	44.53	507	55.47	483	24

附註：本表期限計算係以監察法及監察法施行細則規定之處理期限為基準。

103 年 2 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上 月待辦	案件總 數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	78	285	363	62.60	77	76.24	24	23.76	101	27.82	262	72.18	240	22
內政部	14	66	80	82.61	19	82.61	4	17.39	23	28.75	57	71.25	57	0
外交部	9	9	18	53.33	8	88.89	1	11.11	9	50.00	9	50.00	3	6
國防部	6	3	9	100.00	5	100.00	0	0.00	5	55.56	4	44.44	4	0
教育部	11	24	35	80.95	17	80.95	4	19.05	21	60.00	14	40.00	14	0
法務部	20	2	22	100.00	20	100.00	0	0.00	20	90.91	2	9.09	2	0
經濟部	28	46	74	100.00	21	100.00	0	0.00	21	28.38	53	71.62	53	0
交通部	12	3	15	100.00	15	100.00	0	0.00	15	100.00	0	0.00	0	0
文化部	3	3	6	100.00	4	100.00	0	0.00	4	66.67	2	33.33	2	0
衛生福利部	7	7	14	71.43	5	71.43	2	28.57	7	50.00	7	50.00	7	0
勞動部	1	11	12	100.00	3	100.00	0	0.00	3	25.00	9	75.00	9	0
僑務委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院主計總處	18	3	21	100.00	19	100.00	0	0.00	19	90.48	2	9.52	2	0
行政院人事行政總處	3	1	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	12	13	25	100.00	7	100.00	0	0.00	7	28.00	18	72.00	18	0
國立故宮博物院	1	0	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0
行政院陸委會	1	1	2	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	0
國軍退除役官兵輔導委員會	5	5	10	100.00	6	100.00	0	0.00	6	60.00	4	40.00	4	0
行政院國科會	3	3	6	100.00	3	100.00	0	0.00	3	50.00	3	50.00	3	0
行政院農委會	12	9	21	56.25	9	60.00	6	40.00	15	71.43	6	28.57	5	1
行政院工程會	7	5	12	100.00	10	100.00	0	0.00	10	83.33	2	16.67	2	0
行政院原民會	5	1	6	100.00	3	100.00	0	0.00	3	50.00	3	50.00	3	0
行政院海巡署	1	1	2	100.00	1	100.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0
國家通訊傳播委員會	2	4	6	100.00	4	100.00	0	0.00	4	66.67	2	33.33	2	0
總 計	260	505	765	78.85	261	86.42	41	13.58	302	39.48	463	60.52	434	29

103 年 3 月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦理期限	已逾辦理期限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	84	262	346	60.32	76	79.17	20	20.83	96	27.75	250	72.25	220	30
內政部	17	58	75	90.48	19	90.48	2	9.52	21	28.00	54	72.00	54	0
外交部	8	8	16	60.00	9	60.00	6	40.00	15	93.75	1	6.25	1	0
國防部	18	4	22	100.00	17	100.00	0	0.00	17	77.27	5	22.73	5	0
教育部	15	14	29	100.00	13	100.00	0	0.00	13	44.83	16	55.17	16	0
法務部	18	2	20	100.00	19	100.00	0	0.00	19	95.00	1	5.00	1	0
經濟部	12	50	62	100.00	22	100.00	0	0.00	22	35.48	40	64.52	40	0
交通部	20	0	20	100.00	19	100.00	0	0.00	19	95.00	1	5.00	1	0
文化部	2	2	4	100.00	2	100.00	0	0.00	2	50.00	2	50.00	2	0
衛生福利部	8	12	20	92.86	13	100.00	0	0.00	13	65.00	7	35.00	6	1
勞動部	2	9	11	100.00	6	100.00	0	0.00	6	54.55	5	45.45	5	0
科技部	2	3	5	100.00	3	100.00	0	0.00	3	60.00	2	40.00	2	0
行政院主計總處	8	2	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	11	18	29	87.50	7	100.00	0	0.00	7	24.14	22	75.86	21	1
國立故宮博物院	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	7	4	11	100.00	10	100.00	0	0.00	10	90.91	1	9.09	1	0
行政院農委會	10	6	16	78.57	11	84.62	2	15.38	13	81.25	3	18.75	2	1
行政院工程會	4	2	6	83.33	5	83.33	1	16.67	6	100.00	0	0.00	0	0
原住民族委員會	4	3	7	85.71	6	85.71	1	14.29	7	100.00	0	0.00	0	0
行政院海巡署	2	1	3	100.00	1	100.00	0	0.00	1	33.33	2	66.67	2	0
國家通訊傳播委員會	4	2	6	100.00	3	100.00	0	0.00	3	50.00	3	50.00	3	0
總 計	256	463	719	80.71	272	89.47	32	10.53	304	42.28	415	57.72	382	33
