

103 年度行政院列管案件進度季報

103 年 4 月至 6 月

國家發展委員會 彙編

資料來源：各計畫主管機關

目次

壹、概述.....	1
貳、列管案件執行情形一覽表	11
參、列管落後案件執行情形及原因分析表.....	23
肆、行政院及所屬一級機關公文時效分類統計表	50
一、一般公文時效統計表	53
二、立法委員質詢案件時效統計表.....	56
三、人民申請案件時效統計表	59
四、訴願案件時效統計表	62
五、人民陳情案件時效統計表	65
六、專案管制案件時效統計表	68
七、監察案件時效統計表	71

壹、概述

一、政院管制計畫

(一) 概況說明

1.為落實院屬各機關個案計畫執行，提升管理績效及施政品質，本院將各機關個案計畫分為行政院管制（簡稱政院管制）、部會管制及部會所屬機關自行管制（簡稱自行管制）三級納管。院屬各機關 103 年度截至 6 月底止計有 1,374 件個案計畫，年度可支用預算約新臺幣（以下同）9,125 億元，其中政院管制計畫 113 件（如圖 1），年度可支用預算 3,063 億元（如圖 2）。

圖1 三級管制計畫件數－依管制級別
-截至103年6月底止


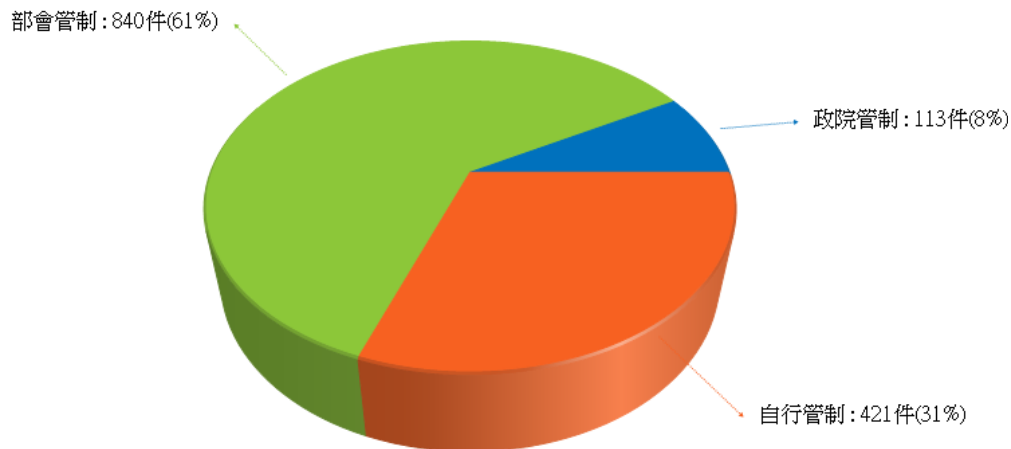


圖2 三級管制計畫年度可支用預算數－依管制級別
-截至103年6月底止



2. 行政院管制計畫以計畫類別區分如次（如圖 3 及圖 4）：

(1) 社會發展計畫計 29 件，年度可支用預算數計 1,447.7 億元，由國發會管制。

(2) 公共建設計畫計 37 件，年度可支用預算數計 1,151.3 億元，由國發會管制。

(3) 經濟發展計畫計 22 件，年度可支用預算數計 271.3 億元，由國發會管制。

(4) 科技發展計畫計 25 件，年度可支用預算數計 192.7 億元，由科技部管制。

圖3 行政院管制計畫件數－依計畫類別
-截至103年6月底止






圖4 行政院管制計畫年度可支用預算數－依計畫類別
-截至103年6月底止

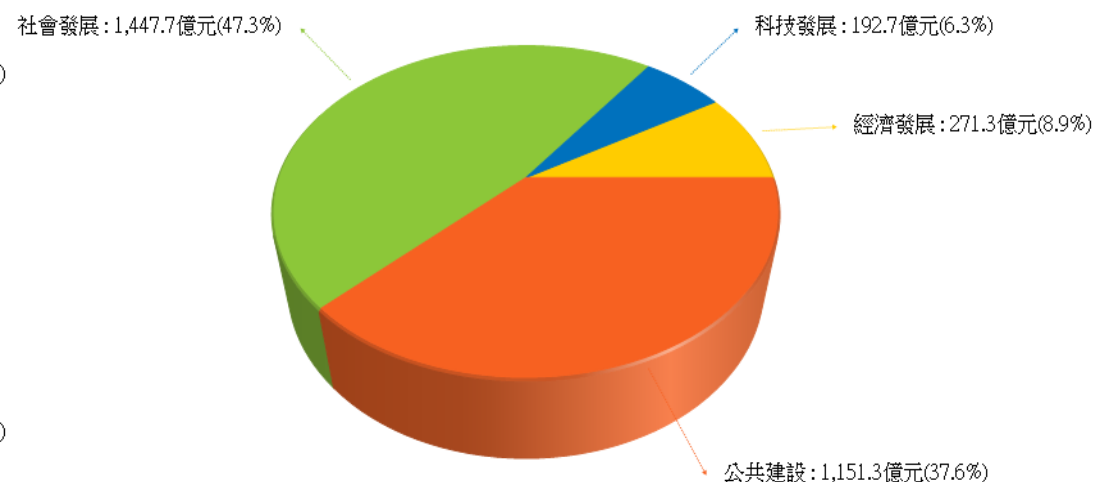

3. 行政院管制計畫以機關別區分如次：


(1) 交通部主管 23 件行政院管制計畫占大宗，其餘依序為經濟部（22 件）、衛福部（14 件）、農委會（14 件）、教育部（9 件）、文化部（8 件）、科技部（6 件）、內政部（5 件）、原民會（3 件）、客委會（3 件）、故宮（2 件）、勞動部（2 件）、環保署（1 件）及臺灣省諮議會（1 件）（如圖 5）。

圖5 行政院管制計畫件數(截至103年6月底止)－依機關別

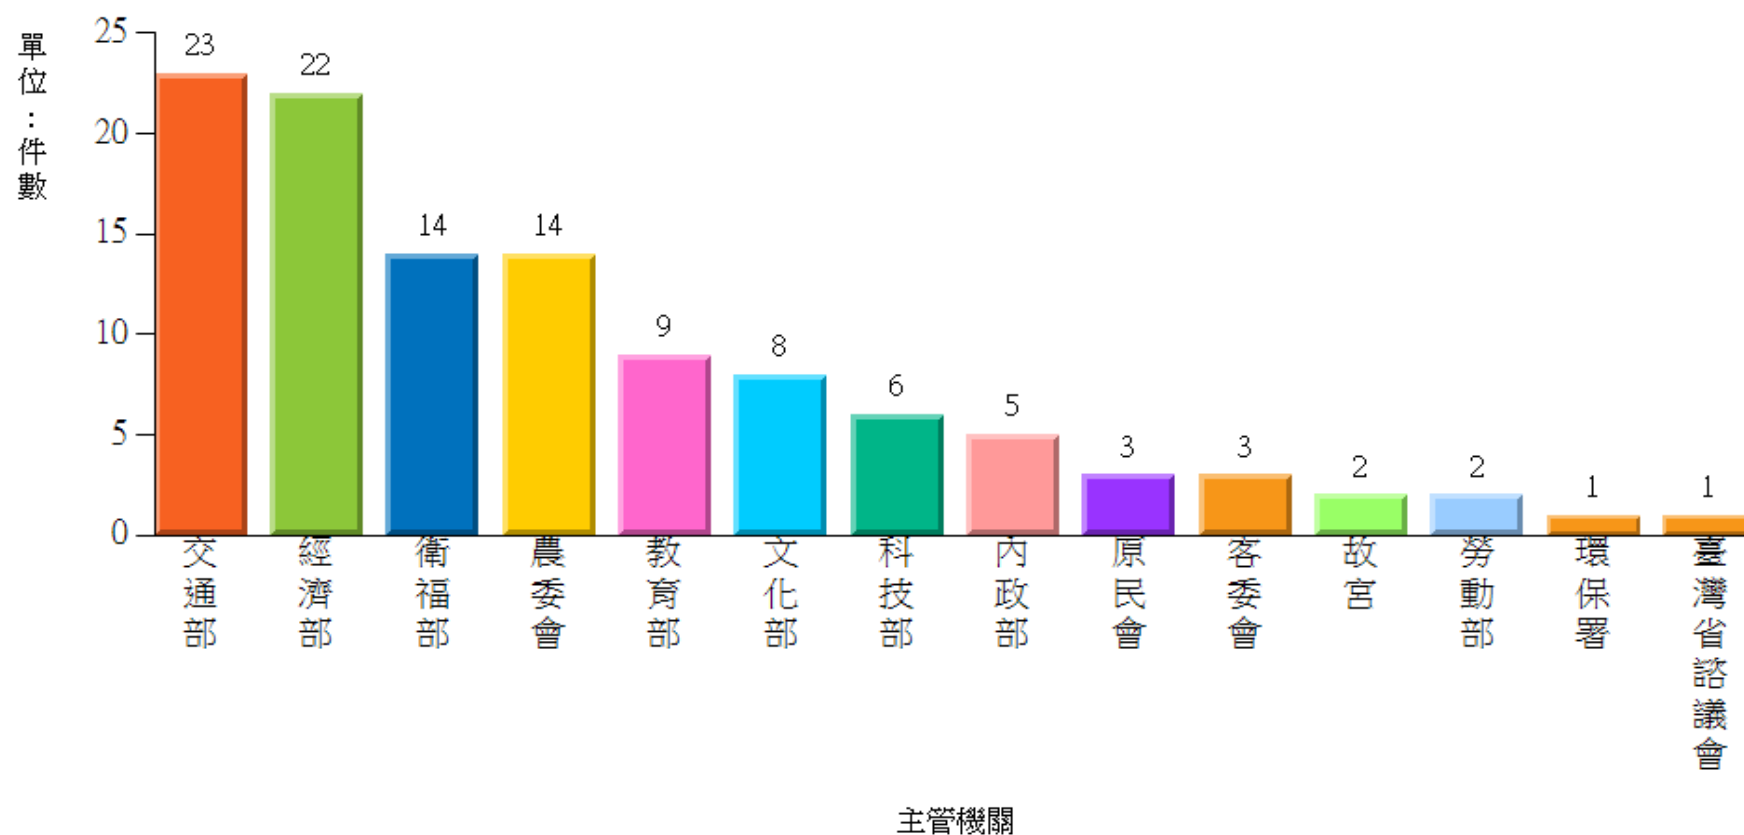

(2)衛福部政院管制計畫年度可支用預算數約 805.02 億元最多，其餘依序為交通部(705.8 億元)、教育部(564.19 億元)、經濟部 (247.46 億元)、農委會 (196.91 億元)、科技部 (179.38 億元)、內政部 (162.08 億元)、文化部 (89.48 億元)、勞動部 (41.8 億元)、原民會 (31.98 億元)、客委會 (17.83 億元)、故宮 (16.7 億元)、環保署 (4.34 億元) 及臺灣省諮議會 (0.04 億元) (如圖 6)。

圖6 政院管制計畫年度可支用預算數(截至103年6月底止)－依機關別

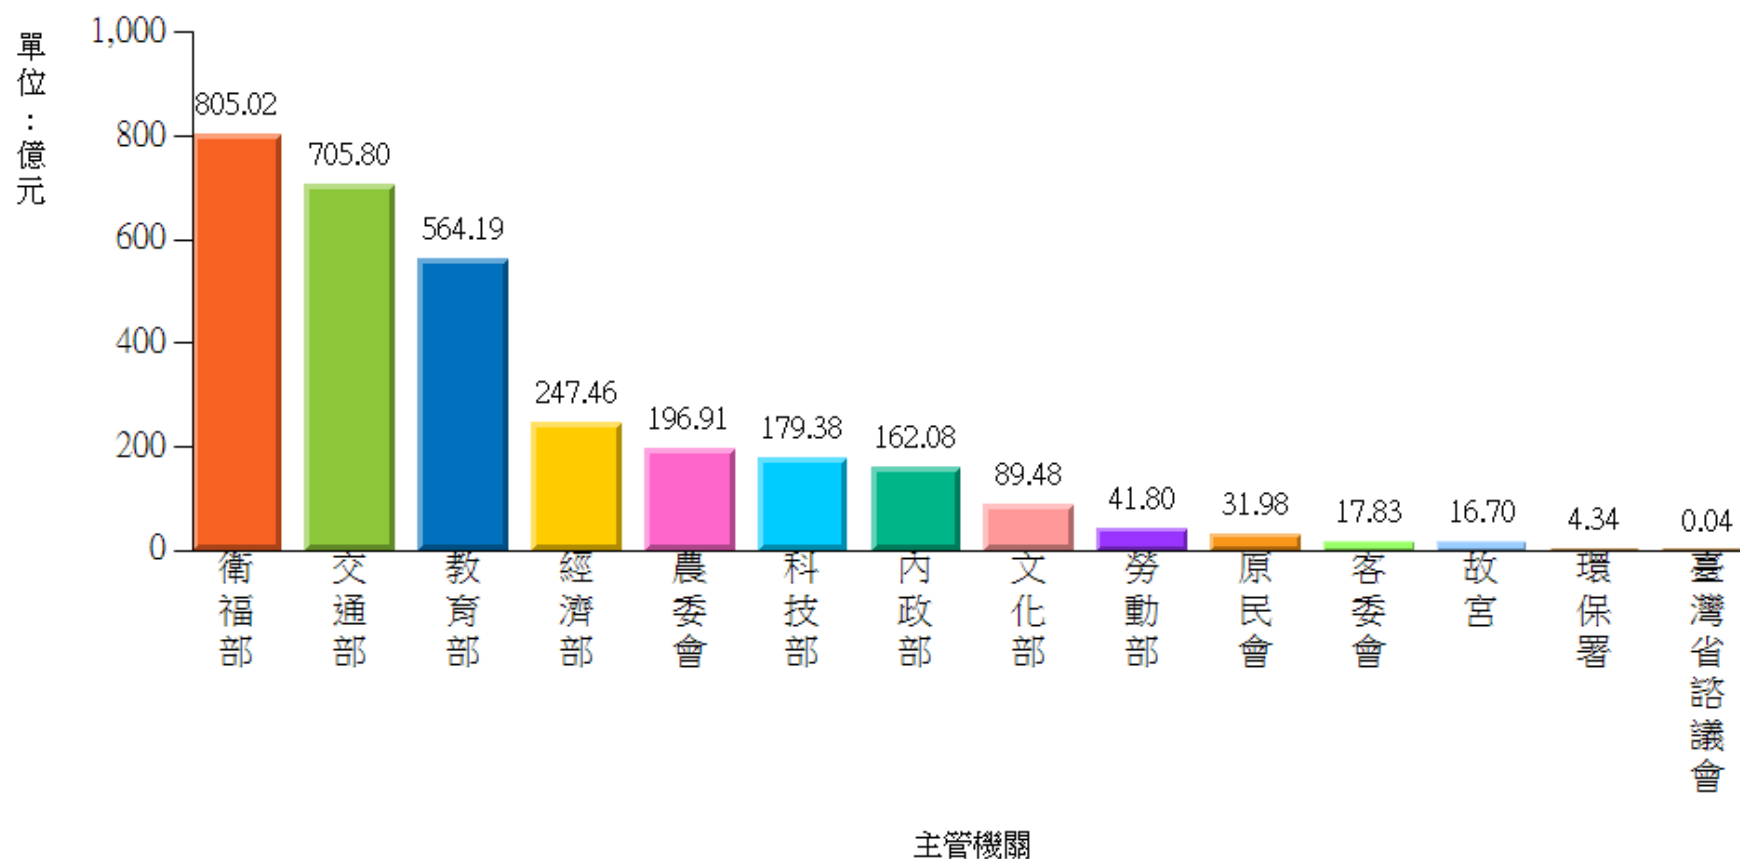

(二) 執行進度 (如表 1) (列管案件執行情形及落後案件原因分析詳如第 11 頁至第 49 頁)

1.總累計執行進度「超前」(實際進度較預定進度超前 1 個百分點)者 8 件,占 7.08%。

2.總累計執行進度「符合」(實際進度在預定進度 ± 1 個百分點範圍內)者 93 件,占 82.3%。

3.總累計執行進度「落後」(實際進度較預定進度落後逾 1 個百分點)者 12 件,占 10.62%,主要落後原因之比率以「其他」占 31.58%最多,其次「行政作業」、「規劃設計」、「土地取得」及「招標作業」等原因均占 10.53%,「拆遷補償」、「驗工作業」、「計畫變更」、「預算編列」及「法令規章」等原因均占 5.26% (如表 2)。

表 1 政院管制計畫總累計執行進度狀態統計表(截至 103 年 6 月底止)

項次	主管機關	管制案件數	執行進度		
			超前	符合	落後
1	內政部	5	0	5	0
2	教育部	9	0	9	0
3	經濟部	22	1	21	0
4	交通部	23	1	19	3
5	文化部	8	3	3	2
6	衛福部	14	0	12	2
7	環保署	1	0	1	0
8	故宮	2	0	1	1
9	科技部	6	1	5	0
10	農委會	14	0	11	3
11	勞動部	2	1	1	0
12	原民會	3	1	1	1
13	客委會	3	0	3	0
14	臺灣省諮議會	1	0	1	0
合計		113	8	93	12
百分比		100%	7.08%	82.30%	10.62%


表 2 政院管制計畫落後原因分析表(截至 103 年 6 月底止，總累計落後幅度：實際進度較預定進度落後逾 1 個百分點)

項次	計畫名稱	總累計落後幅度(%)	落後原因													合計
			行政作業	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗工作業	計畫變更	人力需求	預算編列	法令規章	天然因素	其他	
1	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第 1 階段路線)	24.15		*		*										2
2	故宮南部院區籌建	5.13	*												*	2
3	流域綜合治理計畫-上游坡地水土保持及治山防洪	5.05										*	*			2
4	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	4.16			*		*									2
5	價值產值化-文創產業價值鏈建構與創新	3.90	*							*						2
6	流域綜合治理計畫-農田排水	3.44													*	1
7	漁業多元化經營建設	3.43		*											*	2
8	原住民族住宅改善計畫	2.27			*		*									2
9	長照服務網計畫	2.00													*	1
10	保母托育管理與托育費用補助	1.70													*	1
11	歷史與文化資產維護發展(第二期)計畫	1.15							*							1
12	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	1.11													*	1
合計			2	2	2	1	2	0	1	1	0	1	1	0	6	19
落後原因比率(%)			10.53	10.53	10.53	5.26	10.53	0	5.26	5.26	0	5.26	5.26	0	31.58	100

(三) 預算支用情形 (截至 103 年 6 月底止)


1. 預算支用比 (年累計實際支用數/年累計預定支用數)：各機關政院管制計畫年累計預定支用數合計約 1287.44 億元，年累計實際支用數合計約 1093.48 億元，整體預算支用比平均約為 85%。其中以勞動部(157%)最高，惟仍有支用比未達 85%者，依序為農委會(82%)、經濟部(81%)、故宮(76%)、文化部(73%)、及交通部(51%)等 5 個機關 (如圖 7)。

圖7 政院管制計畫年累計預算支用比(截至103年6月底止)－依機關別

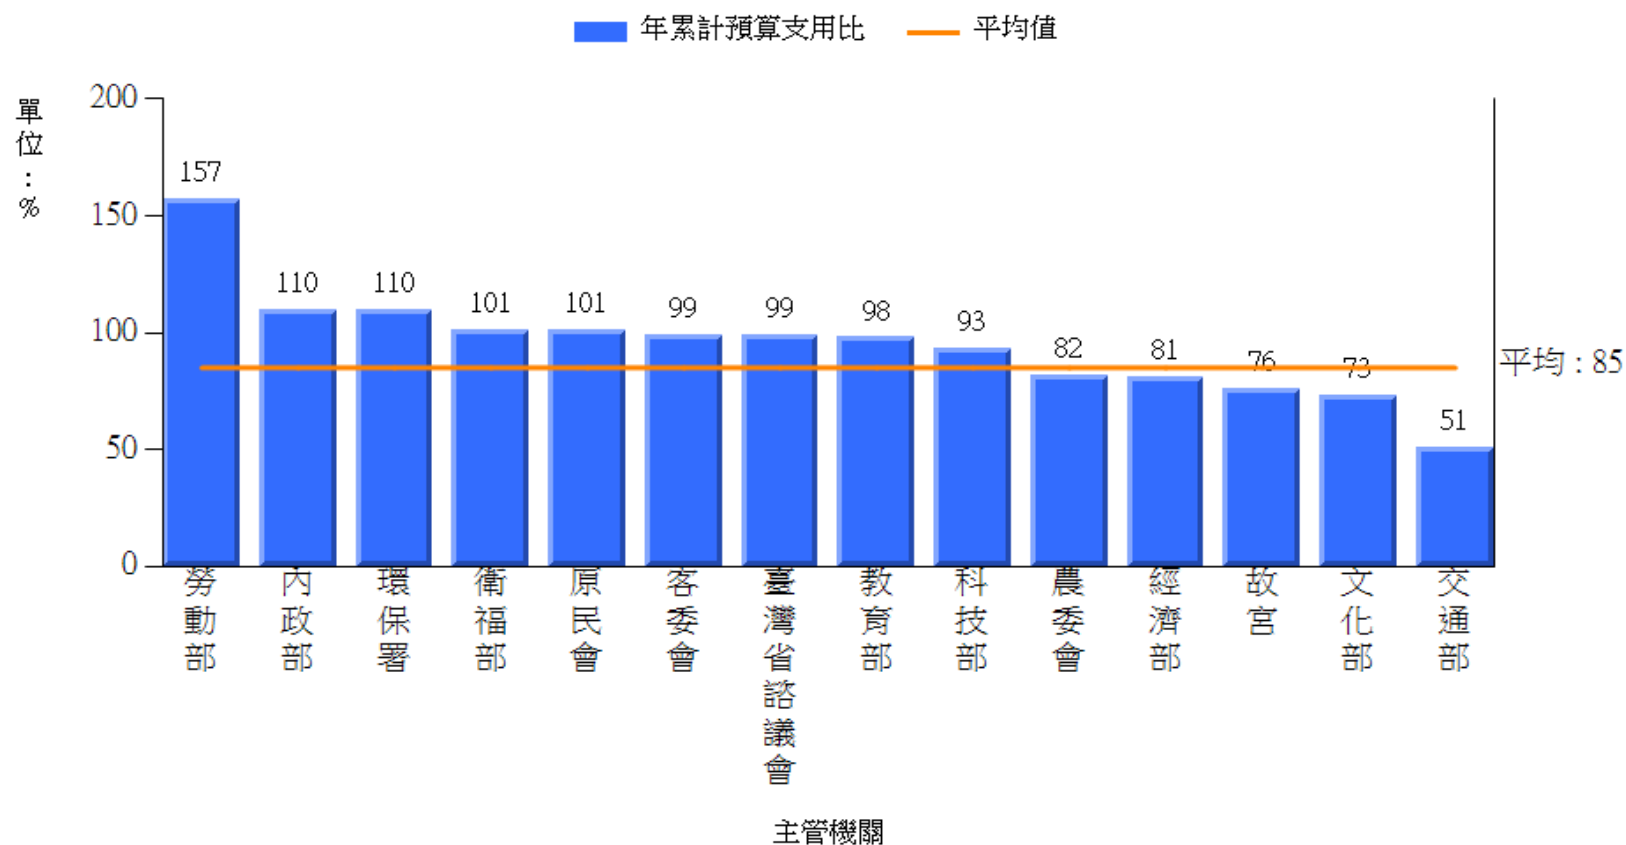


2.預算執行率（年累計實際執行數/年累計預定支用數）：各機關政院管制計畫年累計預定支用數合計約 1287.44 億元，年累計實際執行數合計約 1244.6 億元（含實際支用數 1093.48 億元、已執行應付未付數 70.49 億元、節餘數 2.6 億元及工程預付數 78.03 億元），整體預算執行率平均為 97%。其中以勞動部(157%)最高，惟仍有預算執行率未達 97%者，依序為文化部(94%)、科技部(94%)、農委會(93%)、交通部(86%)及故宮(86%)等 5 個機關（如圖 8）。

圖8 政院管制計畫年累計預算執行率(截至103年6月底止)－依機關別

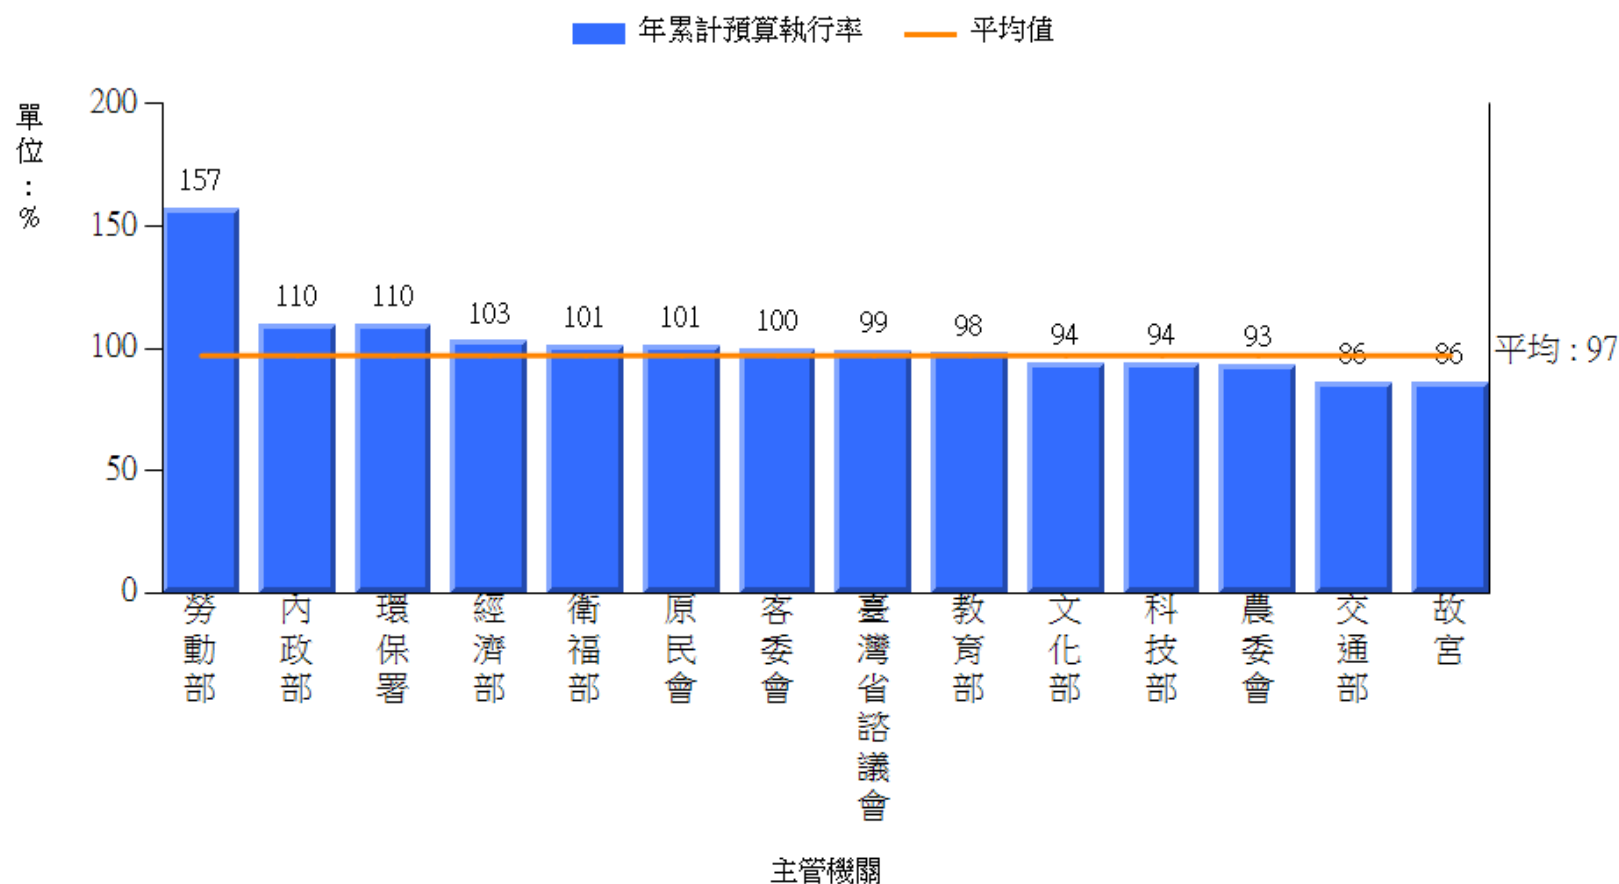

3.年度預算達成率（年累計實際執行數/年度可支用預算數）：各機關政院管制計畫年度可支用預算數 3,063.01 億元，年累計實際執行數合計約 1244.6 億元（含實際支用數 1093.48 億元、已執行應付未付數 70.49 億元、節餘數 2.6 億元及工程預付數 78.03 億元），整體預算達成率平均為 41%。其中以衛福部(49%)最高，惟仍有預算執行率未達 41%者，依序為臺灣省諮議會(37%)、內政部(35%)、客委會(34%)、科技部(26%)、勞動部(26%)、文化部(24%)、故宮(23%)、農委會(18%)及環保署(9%)等 9 個機關（如圖 9）。

圖9 政院管制計畫年度預算達成率(截至103年6月底止)－依機關別

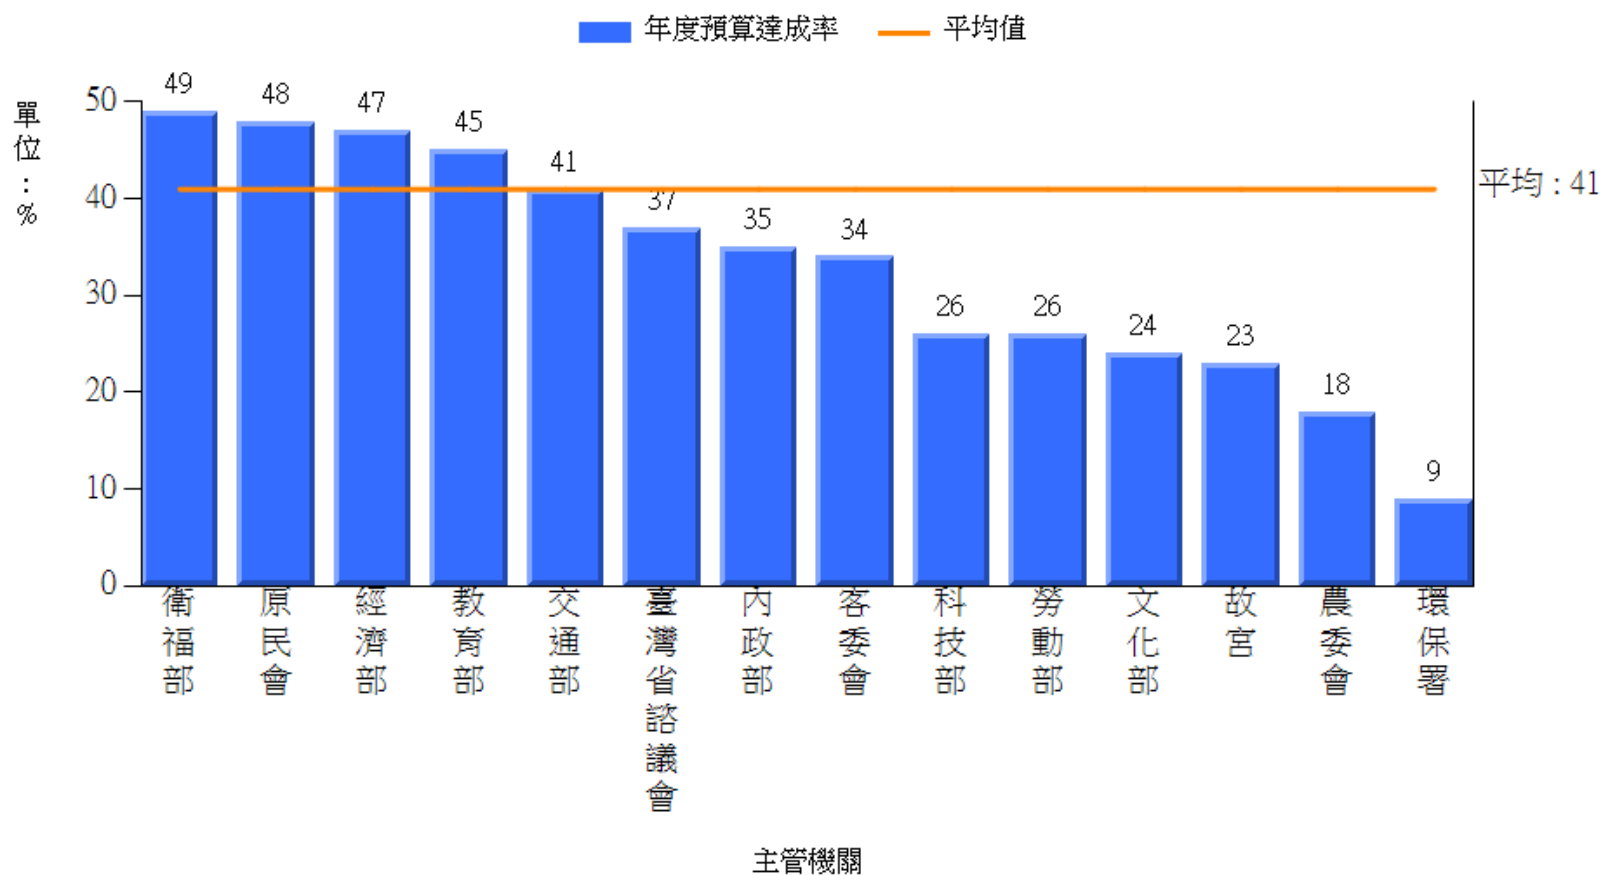

二、院屬各一級機關 103 年第 2 季 7 類公文處理時效（詳如第 50 頁至第 73 頁）

- （一）一般公文發文平均使用日數之平均值為 2.25 日，較上一季月平均值 2.30 日，減少 0.05 日。
- （二）立法委員質詢已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 96.06%，較上一季月平均值 97.01%，減少 0.95 個百分點。
- （三）人民申請案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 98.69%，較上一季月平均值 98.64%，增加 0.05 個百分點。
- （四）訴願案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 99.90%，較上一季月平均值 99.51%，增加 0.39 個百分點。
- （五）人民陳情案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 94.83%，較上一季月平均值 95.37%，減少 0.54 個百分點。
- （六）專案管制案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 99.45%，較上一季月平均值 99.50%，減少 0.05 個百分點。
- （七）監察案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 83.43%，較上一季月平均值 82.80%，增加 0.63 個百分點。

貳、列管案件執行情形一覽表 (截至 103 年 6 月底止)

※執行進度比較：實際進度小於預定進度時，以負號(-)表示。

※進度燈號：○代表超前(總累計執行進度超前 1 個百分點)；◎代表符合(總累計執行進度在±1 個百分點範圍內)；⊙代表落後(總累計執行進度落後逾 1 個百分點)。

※預算執行率=(實際支用數+已執行應付未付數+節餘數+工程預付數)/預定支用數。

※預算達成率=(實際支用數+已執行應付未付數+節餘數+工程預付數)/本年度可支用預算數。

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可支用預算數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定(%) (A)	實際(%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
1	內政部	污水下水道建設計畫 (98/01/01~103/12/31)	公共建設	13,184,230	總累計	90.4	91.03	0.63	76,316,724	76,416,941	100.13	100.13	39.28	◎
					年累計	35	39.28	4.28	4,614,482	5,179,056	112.23			
2	內政部	智慧綠建築推動方案 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	207,314	總累計	62.73	62.73	0.00	455,213	455,213	100.00	100.00	25.94	◎
					年累計	50.9	50.9	0.00	53,771	53,771	100.00			
3	內政部	城鎮風貌型塑整體計畫 (102/01/01~105/12/31)	經濟發展	2,722,400	總累計	37.57	37.57	0.00	2,645,205	2,562,708	96.88	96.88	13.32	◎
					年累計	50.26	50.26	0.00	445,036	362,539	81.46			
4	內政部	災害防救深耕第 2 期計畫 (103/01/01~106/12/31)	社會發展	65,817	總累計	9	9	0.00	8,950	14,040	156.87	156.87	21.33	◎
					年累計	45	45	0.00	8,950	14,040	156.87			
5	內政部	地籍清理第 2 期實施計畫 (103/01/01~108/12/31)	社會發展	28,446	總累計	7.52	7.52	0.00	14,060	18,882	134.30	134.96	66.71	◎
					年累計	47	47	0.00	14,060	18,882	134.30			
6	教育部	5 歲幼兒免學費教育計畫 (99/01/01~104/12/31)	社會發展	7,494,264	總累計	84.45	84.45	0.00	30,994,844	30,994,194	100.00	100.00	51.28	◎
					年累計	44.5	44.5	0.00	3,843,600	3,842,950	99.98			
7	教育部	邁向頂尖大學計畫 (100/04/01~105/12/31)	社會發展	8,608,660	總累計	67	67	0.00	35,981,319	31,676,989	88.04	88.04	50.00	◎
					年累計	60	60	0.00	4,304,330	4,304,330	100.00			
8	教育部	十二年國民基本教育實施計畫 (100/09/20~103/12/31)	社會發展	28,729,890	總累計	84.54	85.51	0.97	82,681,775	84,245,838	101.89	101.89	42.98	◎
					年累計	48.46	51.71	3.25	11,966,882	12,348,766	103.19			

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執行率 (%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
9	教育部	獎勵大學教學卓越計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會發展	4,500,000	總累計	38.13	38.13	0.00	7,239,000	2,638,000	36.44	36.44	58.62	◎
					年累計	52.5	52.5	0.00	2,739,000	2,638,000	96.31	96.31		
10	教育部	優質教保發展計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會發展	2,331,600	總累計	28	28	0.00	2,610,100	2,632,148	100.84	100.84	33.86	◎
					年累計	40	40	0.00	767,500	789,548	102.87	102.87		
11	教育部	第二期技職教育再造計畫 (102/01/01~106/12/31)	社會發展	4,050,000	總累計	30.55	30.55	0.00	2,040,116	1,245,622	61.06	61.06	30.04	◎
					年累計	52.75	52.75	0.00	2,011,166	1,216,672	60.50	60.50		
12	教育部	推動對外華語教育 (103/01/01~109/12/31)	社會發展	200,000	總累計	0.02	0.02	0.00	670	655	97.76	97.76	0.33	◎
					年累計	0.33	0.35	0.02	670	655	97.76	97.76		
13	教育部	2017 臺北世界大學運動會場館 興整建計畫 (103/01/01~106/08/31)	公共建設	394,000	總累計	4	4	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	◎
					年累計	40	40	0.00	0	0	0.00	0.00		
14	教育部	教育學術研究骨幹網路頻寬效能提升計畫 (103/01/01~103/12/31)	科技發展	110,780	總累計	30	30	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	◎
					年累計	30	30	0.00	0	0	0.00	0.00		
15	經濟部	石門水庫及其集水區整治計畫 --穩定供水設施及幹管改善 (95/01/01~104/12/31)	公共建設	868,861	總累計	95.78	95.79	0.01	6,609,333	6,317,116	95.58	99.74	33.89	◎
					年累計	41.47	43.32	1.85	290,400	19,576	6.74	101.40		
16	經濟部	石門水庫及其集水區整治計畫- 緊急供水工程暨水庫更新改善 (95/01/01~104/06/30)	公共建設	1,627,456	總累計	87.1	87.14	0.04	7,585,308	7,243,824	95.50	100.12	47.01	◎
					年累計	21.85	21.77	-0.08	755,806	414,322	54.82	101.23		
17	經濟部	易淹水地區水患治理計畫-河川 排水及事業海堤改善 (95/07/01~103/12/31)	公共建設	4,337,904	總累計	99.28	99.47	0.19	73,828,331	71,653,242	97.05	98.66	78.08	◎
					年累計	27.7	28.5	0.80	3,567,960	2,197,612	61.59	94.92		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度			支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)		
18	經濟部	曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)(99/05/12~105/05/11)	公共建設	3,209,757	總累計	42.83	42.51	-0.32	5,227,760	5,052,147	96.64	24.13	◎
					年累計	38.82	39.67	0.85	600,814	724,907	120.65		
19	經濟部	曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-臺水公司部分(99/07/01~105/04/30)	公共建設	3,117,000	總累計	24.71	24.65	-0.06	3,254,547	2,556,108	78.54	23.83	◎
					年累計	24.92	27.56	2.64	732,657	290,828	39.69		
20	經濟部	因應貿易自由化加強輔導型產業之共通性輔導計畫(100/01/01~103/12/31)	科技發展	149,597	總累計	86.82	86.82	0.00	704,449	708,173	100.53	45.00	◎
					年累計	47.26	47.26	0.00	63,594	67,318	105.86		
21	經濟部	南部新興產業發展關鍵技術計畫(4/4)(100/01/01~103/12/31)	科技發展	164,813	總累計	87.5	87.5	0.00	779,470	780,828	100.17	47.27	◎
					年累計	50	50	0.00	74,800	76,158	101.82		
22	經濟部	智慧型自動化產業推動計畫(101/04/01~104/12/31)	科技發展	119,643	總累計	40.85	40.85	0.00	321,416	321,062	99.89	15.12	◎
					年累計	36.16	36.16	0.00	18,096	18,096	100.00		
23	經濟部	數位內容創新與整合推動計畫(101/01/01~104/12/31)	科技發展	183,984	總累計	61.93	61.93	0.00	746,956	748,019	100.14	35.40	◎
					年累計	47.71	47.71	0.00	64,070	65,133	101.66		
24	經濟部	雲端運算系統及軟體技術研發計畫(101/01/01~103/12/31)	科技發展	211,822	總累計	83.5	83.5	0.00	698,247	707,742	101.36	46.63	◎
					年累計	50	50	0.00	85,233	94,728	111.14		
25	經濟部	傳統產業加值轉型推動計畫(3/3)(101/01/01~103/12/31)	科技發展	172,480	總累計	76.17	76.17	0.00	528,562	534,572	101.14	39.47	◎
					年累計	29.9	29.9	0.00	61,788	68,081	110.18		
26	經濟部	機械與系統領域工業基礎技術研究計畫(2/4)(102/01/01~105/12/31)	科技發展	181,503	總累計	37.5	37.5	0.00	276,844	301,010	108.73	48.67	◎
					年累計	50	50	0.00	53,829	77,995	144.89		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
27	經濟部	民生福祉領域工業基礎技術研究計畫(2/4) (102/01/01~105/12/31)	科技發展	281,916	總累計	37.5	37.5	0.00	438,381	457,296	104.31	105.73	44.17	◎
					年累計	50	50	0.00	99,399	118,314	119.03	125.28		
28	經濟部	小型企業創新研發計畫(SBIR) (102/01/01~105/12/31)	科技發展	684,813	總累計	35	35	0.00	879,802	879,759	100.00	100.00	29.93	◎
					年累計	40	40	0.00	205,000	204,957	99.98	99.98		
29	經濟部	A+企業創新研發淬鍊計畫 (102/01/01~105/12/31)	科技發展	2,062,983	總累計	30.5	30.5	0.00	2,971,351	2,970,847	99.98	99.98	21.79	◎
					年累計	22	22	0.00	450,000	449,496	99.89	99.89		
30	經濟部	臺灣產業形象廣宣計畫 (103/01/01~103/12/31)	經濟發展	830,000	總累計	35	35	0.00	118,275	120,750	102.09	102.09	14.55	◎
					年累計	35	35	0.00	118,275	120,750	102.09	102.09		
31	經濟部	服務業創新研發計畫(SIIR) (103/01/01~106/12/31)	科技發展	159,158	總累計	8	8	0.00	2,035	2,035	100.00	100.00	1.28	◎
					年累計	40	40	0.00	2,035	2,035	100.00	100.00		
32	經濟部	提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫 (103/01/01~103/12/31)	經濟發展	3,677,384	總累計	48	60.12	12.12	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00	81.58	○
					年累計	48	60.12	12.12	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00		
33	經濟部	協助傳統產業技術開發計畫 (103/01/01~106/12/31)	科技發展	223,225	總累計	10.09	10.09	0.00	114,585	127,383	111.17	111.17	57.06	◎
					年累計	42.06	42.06	0.00	114,585	127,383	111.17	111.17		
34	經濟部	標竿新產品創新研發輔導計畫 (103/01/01~106/12/31)	科技發展	1,358,997	總累計	15.03	15.03	0.00	394,547	514,249	130.34	130.34	37.84	◎
					年累計	60.12	60.1	-0.02	394,547	514,249	130.34	130.34		
35	經濟部	智慧手持裝置核心技術攻堅計畫(1/4)(103/01/01~106/12/31)	科技發展	813,522	總累計	8.2	8.2	0.00	324,340	326,246	100.59	123.00	49.04	◎
					年累計	41	41	0.00	324,340	326,246	100.59	123.00		
36	經濟部	石化產業高值化系統技術與應用發展計畫(1/4)(103/01/01~106/12/31)	科技發展	309,275	總累計	12.3	12.3	0.00	118,856	127,355	107.15	118.86	45.68	◎
					年累計	49.2	49.2	0.00	118,856	127,355	107.15	118.86		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
37	交通部	臺北都會區大眾捷運系統工程 計畫新莊蘆洲支線 (88/07/01~103/12/31)	公共 建設	3,697,521	總累計	99.49	99.38	-0.11	133,541,431	133,541,431	100.00	100.00	37.06	◎
					年累計	48.64	48.07	-0.57	1,370,421	1,370,421	100.00	100.00		
38	交通部	臺灣桃園國際機場聯外捷運系 統建設計畫 (92/06/01~106/12/31)	公共 建設	6,314,278	總累計	93.16	93.16	0.00	88,782,167	86,856,825	97.83	99.85	65.50	◎
					年累計	47.38	47.32	-0.06	4,269,167	2,346,757	54.97	96.87		
39	交通部	臺北都會區大眾捷運系統工程 計畫松山線 (93/01/01~105/12/31)	公共 建設	3,724,655	總累計	96.44	96.44	0.00	39,876,630	39,845,025	99.92	99.92	44.06	◎
					年累計	52.96	52.69	-0.27	1,672,723	1,641,118	98.11	98.11		
40	交通部	臺北捷運系統環狀線建設計畫 (第 1 階段路線) (93/01/01~103/12/31)	公共 建設	8,713,000	總累計	100	75.85	-24.15	26,817,010	24,829,120	92.59	95.61	26.58	◎
					年累計	41.24	19.49	-21.75	3,493,325	1,505,435	43.09	66.29		
41	交通部	臺中都會區大眾捷運系統烏日 文心北屯線建設計畫 (94/01/01~105/10/31)	公共 建設	9,499,108	總累計	53.06	48.9	-4.16	11,053,215	4,412,257	39.92	86.49	56.70	◎
					年累計	39.84	36.78	-3.06	6,879,024	238,066	3.46	78.29		
42	交通部	臺北機廠遷建建設計畫 (94/06/01~104/12/31)	公共 建設	1,077,305	總累計	89.44	89.32	-0.12	13,071,088	12,504,922	95.67	96.30	10.10	◎
					年累計	50.01	49.91	-0.10	135,000	26,852	19.89	80.63		
43	交通部	高雄市區鐵路地下化計畫 (94/07/01~106/12/31)	公共 建設	6,084,454	總累計	86.24	86.24	0.00	24,008,920	22,580,156	94.05	98.56	51.96	◎
					年累計	52.83	52.83	0.00	3,327,990	2,077,465	62.42	95.00		
44	交通部	臺中都會區鐵路高架捷運化計 畫(95/02/13~106/03/31)	公共 建設	5,480,387	總累計	70.07	70.07	0.00	19,300,000	17,968,254	93.10	98.30	45.36	◎
					年累計	45.67	45.67	0.00	2,723,969	1,481,641	54.39	91.26		
45	交通部	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨 全線電氣化計畫 (97/04/01~104/03/31)	公共 建設	5,899,348	總累計	93.58	92.7	-0.88	20,595,774	18,888,446	91.71	98.26	52.62	◎
					年累計	62.61	58.93	-3.68	3,413,348	1,756,020	51.45	90.94		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
46	交通部	西濱快速公路後續建設計畫 (98/01/01~108/12/31)	公共 建設	5,996,377	總累計	45.35	44.92	-0.43	24,004,437	23,597,841	98.31	98.31	20.59	◎
					年累計	43.3	38.87	-4.43	1,640,344	1,233,966	75.23	75.27		
47	交通部	東西向快速公路健全路網改善 計畫(98/01/01~105/12/31)	公共 建設	1,984,274	總累計	73.63	73.63	0.00	17,785,194	17,545,295	98.65	99.19	37.46	◎
					年累計	66.31	66.36	0.05	878,564	648,072	73.76	84.60		
48	交通部	環島鐵路整體系統安全提昇計 畫(98/01/01~103/12/31)	公共 建設	729,637	總累計	100	99.86	-0.14	14,949,000	14,316,327	95.77	96.20	22.21	◎
					年累計	44.17	38.2	-5.97	164,908	96,964	58.80	98.28		
49	交通部	基隆火車站都市更新站區遷移 計畫(98/04/01~104/04/30)	公共 建設	1,449,297	總累計	88.69	87.58	-1.11	2,473,533	1,185,634	47.93	52.64	19.17	◎
					年累計	36.93	31.18	-5.75	267,834	161,398	60.26	103.75		
50	交通部	臺9線蘇花公路山區路段改善 計畫(99/12/16~106/12/31)	公共 建設	7,414,700	總累計	31.32	30.38	-0.94	12,503,766	11,428,197	91.40	92.47	31.70	◎
					年累計	39.8	36.71	-3.09	2,951,284	2,215,798	75.08	79.64		
51	交通部	災害性天氣監測與預報作業建 置計畫(99/01/01~104/12/31)	科技 發展	296,122	總累計	75.15	75.15	0.00	1,087,474	1,087,474	100.00	100.00	5.84	◎
					年累計	50	50	0.00	17,291	17,291	100.00	100.00		
52	交通部	曾文南化烏山頭水庫治理及穩 定南部地區供水計畫(交通部公 路總局部份) (99/01/01~104/12/31)	公共 建設	50,000	總累計	87.59	87.59	0.00	578,500	578,500	100.00	100.00	37.00	◎
					年累計	37	37	0.00	18,500	18,500	100.00	100.00		
53	交通部	整備觀光遊憩設施建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	650,000	總累計	53.5	53.5	0.00	1,304,992	1,307,849	100.22	100.22	1.21	◎
					年累計	14	14	0.00	5,000	7,857	157.14	157.14		
54	交通部	北海岸及觀音山國家風景區建 設計畫(101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	196,300	總累計	57.44	60.88	3.44	322,626	323,053	100.13	100.13	30.49	○
					年累計	53.25	65.1	11.85	59,426	59,853	100.72	100.72		
55	交通部	東北角暨宜蘭海岸國家風景區 建設計畫(101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	204,317	總累計	53.19	52.44	-0.75	295,698	276,428	93.48	93.64	15.04	◎
					年累計	35.13	32.46	-2.67	49,517	30,247	61.08	62.05		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度			支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)		
56	交通部	大鵬灣國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	216,000	總累計	60	60.5	0.49	582,464	581,405	99.82	36.11	◎
					年累計	40	41.98	1.98	79,060	78,001	98.66		
57	交通部	日月潭國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	284,274	總累計	63.25	63.59	0.34	615,251	606,001	98.50	24.02	◎
					年累計	53	54.35	1.35	68,134	58,884	86.42		
58	交通部	阿里山國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	352,948	總累計	65.99	66.97	0.98	615,546	600,483	97.55	36.55	◎
					年累計	59.95	63.9	3.95	122,588	121,773	99.34		
59	交通部	茂林國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	265,800	總累計	63.37	63.13	-0.24	379,644	374,485	98.64	30.58	◎
					年累計	33.6	32.76	-0.84	83,506	81,089	97.11		
60	文化部	臺中大都會歌劇院興建計畫 (92/01/01~104/12/31)	公共 建設	1,270,000	總累計	73	94	21.00	3,395,500	2,857,000	84.14	40.00	○
					年累計	40	40	0.00	508,000	508,000	100.00		
61	文化部	北部流行音樂中心計畫 (94/01/01~105/12/31)	公共 建設	747,178	總累計	14.77	35.42	20.65	417,102	377,234	90.44	13.41	○
					年累計	49.8	49.8	0.00	124,357	100,191	80.57		
62	文化部	衛武營藝術文化中心興建計畫 (94/01/01~105/10/31)	公共 建設	3,188,003	總累計	82.73	83.32	0.59	6,656,309	4,816,189	72.36	21.54	◎
					年累計	27.61	10.8	-16.81	761,875	318,772	41.84		
63	文化部	文化創意產業發展(第二期)第 三次修正計畫 (97/01/01~103/12/31)	經濟 發展	672,199	總累計	93.72	96.63	2.91	7,072,766	6,272,537	88.69	25.64	○
					年累計	37.21	34.61	-2.60	231,286	157,574	68.13		
64	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫 (98/10/01~104/12/31)	公共 建設	1,257,443	總累計	51.18	51.18	0.00	669,809	425,988	63.60	20.58	◎
					年累計	25.6	25.6	0.00	262,000	258,815	98.78		
65	文化部	歷史與文化資產維護發展(第二 期)計畫(99/01/11~104/12/31)	經濟 發展	755,806	總累計	60.21	59.06	-1.15	2,479,652	2,450,406	98.82	32.71	◎
					年累計	24.64	21.4	-3.24	185,875	156,629	84.27		
66	文化部	高畫質電視推展計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	408,003	總累計	60.75	60.75	0.00	1,350,037	1,350,037	100.00	6.37	◎
					年累計	43	43	0.00	26,000	26,000	100.00		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
67	文化部	價值產值化-文創產業價值鏈建構與創新(102/01/01~105/12/31)	社會發展	649,083	總累計	26.24	22.34	-3.90	397,715	315,037	79.21	79.21	17.79	◎
					年累計	54.13	41.14	-12.99	162,045	115,444	71.24	71.24		
68	衛福部	父母未就業家庭育兒津貼實施計畫(101/01/01~104/12/31)	社會發展	4,184,743	總累計	62	62	0.00	11,329,869	11,793,845	104.10	104.10	60.41	◎
					年累計	48	48	0.00	2,009,000	2,527,822	125.82	125.82		
69	衛福部	推動長期照顧服務機制(101/01/01~104/12/31)	社會發展	3,272,546	總累計	63	63	0.00	5,747,568	5,747,568	100.00	100.00	39.91	◎
					年累計	52	52	0.00	1,306,008	1,306,008	100.00	100.00		
70	衛福部	重建食品藥物安全(清雲行動五五方案)計畫(101/01/01~105/12/31)	社會發展	317,784	總累計	35.49	35.49	0.00	391,283	390,440	99.78	99.78	22.67	◎
					年累計	37.15	37.15	0.00	72,602	72,050	99.24	99.24		
71	衛福部	開創全民均等健康照護計畫(102/01/01~105/12/31)	社會發展	1,075,020	總累計	35.89	35.61	-0.28	2,094,124	1,323,252	63.19	63.19	28.29	◎
					年累計	43.54	42.6	-0.94	291,073	304,148	104.49	104.49		
72	衛福部	食品安全管制科技發展計畫(102/01/01~105/12/31)	科技發展	214,429	總累計	35.46	35.46	0.00	338,887	327,950	96.77	96.77	29.81	◎
					年累計	41.84	41.84	0.00	71,839	63,918	88.97	88.97		
73	衛福部	臺灣環境毒物健康危害之監測、評估及對策研究(102/01/01~105/12/31)	科技發展	163,619	總累計	32.6	32.6	0.00	255,014	255,627	100.24	100.24	43.27	◎
					年累計	45	45	0.00	70,186	70,799	100.87	100.87		
74	衛福部	國民心理健康促進計畫(102/01/01~105/12/31)	社會發展	595,068	總累計	35.75	35.75	0.00	750,009	721,605	96.21	96.21	43.38	◎
					年累計	43	43	0.00	241,751	258,154	106.79	106.79		
75	衛福部	長照服務網計畫(102/01/01~105/12/31)	社會發展	363,575	總累計	17	15	-2.00	156,220	68,664	43.95	43.95	2.14	◎
					年累計	35	25	-10.00	8,350	7,767	93.02	93.02		
76	衛福部	第三期國家癌症防治計畫(103/01/01~107/12/31)	社會發展	3,369,989	總累計	6.77	6.77	0.00	1,362,019	1,362,019	100.00	100.00	40.42	◎
					年累計	33.85	33.85	0.00	1,362,019	1,362,019	100.00	100.00		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
77	衛福部	強化國民年金保險制度 (103/01/01~103/12/31)	社會 發展	62,334,670	總累計	47.35	46.99	-0.36	29,536,287	29,434,242	99.65	99.65	47.22	◎
					年累計	47.35	46.99	-0.36	29,536,287	29,434,242	99.65			
78	衛福部	預防保健服務計畫 (103/01/01~106/12/31)	社會 發展	2,722,769	總累計	16.25	16.25	0.00	2,500,208	2,500,208	100.00	100.00	91.83	◎
					年累計	65	65	0.00	2,500,208	2,500,208	100.00			
79	衛福部	推動國內醫藥衛生研究 (103/01/01~105/12/31)	科技 發展	425,041	總累計	28	28	0.00	216,771	217,621	100.39	100.39	51.20	◎
					年累計	70	70	0.00	216,771	217,621	100.39			
80	衛福部	友善關懷老人服務方案第二期 計畫(103/01/01~105/12/31)	社會 發展	442,220	總累計	11.25	11.25	0.00	192,158	218,158	113.53	113.53	49.33	◎
					年累計	37.5	37.5	0.00	192,158	218,158	113.53			
81	衛福部	保母托育管理與托育費用補助 (103/01/01~103/12/31)	社會 發展	1,020,860	總累計	50	48.3	-1.70	906,190	906,190	100.00	100.00	88.77	◎
					年累計	50	48.3	-1.70	906,190	906,190	100.00			
82	環保署	資源永續循環利用推動計畫 (102/01/01~106/12/31)	社會 發展	434,220	總累計	11.62	11.44	-0.18	254,308	237,023	93.20	93.20	9.44	◎
					年累計	37.85	36.26	-1.59	37,208	40,994	110.18			
83	故宮	故宮南部院區籌建 (92/01/01~104/12/31)	公共 建設	1,665,193	總累計	50.87	45.74	-5.13	3,461,939	3,334,749	96.33	97.57	22.67	◎
					年累計	28.02	23.62	-4.40	437,382	334,519	76.48			
84	故宮	大故宮計畫 (103/01/01~103/12/31)	公共 建設	5,000	總累計	32	32	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	◎
					年累計	32	32	0.00	0	0	0.00			
85	科技部	中部科學工業園區建設計畫 (92/07/01~110/12/31)	公共 建設	6,997,111	總累計	74.82	74.47	-0.35	77,020,435	76,858,341	99.79	99.79	7.40	◎
					年累計	6.26	7.4	1.14	438,010	514,285	117.41			
86	科技部	奈米國家型科技計畫 (98/01/01~103/12/31)	科技 發展	2,530,485	總累計	90.22	90.62	0.39	15,798,008	13,015,810	82.39	82.39	47.45	◎
					年累計	44.11	46.37	2.26	1,128,937	1,200,599	106.35			
87	科技部	中興新村高等研究園區計畫 (99/01/01~108/12/31)	公共 建設	385,635	總累計	60.51	60.42	-0.09	6,448,647	6,422,195	99.59	99.66	25.54	◎
					年累計	28.21	25.54	-2.67	108,800	93,983	86.38			

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
88	科技部	生技醫藥國家型科技計畫 (100/01/01~105/12/31)	科技 發展	1,512,815	總累計	49.94	49.94	0.00	5,992,668	5,169,362	86.26	86.26	42.28	◎
					年累計	49.35	49.35	0.00	618,475	639,578	103.41	103.41		
89	科技部	智慧電子國家型科技計畫 (100/01/01~104/12/31)	科技 發展	1,673,093	總累計	69.83	69.81	-0.02	6,345,884	6,124,843	96.52	97.09	44.21	◎
					年累計	49.13	49.13	0.00	656,959	703,098	107.02	112.60		
90	科技部	第二期能源國家型科技計畫 (103/01/01~107/12/31)	科技 發展	4,838,609	總累計	8.05	9.94	1.89	1,941,729	1,405,727	72.40	72.40	29.05	○
					年累計	40.24	49.71	9.47	1,941,729	1,405,727	72.40	72.40		
91	農委會	屏東農業生物科技園區 (92/02/25~103/12/31)	經濟 發展	168,619	總累計	98.66	98.53	-0.13	8,191,934	8,092,743	98.79	98.79	7.26	◎
					年累計	33.06	26.66	-6.40	88,286	12,242	13.87	13.87		
92	農委會	曾文南化烏山頭水庫治理及穩 定南部地區供水計畫 (農委會水土保持局部分) (99/05/12~104/12/31)	公共 建設	233,811	總累計	83.75	84.23	0.48	1,381,482	1,373,871	99.45	100.50	34.52	◎
					年累計	37.5	42.28	4.78	72,000	66,200	91.94	112.08		
93	農委會	曾文南化烏山頭水庫治理及穩 定南部地區供水計畫 (農委會林務局部分) (99/05/12~104/12/31)	公共 建設	159,897	總累計	84.25	84.81	0.56	1,572,923	1,569,393	99.78	100.35	30.34	◎
					年累計	42.5	47	4.50	16,697	39,526	236.73	290.56		
94	農委會	漁業多元化經營建設 (102/01/01~105/12/31)	經濟 發展	1,566,155	總累計	32.84	29.41	-3.43	1,579,779	810,762	51.32	62.99	31.71	◎
					年累計	31.34	33.04	1.70	466,938	312,221	66.87	106.36		
95	農委會	加強農田水利建設 (102/01/01~105/12/31)	經濟 發展	3,137,519	總累計	30.39	30.06	-0.33	3,125,806	3,237,788	103.58	106.39	31.10	◎
					年累計	21.55	20.23	-1.32	775,980	887,962	114.43	125.75		
96	農委會	調整耕作制度活化農地計畫 (102/01/01~105/12/31)	經濟 發展	7,170,941	總累計	35	35	0.00	7,412,929	8,380,251	113.05	113.05	5.94	◎
					年累計	40	40	0.00	425,709	425,708	100.00	100.00		
97	農委會	生態旅遊系統建置發展 (102/01/01~105/12/31)	經濟 發展	386,030	總累計	35	35	0.00	514,272	517,016	100.53	100.56	33.74	◎
					年累計	40	40	0.00	100,393	130,131	129.62	129.75		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
98	農委會	植樹造林計畫 (102/01/01~105/12/31)	公共 建設	1,329,044	總累計	32.75	32.36	-0.39	2,117,549	1,946,708	91.93	96.62	39.42	◎
					年累計	31	31	0.00	465,820	424,627	91.16	112.47		
99	農委會	休閒農業加值發展 (102/01/01~104/12/31)	經濟 發展	491,150	總累計	46.2	46.13	-0.07	359,000	346,227	96.44	96.88	5.99	◎
					年累計	40	39.8	-0.20	29,000	27,844	96.01	101.42		
100	農委會	強化農產品全球市場深耕計畫 (103/01/01~103/12/31)	經濟 發展	191,605	總累計	36.5	36.5	0.00	68,515	68,485	99.96	99.96	35.74	◎
					年累計	36.5	36.5	0.00	68,515	68,485	99.96	99.96		
101	農委會	穩定肥料及相關資材供需計畫 (103/01/01~103/12/31)	經濟 發展	2,569,745	總累計	52.38	52.38	0.00	609,213	579,116	95.06	99.00	23.47	◎
					年累計	52.38	52.38	0.00	609,213	579,116	95.06	99.00		
102	農委會	流域綜合治理計畫-農田排水 (103/01/01~108/12/31)	公共 建設	255,000	總累計	3.44	0	-3.44	51,000	0	0.00	0.00	0.00	◎
					年累計	20	0	-20.00	51,000	0	0.00	0.00		
103	農委會	流域綜合治理計畫-上游坡地水土 保持及治山防洪 (103/01/01~108/12/31)	公共 建設	1,600,000	總累計	5.05	0	-5.05	480,000	0	0.00	0.00	0.00	◎
					年累計	30	0	-30.00	480,000	0	0.00	0.00		
104	農委會	推動農業科技產業全球運籌 (103/01/01~106/12/31)	科技 發展	431,491	總累計	12.1	12.05	-0.05	209,323	196,327	93.79	94.88	46.03	◎
					年累計	48.4	48.18	-0.22	209,323	196,327	93.79	94.88		
105	勞動部	辦理職業訓練，協助勞工提升職 場所需之能力 (103/01/01~103/12/31)	社會 發展	2,855,991	總累計	35.5	38.11	2.61	556,000	737,897	132.72	132.72	25.84	○
					年累計	35.5	38.11	2.61	556,000	737,897	132.72	132.72		
106	勞動部	辦理多元就業開發方案及推動 培力就業計畫，促進社會企業的發展 (103/01/01~103/12/31)	社會 發展	1,324,219	總累計	43.2	44.2	1.00	132,421	339,685	256.52	256.52	25.65	◎
					年累計	43.2	44.2	1.00	132,421	339,685	256.52	256.52		
107	原民會	原住民族社會安全發展第二期 四年計畫(102/01/01~105/12/31)	社會 發展	2,681,745	總累計	37.88	37.88	0.00	4,025,483	4,046,176	100.51	100.51	51.92	◎
					年累計	51.5	51.5	0.00	1,371,575	1,392,268	101.51	101.51		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				支用數			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (個百分點) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
108	原民會	輔導原住民產業發展 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	332,200	總累計	18.27	30.63	12.36	72,563	144,331	198.90	198.90	3.31	○
					年累計	29.5	23.2	-6.30	16,563	10,980	66.29	66.29		
109	原民會	原住民族住宅改善計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	183,760	總累計	40.17	37.9	-2.27	257,576	267,564	103.88	103.88	69.20	◎
					年累計	60.7	60.7	0.00	133,020	127,161	95.60	95.60		
110	客委會	客家文化發展中心南北園區設 施管理及擴充計畫 (101/01/01~104/12/31)	公共 建設	420,293	總累計	54.72	53.89	-0.84	1,195,375	1,427,021	119.38	119.53	31.00	◎
					年累計	33.62	32.69	-0.93	132,002	128,522	97.36	98.72		
111	客委會	客家傳播行銷計畫 (103/01/01~108/12/31)	社會 發展	599,726	總累計	8.14	8.13	-0.01	243,636	242,975	99.73	99.73	40.51	◎
					年累計	50.9	50.83	-0.07	243,636	242,975	99.73	99.73		
112	客委會	客家文化生活環境營造計畫 (103/01/01~108/12/31)	公共 建設	762,608	總累計	3.36	3.31	-0.05	229,022	225,097	98.29	101.08	30.36	◎
					年累計	33.55	33.09	-0.46	229,022	225,097	98.29	101.08		
113	臺灣省 諮議會	研究發展及諮詢 (103/01/01~103/12/31)	社會 發展	3,746	總累計	52	52	0.00	1,395	1,381	99.00	99.00	36.87	◎
					年累計	52	52	0.00	1,395	1,381	99.00	99.00		

參、列管落後案件執行情形及原因分析表
(截至 103 年 6 月底止)

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
臺北捷運系統環狀線 建設計畫(第 1 階段路線)	交通部	總累計	100	75.85	落後 24.15	26,817,010	24,829,120	92.59	66.29	26.58
		年累計	41.24	19.49	落後 21.75	3,493,325	1,505,435	43.09		
執行情形	一、土木細設標各項細設作業：進行土木細部設計施工中服務。 二、土木工程施工： （一）CF640 區段標：管線遷移、連續壁、潛盾隧道、高架段橋梁結構工程，機廠則進行土方開挖、結構及鋼構吊裝等工作。 （二）CF650 區段標：管線遷移、車站站體結構、高架段橋梁結構及鋼構件吊裝等工作。 （三）CF660A 區段標：管線遷移、板橋站暨有建物拆除、建物保護、全套管基樁施作、高架段橋梁結構、預埋螺栓開挖及安全檢討等工作。 （四）CF660B 區段標：管線遷移、排水箱涵施築、車站開挖支撐及結構施作、高架段橋梁結構施作等工作。 三、機電工程細部設計及文件審查： （一）機電系統標細部設計文件送審。 （二）電聯車子系統合格測試、機電系統設備製造、廠測。 四、土地取得作業－穿越段之用地取得作業： （一）同意設定地上權之用地刻正辦理簽約及登記作業。 （二）墩柱用地範圍同意讓售其持有土地者，刻正辦理價購補償作業。 （三）其餘墩柱及高架段範圍之土地所有權人如未於期限內達成協議者，將以徵收方式辦理。 五、工務行政：工務行政及準備金支付。									
重要成果	一、電聯車車體壓縮測試於 103 年 3 月 7 日完成。									

	二、CF660B 區段標新設排水箱涵已於 103 年 4 月 22 日完成。 三、CF641 標站體結構設備二層版已於 103 年 5 月 30 日完成。 四、CF660A 區段標基樁已於 103 年 1 月 3 日開始施作。 五、電聯車轉向架已於 103 年 2 月 14 日於義大利開始靜態及疲勞測試。
落後原因	一、本計畫南機廠斯馨祠(碑)(土地公廟)歷史建物遷移問題致主體工程 CF640 區段標工程進度落後。 二、本計畫板橋民生路 3 段居民及當地民意代表反映受臺 64 線通車後振動噪音影響，以及路線受限於臺 64 線高架橋位置，而陳情要求 CF660 區段標變更線形設計，致 CF660 區段標工程進度落後。 三、中和景平路段管線遷移困難等原因，致主體工程 CF650 區段標工程進度落後。 四、機電廠商提送文件時程落後，並受土建 CF640、CF650 標發包進度落後，造成本標進度落後。電聯車 DDR 文件提送及合格測試、供電及機廠設備 DDR 文件提送未能如期完成、通訊製造作業未能如期開始，設計介面文件確認及提審受土建標施工進度落後影響。 五、CF640 區段標：工區發現契約圖未標示之排水箱涵，需配合辦理遷移，並施作臨時箱涵及吊掛保護作業，影響連續壁、中間柱施作及後續開挖支撐作業。 六、CF650 區段標： (一) 因高架橋工程特性須於道路施工，施工交通動線更動易影響交通流暢，且施工圍籬架設後影響居民進出，致需分多段施工，無法全面開展。 (二) 基礎位置位於未徵收之私有地上，需進行土地徵收，在未完成徵收前地主不同意原規劃之 $\phi 1000\text{mm}$ 自來水臨時遷移經過其土地。 七、CF660B 區段標部分基礎結構與臺電高低壓、161KV 特高壓、自來水 $\phi 1200$ 管路衝突。部分計價文件未及提送，影響執行進度。
因應對策	一、本計畫南機廠斯馨祠(碑)(土地公廟)歷史建物拆遷異地重組作業已辦理完成，南機廠工程已全面開展。 二、板橋民生路段因民眾陳情要求變更線形案，臺北市政府捷運局變更線形細部設計已辦理完成，CF660A 區段標已於 102 年 6 月 3 日決標，7 月 16 日開工。 三、本計畫中和景平路段管線遷移困難，臺北市捷運局已逐步積極協調解決管線遷移問題，包括協調臺電撥遷路線，另須配合新北市水利局進行景平路易淹水路段整體改善。 四、機電標已於 100 年起陸續發文要求得標廠商趕工，另針對廠商整體進度已落後超過 10 個百分點部分，於 101 年 10 月 5 日發函廠商依契約規定處置，新北市交通局要求廠商加速改善並追趕 DDR 文件送審進度，其餘項目也在月進度追蹤列管，每月檢討廠商改善成效。

	五、CF640 區段標：已要求廠商積極趕工儘速弭平工進差異。 六、CF650 區段標： (一) 工程期間改變路型皆經報請新北市政府交通局交維計畫核定，相關交維調整均發布新聞稿並由廠商發送宣導傳單。 (二) 經與當地民眾積極協調，目前已採避開巷道、公車停靠站方式，擴大施工區域圍設作業範圍進行施工，將於完成新建箱涵後，進行中央區既有箱涵破除及後續基樁基礎作業。 (三) 臺北市捷運局路權室已於 103 年 5 月 16 日辦理設定地上權及協議價購會議，後續將配合民眾之申請辦理相關手續。 (四) 有關自來水管線避開私地改遷處理，該局東工處已協調臺北自來水工程總隊配合改採避開私人土地進行管遷作業，管屬單位已完成管線遷移，目前正進行 P0827 交維佈設及後續基樁施工前整備作業，惟 P0828 基樁及基礎工程仍需待用地取得方得施作。 七、CF660B 區段標： (一) 迴避 161KV 特高壓衝突，調整基樁或墩柱位置，臺電高低壓管線委由臺電公司遷入共同管溝。 (二) 加強協調臺電與自來水公司協助加速配合遷移作業，基樁機組先調整至其餘基樁趨趕工進。
管考建議(國發會)	一、本計畫年累計進度落後 21.75 個百分點，落後幅度較上月持續擴大，顯示所提改善策略效果不佳，請針對進度落後工項再積極檢討辦理。 二、落後原因分析所述事項，除俟修正計畫核定後配合修正相關進度，請就部分工程標案未能有效推展工進，造成年累計及總累計進度落後之原因擇要說明，並研擬因應對策積極改善辦理。 三、本計畫已逾 102 年 12 月之核定期程，已發包工程經費亦逾計畫核定經費，須辦理修正計畫，請配合儘速完成修正計畫事宜。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
故宮南部院區籌建	故宮	總累計	50.87	45.74	落後 5.13	3,461,939	3,334,749	96.33	86.32	22.67
		年累計	28.02	23.62	落後 4.40	437,382	334,519	76.48		
執行情形	一、建築工程（營建署代辦）：博物館主體工程進行鋼構現場電銲及支承鈑安裝，施工進度為 30.75%；景觀橋工程進行基礎鋼筋綁紮、混凝土澆置，及鋼構廠內加工，施工進度為 45.4%。 二、景觀工程：全區排水設施施作及植栽驗苗。 三、展示工程：各展廳細部設計階段報告書審查。 四、促參招商：辦理招商說明會。 五、軟體建置：持續辦理南院圖書加工及文物徵集。 六、行政管理及雜項： （一）辦理委託專案管理服務變更契約。 （二）持續辦理大地安全及環境監測作業。									
重要成果	一、建築工程（含景觀橋）：吳副總統於 103 年 6 月 9 日主持建築工程鋼構上梁典禮。 二、景觀工程：完成北側廁所、中央控制室及機房基礎混凝土澆置。 三、展示工程：承商於 6 月 4 日提交各展廳及獨立櫃細部設計報告書，並陸續於 6 月 30 日完成審查。 四、促參招商：6 月 30 日辦理臺北場招商說明會。 五、博物館軟體建置：累計完成圖書登錄 7,021 冊、編目 6,600 冊、103 年度累計購得圖書 686 冊。 六、行政管理及雜項：完成 103 年 6 月環境及大地安全監測工作。									
落後原因	一、預定於 4 月份支付之委託專案管理費用 1,805 萬元尚未支付。 二、預定於 6 月份支付與前 1 階段規劃設計廠商之履約爭議款項 2,000 萬元尚未給付。 三、郭達樺先生讓售茶文化文物 1 批及細密畫尚未完成採購。 四、線上目錄伺服器主機尚未完成採購。									
因應對策	一、因本院與委託專案管理廠商（中興工程顧問公司）之履約爭議仲裁案件尚未獲判斷，俟完成仲裁後即可給付相關契約價金。 二、相關案件尚在進行訴訟中，待判決結果即可支付相關款項。									

	三、前列文物均已於 6 月完成議價會議，將於 7 月付款後完成採購程序。 四、伺服器主機已於 6 月 30 日下訂，將於 7 月驗收付款後完成採購程序。
管考建議(國發會)	一、本計畫之博物館主體及景觀橋工程 6 月總累計執行進度(落後 2.16 個百分點)較 5 月(落後 1.73 個百分點)有擴大落後幅度之情形，主要原因在於內政部營建署之代辦款項預定於 7 月間撥付，且主體建築鋼構吊裝部分區域尚未於 6 月間完成，故請主辦(管)機關與代辦機關加強聯繫，儘速趕辦，並於 7 月執行情形更新 2 項新建工程之年度目標(實際值)。 二、其中景觀工程、展示工程、軟體建置及行政管理等工作項目之年度預算支用比均偏低(未達 90%)，未能依預定期程付款之主要原因在於承商提供估價資料不齊、實際執行進度較預定進度落後 10 個百分點、相關軟體設備未完成採購作業，以及與廠商有履約爭議須經裁決未果等，故請主辦機關加強督導承商完成相關作業程序，並加速採購作業程序，以及依裁決結果儘速撥付款項。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
流域綜合治理計畫-上游坡地水土保持及治山防洪	農委會	總累計	5.05	0	落後 5.05	480,000	0	0.00	0.00	0.00
		年累計	30	0	落後 30.00	480,000	0	0.00		
執行情形	本計畫預算經費總統府於 103 年 6 月 18 日公告完成法定程序，水保局辦理測設、發包及施工作業中。									
重要成果	一、103 年度土石流防治、崩塌地處理、坡地保育工程：崩塌地處理。 二、103 年度野溪治理、坡面沖蝕控制工程：水土保持及農路設施。									
落後原因	本計畫預算經費經總統府 6 月 18 日公告，行政院主計總處訂於 7 月份起始得支用。									
因應對策	水保局辦理測設、發包及施工作業中。									
管考建議(國發會)	本計畫特別預算已奉立法院核定，並於 7 月間依核定後計畫內容進行調整(含各月預定執行進度及經費支用情形)，請農委會速辦計畫追趕預定進度。									

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支出			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	交通部	總累計	53.06	48.9	落後 4.16	11,053,215	4,412,257	39.92	78.29	56.70
		年累計	39.84	36.78	落後 3.06	6,879,024	238,066	3.46		
執行情形	一、用地取得：因內政部 101 年 9 月 25 日函知臺中市政府本計畫（原臺中市）徵收工程失效。故於 102 年重新依法辦理用地取得作業，其中一般場站及路線段徵收計畫已於 102 年 11 月 13 日經審議核准並辦理公告，12 月發放補償費，103 年 4 月已陸續辦理用地點交，剩 G4 處 2 戶於 6 月 27 日起進行拆除，另 G16 北側亦已進行拆除工程，預計 7 月中竣工。 二、土木工程： （一）CJ910 區段標(北屯機廠、G0 站及全線軌道區段標工程)： 1、101 年 12 月 31 日開工，惟開工後施工廠商進場施工受居民阻撓且工區內尚有住戶未遷出，致辦理工程停工至 102 年 7 月 22 日(雖未全數完成搬遷，然暫無影響施工)，並於 7 月 23 日復工。本項停工案影響計 204 天，目前已辦理工期展延。 2、本標廠區內各棟建物「建照執照」臺中市政府於 103 年 5 月 17 日核頒，目前施工廠商辦理建照開工等作業。 3、因本 CJ910 區段標之 CJ910A 子施工標 G0 車站，需取得「特種建築物許可」始得施作，惟至今未獲得「特種建築物許可」，將延遲 G0 車站後續要徑施工，自 103 年 4 月 6 日起部分停工中。 4、為降低停工影響，本標目前積極辦理廠區開挖、污水管、排水箱涵、擋土牆、明隧道及高架橋等施工作業中。 （二）CJ920 區段標(G03 至 G09 站及全線環控監控系統區段標工程)：102 年 3 月 15 日開工，目前進行高架橋之井式基礎、墩柱及帽梁等下部結構工程，預鑄 U 型梁生產及吊裝、場鑄梁等上構作業於 103 年 4 月份開始進行，另懸臂工法梁、連續鋼箱梁、車站鋼帽梁等亦於 5 月份啟動施工作業；惟本標路線轉彎段（松竹路轉北屯路）施工用地迄今仍尚未取得，已影響既定里程碑交付時程，施工廠商已自 5 月 10 日起提報部分停工迄今。 （三）CJ930 區段標(G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程)：102 年 3 月 1 日開工，依施工作業進行圍籬									

	佈設含交維設施、全套管基樁、基礎開挖擋土支撐、下部結構(墩柱、帽梁)、G12 車站帽梁軌道梁吊裝、筏子溪箱涵段等施工，另預鑄場已設置完成進行 U 梁生產作業中，迄 103 年 6 月 30 日已完成 22 支 U 梁吊裝作業；惟本標路線轉彎段施工用地迄今仍尚未取得，已影響既定里程碑交付日期。施工廠商所提送之綱要施工計畫已核可，施工綱圖臺北市捷運局將詳細檢討施工作業順序(出入口與道路上主線站體下構及上構施工順序)與工率，降低對提供機電標進場時間之影響。 三、機電工程： (一) 機電系統工程標歷經 3 次流、廢標後終於 100 年 3 月 9 日決標（較原預訂時程亦落後約 23 個月），並於 100 年 4 月 21 日開工，持續進行全系統共同性管理文件、各子系統概念設計及細部設計文件提送審查，各子系統主要設備供應商選定、請購單擬定及下單等採購作業。 (二) 100 年 7 月 14 日支付機電工程第 1 期預付款。 (三) 101 年 12 月 19 日支付機電工程第 2 期預付款。 (四) 102 年 12 月 24 日支付機電工程第 3 期預付款。
重要成果	一、一般場站及路線段用地補償費轉保管專戶於 103 年 1 月 21 日完成移轉登記。 二、CJ920 區段標預鑄 U 型梁於 103 年 1 月 15 日開始生產。 三、CJ930 區段標全跨預鑄 U 梁於 103 年 3 月 16 日開始量產。 四、通訊系統細部設計文件-直線電話 G0 車站設備位置圖於 103 年 3 月 17 日開始送審。 五、CJ920 區段標預鑄 U 型梁於 103 年 3 月 18 日吊裝。 六、CJ906A 電(扶)梯工程技術文件資料於 103 年 3 月 27 日審查完成。 七、CJ920 區段標鋼箱梁於 103 年 5 月 25 日開始生產。
落後原因	一、北屯機廠(含 G0 車站)用地取得原定於 98 年底完成，實際於 101 年 8 月完成徵收作業，其後又因民眾抗爭、住戶尚未搬遷等因素，迄 102 年 7 月 23 日復工，已較原計畫 98 年 12 月交付落後 43 個月。 二、另場站及轉彎段範圍內私有土地部分：因臺中市政府用地徵收工程失效，較原計畫 98 年 12 月交付落後 51 個月。 三、本計畫機電系統標案於 99 年 8 月 26 日開啟標封，因投標家數不足三家，宣告流標，流標後依採購法檢討相關規定，99 年 9 月 17 日辦理第 2 次招標、99 年 11 月 30 日均無廠商符合資格標規定，當場宣佈廢標。99 年 12 月 6 日重新辦理第 3 次招標作業，目前機電工程已於 100 年 3 月 9 日由川崎重工業株式會社/法商阿爾斯通運輸股份有限公司/中鼎工程股份有限公司共同投標商得標，並於 100 年 4 月 21 日開工，較原計畫 98 年 5 月 15 日開工時程落後約 23 個月。

因應對策	一、北屯機廠(含 G0 車站)用地取得原定於 98 年底完成，因民眾抗爭、住戶尚未搬遷等因素，迄 102 年 7 月 23 日復工。 二、其中一般場站及路線段徵收計畫已於 102 年 11 月 13 日經審議核准並辦理公告，12 月發放補償費，103 年 4 月已陸續辦理用地點交，剩 G4 處 2 戶及 G16 北側尚未完成拆除，經洽均預計於 6 月底拆除。 三、臺北市捷運局已採各項積極作為如規劃先期工程，調整原計畫里程碑等方式因應，惟因計畫時程目前已大幅度落後，勢已無法依原訂計畫時程於 104 年 10 月通車，經臺北市捷運局於交通部重大工程督導會報提報，並依高鐵局 102 年 6 月 17 日專案會議紀錄，以 103 年 4 月取得用地為基礎評估對整體計畫時程之影響，已於 102 年 7 月 22 日將評估後之修正時程提報高鐵局轉交通部，依現況完工時程為 107 年 12 月，將配合交通部高鐵局、臺中市政府檢討修正內容與時機，以利整體計畫時程合理之控管。
管考建議(國發會)	一、本計畫年累計進度落後 3.06 個百分點，總累計進度落後 4.16 個百分點，其中 CJ910 區段標特種建照未取得等問題，請儘速積極協調解決並提出改善作法。另年累計支用比僅 3.46%，請督促承商儘速提出請款，將預付款實支轉正，並完成經費核撥作業。 二、請就工程標案未能有效推展工進，造成年累計及總累計進度落後之原因擇要說明，並研擬因應對策積極改善辦理。 三、主辦機關已提出須修正完工工期，請儘速協調提報修正計畫，並循序完成報核程序。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較(個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
價值產值化-文創產業價值鏈建構與創新	文化部	總累計	26.24	22.34	落後 3.90	397,715	315,037	79.21	71.24	17.79
		年累計	54.13	41.14	落後 12.99	162,045	115,444	71.24		
執行情形	一、推動文化內容開放與加值應用									
	(一) 建立雲端「文創咖啡廳」媒合平臺：於 103 年 5 月 1 日至 5 月 31 日完成第 1 梯次競賽徵件，共徵得 126 件提案，並持續辦理平臺維運工作。 (二) 舉辦年度文化素材原創、加值應用獎勵：於 5 月 1 日至 5 月 31 日完成第 1 梯次競賽徵件，共徵得 126 件提案，已於 6 月 6 日完成初審、於 6 月 17 日完成複審、6 月 25 日完成決審作業。 (三) 智財權產值化：103 年「公有文化創意素材加值應用計畫」賡續執行 8 案，補助 6 案均已完成簽約，2 案為跨年度執行。 (四) 充實工藝原創素材庫：辦理「當代金工複合媒材創作藝術展」展期：103 年 5 月 1 日至 10 月 12 日。 1、截至 6 月 25 日共計 2 萬 1,357 人次參觀；5 月 18 日完成第 2 場示範表演活動，共計 50 人參與；6 月 1 日完成兩場付費 DIY 體驗課程，共計 22 人參與。 2、5 月 14 日完成開幕記者會，截至 5 月 21 日計有電視臺等平面與電子媒體報導共 16 則以上。 (五) 當代藝術資產應用發展計畫： 1、辦理作品保護盒製作之採購發包，及保護作品材料購置。 2、辦理青年藝術家作品購藏計畫宣導，已完成第 1 階段公開徵件，共 326 位藝術家 5,867 件作品送件，初審通過作品 55 件，預計 7 月 10 日辦理複審。 3、當代藝術資產衍生商品開發案於 5 月 21 日決標，共 3 家廠商得標，10 種產品初步規劃通過，細部設計書圖審查中。 4、典藏之美及藝術品管理資訊系統擴充案於 5 月 20 日決標，專案管理計畫書已審查通過，進行程式設計中。 5、藏品數位化內容建置案已完成審查。 6、辦理「國美館形象吉祥物設計徵件比賽」包括網路社群等相關媒體之宣導，預計 7 月 25 日辦理初選。 7、辦理典藏譯讀親子詮釋分享等展覽相關教育推廣活動之宣導。									

二、促進一源多用與強化中介體系

- (一) 協助推動智慧財產權保護及管理措施：103 年度「文創產業智財權保護及加值應用工作營」已完成委辦作業，規劃自 103 年 8 月起於北、中、南、東 4 個地區辦理 10 梯次，參與對象以從事文創產業範疇之在職人士為主，課程方向包含創作權利自我保護觀念與操作、授權商業模式與經營實務、公有文化創意資產衍生素材應用開發及中國大陸智財權保護實務。
- (二) 輔助藝文產業創新育成中心：103 年度「輔導藝文產業創新育成補助計畫」共計 18 案進入複審，業於 5 月 26 日完成召開複審會議，審查結果刻正辦理簽核作業中。
- (三) 建全工藝產業行銷體系：
 - 1、臺灣優良工藝品評鑑徵選 6 月 3 日完成資格審查及會議紀錄陳核，共計通過 74 家廠商、212 組 796 件產品。
 - 2、2014hito 流行音樂獎得獎獎座，由良品美器入選廠商谷橋工業股份有限公司及春池玻璃實業有限公司聯合設計製作，認證之廠家獲得甚高之殊榮。
 - 3、推廣工藝育成平臺暨整合行銷計畫：完成五支創意形象影片於網路進行整合行銷推播。
- (四) 臺灣史前文化國寶及品牌旗艦計畫：
 - 1、廠商於 6 月 17 日提交展品細部設計圖。
 - 2、本館於 6 月 24 日函覆廠商審查會議修改意見。

三、促成跨界與跨業整合，提升文創產業價值

- (一) 輔助文創跨界加值應用體系之建立：103 年度已於 5 月 2 日(原創組)、5 月 1 日(跨界組)日召開決審會議。決審結果已奉核定，跨界組同意補助 10 件，原創組同意補助 7 件，已於 5 月 29 日上午召開簽約核銷事宜說明會，目前契約已奉核定，用印中，於 6 月核撥第 1 期款(720 萬元)。
- (二) 藝術跨域發展計畫：
 - 1、完成數位藝術創作案「金啟平 x 吳冠穎：世界之島」開展，展期 6 月 7 日至 8 月 17 日。
 - 2、完成數位藝術創作案「曹筱珣：心之舞」開展，展期 6 月 14 日至 8 月 31 日。
 - 3、完成數位藝術策劃展「媒界探勘開展，展期 6 月 14 日至 8 月 17 日。
 - 4、完成數位藝術創作案「陳韻如：時光間」和「吳宜曄：Falling」共 2 檔閉展 5.完成數位藝術策展案「後福島的今天與我們的明天」閉展共 1 檔。
- (三) 跨界合作與研發計畫：
 - 1、陶瓷研究會產品開發及推廣計畫：於道禾六藝文化館進行成果發表展—小學器特展。另完成麥克摩爾陶藝講

	座。後續持續辦理 2 場設計課，1 場黑釉釉藥課程。 2、自慢活產品開發補助計畫：已於 6 月 12 日完成審查，共計 9 家 12 組件獲得補助。 3、「2014 天然染服飾創新研發補助提案徵求案」已於 6 月 20 日完成審查，共計 3 組團隊獲選。 (四) 輔導核心創作及獨立工作者進駐文化創意聚落：103 年度核定補助 28 案，已完成 27 案簽約及第 1 期款撥付，另有 1 案因尚未依計畫進駐聚落，同意俟其進駐再行辦理簽約。自 6 月起安排辦理期中訪視作業。 (五) 補助民間提供空間供文創事業使用：103 年度第 1 次申請於 4 月 30 日截止，計收 3 件，經初審 2 件不符補助辦法規定，1 件符合，已於 103 年 6 月 3 日辦理實地會勘，因既有建築空間環境條件不足等因素，已奉核不予補助。
重要成果	一、充實工藝原創素材庫—辦理「當代金工複合媒材創作藝術展」展期(103 年 5 月 1 日~103 年 10 月 12 日) (一) 截至 6 月 25 日參觀人次共計 2 萬 1,357；5 月 18 日完成第 2 場示範表演活動，共計 50 人參與；6 月 1 日完成 2 場付費 DIY 體驗課程，共計 22 人參與。 (二) 5 月 14 日完成開幕記者會，截至 5 月 21 日計有電視臺等平面與電子媒體報導共 16 則以上。 二、當代藝術資產應用發展計畫： (一) 辦理作品保護盒製作之採購發包，及保護作品材料購置。 (二) 辦理青年藝術家作品購藏計畫宣導，已完成第 1 階段公開徵件，共 326 位藝術家 5,867 件作品送件，初審通過作品 55 件，預計 7 月 10 日辦理複審。 (三) 當代藝術資產衍生商品開發案 5 月 21 日決標，共 3 家廠商得標，10 種產品初步規劃通過，細部設計書圖審查中。 (四) 典藏之美及藝術品管理資訊系統擴充案 5 月 20 日決標，專案管理計畫書已審查通過，進行程式設計中。 (五) 藏品數位化內容建置案已完成審查。 (六) 辦理「國美館形象吉祥物設計徵件比賽」包括網路社群等相關媒體之宣導，預計 7 月 25 日辦理初選。 (七) 辦理典藏譯讚親子詮釋分享等展覽相關教育推廣活動之宣導。 三、協助推動智慧財產權保護及管理措施：103 年度「文創產業智財權保護及加值應用工作營」已完成委辦作業，規劃自 8 月起於北、中、南、東 4 個地區辦理 10 梯次，參與對象以從事文創產業範疇之在職人士為主，課程方向包含 創作權利自我保護觀念與操作、授權商業模式與經營實務、公有文化創意資產衍生素材應用開發及中國大陸智財權保護實務。 四、藝術跨域發展計畫：

	(一) 完成數位藝術創作案「金啟平 x 吳冠穎：世界之島」開展，展期 6 月 7 日至 8 月 17 日。 (二) 完成數位藝術創作案「曹筱珣：心之舞」開展，展期 6 月 14 日至 8 月 31 日。 (三) 完成數位藝術策劃展「媒界探勘開展，展期 6 月 14 日~8 月 17 日。 (四) 完成數位藝術創作案「陳韻如：時光間」和「吳宜曄：Falling」共 2 檔閉展 (五) 完成數位藝術策展案「後福島的今天與我們的明天」閉展共 1 檔。 五、跨界合作與研發計畫： (一) 陶瓷研究會產品開發及推廣計畫：於道禾六藝文化館進行成果發表展—小學器特展。另完成麥克摩爾陶藝講座。後續持續辦理 2 場設計課，1 場黑釉釉藥課程。 (二) 自慢活產品開發補助計畫：已於 6 月 12 日完成審查，共計 9 家 12 組件獲得補助。 (三)「2014 天然染服飾創新研發補助提案徵求案」已於 6 月 20 日完成審查，共計 3 組團隊獲選。
落後原因	一、智財權產值化：尚有 1 獲補助單位未撥付第 1 期補助款。 二、輔助藝文產業創新育成中心：審查結果刻正辦理簽核作業中。 三、補助民間提供空間供文創事業使用：103 年第 1 次申請無案件獲得補助。 四、協助文創產業國際拓展：103 年「國際文創產業及組織搭橋計畫」配合文博會轉型就內容主軸及時程進行調整，致影響原定預算執行進度。 五、促成文創產業展售流通：「臺灣國際文化創意產業展推動計畫」為求妥適，邀集產業界代表諮詢討論始定案，並辦理採購程序，影響執行進度。 六、打造藝術產業媒合交易平臺： (一) 衛武營玩劇藝術生活節總經費 2,997 萬元，已完成簽約，7 月可撥付第 1 期款 899 萬 1,000 元。 (二) 另 600 萬元已奉核支應衛武營籌備處洽邀英國莎士比亞環球劇場，分 3 期撥付，預計 7 月撥付第 1 期款 200 萬元（總金額 30%）。 七、輔助文創產業研發生產、品牌行銷及市場拓展：具時效性補助案計畫尚未執行完畢。 八、提供圓夢資金協助文創團隊產業化：配合獲獎人提送資料期程辦理核銷。 九、補助縣市政府推動文創產業發展計畫：臺中市尚缺漏納入預算證明，無法進行撥款。 十、建立文創產業情報網(文創產業基礎調查研究與市場情報建立)：因公告金額酌減，以致分期付款較原訂數額低。 十一、推動文創園區：

	(一) 因嘉義文創園區未順利完成招商，無法如期規劃委託履約經管採購案之執行進度，以及嘉義園區 103 年度保全（警衛勤務）採購案有疑似違反契約之情事，暫緩撥付 2 期服務費。 (二) 另因部分廠商未如期檢送核銷憑證資料，及本部文化資產局未檢送辦理臺南文創園區音樂排練室消防改善工程之相關撥款資料至部申請撥款，以致無法依預定進度辦理。
因應對策	一、智財權產值化：已請該完成簽約事宜及第 1 期款撥付。 二、輔助藝文產業創新育成中心：俟審查結果核定後，續辦理計畫公告及簽約事宜。 三、補助民間提供空間供文創事業使用：俟第 2 次申請再進行補助。 四、協助文創產業國際拓展：103 年「國際文創產業及組織搭橋計畫」已於 5 月 13 日完成議價，刻正辦理第 1 期款撥付。 五、促成文創產業展售流通：預計 7 月完成採購程序後儘速辦理經費撥付。 六、打造藝術產業媒合交易平臺：衛武營玩劇藝術生活節已決標並完成簽約，待細部規劃審核通過後撥付第 1 期款。 七、輔助文創產業研發生產、品牌行銷及市場拓展：俟計畫執行完畢後辦理核銷。 八、提供圓夢資金協助文創團隊產業化：核銷資料簽核中。 九、補助縣市政府推動文創產業發展計畫：預計 7 月可完成各獲補助縣市第 1 期款撥付，達成預算執行進度。 十、建立文創產業情報網(文創產業基礎調查研究與市場情報建立)：將調整運用未公告之預算。 十一、推動文創園區： (一) 將催請委託代管嘉義文創園區單位儘速配合辦理轉正及下半年度委託代管費用之撥付事宜。 (二) 將儘速釐清嘉義園區 103 年度保全（警衛勤務）採購案疑有履約爭議之權責問題後撥付應付款項。 (三) 另再催請相關廠商及本部文化資產局配合趕辦執行進度。
管考建議(國發會)	6 月份執行進度落後達 20 個百分點，請文化部加強督導，予以改善。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
流域綜合治理計畫-農田排水	農委會	總累計	3.44	0	落後 3.44	51,000	0	0.00	0.00	0.00
		年累計	20	0	落後 20.00	51,000	0	0.00		
執行情形	103 年度治理工程執行計畫書修正審議中。									
重要成果	無重要成果。									
落後原因	流域綜合治理計畫第 1 期(103 至 104 年)特別預算案，已於 103 年 5 月 30 日立法院三讀通過，因預算經費尚未能支用，故執行進度落後。									
因應對策	已辦理計畫相關先期作業等程序，將儘速趕辦。因立法院審核通過時程較晚，為符合計畫管考期程，已提出計畫調整需求。									
管考建議(國發會)	截至 103 年 6 月各工作項目實際進度及預算支用比皆為 0%，主因為立法院預算審議至 5 月 30 日始通過，請主辦機關檢討目前工作進度，適時調整計畫之各月預定執行進度、預定支用數及查核點，另請依計畫目標加緊趕辦，俾如期完成各項相關工作。									

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
漁業多元化經營建設	農委會	總累計	32.84	29.41	落後 3.43	1,579,779	810,762	51.32	106.36	31.71
		年累計	31.34	33.04	超前 1.70	466,938	312,221	66.87		
執行情形	一、沿近海漁業永續經營： (一) 魚苗放流計畫已核定，續辦理後續事宜。 (二) 已核定沿近海漁業之監控、管制及調查計畫，刻正辦理計畫相關工作推動事宜。 (三) 有關 102 年度第 2 階段漁船筏收購辦理情形，已核定「103 年度漁船筏收購及處理計畫(一)」計畫，已完成搗毀作業，續辦計畫結案事宜。「103 年度漁船筏收購及處理作業程序」業於 4 月 29 日公告，受理登記時間至 5 月 30 日止。刻正辦理初審及經費統計事宜。 (四) 餘各工作計畫依預定工作項目辦理中，相關補助計畫正由地方政府、漁業團體依需求研擬計畫，俟研提後由執行單位按必要性及優先性分別審核補助辦理；並由執行機關推動執行中。 二、促進養殖漁業與環境和諧： (一) 養殖漁業生產環境改善工程補助案件 12 件納入地方預算發包，已於 6 月 30 日前完成。 (二) 102 年保留 21 件工程截至 6 月底已有 18 件工程已完工(16 件(處)陸上養殖區工程，2 件 4 處海養殖區改善工程)。 (三) 102 年度工程標案核定率為 100%。 (四) 102 年度工程標案決標達成率為 100%。 (五) 103 年工程標案核定率為 71.13%。 (六) 103 年工程標案決標達成率為 23.18%。 三、振興漁港設施機能： (一) 103 年度部分至 103 年 6 月底止已同意辦理：資本門工作 59 項(漁業署自辦 11 項，委辦及補助 48 項)，其中已核定 59 項(漁業署自辦 11 項，委辦及補助 48 項)；另經常門工作已同意辦理 18 項(漁業署自辦 14 項，委辦及補助 4 項)，其中已核定 15 項(漁業署自辦 11 項，委辦及補助 4 項)。 (二) 102 年度保留部分：保留 62 件工程計畫，現階段均已完成設計發包，已開工 62 件，竣工 57 件，驗收 49									

	件，結案 30 件。 (三) 103 年工程計畫核定率為 77.45%，工程決標達成率為 28.47%。 (四) 102 年工程計畫核定率為 100.00%，工程決標達成率為 100.00%。 四、加速漁產品運銷通路相關設施建設： (一) 已核定 15 件工程，2 件決標，2 件開工。103 年核定率為 88.44%，決標達成率為 4.80%。 (二) 102 年保留工程已完成 6 件，其中 3 件結案，3 件結算中。 (三) 桃園魚市場工程於 103 年 5 月 23 日發文停止補助該公司一年。 五、石斑魚及其他養殖產業： (一) 本(103)年 1-6 月石斑魚出口量(值)統計 9,757.65 公噸，出口值高達新臺幣(以下同)32.4 億元。 (二) 截至 103 年 5 月底輔導活魚運搬船運搬至大陸及香港地區 487 航次。 (三) 漁業署已於 103 年 3 月 28 日公告「輸大陸地區石斑魚養殖場及中轉養殖場登錄管理作業要點」，將依積極輔導輸大陸地區石斑魚養殖示範場。 (四) 完成 103 年度 25,664.7 公頃(58.1%)養殖漁業放養量申(查)報資料。
重要成果	一、沿近海漁業永續經營：辦理漁業之監控、管制及調查 5 萬筆、魚苗放流 700 萬尾及漁船筏收購 65 艘。 二、振興漁港設施機能：永續海岸與因應氣候變遷對策(漁港疏浚、防減災工程等) 2 港次、漁港多元化營造 1 項及維護漁港功能與適正建設 1 港次。 三、石斑魚及其他養殖產業：輔導漁船運搬養殖活魚作業 410 航次及石斑魚產值增加至 76 億元(其中出口值達 53.2 億元)28 億元。
落後原因	部分工程現階段仍辦理工程設計及工程發包作業中；部分工程因流標重新檢討設計內容，再辦理發包作業中，待上開情事改善後，本計畫將趕上預定進度。
因應對策	一、已於 103 年 6 月 30 日以漁一字第 1031314213 號函送各縣市政府妥善運用契約「部分驗收」條款，以提升預算執行成效；尚未提送預算書圖送署審查之案件，請於 103 年 7 月底前將預算書圖送署審查。 二、漁業署持續檢討各地方漁業建設需求之必要性及優先性，目前相關計畫已陸續核定執行，並由執行機關推動辦理工程設計，漁業署公共建設推動會報亦持續掌握各工程進度，俟工程完成發包後將陸續辦理撥款俾提高支用比。
管考建議(國發會)	本計畫部分工程進度仍有持續落後情形，請農委會持續督導，並協助漁業署加強辦理，研提相關因應對策，以利工進。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較(個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
原住民族住宅改善計畫	原民會	總累計	40.17	37.9	落後 2.27	257,576	267,564	103.88	95.60	69.20
		年累計	60.7	60.7	0.00	133,020	127,161	95.60		
執行情形	一、中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助： （一）將於 103 年 7 月中旬前函請各地方政府提報 104 年度計畫。 （二）已於 6 月 25、27 日辦理訪查督導竣事。 二、補助地方政府承租國宅或集合式住宅轉出租原住民居住：已督導臺北市政府辦理承租國宅或集合式住宅轉出租原住民居住情形竣事。 三、花東新村原住民臨時安置住所維護管理業務： （一）已完成當月份房屋及車位租金收繳。 （二）已完成 9 臺電梯維護保養、保全警衛勞務每月價金之核銷。 四、補助南投縣仁愛鄉翠巒、瑞岩及臺中市和平區松茂 3 個部落遷建作業(規劃作業、興辦事業計畫、遷居地公共設施測設作業等)及補助南投縣政府辦理瑞岩部落擴充計畫可行性評估-先期規劃設計(以前年度保留案) （一）辦理專案會議。 （二）103 年 6 月 13 日本會土管處至臺中市召開松茂部落遷建地排占協調土地問題。 （三）南投縣政府辦理翠巒部落遷建作業用地問題： 1、本會及該府於 6 月 3 日出席公路總局二工處召開之大型邊坡整治會議，以期整治翠巒部落上邊坡，惟經主席裁示，因事涉跨部會權責本案不予討論。 2、該府已於 6 月 10 日函請公所督促顧問公司將遷建預定地是否涉及相關法令之禁限建或興辦情事及位處海拔高達 20,00 公尺是否適宜住宅等補正於評估報告。 （四）臺中市政府辦理松茂部落遷建作業用地問題： 1、臺中市政府 5 月 28 日辦理和平區梨山里松茂部落臨時安置說明及協調溝通會議。 2、本會土管處於 6 月 13 日至臺中市辦理松茂部落之擬遷建地占耕協調會議。 （五）本會前以 103 年 4 月 22 日原民建字第 1030021198 號函撥付南投縣政府第 2 期款 210 萬元整，南投縣政府									

	刻正辦理第三期全區水土保持、土地開發許可計畫等相關興辦事業作業，俟完成核定後由本會撥付第三期款計 280 萬元整。 五、建築文化語彙：主辦單位新竹縣政府刻正研修本案標案，預定 7 月中旬前公告上網。 六、部落文化風貌：本案已有得標廠商投標，並訂於 7 月 4 日召開評選會議，得標後將依契約內容儘速辦理本案。
重要成果	無重要執行成果。
落後原因	一、部落文化風貌計畫：招標作業未如期進行，致經費撥付延宕。 二、補助南投縣政府辦理瑞岩部落 107 戶擴充計畫可行性評估-先期規劃設計(以前年度保留案)490 萬元，尚未撥付完竣。
因應對策	一、本案於 103 年 7 月 4 日召開評選會議，本會亦持續督導後續相關作業事宜並請縣府依核定計畫撥付方式向本會請款。 二、本會業於 103 年 4 月 22 日原民建字第 1030021198 號函撥付南投縣政府第 2 期款 210 萬元整，南投縣政府刻正辦理第 3 期全區水土保持、土地開發許可計畫等相關興辦事業作業，俟完成核定後由本會撥付第 3 期款計 280 萬元整。
管考建議(國發會)	本計畫總累計進度落後 2.27 個百分點，年累計預算執行率 95.6%，款項未撥付部分，請儘速辦理完竣。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
長照服務網計畫	衛福部	總累計	17	15	落後 2.00	156,220	68,664	43.95	93.02	2.14
		年累計	35	25	落後 10.00	8,350	7,767	93.02		
執行情形	一、有關失智症社區服務據點已於 103 年 4 月 18 日辦理一場失智症社區服務教育訓練。 二、103 年獎勵長照資源不足地區建置失智症社區服務計畫已於 6 月 16 日核定 23 家社區服務據點,刻正辦理簽約及撥付第 1 期款事宜。 三、辦理 103 年「獎勵偏遠(含山地離島)及長照資源不足地區設置在地且社區化長期照護服務據點計畫」刻正簽約及撥付第 1 期款。 四、有關長照資源管理與輔導計畫已於 103 年 6 月 19 日完成議價與簽約作業，目前委辦單位已規劃 7 月中旬邀集專家學者辦理輔導指標擬定。									
重要成果	一、有關失智症社區服務據點已辦理一場失智症社區服務教育訓練。 二、辦理 103 年「獎勵偏遠(含山地離島)及長照資源不足地區設置在地且社區化長期照護服務據點計畫」計畫簽約及撥付第 1 期款。 三、有關長照資源管理與輔導計畫已於 103 年 6 月 19 日完成議價與簽約作業，目前委辦單位已規劃 7 月中旬邀集專家學者辦理輔導指標擬定。									
落後原因	失智症社區服務據點核定與簽訂契約之簽呈已於 5 月上旬簽出，惟經彙辦相關單位，依其意見修正並重新核定各據點經費，本案已於 6 月 16 日簽奉核可在案，未能按預定期程撥付第 1 期款。									
因應對策	本案已奉核，以計畫核定日作為簽約日，各據點刻正加速布建中。									
管考建議(國發會)	計畫累計執行進度落後 2 個百分點，其中「辦理獎勵長照資源不足地區發展長照資源計畫」工作項目年累計進度落後 20 個百分點，經費支用比僅 0.93%，建請加速完成失智症社區服務據點簽約及第 1 期款撥付作業，以提升計畫執行成效，如期達到計畫目標。									

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支出			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
保母托育管理與托育費用補助	衛福部	總累計	50	48.3	落後 1.70	906,190	906,190	100.00	100.00	88.77
		年累計	50	48.3	落後 1.70	906,190	906,190	100.00		
執行情形	一、辦理 103 年 6 月份社區保母系統、托嬰中心經費審查。 二、規劃 103 年度社區保母系統評鑑，共計 56 場次。 三、103 年 6 月 26 日辦理 103 年度全國社區保母系統第一次聯繫會報，邀請各地方政府及相關單位參與，並於 7、8 月進行全國社區保母系統評鑑作業、102 年度社區保母系統管理費用補助未核銷案及托育費用補助之申請資料及審核進行討論；另為規劃年底登記制度實施之相關準備作業，避免作業不及，影響托育人員權益等相關建議提出討論，參與人數共計 111 人。 四、本辦法自 100 年起業已召開 16 次研商會議及 4 場分區公聽暨專案會議，業於 103 年 5 月 9 日至 18 日依法制程序進行草案預告完成在案，惟為使法案更為周延，社會及家庭署彙整預告期間各界建議，爰於 6 月 10 日召開第 17 次會議，針對尚有意見之條文進行討論，並於 6 月底依法制程序送本部法規會審查及後續進行本辦法公告事宜。 五、為宣導男性加入家庭育兒事務及托育服務，本項業於母親節提前辦理，當日計 80 人參加，活動中邀請男性保母現場分享托育心得，並鼓勵男性踴躍加入育兒行列及托育人員工作。 六、刻正規劃播放「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」政策宣導影片事宜。 七、受理 103 年 6 月份地方政府、家長等針對托育費用補助之疑義案件，共計 2 案。 八、辦理受托兒家庭財稅、戶政及育嬰留職停薪津貼比對。 九、輔導地方政府審核部份托育費用補助申請案。 十、調查 103 年度地方政府托育費用補助經費不足數，共計 6 億 9,865 萬 4,500 元整，刻正辦理後續經費撥補事宜。 十一、103 年度全國保母登記管理資訊網分區教育訓練 12 場，業於 6 月 30 日全數辦理完竣，共計 657 人參加。 十二、委託研究案-「103 年我國托育服務供給模式與收費機制之研究」期中審查辦理完竣，專家學者、兒童福利團體及實務工作者共計 4 名參與審查。									

重要成果	103 年度於全國 22 個直轄市、縣(市)成立 70 個(處)社區保母系統，截至 6 月底止，加入社區保母系統之保母數為 3 萬 7,216 人，在職保母數為 3 萬 3,852 人，托嬰中心保母數為 3,742 人，合計受托幼童數為 6 萬 5,795 人。
落後原因	本辦法自 100 年起業已召開 16 次研商會議及 4 場分區公聽暨專案會議，業於 103 年 5 月 9 日至 18 日依法制程序進行草案預告完成在案，惟為使法案更為周延，社會及家庭署彙整預告期間各界建議，以致 6 月 10 日召開第 17 次會議，再針對尚有意見之條文進行討論。
因應對策	本案已於 6 月底依法制程序送本部法規會審查，俟本部法規會審查完竣再進行後續本辦法之公告事宜。
管考建議(國發會)	計畫總累計進度落後 1.7 個百分點，其中「建構保母托育管理制度」工作項目之年累計進度落後 3.4 個百分點，「居家式托育服務登記及管理辦法」已於 6 月底送法規會審查，建請積極掌控法規審查情形，並加速辦理後續法規公告作業。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
歷史與文化資產維護發展(第2期)計畫	文化部	總累計	60.21	59.06	落後 1.15	2,479,652	2,450,406	98.82	133.00	32.71
		年累計	24.64	21.4	落後 3.24	185,875	156,629	84.27		
執行情形	一、有形文化資產管理體系計畫--古蹟聚落組： (一)基隆市市定古蹟市長官邸修復工程案已於 102 年 12 月 23 日完成工程驗，103 年 5 年 5 日完成工作報告書，並於 5 月 27 日完成結案。 (二)依「輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫作業要點」規定核撥縣市政府各項計畫執行進度款項，已完成撥付縣定古蹟北港集雅軒調查研究及修復再利用計畫等 43 件。 二、有形文化資產管理體系計畫--古物遺址組： (一)已辦理遺址、水下文資之各項計畫審查及工作會議等 16 場次，如「列冊沉船遺址歷史文獻資料蒐集及研析評審會議」、「綠島一號進階調查部會協調會議」，累計共 43 場。 (二)已辦理遺址審查委員會累計 3 場。 (三)已完成 7 處國定遺址維護管理計畫委辦案第 1 期撥款，累積計 7 案。 (四)已彙整 104 年縣市政府遺址監管保護及保存活化等補助案修正計畫。 (五)完成有形文化資產導覽暨管理系統維運委託案簽約及第 1 期款撥款程序。 三、有形文化資產管理體系計畫--國家人權博物館籌備處： (一)景美人權文化園區仁愛樓二、三期修復案 24.67%。 (二)政治受難者(醫生群像)研究暨展示腳本規劃案業於 6 月 30 日通過期中審查。 (三)臺灣白色恐怖時期相關史蹟點調查案業於 6 月 30 日通過期初審查。 四、有形文化資產管理體系計畫--臺博館： (一)臺博館鐵道部博物館古蹟修復工程遺構清點完成。 (二)臺博館鐵道部博物館景觀工程設計 50%。 (三)臺博館鐵道部博物館室內裝修工程設計。 (四)臺博館本館空調更新工程完成驗收。 (五)臺博館本館再利用展覽工程設計 90%(三樓)。									

	(六) 臺博館本館再利用裝飾工程設計 80%(全館公共空間)。 五、無形文化資產與保存技術推廣計畫--傳藝民俗組： (一) 103 年無形文化資產校園推廣計畫辦理完成 10%場次。 (二) 辦理完成保存技術宣導研習講座計 2 場。 (三) 臺灣王爺特展已撥付第 1 期款。 六、文化資產保存修護研究領航計畫--文化資產保存研究中心： (一) 103 年 1 月 2 日專案派遣人員已陸續完成報到。 (二) 辦理國定古蹟澎湖西嶼東砲臺塗鴉清除作業。 七、歷史文化場域保存活化計畫--綜合規劃組： (一) 產業文化資產再生計畫業於 5 月 30 日至 6 月 20 日期間完成受補助之再生點之期初訪查會議；公有文化資產潛力建築調查業於 5 月 28 日召開跨部會「文化性資產調查小組」第 1 次會議研商討論，並訂於 6 月 12 日、7 月 10 日、14 日召開潛力建物調查填報系統實務操作分區說明會。 (二) 區域型文化資產非典型學習、評核及成果規劃計畫已於 5 月 29 日撥付第 1 期款，並已於 5 月 30 日及 6 月 30 日辦理兩場次交流研習課程。 (三)「2014 眷村文化保存與活化再利用工作坊暨論壇活動」已於 103 年 6 月 25 日完成評審會議，由投標廠商「和觀管理顧問有限公司」取得優先議價權，後續移交由秘書室辦理議價等程序事宜。 八、文化資產育成中心建置計畫--文化資產保存研究中心： (一)「傳說、歌謠與文化」音樂文化講座已於 5 月 26 日期初審查通過。 (二)「油畫鑑賞與科學管理研習」因故改辦理「古蹟歷史建築塗鴉處理研習」，並於 6 月 27 日辦理期初審查，修正後通過。 (三)「兩岸出土遺物保存修復特展及座談會」更名為「科技探秘-文化資產保存與環境特展暨座談會」預定 7 月上旬辦理期初審查。 (四) 古蹟構件保存包裝運送研習已於 5 月 28 日期初審查通過。 九、文化資產育成中心建置計畫--秘書室： (一) R13、R14 修復再利用工程部分驗收程序完成，預計 7 月底辦理驗收複驗作業。 (二) 育成中心室內裝修案已完成招標，6 月 27 日召開施工前第 2 次協調會議。 十、文化資產育成中心建置計畫--綜合規劃組：完成文化資產資訊出版推廣服務計畫第 2 期報告審查，並撥付第 2 期款項。
重要成果	無。

落後原因	一、工程驗收程序未完成，以及部分計畫未撥款完成導致實支數未達 90%。 二、有形文化資產管理體系計畫--臺博館： （一）鐵道部博物館古蹟修復第 1 期工程估驗程序進行中，其中 103 年 2 月份估驗款 157 萬 8,000 元；3 月份估驗款 495 萬 1,000 元；4 月份估驗款 171 萬 8,000 元；5 月份估驗款 124 萬 8,000 元。 （二）臺灣經典建築圖說徵集計畫第 1 期期末款 65 萬 8,000 元整，已完成驗收，撥款中。 （三）臺博館南門園區庫房複式壁 133 萬元，已完成驗收，撥款中。 （四）鐵道文化展示規劃案第 1 期 28 萬元，撥款中。 三、文化資產育成中心建置計畫--秘書室： （一）育成中心整修案因驗收缺失改善致影響驗收程序進行。 （二）育成中心內裝工程案因前整修工程尚未完成驗收致尚未進場施作。
因應對策	一、有形文化資產管理體系計畫--臺博館：已請廠商加速各期估驗款之請領進度，每月工程督導會報亦提列估驗進度檢討。 二、文化資產育成中心建置計畫--秘書室：育成中心整修案已完成部分驗收程序，俟缺失改善後，排定 7 月底進行驗收複驗。
管考建議(國發會)	建請加速辦理驗收及撥款程序等行政作業，避免工作進度落後。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)
			預定(%)	實際(%)	比較 (個百分點)	預定(千元)	實際(千元)	支用比(%)		
基隆火車站都市更新站區遷移計畫	交通部	總累計	88.69	87.58	落後 1.11	2,473,533	1,185,634	47.93	103.75	19.17
		年累計	36.93	31.18	落後 5.75	267,834	161,398	60.26		
執行情形	一、細設服務：基隆計畫細設配合主體工程施工期間克服施工技術等相關事項。 二、鐵路工程： （一）辦理主體工程及機電管線施工等相關作業。 （二）特種建照案鐵工局於 103 年 3 月 26 日將都市計畫審議報告書修正資料函送基隆市政府審查，基隆市政府於 5 月 12 日函復同意核備。 （三）鐵工局業於 103 年 5 月 26 日彙整基隆市政府同意核備之都設審報告書併入補正特種建築物申請報告書函送內政部營建署審核；內政部營建署於 6 月 11 日請鐵工局申請土地分區使用證明，並再修改特種建築物申請報告書內容，鐵工局已於 6 月 16 日將修正之特種建築物申請報告書送至內政部營建署，鐵工局將持續追蹤內政部營建署審核進展。 （四）對於引道段用地交付事宜，基隆市政府表示需延至 103 年 7 月底始能交付引道段用地，爰辦理第 2 次期程修正，鐵工局於 4 月 21 日報部，交通部 4 月 28 日核轉報院，行政院已於 5 月 6 日交議國發會審查，國發會經審查並彙整相關單位意見後，於 6 月 18 日函報行政院核定。									
重要成果	無。									
落後原因	一、都市計畫變更案延後通過，致影響特種建照申辦與施工等作業。 二、受引道段用地交付影響，基隆市政府表示需延至 103 年 7 月底始能交付引道段用地，惟此已造成本計畫預算執行及通車啟用期程調整。 三、承商因出工率不足，各工項無法接續不間斷進行。 四、工程預付款併隨估驗計價逐期扣回轉成實支數。 五、部分已執行之應付未付數施工承商尚未提送計價資料，致整體進度落後。									
因應對策	一、特種建照案鐵工局於 103 年 3 月 26 日將都市計畫審議報告書修正資料函送基隆市政府審查，基隆市政府於 5 月 12 日函復同意核備。									

	二、103 年 5 月 26 日彙整基隆市政府同意核備之都設審報告書併入補正特種建築物申請報告書函送內政部營建署審核；內政部營建署於 6 月 11 日請鐵工局申請土地分區使用證明，並再修改特種建築物申請報告書內容，鐵工局已於 6 月 16 日將修正之特種建築物申請報告書送至內政部營建署，鐵工局將持續追蹤內政部營建署審核進展。 三、對於引道段用地交付事宜，基隆市政府表示需延至 103 年 7 月底始能交付引道段用地，爰辦理第 2 次期程修正，鐵工局於 4 月 21 日報部，交通部 4 月 28 日核轉報院，行政院已於 5 月 6 日交議國發會審查，國發會經審查並彙整相關單位意見後，於 6 月 18 日函報行政院核定。 四、進度落後部分不定期與廠商高層人員檢討工進，請廠商加派人力趲趕，務必追趕至預定進度。 五、請廠商定期提送估驗計價，俾利提昇整體進度。
管考建議(國發會)	一、本計畫年累計支用比 60.26%，請督促承商儘速提出計價資料請款，並完成經費核撥作業。 二、本計畫年累計進度落後 5.75 個百分點，落後幅度較上月增加，俟行政院核定特種建照後，請督促承商追趕已落後之工程進度。 三、本計畫因基隆市政府用地交付等影響推動進度，提報修正計畫(含期程)，已於 103 年 7 月 1 日奉院核定，請配合辦理作業計畫調整事宜。

肆、行政院及所屬一級機關公文時效分類統計表

103年04月份統計分析

期間／類別		04月份 (1)	上季月平均值 (2)	增減值 (1)-(2)	尚待改進機關
一般公文	各機關平均辦結率(%)	90.51	89.55	0.96	行政院陸委會(83.93) 教育部(85.83) 交通部(86.22)
	發文平均使用日數	2.30	2.30	0.00	行政院陸委會(4.56) 金融監督管理委員會(4.01) 教育部(3.21)
	待辦公文之逾限率(%)	9.71	13.43	-3.71	交通部(37.05) 行政院陸委會(22.48) 勞動部(20.36)
立法委員質詢案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		95.62	97.01	-1.39	外交部(25.00) 行政院農委會(75.00) 國家發展委員會(83.33)
人民申請案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.78	98.64	0.13	行政院原能會(87.50) 外交部(92.86) 內政部(93.63)
訴願案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.65	99.51	0.14	外交部(95.95) 交通部(97.22)
人民陳情案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		92.90	95.37	-2.47	行政院陸委會(29.36) 法務部(75.07) 金融監督管理委員會(80.00)
專案管制案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.51	99.50	0.01	行政院陸委會(0.00) 行政院環保署(0.00) 文化部(80.00)
監察案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		81.67	82.80	-1.13	行政院農委會(72.73)

103年05月份統計分析

期間／類別		05月份 (1)	上季月平均值 (2)	增減值 (1)-(2)	尚待改進機關
一般公文	各機關平均辦結率(%)	90.60	89.55	1.05	金融監督管理委員會(84.31) 行政院陸委會(84.96) 文化部(86.72)
	發文平均使用日數	2.20	2.30	-0.10	行政院陸委會(4.90) 金融監督管理委員會(3.67) 教育部(3.50)
	待辦公文之逾限率(%)	9.41	13.43	-4.02	交通部(39.95) 行政院陸委會(21.26) 法務部(19.42)
立法委員質詢案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		96.58	97.01	-0.42	勞動部(61.11) 行政院環保署(85.71) 國家發展委員會(88.24)
人民申請案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.57	98.64	-0.08	交通部(33.33) 國家發展委員會(88.46) 原住民族委員會(88.89)
訴願案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		100.00	99.34	0.66	
人民陳情案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		95.99	95.37	0.62	行政院陸委會(67.21) 法務部(72.74) 國防部(78.89)
專案管制案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.43	99.50	-0.08	行政院陸委會(33.33) 衛生福利部(33.33) 行政院人事行政總處(66.67)
監察案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		84.80	82.80	2.00	教育部(73.33) 行政院農委會(76.19)

103年06月份統計分析

期間／類別		06月份 (1)	上季月平均值 (2)	增減值 (1)-(2)	尚待改進機關
一般公文	各機關平均辦結率(%)	90.20	89.55	0.66	行政院陸委會(82.51) 金融監督管理委員會(82.89) 國防部(84.94)
	發文平均使用日數	2.24	2.30	-0.06	行政院陸委會(5.31) 金融監督管理委員會(3.71) 教育部(3.41)
	待辦公文之逾限率(%)	10.63	13.43	-2.79	交通部(42.01) 行政院陸委會(25.05) 勞動部(21.11)
立法委員質詢案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		95.58	97.01	-1.42	行政院環保署(0.00) 外交部(50.00) 行政院陸委會(50.00)
人民申請案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.73	98.64	0.08	交通部(85.71) 行政院原能會(88.94) 內政部(90.70)
訴願案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		100.00	99.34	0.66	
人民陳情案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		95.18	95.37	-0.20	外交部(42.86) 行政院陸委會(71.84) 法務部(73.74)
專案管制案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.41	99.50	-0.09	行政院陸委會(33.33) 衛生福利部(50.00) 行政院環保署(66.67)
監察案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		83.54	82.80	0.74	內政部(76.47) 教育部(77.78)

一、一般公文時效統計表

103年4月份

項 目 數 量 機 關	應辦公文統計				已 辦 結 公 文 統 計										待辦公文統計				
	本月	截至上月	本月	案件總數	發 文 統 計							存 查	辦 結 公 文 合 計		待辦公文		未逾辦理	已逾辦理期限	
	新收件數	待辦件數	創稿數	(1)+(2)+(3)	6日以內辦結		6日以上至30日辦結		30日以上辦結	小 計	發文平均		(8)+(10)		(4)-(11)		期限件數	件數	％
	(1)	(2)	(3)	(4)	件數	％	件數	％	件數	(5)+(6)+(7)	使用日數	件數	件數	％	件 數	％	(13)	(14)	(14)/(12)
					(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(4)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	(14)/(12)
行政院	5,662	571	1,895	8,128	1,837	94.06	113	5.79	3	1,953	1.78	5,559	7,512	92.42	616	7.58	541	75	12.18
內政部	53,550	5,717	12,067	71,334	19,784	92.38	1,596	7.45	37	21,417	2.37	44,609	66,026	92.56	5,308	7.44	4,903	405	7.63
外交部	23,538	2,439	5,688	31,665	5,853	91.75	461	7.23	65	6,379	2.95	23,420	29,799	94.11	1,866	5.89	1,573	293	15.70
國防部	24,696	5,148	4,048	33,892	12,288	86.10	1,951	13.67	33	14,272	1.89	15,060	29,332	86.55	4,560	13.45	3,973	587	12.87
財政部	3,177	371	835	4,383	1,190	99.17	10	0.83	0	1,200	1.48	2,875	4,075	92.97	308	7.03	305	3	0.97
教育部	11,151	2,595	5,200	18,946	7,938	88.38	1,022	11.38	22	8,982	3.21	7,280	16,262	85.83	2,684	14.17	2,644	40	1.49
法務部	5,184	513	985	6,682	1,693	94.06	105	5.83	2	1,800	2.75	4,352	6,152	92.07	530	7.93	447	83	15.66
經濟部	14,622	1,475	2,515	18,612	5,104	95.83	220	4.13	2	5,326	1.81	11,722	17,048	91.60	1,564	8.40	1,369	195	12.47
交通部	10,250	1,836	1,330	13,416	3,335	89.31	380	10.18	19	3,734	2.63	7,833	11,567	86.22	1,849	13.78	1,164	685	37.05
文化部	2,663	856	2,424	5,943	1,693	91.61	154	8.33	1	1,848	2.81	3,289	5,137	86.44	806	13.56	787	19	2.36
衛生福利部	7,585	1,058	2,891	11,534	3,869	90.63	378	8.85	22	4,269	2.68	6,287	10,556	91.52	978	8.48	867	111	11.35
勞動部	2,738	481	1,206	4,425	1,410	88.85	177	11.15	0	1,587	3.08	2,337	3,924	88.68	501	11.32	399	102	20.36
科技部	2,518	403	545	3,466	2,028	99.17	17	0.83	0	2,045	1.80	1,037	3,082	88.92	384	11.08	372	12	3.12
蒙藏委員會	338	48	147	533	77	97.47	2	2.53	0	79	1.90	395	474	88.93	59	11.07	57	2	3.39
僑務委員會	2,748	387	779	3,914	1,285	92.71	101	7.29	0	1,386	2.51	2,174	3,560	90.96	354	9.04	322	32	9.04
中央銀行	3,764	484	1,176	5,424	754	100.00	0	0.00	0	754	1.80	4,121	4,875	89.88	549	10.12	549	0	0.00
行政院主計總處	3,117	348	725	4,190	711	98.48	11	1.52	0	722	1.33	3,033	3,755	89.62	435	10.38	435	0	0.00
行政院人事行政總處	2,688	293	1,743	4,724	1,730	98.24	31	1.76	0	1,761	1.10	2,604	4,365	92.40	359	7.60	357	2	0.56
行政院環保署	9,640	1,615	2,826	14,081	3,426	97.27	93	2.64	3	3,522	1.66	8,969	12,491	88.71	1,590	11.29	1,586	4	0.25
國立故宮博物院	770	250	1,026	2,046	444	88.62	57	11.38	0	501	3.05	1,358	1,859	90.86	187	9.14	186	1	0.53
行政院陸委會	1,909	442	860	3,211	477	77.69	135	21.99	2	614	4.56	2,081	2,695	83.93	516	16.07	400	116	22.48
國家發展委員會	5,201	330	1,805	7,336	1,278	92.81	98	7.12	1	1,377	2.60	5,243	6,620	90.24	716	9.76	633	83	11.59
金融監督管理委員會	734	185	657	1,576	297	84.86	52	14.86	1	350	4.01	1,023	1,373	87.12	203	12.88	203	0	0.00
國軍退除役官兵輔導委員會	5,523	652	954	7,129	2,001	93.94	128	6.01	1	2,130	2.82	4,332	6,462	90.64	667	9.36	667	0	0.00
行政院原能會	997	171	594	1,762	603	92.91	46	7.09	0	649	2.38	957	1,606	91.15	156	8.85	145	11	7.05
行政院農委會	5,913	782	1,080	7,775	2,348	95.84	99	4.04	3	2,450	2.40	4,452	6,902	88.77	873	11.23	807	66	7.56
公平交易委員會	2,211	18	746	2,975	552	99.64	2	0.36	0	554	1.51	2,409	2,963	99.60	12	0.40	12	0	0.00
行政院工程會	1,818	253	334	2,405	714	97.67	17	2.33	0	731	2.33	1,354	2,085	86.69	320	13.31	320	0	0.00
原住民族委員會	3,495	512	1,727	5,734	2,309	94.40	137	5.60	0	2,446	1.72	2,852	5,298	92.40	436	7.60	430	6	1.38
行政院海巡署	1,644	275	869	2,788	837	96.88	27	3.13	0	864	2.55	1,604	2,468	88.52	320	11.48	320	0	0.00
客家委員會	1,063	197	716	1,976	784	97.88	17	2.12	0	801	2.21	1,041	1,842	93.22	134	6.78	133	1	0.75
國家通訊傳播委員會	3,073	335	1,096	4,504	1,406	92.99	105	6.94	1	1,512	1.79	2,693	4,205	93.36	299	6.64	299	0	0.00
中央選舉委員會	743	41	131	915	315	99.37	2	0.63	0	317	1.29	562	879	96.07	36	3.93	36	0	0.00
臺灣省政府	432	18	206	656	260	97.01	8	2.99	0	268	1.47	367	635	96.80	21	3.20	21	0	0.00
福建省政府	211	21	66	298	75	93.75	5	6.25	0	80	2.37	197	277	92.95	21	7.05	20	1	4.76
總 計	225,366	31,120	61,892	318,378	90,705	91.92	7,757	7.86	218	98,680	2.30	189,481	288,161	90.51	30,217	9.49	27,282	2,935	9.71

附註：公文時效管理作業係以分層方式管制統計，表列數字為機關內部單位處理數量，以下各表均同。

103年5月份

項 目 數 量 機 關	應辦公文統計				已 辦 結 公 文 統 計										待辦公文統計				
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	本月 創稿數 (3)	案件總數 (1)+(2)+(3) (4)	發 文 統 計							存 查 件數 (10)	辦 結 公 文 合 計 (8)+(10)		待辦公文 (4)-(11)		未逾辦理 期限件數 (13)	已逾辦理期限	
					6日以內辦結		6日以上至30日辦結		30日以上辦結	小 計 (5)+(6)+(7) (8)	發文平均 使用日數 (9)		件數 (11)	% (11)/(4)	件 數 (12)	% (12)/(4)		件數 (14)	% (14)/(12)
					件數 (5)	% (5)/(8)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(4)	件 數 (12)	% (12)/(4)	(13)	(14)	(14)/(12)
行政院	5,611	614	1,879	8,104	1,798	93.55	124	6.45	0	1,922	1.84	5,603	7,525	92.86	579	7.14	505	74	12.78
內政部	53,001	5,106	11,356	69,463	19,482	93.05	1,450	6.93	5	20,937	2.32	43,083	64,020	92.16	5,443	7.84	5,091	352	6.47
外交部	25,086	2,052	6,453	33,591	6,892	96.62	224	3.14	17	7,133	2.17	24,588	31,721	94.43	1,870	5.57	1,717	153	8.18
國防部	22,872	4,560	4,218	31,650	12,348	86.90	1,829	12.87	32	14,209	1.84	13,258	27,467	86.78	4,183	13.22	3,613	570	13.63
財政部	3,109	309	845	4,263	1,135	99.39	7	0.61	0	1,142	1.39	2,891	4,033	94.60	230	5.40	229	1	0.43
教育部	11,821	2,687	5,176	19,684	7,523	85.58	1,251	14.23	17	8,791	3.50	8,354	17,145	87.10	2,539	12.90	2,507	32	1.26
法務部	5,803	594	959	7,356	1,821	93.87	114	5.88	5	1,940	2.90	4,829	6,769	92.02	587	7.98	473	114	19.42
經濟部	14,662	1,486	2,615	18,763	5,197	96.37	195	3.62	1	5,393	1.69	11,689	17,082	91.04	1,681	8.96	1,489	192	11.42
交通部	10,596	1,833	1,381	13,810	3,529	89.75	391	9.94	12	3,932	2.62	8,058	11,990	86.82	1,820	13.18	1,093	727	39.95
文化部	2,973	789	2,637	6,399	1,724	94.00	110	6.00	0	1,834	2.56	3,715	5,549	86.72	850	13.28	801	49	5.76
衛生福利部	7,295	963	2,887	11,145	3,783	90.83	371	8.91	11	4,165	2.56	5,980	10,145	91.03	1,000	8.97	878	122	12.20
勞動部	2,726	494	1,540	4,760	1,678	90.60	174	9.40	0	1,852	2.55	2,441	4,293	90.19	467	9.81	377	90	19.27
科技部	2,744	355	551	3,650	2,304	99.27	17	0.73	0	2,321	1.62	990	3,311	90.71	339	9.29	320	19	5.60
蒙藏委員會	357	58	177	592	95	97.94	2	2.06	0	97	1.76	439	536	90.54	56	9.46	56	0	0.00
僑務委員會	2,566	347	675	3,588	1,126	91.25	107	8.67	1	1,234	2.72	2,045	3,279	91.39	309	8.61	279	30	9.71
中央銀行	3,380	539	1,079	4,998	704	100.00	0	0.00	0	704	1.83	3,818	4,522	90.48	476	9.52	476	0	0.00
行政院主計總處	3,016	431	642	4,089	667	99.11	6	0.89	0	673	1.32	3,003	3,676	89.90	413	10.10	413	0	0.00
行政院人事行政總處	2,433	351	1,240	4,024	1,331	98.08	26	1.92	0	1,357	1.29	2,357	3,714	92.30	310	7.70	305	5	1.61
行政院環保署	9,830	1,571	3,055	14,456	3,576	97.81	80	2.19	0	3,656	1.50	9,163	12,819	88.68	1,637	11.32	1,634	3	0.18
國立故宮博物院	804	181	1,123	2,108	427	91.24	40	8.55	1	468	2.76	1,425	1,893	89.80	215	10.20	215	0	0.00
行政院陸委會	2,014	501	770	3,285	515	75.74	163	23.97	2	680	4.90	2,111	2,791	84.96	494	15.04	389	105	21.26
國家發展委員會	4,318	716	1,571	6,605	1,160	91.41	108	8.51	1	1,269	2.05	4,726	5,995	90.76	610	9.24	536	74	12.13
金融監督管理委員會	746	194	634	1,574	321	88.43	41	11.29	1	363	3.67	964	1,327	84.31	247	15.69	247	0	0.00
國家選除役官兵輔導委員會	5,638	665	1,107	7,410	2,188	94.47	128	5.53	0	2,316	2.81	4,358	6,674	90.07	736	9.93	736	0	0.00
行政院原能會	1,085	152	630	1,867	698	95.88	28	3.85	2	728	1.99	953	1,681	90.04	186	9.96	169	17	9.14
行政院農委會	5,606	873	999	7,478	2,182	95.62	97	4.25	3	2,282	2.43	4,411	6,693	89.50	785	10.50	729	56	7.13
公平交易委員會	1,724	12	654	2,390	523	99.81	1	0.19	0	524	1.14	1,806	2,330	97.49	60	2.51	60	0	0.00
行政院工程會	1,968	281	352	2,601	776	97.12	23	2.88	0	799	2.38	1,480	2,279	87.62	322	12.38	322	0	0.00
原住民族委員會	3,140	436	1,919	5,495	2,186	95.50	103	4.50	0	2,289	1.48	2,789	5,078	92.41	417	7.59	413	4	0.96
行政院海巡署	1,458	317	885	2,660	886	96.62	31	3.38	0	917	2.52	1,502	2,419	90.94	241	9.06	241	0	0.00
客家委員會	1,095	134	772	2,001	807	99.26	6	0.74	0	813	1.77	1,080	1,893	94.60	108	5.40	108	0	0.00
國家通訊傳播委員會	2,865	294	820	3,979	1,144	93.08	85	6.92	0	1,229	1.98	2,374	3,603	90.55	376	9.45	373	3	0.80
中央選舉委員會	660	37	113	810	312	99.36	2	0.64	0	314	1.20	448	762	94.07	48	5.93	48	0	0.00
臺灣省政府	423	21	181	625	231	97.88	5	2.12	0	236	1.70	361	597	95.52	28	4.48	28	0	0.00
福建省政府	255	21	51	327	81	95.29	4	4.71	0	85	2.08	223	308	94.19	19	5.81	18	1	5.26
總 計	223,680	29,974	61,946	315,600	91,150	92.44	7,343	7.45	111	98,604	2.20	187,315	285,919	90.60	29,681	9.40	26,888	2,793	9.41

103年6月份

項 目 數 量 機 關	應辦公文統計				已 辦 結 公 文 統 計										待辦公文統計					
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	本月 創稿數 (3)	案件總數 (1)+(2)+(3) (4)	發 文 統 計							存查 件數 (10)	辦 結 公 文 合 計 (8)+(10) (11)／(4)			待辦公文 (4)－(11) (12)／(4)		未逾辦理 期限件數 (13)	已逾辦理期限	
					6日以內辦結		6日以上至30日辦結		30日以上辦結	小 計	發文平均		件數 (11)	件數 (12)	件數 (13)	件數 (14)	件數 (15)			
					件數	%	件數	%	件數	(5)+(6)+(7) (8)	使用日數 (9)									
					(5)	(5)／(8)	(6)	(6)／(8)	(7)	(8)	(9)									
行政院	5,687	578	1,668	7,933	1,846	95.25	88	4.54	4	1,938	1.71	5,424	7,362	92.80	571	7.20	511	60	10.51	
內政部	51,753	5,325	10,941	68,019	18,654	93.27	1,346	6.73	1	20,001	2.34	42,713	62,714	92.20	5,305	7.80	4,722	583	10.99	
外交部	22,528	1,900	5,771	30,199	6,039	97.17	174	2.80	2	6,215	1.80	22,555	28,770	95.27	1,429	4.73	1,293	136	9.52	
國防部	21,327	4,183	3,805	29,315	11,295	87.74	1,548	12.03	30	12,873	1.79	12,028	24,901	84.94	4,414	15.06	3,698	716	16.22	
財政部	3,042	230	857	4,129	1,190	99.66	4	0.34	0	1,194	1.28	2,659	3,853	93.32	276	6.68	276	0	0.00	
教育部	10,612	2,549	5,192	18,353	7,171	86.18	1,134	13.63	16	8,321	3.41	7,595	15,916	86.72	2,437	13.28	2,408	29	1.19	
法務部	4,839	640	836	6,315	1,564	93.21	108	6.44	6	1,678	3.10	4,097	5,775	91.45	540	8.55	465	75	13.89	
經濟部	14,078	1,558	2,235	17,871	4,720	96.35	176	3.59	3	4,899	1.82	11,310	16,209	90.70	1,662	9.30	1,494	168	10.11	
交通部	9,422	1,797	1,225	12,444	3,209	90.34	330	9.29	13	3,552	2.54	7,114	10,666	85.71	1,778	14.29	1,031	747	42.01	
文化部	2,759	822	2,590	6,171	2,017	95.41	97	4.59	0	2,114	2.44	3,292	5,406	87.60	765	12.40	735	30	3.92	
衛生福利部	6,639	983	2,368	9,990	3,119	88.96	373	10.64	14	3,506	2.83	5,455	8,961	89.70	1,029	10.30	942	87	8.45	
勞動部	2,531	444	1,061	4,036	1,304	89.56	150	10.30	2	1,456	2.75	2,092	3,548	87.91	488	12.09	385	103	21.11	
科技部	3,615	325	890	4,830	3,343	98.96	35	1.04	0	3,378	1.52	922	4,300	89.03	530	10.97	514	16	3.02	
蒙藏委員會	339	54	140	533	75	90.36	8	9.64	0	83	2.92	397	480	90.06	53	9.94	50	3	5.66	
僑務委員會	2,426	315	687	3,428	1,160	90.98	115	9.02	0	1,275	2.55	1,794	3,069	89.53	359	10.47	320	39	10.86	
中央銀行	3,304	468	1,193	4,965	775	100.00	0	0.00	0	775	1.94	3,704	4,479	90.21	486	9.79	486	0	0.00	
行政院主計總處	2,959	411	704	4,074	694	99.28	5	0.72	0	699	1.31	2,977	3,676	90.23	398	9.77	397	1	0.25	
行政院人事行政總處	2,149	296	1,297	3,742	1,387	98.23	25	1.77	0	1,412	1.26	2,018	3,430	91.66	312	8.34	283	29	9.29	
行政院環保署	9,777	1,591	2,820	14,188	3,408	97.65	79	2.26	3	3,490	1.64	9,041	12,531	88.32	1,657	11.68	1,652	5	0.30	
國立故宮博物院	804	212	1,027	2,043	420	91.30	40	8.70	0	460	2.72	1,372	1,832	89.67	211	10.33	210	1	0.47	
行政院陸委會	1,894	484	612	2,990	383	78.00	104	21.18	4	491	5.31	1,976	2,467	82.51	523	17.49	392	131	25.05	
國家發展委員會	3,755	610	1,479	5,844	1,006	93.49	69	6.41	1	1,076	1.71	4,240	5,316	90.97	528	9.03	468	60	11.36	
金融監督管理委員會	697	237	527	1,461	282	87.85	39	12.15	0	321	3.71	890	1,211	82.89	250	17.11	250	0	0.00	
國軍退除役官兵輔導委員會	5,035	744	916	6,695	1,979	95.01	104	4.99	0	2,083	2.77	3,886	5,969	89.16	726	10.84	726	0	0.00	
行政院原能會	1,010	181	574	1,765	618	94.64	33	5.05	2	653	2.14	920	1,573	89.12	192	10.88	176	16	8.33	
行政院農委會	5,390	785	896	7,071	2,089	96.27	81	3.73	0	2,170	2.17	4,310	6,480	91.64	591	8.36	539	52	8.80	
公平交易委員會	1,919	60	608	2,587	464	99.78	1	0.22	0	465	1.40	2,079	2,544	98.34	43	1.66	43	0	0.00	
行政院工程會	1,794	288	310	2,392	724	97.84	16	2.16	0	740	2.28	1,327	2,067	86.41	325	13.59	325	0	0.00	
原住民族委員會	3,137	418	1,559	5,114	1,964	96.04	81	3.96	0	2,045	1.48	2,568	4,613	90.20	501	9.80	478	23	4.59	
行政院海巡署	1,340	238	900	2,478	760	97.31	21	2.69	0	781	2.37	1,425	2,206	89.02	272	10.98	272	0	0.00	
客家委員會	1,015	108	733	1,856	753	100.00	0	0.00	0	753	1.60	912	1,665	89.71	191	10.29	187	4	2.09	
國家通訊傳播委員會	3,176	350	984	4,510	1,334	95.22	66	4.71	1	1,401	1.72	2,735	4,136	91.71	374	8.29	372	2	0.53	
中央選舉委員會	790	48	115	953	374	100.00	0	0.00	0	374	1.34	528	902	94.65	51	5.35	51	0	0.00	
臺灣省政府	380	28	186	594	275	95.82	12	4.18	0	287	1.76	285	572	96.30	22	3.70	22	0	0.00	
福建省政府	237	19	34	290	26	92.86	2	7.14	0	28	2.95	243	271	93.45	19	6.55	19	0	0.00	
總 計	212,159	29,279	57,740	299,178	86,421	92.94	6,464	6.95	102	92,987	2.24	176,883	269,870	90.20	29,308	9.80	26,192	3,116	10.63	

二、立法委員質詢案件時效統計表

103年4月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已 辦 結 案 件 統 計											待 辦 案 件 統 計			
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	案件總數 (1)+(2) (3)	屆期應辦案件 之依限辦結率 (5) (3)-(14) (4)	依限辦結		逾 限 辦 結					辦結案件		發文平 均使用 日數 (12)	待辦案件		未逾 辦理 期限 件數 (14)	已逾 辦理 期限 件數 (15)	
												合 計			(3)-(11)				
					以內辦結		逾限5以上 至10日辦結	逾限10以上 至15日辦結	逾限15日 以上辦結	小 計 (6)+(7)+(8)+(9)	(5)+(10)		(3)-(11)						
					件數	%	件數	件數	件數	件數	件數	%	件數		%	件數			%
(5)	(5)/(11)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(3)	(12)	(13)	(13)/(3)	(14)	(15)						
行政院	177	69	246	100.00	130	100.00	0	0	0	0	0	130	53	14.00	116	47	116	0	
內政部	23	0	23	100.00	11	100.00	0	0	0	0	0	11	48	3.82	12	52	12	0	
外交部	2	2	4	25.00	1	33.33	2	0	0	0	2	3	75	11.00	1	25	0	1	
國防部	1	0	1	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	100	1	0	
財政部	15	0	15	100.00	12	100.00	0	0	0	0	0	12	80	2.67	3	20	3	0	
教育部	17	0	17	100.00	11	100.00	0	0	0	0	0	11	65	4.18	6	35	6	0	
法務部	5	0	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100	2.60	0	0	0	0	
經濟部	19	1	20	93.75	15	93.75	0	0	0	1	1	16	80	6.63	4	20	4	0	
交通部	32	0	32	90.91	20	95.24	1	0	0	0	1	21	66	6.10	11	34	10	1	
衛生福利部	9	0	9	100.00	9	100.00	0	0	0	0	0	9	100	4.33	0	0	0	0	
勞動部	14	1	15	90.00	9	90.00	1	0	0	0	1	10	67	7.80	5	33	5	0	
科技部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100	0.75	0	0	0	0	
中央銀行	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100	3.50	0	0	0	0	
行政院主計總處	1	0	1	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	100	1	0	
行政院人事行政總處	2	0	2	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	50	1.00	1	50	1	0	
行政院環保署	9	2	11	90.00	9	90.00	1	0	0	0	1	10	91	4.20	1	9	1	0	
行政院陸委會	6	0	6	100.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	67	3.25	2	33	2	0	
國家發展委員會	14	0	14	83.33	10	83.33	2	0	0	0	2	12	86	4.29	2	14	2	0	
行政院農委會	8	0	8	75.00	6	75.00	2	0	0	0	2	8	100	1.69	0	0	0	0	
公平交易委員會	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100	2.00	0	0	0	0	
國家通訊傳播委員會	6	0	6	100.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	67	6.38	2	33	2	0	
總 計	365	75	440	95.62	262	96.32	9	0	0	1	10	272	61.82	4.29	168	38.18	166	2	

附註：1.本表期限計算係以行政院及所屬各機關辦理答復立法委員質詢案件處理原則及其相關規定之日數為基準。

2.行政院所列資料係代表該院自立法院提出質詢至函復之時效統計，其發文平均使用日數即為結案平均使用日數。

103年5月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已 辦 結 案 件 統 計											待 辦 案 件 統 計			
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	案件總數 (1)+(2) (3)	屆期應辦案件 之依限辦結率 (5) (3)-(14) (4)	依限辦結		逾 限 辦 結					辦結案件		發文平 均使用 日數 (12)	待辦案件		未逾 辦理 期限 件數 (14)	已逾 辦理 期限 件數 (15)	
												合 計			(3)-(11)				
					件數	%	件數	件數	件數	件數	件數	件數	件數		%	件數			%
(5)	(5)/(11)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(3)	(13)	(13)/(3)	(14)	(15)							
行政院	178	116	294	100.00	181	100.00	0	0	0	0	0	181	61.56	14.00	113	38.44	113	0	
內政部	35	12	47	97.50	39	97.50	1	0	0	0	1	40	85.11	5.10	7	14.89	7	0	
外交部	9	1	10	90.00	9	90.00	1	0	0	0	1	10	100.00	4.10	0	0.00	0	0	
國防部	1	1	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	0.00	0	0.00	0	0	
財政部	15	3	18	100.00	18	100.00	0	0	0	0	0	18	100.00	3.22	0	0.00	0	0	
教育部	26	6	32	100.00	28	100.00	0	0	0	0	0	28	87.50	4.11	4	12.50	4	0	
法務部	9	0	9	100.00	6	100.00	0	0	0	0	0	6	66.67	3.44	3	33.33	3	0	
經濟部	29	4	33	100.00	31	100.00	0	0	0	1	0	31	93.94	5.00	2	6.06	2	0	
交通部	30	11	41	90.00	27	90.00	2	1	0	0	3	30	73.17	6.43	11	26.83	11	0	
文化部	5	0	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100.00	3.50	0	0.00	0	0	
衛生福利部	26	1	27	100.00	24	100.00	0	0	0	0	0	24	88.89	4.58	3	11.11	3	0	
勞動部	21	5	26	61.11	11	68.75	5	0	0	0	5	16	61.54	8.25	10	38.46	8	2	
科技部	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	3.38	0	0.00	0	0	
中央銀行	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	4.00	0	0.00	0	0	
行政院主計總處	4	1	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100.00	4.10	0	0.00	0	0	
行政院人事行政總處	4	1	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100.00	4.40	0	0.00	0	0	
行政院環保署	6	1	7	85.71	6	100.00	0	0	0	0	0	6	85.71	3.25	1	14.29	0	1	
行政院陸委會	13	2	15	100.00	14	100.00	0	0	0	0	0	14	93.33	4.79	1	6.67	1	0	
國家發展委員會	15	2	17	88.24	15	88.24	2	0	0	0	2	17	100.00	5.67	0	0.00	0	0	
行政院農委會	7	0	7	100.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	57.14	2.50	3	42.86	3	0	
公平交易委員會	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	1.67	0	0.00	0	0	
行政院工程會	1	1	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	4.10	0	0.00	0	0	
國家通訊傳播委員會	10	2	12	91.67	11	91.67	1	0	0	0	1	12	100.00	4.96	0	0.00	0	0	
中央選舉委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	4.00	0	0.00	0	0	
總 計	453	170	623	96.58	452	97.20	12	1	0	0	13	465	74.64	4.52	158	25.36	155	3	

103年6月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已 辦 結 案 件 統 計											待 辦 案 件 統 計			
	本月	截至上月	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾 限 辦 結					辦結案件		發文平 均使用 日數	待辦案件		未逾 辦理 期限 件數	已逾 辦理 期限 件數	
												合 計			(3)－(11)				
	新收件數	待辦件數	(1)+(2)	(5) (3)-(14)	件數	%	逾限5日 以內辦結	逾限5以上 至10日辦結	逾限10以上 至15日辦結	逾限15日 以上辦結	小 計 (6)+(7)+(8)+(9)	(5)+(10)	件數		%	件數			%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(11)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(3)	(12)	(13)	(13)/(3)	(14)	(15)	
行政院	25	113	138	100.00	138	100.00	0	0	0	0	0	138	100.00	13.00	0	0.00	0	0	
內政部	4	7	11	100.00	11	100.00	0	0	0	0	0	11	100.00	6.55	0	0.00	0	0	
外交部	2	3	5	50.00	2	50.00	2	0	0	0	2	4	80.00	8.63	1	20.00	1	0	
財政部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	3.00	0	0.00	0	0	
教育部	1	4	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100.00	6.40	0	0.00	0	0	
法務部	2	3	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100.00	4.00	0	0.00	0	0	
經濟部	9	2	11	100.00	11	100.00	0	0	0	0	0	11	100.00	4.55	0	0.00	0	0	
交通部	9	32	41	92.68	38	92.68	3	0	0	0	3	41	100.00	7.70	0	0.00	0	0	
文化部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	0.50	0	0.00	0	0	
衛生福利部	0	2	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	5.50	0	0.00	0	0	
勞動部	1	10	11	81.82	9	81.82	2	0	0	0	2	11	100.00	9.73	0	0.00	0	0	
行政院主計總處	5	0	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100.00	2.50	0	0.00	0	0	
行政院人事行政總處	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	3.00	0	0.00	0	0	
行政院環保署	0	1	1	0.00	0	0.00	1	0	0	0	1	1	100.00	14.50	0	0.00	0	0	
行政院陸委會	0	2	2	50.00	1	50.00	1	0	0	0	1	2	100.00	9.00	0	0.00	0	0	
行政院農委會	2	3	5	60.00	3	60.00	2	0	0	0	2	5	100.00	6.00	0	0.00	0	0	
國家通訊傳播委員會	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	100.00	8.12	0	0.00	0	0	
總 計	68	182	250	95.58	238	95.58	11	0	0	0	11	249	99.60	6.63	1	0.40	1	0	

三、人民申請案件時效統計表

103年4月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未 逾 辦	已 逾 辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	0	4	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
內政部	3,439	1,356	4,795	93.63	2,868	94.50	167	5.50	3,035	63.30	1,760	36.70	1,732	28
外交部	157	36	193	92.86	156	92.86	12	7.14	168	87.05	25	12.95	25	0
國防部	41	11	52	100.00	38	100.00	0	0.00	38	73.08	14	26.92	14	0
法務部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
經濟部	19,933	567	20,500	99.66	20,074	99.68	65	0.32	20,139	98.24	361	1.76	357	4
交通部	1	1	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
文化部	407	72	479	99.75	400	100.00	0	0.00	400	83.51	79	16.49	78	1
衛生福利部	7,136	32,283	39,419	99.49	7,553	99.88	9	0.12	7,562	19.18	31,857	80.82	31,827	30
僑務委員會	90	1	91	100.00	90	100.00	0	0.00	90	98.90	1	1.10	1	0
中央銀行	226	23	249	100.00	224	100.00	0	0.00	224	89.96	25	10.04	25	0
行政院主計總處	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	287	145	432	100.00	336	100.00	0	0.00	336	77.78	96	22.22	96	0
國立故宮博物院	113	4	117	99.05	104	99.05	1	0.95	105	89.74	12	10.26	12	0
國家發展委員會	43	0	43	94.29	33	94.29	2	5.71	35	81.40	8	18.60	8	0
國軍退除役官兵輔導委員會	93	3	96	100.00	93	100.00	0	0.00	93	96.88	3	3.13	3	0
行政院原能會	686	376	1,062	87.50	630	92.51	51	7.49	681	64.12	381	35.88	342	39
行政院農委會	281	31	312	96.68	262	97.04	8	2.96	270	86.54	42	13.46	41	1
公平交易委員會	214	5	219	98.17	214	98.17	4	1.83	218	99.54	1	0.46	1	0
行政院工程會	294	120	414	100.00	316	100.00	0	0.00	316	76.33	98	23.67	98	0
原住民族委員會	23	0	23	100.00	17	100.00	0	0.00	17	73.91	6	26.09	6	0
客家委員會	210	47	257	100.00	233	100.00	0	0.00	233	90.66	24	9.34	24	0
國家通訊傳播委員會	338	228	566	100.00	386	100.00	0	0.00	386	68.20	180	31.80	180	0
總 計	34,014	35,313	69,327	98.78	34,035	99.07	319	0.93	34,354	49.55	34,973	50.45	34,870	103

附註：本表期限計算係以各類別申請案件項目之公告處理日數為基準。

103年5月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦理期限	已逾辦理期限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	9	0	9	100.00	5	100.00	0	0.00	5	55.56	4	44.44	4	0
內政部	2,906	1,812	4,718	90.22	2,879	92.01	250	7.99	3,129	66.32	1,589	33.68	1,527	62
外交部	186	27	213	100.00	197	100.00	0	0.00	197	92.49	16	7.51	16	0
國防部	62	14	76	100.00	61	100.00	0	0.00	61	80.26	15	19.74	15	0
經濟部	19,176	361	19,537	99.71	19,116	99.76	46	0.24	19,162	98.08	375	1.92	366	9
交通部	8	0	8	33.33	1	33.33	2	66.67	3	37.50	5	62.50	5	0
文化部	521	77	598	100.00	547	100.00	0	0.00	547	91.47	51	8.53	51	0
衛生福利部	11,522	32,011	43,533	99.42	8,193	99.89	9	0.11	8,202	18.84	35,331	81.16	35,292	39
僑務委員會	87	1	88	100.00	86	100.00	0	0.00	86	97.73	2	2.27	2	0
中央銀行	274	25	299	100.00	284	100.00	0	0.00	284	94.98	15	5.02	15	0
行政院主計總處	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	298	96	394	100.00	302	100.00	0	0.00	302	76.65	92	23.35	92	0
國立故宮博物院	99	12	111	100.00	109	100.00	0	0.00	109	98.20	2	1.80	2	0
國家發展委員會	18	8	26	88.46	23	88.46	3	11.54	26	100.00	0	0.00	0	0
金融監督管理委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	116	3	119	100.00	105	100.00	0	0.00	105	88.24	14	11.76	14	0
行政院原能會	716	384	1,100	91.97	699	98.04	14	1.96	713	64.82	387	35.18	340	47
行政院農委會	190	42	232	96.52	194	96.52	7	3.48	201	86.64	31	13.36	31	0
公平交易委員會	221	1	222	100.00	217	100.00	0	0.00	217	97.75	5	2.25	5	0
行政院工程會	221	97	318	100.00	232	100.00	0	0.00	232	72.96	86	27.04	86	0
原住民族委員會	32	6	38	88.89	32	88.89	4	11.11	36	94.74	2	5.26	2	0
客家委員會	197	24	221	100.00	201	100.00	0	0.00	201	90.95	20	9.05	20	0
國家通訊傳播委員會	325	185	510	100.00	330	100.00	0	0.00	330	64.71	180	35.29	180	0
臺灣省政府	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
總 計	37,188	35,186	72,374	98.57	33,817	99.02	335	0.98	34,152	47.19	38,222	52.81	38,065	157

103年6月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未 逾 辦	已 逾 辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)／(3)－(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)／(7)	(6)	(6)／(7)	(7)	(7)／(3)	(8)	(8)／(3)	(9)	(10)
行政院	4	4	8	100.00	5	100.00	0	0.00	5	62.50	3	37.50	3	0
內政部	2,598	1,468	4,066	90.70	2,526	93.00	190	7.00	2,716	66.80	1,350	33.20	1,281	69
外交部	202	18	220	100.00	188	100.00	0	0.00	188	85.45	32	14.55	32	0
國防部	53	15	68	100.00	49	100.00	0	0.00	49	72.06	19	27.94	19	0
經濟部	20,035	553	20,588	99.80	19,273	99.86	27	0.14	19,300	93.74	1,288	6.26	1,277	11
交通部	3	5	8	85.71	6	85.71	1	14.29	7	87.50	1	12.50	1	0
文化部	369	50	419	100.00	370	100.00	0	0.00	370	88.31	49	11.69	49	0
衛生福利部	8,453	35,179	43,632	99.42	9,981	99.96	4	0.04	9,985	22.88	33,647	77.12	33,593	54
僑務委員會	94	2	96	97.89	93	98.94	1	1.06	94	97.92	2	2.08	1	1
中央銀行	225	15	240	100.00	214	100.00	0	0.00	214	89.17	26	10.83	26	0
行政院主計總處	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	299	95	394	100.00	282	100.00	0	0.00	282	71.57	112	28.43	112	0
國立故宮博物院	96	2	98	100.00	93	100.00	0	0.00	93	94.90	5	5.10	5	0
國軍退除役官兵輔導委員會	128	14	142	100.00	135	100.00	0	0.00	135	95.07	7	4.93	7	0
行政院原能會	682	394	1,076	88.94	627	95.00	33	5.00	660	61.34	416	38.66	371	45
行政院農委會	195	31	226	94.02	173	95.05	9	4.95	182	80.53	44	19.47	42	2
公平交易委員會	186	5	191	99.47	189	99.47	1	0.53	190	99.48	1	0.52	1	0
行政院工程會	186	85	271	100.00	212	100.00	0	0.00	212	78.23	59	21.77	59	0
原住民族委員會	46	2	48	91.43	32	91.43	3	8.57	35	72.92	13	27.08	13	0
客家委員會	219	20	239	100.00	210	100.00	0	0.00	210	87.87	29	12.13	29	0
國家通訊傳播委員會	444	184	628	100.00	350	100.00	0	0.00	350	55.73	278	44.27	278	0
總 計	34,518	38,141	72,659	98.73	35,009	99.24	269	0.76	35,278	48.55	37,381	51.45	37,199	182

四、訴願案件時效統計表

103年4月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計										待辦案件統計				
	本月新收	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結				逾限辦結				合 計		待辦案件		未 逾 辦	已 逾 辦	本月份被合 併審議決定 辦結案件數
	案件數	案件數	(1)+(2)-(13)	(5)+(6)／(3)-(11)	3 個月內		3 ～ 5 個月		3 ～ 5 個月		逾 5 個月		(5)+(6)+(7)+(8)		(3)－(9)		理 期 限	理 期 限	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)／(9)	(6)	(6)／(9)	(7)	(7)／(9)	(8)	(8)／(9)	(9)	(9)／(3)	(10)	(10)／(3)	(11)	(12)	(13)
行政院	186	515	700	100.00	137	76.54	42	23.46	0	0.00	0	0.00	179	25.57	521	74.43	521	0	1
外交部	72	18	90	95.95	71	95.95	0	0.00	3	4.05	0	0.00	74	82.22	16	17.78	16	0	0
國防部	41	3	41	100.00	26	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	26	63.41	15	36.59	15	0	3
財政部	152	717	869	100.00	182	86.26	29	13.74	0	0.00	0	0.00	211	24.28	658	75.72	658	0	0
教育部	93	199	292	100.00	84	84.85	15	15.15	0	0.00	0	0.00	99	33.90	193	66.10	193	0	0
法務部	26	1	27	100.00	25	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	92.59	2	7.41	2	0	0
經濟部	132	438	570	100.00	50	45.87	59	54.13	0	0.00	0	0.00	109	19.12	461	80.88	461	0	0
交通部	39	47	86	97.22	28	77.78	7	19.44	0	0.00	1	2.78	36	41.86	50	58.14	50	0	0
文化部	4	4	8	100.00	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	100.00	0	0.00	0	0	0
衛生福利部	64	125	189	100.00	51	98.08	1	1.92	0	0.00	0	0.00	52	27.51	137	72.49	137	0	0
勞動部	166	580	746	100.00	167	72.29	64	27.71	0	0.00	0	0.00	231	30.97	515	69.03	515	0	0
科技部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院環保署	43	101	144	100.00	31	91.18	3	8.82	0	0.00	0	0.00	34	23.61	110	76.39	110	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	8	1	9	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	33.33	6	66.67	6	0	0
行政院農委會	64	93	156	100.00	34	72.34	13	27.66	0	0.00	0	0.00	47	30.13	109	69.87	109	0	1
原住民族委員會	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0	0
國家通訊傳播委員會	0	1	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0	0
臺灣省政府	14	0	14	100.00	14	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	100.00	0	0.00	0	0	0
總 計	1,107	2,843	3,945	99.65	914	79.41	233	20.24	3	0.26	1	0.09	1,151	29.18	2,794	70.82	2,794	0	5

附註：本表期限計算係以訴願法及其相關規定之處理期限為基準。

103年5月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計										待辦案件統計				
	本月新收	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結				逾限辦結				合 計		待辦案件 (3)－(9)		未 逾 辦	已 逾 辦	本月份被合 併審議決定 辦結案件數
	案件數	案件數	(1)+(2)-(13)	(5)+(6)／(3)-(11)	3 個月內		3 ～ 5 個月		3 ～ 5 個月		逾 5 個月		(5)+(6)+(7)+(8)		(3)－(9)		理 期 限	理 期 限	
	(1)	(2)	(3)	(4)	件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)／(9)	(6)	(6)／(9)	(7)	(7)／(9)	(8)	(8)／(9)	(9)	(9)／(3)	(10)	(10)／(3)	(11)	(12)	(13)
行政院	208	535	743	100.00	132	71.74	52	28.26	0	0.00	0	0.00	184	24.76	559	75.24	559	0	0
內政部	252	429	670	100.00	152	79.17	40	20.83	0	0.00	0	0.00	192	28.66	478	71.34	478	0	11
外交部	95	21	116	100.00	105	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	105	90.52	11	9.48	11	0	0
國防部	42	15	54	100.00	37	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	37	68.52	17	31.48	17	0	3
財政部	173	658	831	100.00	186	80.52	45	19.48	0	0.00	0	0.00	231	27.80	600	72.20	600	0	0
教育部	113	188	301	100.00	115	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	115	38.21	186	61.79	186	0	0
法務部	25	2	27	100.00	24	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	88.89	3	11.11	3	0	0
經濟部	139	461	600	100.00	84	56.38	65	43.62	0	0.00	0	0.00	149	24.83	451	75.17	451	0	0
交通部	28	50	78	100.00	29	87.88	4	12.12	0	0.00	0	0.00	33	42.31	45	57.69	45	0	0
文化部	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0	0
衛生福利部	53	137	190	100.00	49	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	49	25.79	141	74.21	141	0	0
勞動部	204	515	719	100.00	171	69.80	74	30.20	0	0.00	0	0.00	245	34.08	474	65.92	474	0	0
科技部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院環保署	57	107	164	100.00	59	84.29	11	15.71	0	0.00	0	0.00	70	42.68	94	57.32	94	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	5	6	11	100.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	54.55	5	45.45	5	0	0
行政院農委會	59	109	168	100.00	29	85.29	5	14.71	0	0.00	0	0.00	34	20.24	134	79.76	134	0	0
行政院海巡署	1	0	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0	0
國家通訊傳播委員會	1	1	2	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0	0
臺灣省政府	6	0	6	100.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	0	0	0
總 計	1,465	3,234	4,685	100.00	1,189	80.07	296	19.93	0	0.00	0	0.00	1,485	31.70	3,200	68.30	3,200	0	14

103年6月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計										待辦案件統計				
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結				逾限辦結				合 計		待辦案件		未逾辦	已逾辦	本月份被合併審議決定
	案件數	案件數	(1)+(2)-(13)	(5)+(6)/(3)-(11)	3個月內		3～5個月		3～5個月		逾5個月		(5)+(6)+(7)+(8)		(3)-(9)		理期限	理期限	辦結案件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	件數	％	案件數	％	案件數	％	案件數	％	案件數	％	案件數	％	案件數	案件數	(13)
行政院	188	542	728	100.00	119	76.28	37	23.72	0	0.00	0	0.00	156	21.43	572	78.57	572	0	2
內政部	177	489	658	100.00	120	77.92	34	22.08	0	0.00	0	0.00	154	23.40	504	76.60	504	0	8
外交部	90	12	102	100.00	86	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	86	84.31	16	15.69	16	0	0
國防部	27	17	41	100.00	35	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35	85.37	6	14.63	6	0	3
財政部	208	600	808	100.00	152	83.52	30	16.48	0	0.00	0	0.00	182	22.52	626	77.48	626	0	0
教育部	123	182	305	100.00	106	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	106	34.75	199	65.25	199	0	0
法務部	21	3	24	100.00	21	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21	87.50	3	12.50	3	0	0
經濟部	164	451	615	100.00	72	53.33	63	46.67	0	0.00	0	0.00	135	21.95	480	78.05	480	0	0
交通部	37	45	82	100.00	21	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21	25.61	61	74.39	61	0	0
文化部	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0	0
衛生福利部	55	141	196	100.00	66	98.51	1	1.49	0	0.00	0	0.00	67	34.18	129	65.82	129	0	0
勞動部	201	474	675	100.00	134	74.03	47	25.97	0	0.00	0	0.00	181	26.81	494	73.19	494	0	0
科技部	2	0	2	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0	0
行政院環保署	66	94	160	100.00	47	88.68	6	11.32	0	0.00	0	0.00	53	33.13	107	66.88	107	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	1	5	6	100.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	83.33	1	16.67	1	0	0
行政院農委會	40	134	174	100.00	39	86.67	6	13.33	0	0.00	0	0.00	45	25.86	129	74.14	129	0	0
行政院工程會	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院海巡署	0	1	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0	0
國家通訊傳播委員會	2	1	3	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	3	0	0
中央選舉委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0
臺灣省政府	6	0	6	100.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	0	0	0
總 計	1,411	3,192	4,590	100.00	1,034	82.19	224	17.81	0	0.00	0	0.00	1,258	27.41	3,332	72.59	3,332	0	13

五、人民陳情案件時效統計表

103年4月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦理期限	已逾辦理期限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	545	37	582	100.00	556	100.00	0	0.00	556	95.53	26	4.47	26	0
內政部	1,694	225	1,919	99.46	1,653	99.76	4	0.24	1,657	86.35	262	13.65	257	5
外交部	107	0	107	82.24	88	82.24	19	17.76	107	100.00	0	0.00	0	0
國防部	79	26	105	90.70	78	90.70	8	9.30	86	81.90	19	18.10	19	0
財政部	26	2	28	100.00	27	100.00	0	0.00	27	96.43	1	3.57	1	0
教育部	683	187	870	99.58	711	99.86	1	0.14	712	81.84	158	18.16	156	2
法務部	1,039	209	1,248	75.07	816	77.42	238	22.58	1,054	84.46	194	15.54	161	33
經濟部	118	23	141	100.00	105	100.00	0	0.00	105	74.47	36	25.53	36	0
交通部	1,272	215	1,487	98.57	1,237	98.72	16	1.28	1,253	84.26	234	15.74	232	2
文化部	92	36	128	100.00	101	100.00	0	0.00	101	78.91	27	21.09	27	0
衛生福利部	42	23	65	90.20	46	92.00	4	8.00	50	76.92	15	23.08	14	1
勞動部	571	79	650	86.25	464	89.40	55	10.60	519	79.85	131	20.15	112	19
科技部	8	3	11	100.00	9	100.00	0	0.00	9	81.82	2	18.18	2	0
僑務委員會	41	10	51	95.83	46	95.83	2	4.17	48	94.12	3	5.88	3	0
中央銀行	114	22	136	100.00	119	100.00	0	0.00	119	87.50	17	12.50	17	0
行政院主計總處	55	8	63	100.00	53	100.00	0	0.00	53	84.13	10	15.87	10	0
行政院人事行政總處	232	26	258	100.00	238	100.00	0	0.00	238	92.25	20	7.75	20	0
行政院環保署	27	4	31	100.00	20	100.00	0	0.00	20	64.52	11	35.48	11	0
國立故宮博物院	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院陸委會	237	231	468	29.36	133	30.43	304	69.57	437	93.38	31	6.62	15	16
國家發展委員會	67	0	67	96.23	51	96.23	2	3.77	53	79.10	14	20.90	14	0
金融監督管理委員會	8	3	11	80.00	8	80.00	2	20.00	10	90.91	1	9.09	1	0
國軍退除役官兵輔導委員會	71	2	73	100.00	69	100.00	0	0.00	69	94.52	4	5.48	4	0
行政院農委會	146	36	182	98.05	151	100.00	0	0.00	151	82.97	31	17.03	28	3
公平交易委員會	5	0	5	100.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0
行政院工程會	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
原住民族委員會	26	4	30	100.00	25	100.00	0	0.00	25	83.33	5	16.67	5	0
行政院海巡署	36	6	42	100.00	36	100.00	0	0.00	36	85.71	6	14.29	6	0
客家委員會	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0
國家通訊傳播委員會	6,407	1,276	7,683	99.76	2,851	99.79	6	0.21	2,857	37.19	4,826	62.81	4,825	1
中央選舉委員會	22	1	23	100.00	20	100.00	0	0.00	20	86.96	3	13.04	3	0
臺灣省政府	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
總 計	13,777	2,694	16,471	92.90	9,723	93.63	661	6.37	10,384	63.04	6,087	36.96	6,005	82

附註：本表期限計算係以行政院暨所屬各機關處理人民陳情案件要點規定之日數為基準。

103年5月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上 月待辦	案件總 數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件 (3)-(7)		未 逾 辦 理 期 限	已 逾 辦 理 期 限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	527	26	553	100.00	534	100.00	0	0.00	534	96.56	19	3.44	19	0
內政部	1,851	156	2,007	99.55	1,786	99.61	7	0.39	1,793	89.34	214	10.66	213	1
外交部	231	6	237	80.09	177	81.94	39	18.06	216	91.14	21	8.86	16	5
國防部	88	19	107	78.89	71	86.59	11	13.41	82	76.64	25	23.36	17	8
財政部	23	1	24	100.00	23	100.00	0	0.00	23	95.83	1	4.17	1	0
教育部	879	158	1,037	99.04	824	99.64	3	0.36	827	79.75	210	20.25	205	5
法務部	1,033	197	1,230	72.74	814	77.45	237	22.55	1,051	85.45	179	14.55	111	68
經濟部	97	26	123	99.02	101	99.02	1	0.98	102	82.93	21	17.07	21	0
交通部	1,437	236	1,673	98.73	1,477	98.93	16	1.07	1,493	89.24	180	10.76	177	3
文化部	478	28	506	100.00	483	100.00	0	0.00	483	95.45	23	4.55	23	0
衛生福利部	63	19	82	96.43	54	96.43	2	3.57	56	68.29	26	31.71	26	0
勞動部	772	131	903	87.47	691	88.70	88	11.30	779	86.27	124	13.73	113	11
科技部	4	2	6	100.00	5	100.00	0	0.00	5	83.33	1	16.67	1	0
僑務委員會	21	3	24	100.00	23	100.00	0	0.00	23	95.83	1	4.17	1	0
中央銀行	119	17	136	100.00	116	100.00	0	0.00	116	85.29	20	14.71	20	0
行政院主計總處	42	10	52	100.00	47	100.00	0	0.00	47	90.38	5	9.62	5	0
行政院人事行政總處	201	21	222	100.00	212	100.00	0	0.00	212	95.50	10	4.50	10	0
行政院環保署	44	11	55	95.45	42	100.00	0	0.00	42	76.36	13	23.64	11	2
行政院陸委會	104	32	136	67.21	82	71.30	33	28.70	115	84.56	21	15.44	14	7
國家發展委員會	70	14	84	92.86	65	92.86	5	7.14	70	83.33	14	16.67	14	0
金融監督管理委員會	6	1	7	100.00	3	100.00	0	0.00	3	42.86	4	57.14	4	0
國軍退役役官兵輔導委員會	61	4	65	100.00	56	100.00	0	0.00	56	86.15	9	13.85	9	0
行政院農委會	135	31	166	98.01	148	99.33	1	0.67	149	89.76	17	10.24	15	2
公平交易委員會	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
行政院工程會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
原住民族委員會	42	5	47	97.62	41	100.00	0	0.00	41	87.23	6	12.77	5	1
行政院海巡署	43	6	49	100.00	44	100.00	0	0.00	44	89.80	5	10.20	5	0
客家委員會	3	0	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	1	0
國家通訊傳播委員會	3,568	3,843	7,411	99.77	5,686	99.77	13	0.23	5,699	76.90	1,712	23.10	1,712	0
中央選舉委員會	18	3	21	100.00	18	100.00	0	0.00	18	85.71	3	14.29	3	0
臺灣省政府	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
總 計	11,965	5,006	16,971	95.99	13,630	96.76	456	3.24	14,086	83.00	2,885	17.00	2,772	113

103年6月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上 月待辦	案件總 數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	527	19	546	99.81	513	99.81	1	0.19	514	94.14	32	5.86	32	0
內政部	1,648	308	1,956	99.34	1,657	99.70	5	0.30	1,662	84.97	294	15.03	288	6
外交部	57	71	128	42.86	51	44.35	64	55.65	115	89.84	13	10.16	9	4
國防部	53	15	68	100.00	49	100.00	0	0.00	49	72.06	19	27.94	19	0
財政部	17	1	18	100.00	17	100.00	0	0.00	17	94.44	1	5.56	1	0
教育部	870	210	1,080	98.99	880	99.44	5	0.56	885	81.94	195	18.06	191	4
法務部	938	183	1,121	73.74	747	75.23	246	24.77	993	88.58	128	11.42	108	20
經濟部	69	20	89	100.00	67	100.00	0	0.00	67	75.28	22	24.72	22	0
交通部	1,242	181	1,423	98.41	1,115	99.11	10	0.89	1,125	79.06	298	20.94	290	8
文化部	148	23	171	100.00	153	100.00	0	0.00	153	89.47	18	10.53	18	0
衛生福利部	68	40	108	93.62	88	93.62	6	6.38	94	87.04	14	12.96	14	0
勞動部	601	127	728	88.13	579	89.91	65	10.09	644	88.46	84	11.54	71	13
科技部	9	1	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0
僑務委員會	21	1	22	85.71	12	92.31	1	7.69	13	59.09	9	40.91	8	1
中央銀行	113	20	133	100.00	116	100.00	0	0.00	116	87.22	17	12.78	17	0
行政院主計總處	37	5	42	100.00	38	100.00	0	0.00	38	90.48	4	9.52	4	0
行政院人事行政總處	180	10	190	100.00	169	100.00	0	0.00	169	88.95	21	11.05	21	0
行政院環保署	37	15	52	91.67	33	91.67	3	8.33	36	69.23	16	30.77	16	0
行政院陸委會	113	21	134	71.84	74	81.32	17	18.68	91	67.91	43	32.09	31	12
國家發展委員會	61	14	75	86.96	60	86.96	9	13.04	69	92.00	6	8.00	6	0
金融監督管理委員會	6	4	10	100.00	7	100.00	0	0.00	7	70.00	3	30.00	3	0
國軍退除役官兵輔導委員會	84	9	93	100.00	88	100.00	0	0.00	88	94.62	5	5.38	5	0
行政院農委會	127	17	144	98.40	123	100.00	0	0.00	123	85.42	21	14.58	19	2
公平交易委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
原住民族委員會	36	6	42	100.00	33	100.00	0	0.00	33	78.57	9	21.43	9	0
行政院海巡署	42	5	47	100.00	42	100.00	0	0.00	42	89.36	5	10.64	5	0
客家委員會	4	1	5	100.00	4	100.00	0	0.00	4	80.00	1	20.00	1	0
國家通訊傳播委員會	2,676	1,703	4,379	99.97	3,171	99.97	1	0.03	3,172	72.44	1,207	27.56	1,207	0
中央選舉委員會	26	2	28	100.00	25	100.00	0	0.00	25	89.29	3	10.71	3	0
臺灣省政府	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
總 計	9,813	3,032	12,845	95.18	9,924	95.82	433	4.18	10,357	80.63	2,488	19.37	2,418	70

六、專案管制案件時效統計表

103年4月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計				待辦案件統計			
	本月新增	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結	逾限辦結	辦結案件合計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	專 案 數	專 案 數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案 件 數	案 件 數	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	11	5	16	93.33	14	0	14	87.50	2	12.50	1	1
外交部	2	0	2	100.00	2	0	2	100.00	0	0.00	0	0
國防部	17	11	28	100.00	4	0	4	14.29	24	85.71	24	0
財政部	0	3	3	100.00	2	0	2	66.67	1	33.33	1	0
教育部	3	13	16	100.00	11	0	11	68.75	5	31.25	5	0
文化部	9	20	29	80.00	12	2	14	48.28	15	51.72	14	1
衛生福利部	3	2	5	100.00	1	0	1	20.00	4	80.00	4	0
科技部	3,277	1,590	4,867	99.71	3,103	7	3,110	63.90	1,757	36.10	1,755	2
行政院人事行政總處	1	4	5	100.00	1	0	1	20.00	4	80.00	4	0
行政院環保署	0	1	1	0.00	0	1	1	100.00	0	0.00	0	0
國立故宮博物院	0	2	2	100.00	1	0	1	50.00	1	50.00	1	0
行政院陸委會	0	3	3	0.00	0	0	0	0.00	3	100.00	1	2
金融監督管理委員會	0	1	1	--	0	0	0	0.00	1	100.00	1	0
行政院農委會	35	27	62	85.71	24	2	26	41.94	36	58.06	34	2
行政院工程會	857	193	1,050	100.00	878	0	878	83.62	172	16.38	172	0
國家通訊傳播委員會	11	46	57	100.00	17	0	17	29.82	40	70.18	40	0
總 計	4,226	1,921	6,147	99.51	4,070	12	4,082	66.41	2,065	33.59	2,057	8

附註：本表期限計算係以各專案規定程序申請奉核之處理期限為基準。

103年5月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計				待辦案件統計			
	本月新增	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結	逾限辦結	辦結案件合計		待辦案件		未 逾 辦 理 期 限	已 逾 辦 理 期 限
							(5)+(6)		(3)-(7)			
	專 案 數	專 案 數	(1)+(2)	(5)／(3)-(9)	案 件 數	案 件 數	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)／(3)	(8)	(8)／(3)	(9)	(10)	
行政院	11	2	13	91.67	11	1	12	92.31	1	7.69	1	0
外交部	1	0	1	100.00	1	0	1	100.00	0	0.00	0	0
國防部	23	24	47	100.00	22	0	22	46.81	25	53.19	25	0
財政部	2	1	3	100.00	1	0	1	33.33	2	66.67	2	0
教育部	2	5	7	100.00	1	0	1	14.29	6	85.71	6	0
法務部	20	3	23	100.00	11	0	11	47.83	12	52.17	12	0
交通部	1	0	1	--	0	0	0	0.00	1	100.00	1	0
文化部	9	24	33	82.76	24	5	29	87.88	4	12.12	4	0
衛生福利部	1	4	5	33.33	1	2	3	60.00	2	40.00	2	0
科技部	3,154	1,807	4,961	99.62	3,164	9	3,173	63.96	1,788	36.04	1,785	3
行政院人事行政總處	0	6	6	66.67	2	0	2	33.33	4	66.67	3	1
行政院環保署	2	0	2	--	0	0	0	0.00	2	100.00	2	0
國立故宮博物院	0	6	6	100.00	5	0	5	83.33	1	16.67	1	0
行政院陸委會	0	4	4	33.33	1	0	1	25.00	3	75.00	1	2
金融監督管理委員會	0	3	3	100.00	1	0	1	33.33	2	66.67	2	0
行政院農委會	34	36	70	93.94	31	1	32	45.71	38	54.29	37	1
行政院工程會	1,033	205	1,238	100.00	1,033	0	1,033	83.44	205	16.56	205	0
國家通訊傳播委員會	9	39	48	100.00	17	0	17	35.42	31	64.58	31	0
總 計	4,302	2,169	6,471	99.43	4,326	18	4,344	67.13	2,127	32.87	2,120	7

103年6月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計				待辦案件統計			
	本月新增	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結	逾限辦結	辦結案件合計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	專 案 數	專案數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案 件 數	案 件 數	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	4	1	5	100.00	3	0	3	60.00	2	40.00	2	0
外交部	2	0	2	100.00	1	0	1	50.00	1	50.00	1	0
國防部	10	25	35	94.74	18	0	18	51.43	17	48.57	16	1
財政部	3	2	5	--	0	0	0	0.00	5	100.00	5	0
教育部	4	7	11	100.00	3	0	3	27.27	8	72.73	8	0
法務部	23	13	36	100.00	19	0	19	52.78	17	47.22	17	0
交通部	1	1	2	--	0	0	0	0.00	2	100.00	2	0
文化部	11	17	28	95.00	19	1	20	71.43	8	28.57	8	0
衛生福利部	3	2	5	50.00	1	0	1	20.00	4	80.00	3	1
科技部	3,170	1,801	4,971	99.65	3,437	10	3,447	69.34	1,524	30.66	1,522	2
行政院人事行政總處	0	11	11	87.50	7	0	7	63.64	4	36.36	3	1
行政院環保署	1	2	3	66.67	2	1	3	100.00	0	0.00	0	0
國立故宮博物院	0	3	3	--	0	0	0	0.00	3	100.00	3	0
行政院陸委會	0	3	3	33.33	1	1	2	66.67	1	33.33	0	1
金融監督管理委員會	0	2	2	100.00	1	0	1	50.00	1	50.00	1	0
行政院農委會	32	38	70	81.40	35	7	42	60.00	28	40.00	27	1
行政院工程會	986	224	1,210	100.00	973	0	973	80.41	237	19.59	237	0
國家通訊傳播委員會	26	37	63	100.00	20	0	20	31.75	43	68.25	43	0
總 計	4,276	2,189	6,465	99.41	4,540	20	4,560	70.53	1,905	29.47	1,898	7

七、監察案件時效統計表

103年4月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦	已逾辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理期限	理期限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	126	250	376	57.50	69	71.13	28	28.87	97	25.80	279	74.20	256	23
內政部	21	54	75	100.00	17	100.00	0	0.00	17	22.67	58	77.33	58	0
外交部	4	1	5	100.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0
國防部	17	5	22	100.00	18	100.00	0	0.00	18	81.82	4	18.18	4	0
財政部	2	0	2	100.00	1	100.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0
教育部	14	16	30	100.00	14	100.00	0	0.00	14	46.67	16	53.33	16	0
法務部	25	1	26	100.00	22	100.00	0	0.00	22	84.62	4	15.38	4	0
經濟部	37	41	78	100.00	24	100.00	0	0.00	24	30.77	54	69.23	54	0
交通部	6	1	7	100.00	6	100.00	0	0.00	6	85.71	1	14.29	1	0
文化部	4	2	6	100.00	5	100.00	0	0.00	5	83.33	1	16.67	1	0
衛生福利部	11	11	22	85.00	17	85.00	3	15.00	20	90.91	2	9.09	2	0
勞動部	4	5	9	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	100.00	9	0
科技部	2	2	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
行政院主計總處	12	0	12	100.00	9	100.00	0	0.00	9	75.00	3	25.00	3	0
行政院人事行政總處	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	3	19	22	100.00	6	100.00	0	0.00	6	27.27	16	72.73	16	0
國軍退除役官兵輔導委員會	11	1	12	100.00	8	100.00	0	0.00	8	66.67	4	33.33	4	0
行政院農委會	11	3	14	72.73	8	80.00	2	20.00	10	71.43	4	28.57	3	1
行政院工程會	17	0	17	100.00	10	100.00	0	0.00	10	58.82	7	41.18	7	0
原住民族委員會	5	0	5	100.00	4	100.00	0	0.00	4	80.00	1	20.00	1	0
行政院海巡署	1	2	3	100.00	1	100.00	0	0.00	1	33.33	2	66.67	2	0
國家通訊傳播委員會	5	3	8	100.00	4	100.00	0	0.00	4	50.00	4	50.00	4	0
總 計	340	417	757	81.67	254	88.50	33	11.50	287	37.91	470	62.09	446	24

附註：本表期限計算係以監察法及監察法施行細則規定之處理期限為基準。

103年5月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦	已逾辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)／(3)－(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理期限	理期限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)／(7)	(6)	(6)／(7)	(7)	(7)／(3)	(8)	(8)／(3)	(9)	(10)
行政院	91	279	370	70.95	105	79.55	27	20.45	132	35.68	238	64.32	222	16
內政部	26	59	85	93.55	29	93.55	2	6.45	31	36.47	54	63.53	54	0
外交部	11	0	11	100.00	6	100.00	0	0.00	6	54.55	5	45.45	5	0
國防部	8	4	12	88.89	8	100.00	0	0.00	8	66.67	4	33.33	3	1
財政部	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
教育部	18	16	34	73.33	11	73.33	4	26.67	15	44.12	19	55.88	19	0
法務部	29	4	33	100.00	30	100.00	0	0.00	30	90.91	3	9.09	3	0
經濟部	11	53	64	100.00	25	100.00	0	0.00	25	39.06	39	60.94	39	0
交通部	17	1	18	94.44	17	100.00	0	0.00	17	94.44	1	5.56	0	1
文化部	3	1	4	100.00	3	100.00	0	0.00	3	75.00	1	25.00	1	0
衛生福利部	3	22	25	93.33	14	100.00	0	0.00	14	56.00	11	44.00	10	1
勞動部	4	9	13	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	100.00	13	0
科技部	9	0	9	100.00	1	100.00	0	0.00	1	11.11	8	88.89	8	0
行政院主計總處	11	3	14	100.00	13	100.00	0	0.00	13	92.86	1	7.14	1	0
行政院人事行政總處	5	0	5	100.00	4	100.00	0	0.00	4	80.00	1	20.00	1	0
行政院環保署	4	15	19	100.00	8	100.00	0	0.00	8	42.11	11	57.89	11	0
國軍退除役官兵輔導委員會	9	4	13	100.00	7	100.00	0	0.00	7	53.85	6	46.15	6	0
行政院農委會	18	4	22	76.19	16	80.00	4	20.00	20	90.91	2	9.09	1	1
公平交易委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院工程會	7	7	14	100.00	12	100.00	0	0.00	12	85.71	2	14.29	2	0
原住民族委員會	2	1	3	100.00	1	100.00	0	0.00	1	33.33	2	66.67	2	0
行政院海巡署	1	2	3	100.00	1	100.00	0	0.00	1	33.33	2	66.67	2	0
國家通訊傳播委員會	4	4	8	100.00	5	100.00	0	0.00	5	62.50	3	37.50	3	0
總 計	292	489	781	84.80	318	89.58	37	10.42	355	45.45	426	54.55	406	20

103年6月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	79	238	317	67.19	86	81.90	19	18.10	105	33.12	212	66.88	189	23
內政部	26	52	78	76.47	13	76.47	4	23.53	17	21.79	61	78.21	61	0
外交部	4	5	9	100.00	7	100.00	0	0.00	7	77.78	2	22.22	2	0
國防部	5	4	9	100.00	6	100.00	0	0.00	6	66.67	3	33.33	3	0
教育部	13	19	32	77.78	7	77.78	2	22.22	9	28.13	23	71.88	23	0
法務部	17	3	20	94.74	18	94.74	1	5.26	19	95.00	1	5.00	1	0
經濟部	21	38	59	100.00	29	100.00	0	0.00	29	49.15	30	50.85	30	0
交通部	16	1	17	93.75	15	100.00	0	0.00	15	88.24	2	11.76	1	1
文化部	4	1	5	100.00	2	100.00	0	0.00	2	40.00	3	60.00	3	0
衛生福利部	7	15	22	94.74	18	100.00	0	0.00	18	81.82	4	18.18	3	1
勞動部	5	13	18	100.00	4	100.00	0	0.00	4	22.22	14	77.78	14	0
科技部	2	8	10	100.00	6	100.00	0	0.00	6	60.00	4	40.00	4	0
行政院主計總處	11	1	12	100.00	10	100.00	0	0.00	10	83.33	2	16.67	2	0
行政院人事行政總處	2	1	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	1	0
行政院環保署	5	10	15	100.00	6	100.00	0	0.00	6	40.00	9	60.00	9	0
國軍退除役官兵輔導委員會	10	6	16	100.00	15	100.00	0	0.00	15	93.75	1	6.25	1	0
行政院農委會	7	2	9	87.50	7	87.50	1	12.50	8	88.89	1	11.11	1	0
行政院工程會	6	1	7	100.00	6	100.00	0	0.00	6	85.71	1	14.29	1	0
原住民族委員會	5	2	7	100.00	5	100.00	0	0.00	5	71.43	2	28.57	2	0
行政院海巡署	0	2	2	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	0
國家通訊傳播委員會	2	3	5	100.00	2	100.00	0	0.00	2	40.00	3	60.00	3	0
總 計	247	425	672	83.54	264	90.72	27	9.28	291	43.30	381	56.70	356	25
