

103 年度行政院列管案件進度年報

國家發展委員會 彙編

資料來源：各計畫主管機關

目次

壹、概述.....	1
貳、列管案件執行情形一覽表	11
參、列管案件階段性重要執行成效一覽表.....	24
肆、落後案件執行情形及原因分析表.....	36
伍、行政院及所屬一級機關公文時效分類統計表	67
一、一般公文時效統計表	70
二、立法委員質詢案件時效統計表	73
三、人民申請案件時效統計表	76
四、訴願案件時效統計表	79
五、人民陳情案件時效統計表	82
六、專案管制案件時效統計表	85
七、監察案件時效統計表	88

壹、概述

一、行政院管制計畫

(一) 概況說明

1. 為落實院屬各機關個案計畫執行，提升管理績效及施政品質，本院將各機關個案計畫分為行政院管制（簡稱政院管制）、部會管制及部會所屬機關自行管制（簡稱自行管制）三級納管。院屬各機關 103 年度截至 12 月底止計有 1,389 件個案計畫，年度可支用預算約新臺幣（以下同）9,131.24 億元，其中政院管制計畫 113 件（如圖 1），年度可支用預算 3,053.96 億元（如圖 2）。

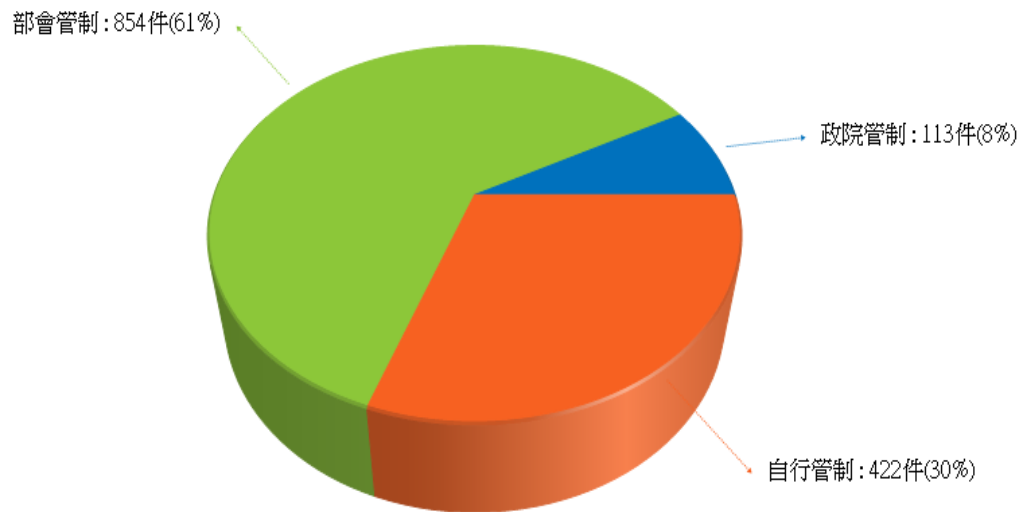


圖 1 三級管制計畫件數(截至 103 年 12 月底止)－依管制級別

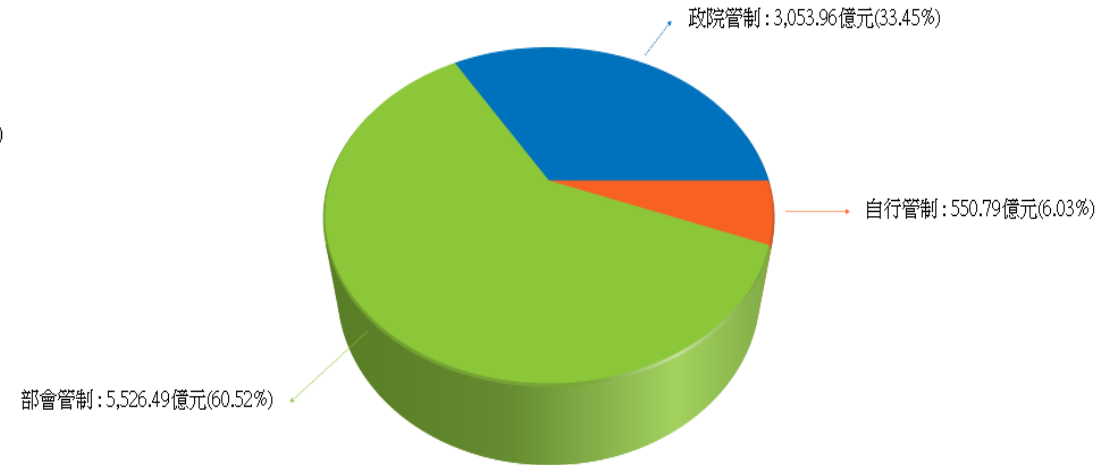


圖 2 三級管制計畫年度可支用預算數(截至 103 年 12 月底止)－依管制級別

2. 行政院管制計畫以計畫類別區分如次（如圖 3 及圖 4）：

(1) 社會發展計畫計 29 件，年度可支用預算數計 1,457.42 億元，由國發會管制。

(2) 公共建設計畫計 37 件，年度可支用預算數計 1,138.96 億元，由國發會管制。

(3) 經濟發展計畫計 22 件，年度可支用預算數計 267.42 億元，由國發會管制。

(4) 科技發展計畫計 25 件，年度可支用預算數計 190.16 億元，由科技部管制。

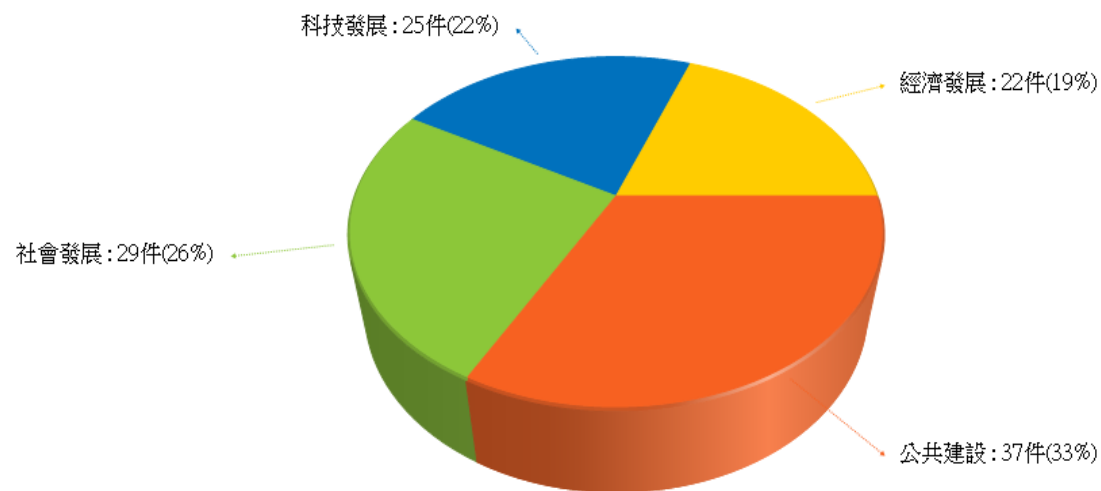


圖 3 行政院管制計畫件數(截至 103 年 12 月底止)－依計畫類別

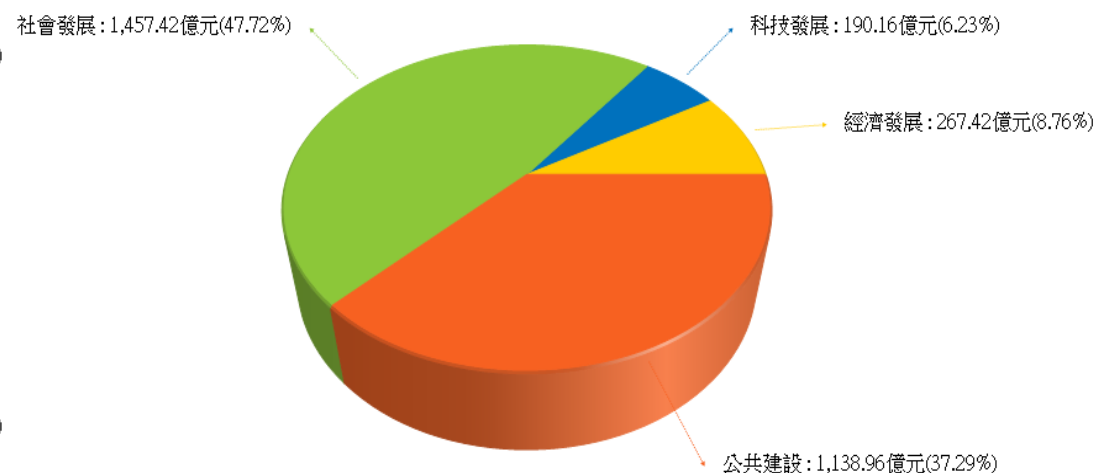


圖 4 行政院管制計畫年度可支用預算數(截至 103 年 12 月底止)－依計畫類別

3. 行政院管制計畫以機關別區分如次：

(1) 交通部主管 23 件行政院管制計畫占大宗，其餘依序為經濟部（22 件）、衛福部（14 件）、農委會（14 件）、教育部（9 件）、文化部（8 件）、科技部（6 件）、內政部（5 件）、原民會（3 件）、客委會（3 件）、勞動部（2 件）、故宮（2 件）、環保署（1 件）及臺灣省諮議會（1 件）（如圖 5）。

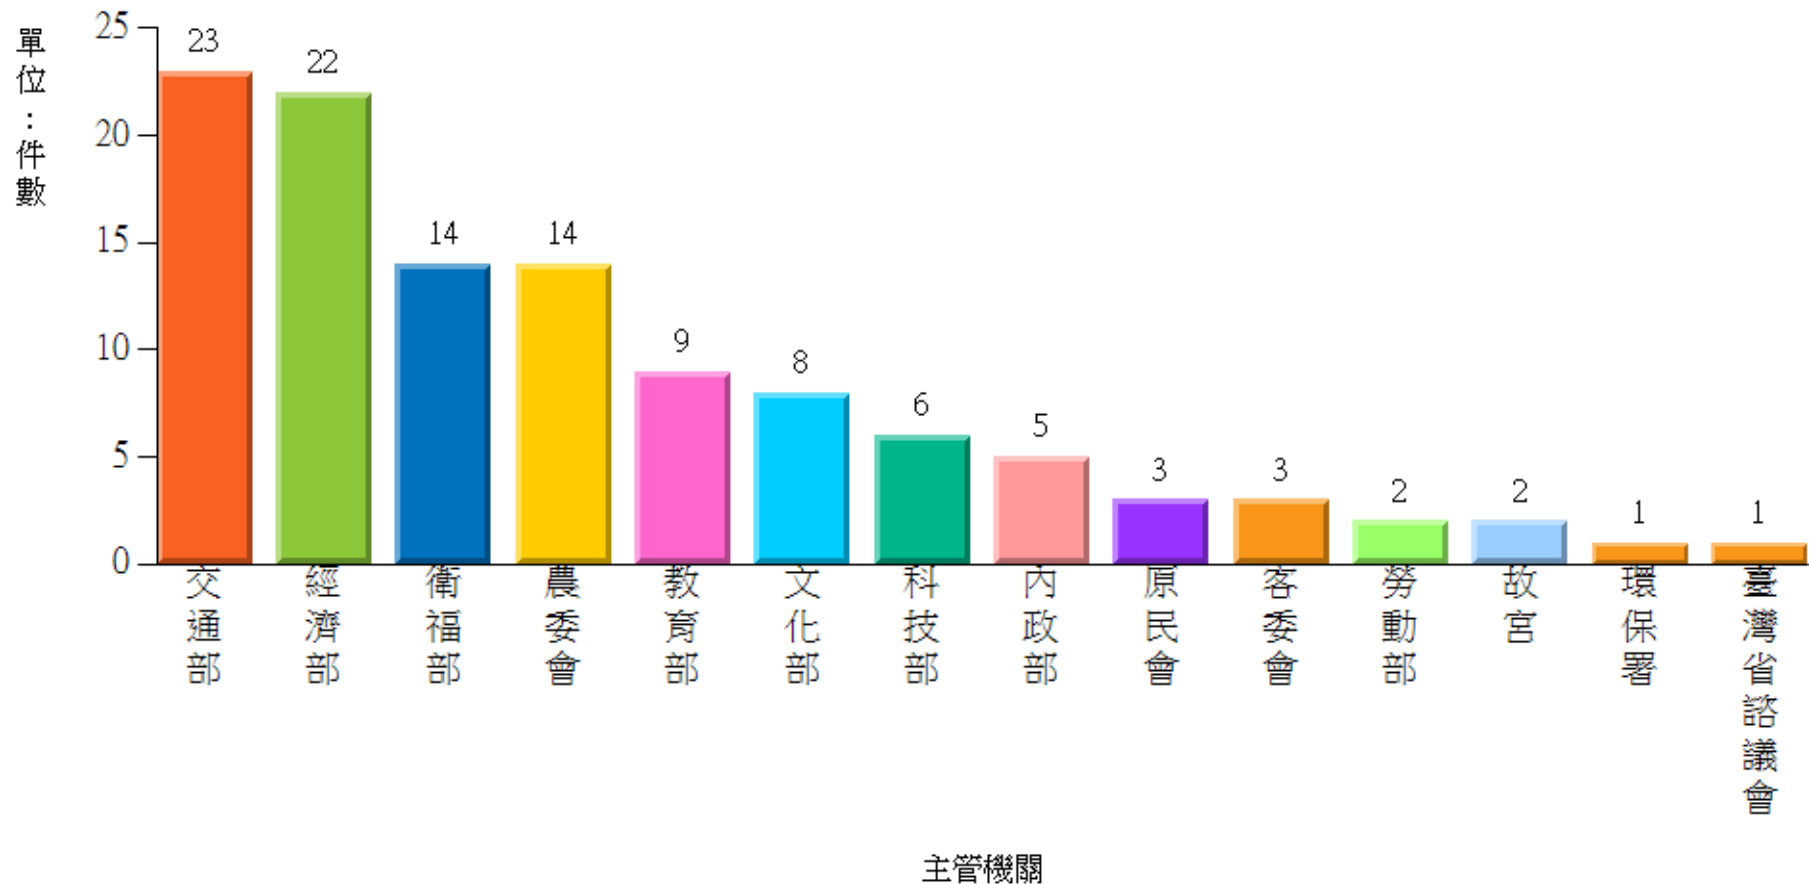


圖 5 行政院管制計畫件數(截至 103 年 12 月底止)－依機關別

(2) 行政院管制計畫年度可支用預算數以衛福部（814.75 億元）最多，其餘依序為交通部（700.98 億元）、教育部（564.19 億元）、經濟部（244.84 億元）、農委會（189.30 億元）、科技部（178.18 億元）、內政部（159.60 億元）、文化部（89.48 億元）、勞動部（41.80 億元）、原民會（31.94 億元）、客委會（17.83 億元）、故宮（16.70 億元）、環保署（4.34 億元）及臺灣省諮議會（0.04 億元）（如圖 6）。

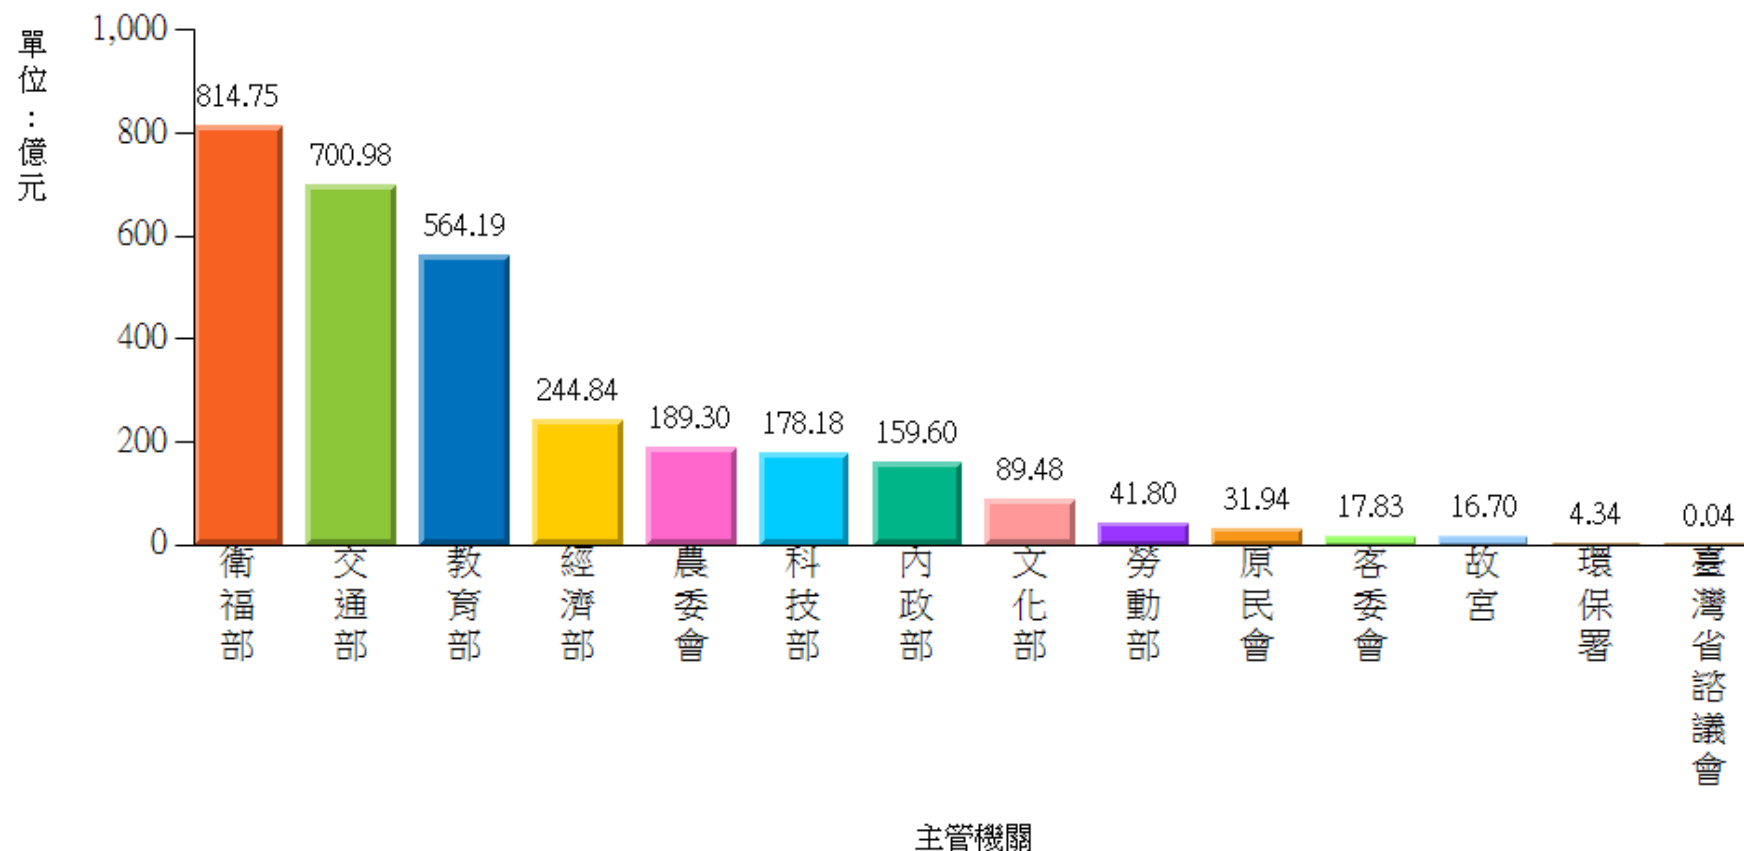


圖 6 行政院管制計畫年度可支用預算數(截至 103 年 12 月底止)－依機關別

(二) 執行進度(如表1)(落後案件執行情形及原因分析詳如第36頁至第66頁)

- 1.總累計執行進度「完成」(實際進度達100%)者12件,占10.62%。
- 2.總累計執行進度「超前」(實際進度較預定進度超前1個百分點)者2件,占1.77%。
- 3.總累計執行進度「符合」(實際進度較預定進度在±1個百分點範圍內)者84件,占74.34%。
- 4.總累計執行進度「落後」(實際進度較預定進度落後逾1個百分點)者15件,占13.27%,主要落後原因之比率以「其他」占18.00%最多;其次為「招標作業」占16.00%;其後依序為「規劃設計」占12.00%;「行政作業」占10.00%;「施工作業」占8.00%;「驗工作業」、「人力需求」及「預算編列」均占6.00%;「土地取得」、「計畫變更」、「法令規章」及「天然因素」均占4.00%;「拆遷補償」占2.00%(如表2)。

表1 政院管制計畫總累計執行進度狀態統計表(截至103年12月底止)

項次	主管機關	管制案件數	執行進度				落後案件比例 (%)
			完成	超前	符合	落後	
1	內政部	5	0	0	5	0	0.00
2	教育部	9	1	0	8	0	0.00
3	經濟部	22	6	0	15	1	4.55
4	交通部	23	0	0	20	3	13.04
5	衛福部	14	1	0	11	2	14.29
6	文化部	8	0	1	4	3	37.50
7	勞動部	2	1	0	1	0	0.00
8	科技部	6	1	0	5	0	0.00
9	環保署	1	0	0	1	0	0.00
10	故宮	2	0	1	0	1	50.00
11	農委會	14	1	0	10	3	21.43
12	原民會	3	0	0	2	1	33.33
13	客委會	3	0	0	2	1	33.33
14	臺灣省諮議會	1	1	0	0	0	0.00
合計		113	12	2	84	15	100.00
比率(%)			10.62	1.77	74.34	13.27	

表 2 政院管制計畫落後原因分析表(截至 103 年 12 月底止，總累計落後幅度：實際進度較預定進度落後逾 1 個百分點)

項次	主管機關	計畫名稱	總累計落後幅度 (個百分點)	預算執行率 (%)	落後原因													合計
					行政作業	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗工作業	計畫變更	人力需求	預算編列	法令規章	天然因素	其他	
1	故宮	大故宮計畫	落後 52.00	0.00		*												1
2	交通部	臺北捷運系統環狀線建設計畫 (第 1 階段路線)	落後 23.58	96.37		*	*	*	*									4
3	農委會	流域綜合治理計畫-農田排水	落後 17.20	13.59		*								*			*	3
4	原民會	輔導原住民產業發展	落後 13.49	51.18	*				*			*						3
5	交通部	臺中都會區大眾捷運系統烏日文 心北屯線建設計畫	落後 8.42	94.91			*		*									2
6	農委會	漁業多元化經營建設	落後 4.98	77.94		*			*		*				*		*	5
7	交通部	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全 線電氣化計畫	落後 4.20	90.08	*				*	*	*		*			*	*	7
8	文化部	衛武營藝術文化中心興建計畫	落後 4.18	93.87						*			*					2
9	衛福部	長照服務網計畫	落後 2.90	78.30											*		*	2
10	經濟部	石門水庫及其集水區整治計畫- 緊急供水工程暨水庫更新改善	落後 2.79	85.12						*			*			*		3
11	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫	落後 2.13	7.79	*	*			*					*			*	5
12	衛福部	強化國民年金保險制度	落後 1.78	96.70													*	1
13	客委會	客家文化發展中心南北園區設施 管理及擴充計畫	落後 1.46	100.00	*				*	*		*					*	5
14	農委會	穩定肥料及相關資材供需計畫	落後 1.25	60.81										*			*	2
15	文化部	歷史與文化資產維護發展(第二期) 計畫	落後 1.01	94.30	*	*			*		*						*	5
合計					5	6	2	1	8	4	3	2	3	3	2	2	9	50
占有落後原因之比率(%)					10.00	12.00	4.00	2.00	16.00	8.00	6.00	4.00	6.00	6.00	4.00	4.00	18.00	100

(三) 預算支用情形 (截至 103 年 12 月底止)

1. 預算支用比 (年累計實際支用數/年累計預定支用數)：各機關政院管制計畫年累計預定支用數合計約 3,053.96 億元，年累計實際支用數合計約 2,651.59 億元，整體預算支用比平均約為 87%。其中以臺灣省諮議會(100%)最高，惟仍有支用比未達 87%者，依序為經濟部(81%)、交通部(68%)、環保署(60%)及文化部(54%)等 4 個機關 (如圖 7)。

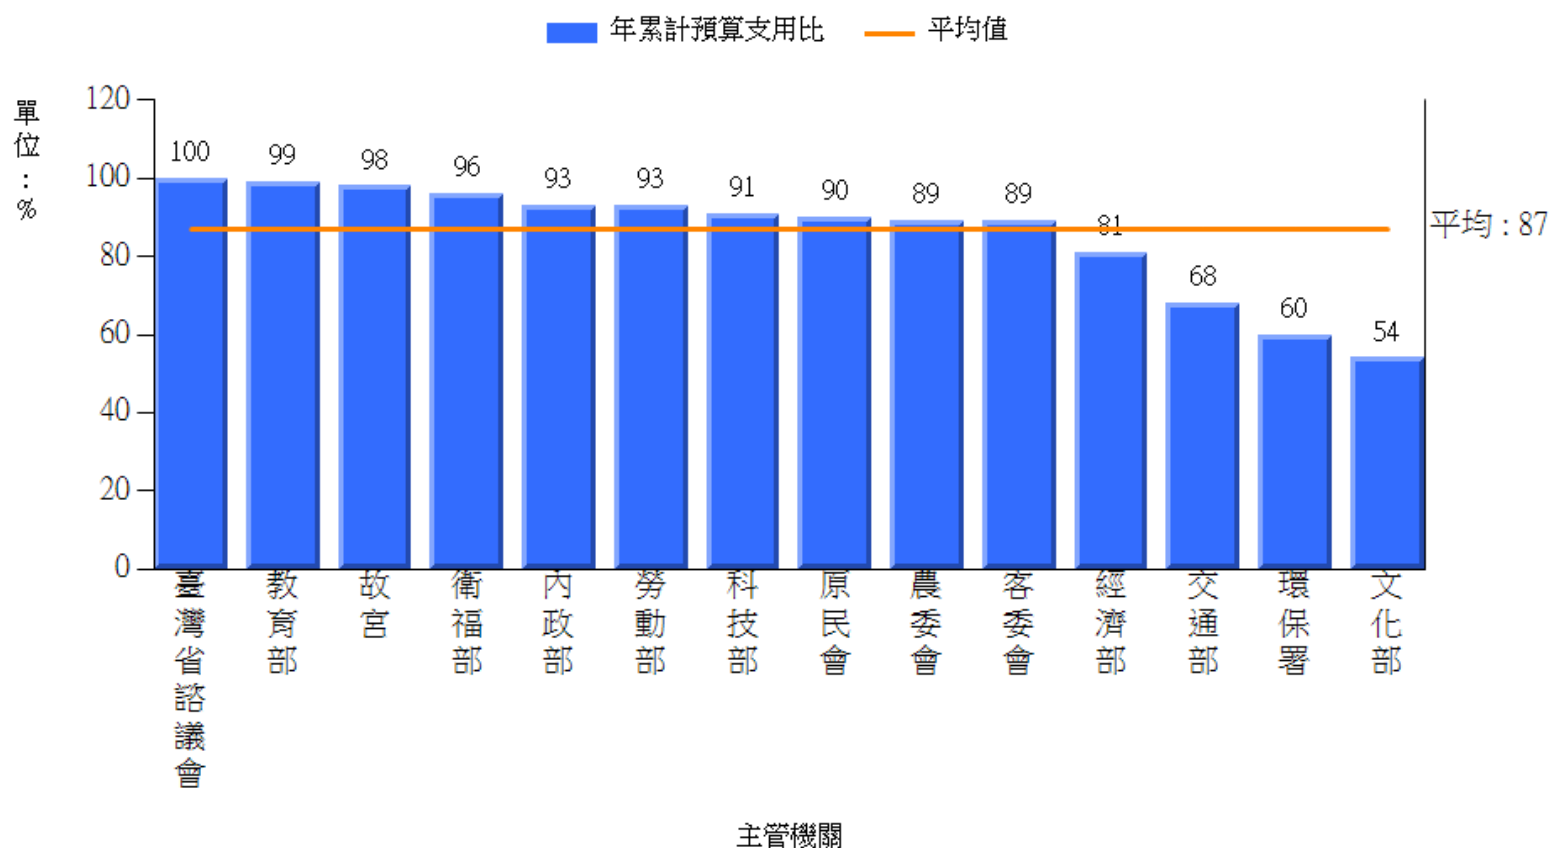


圖 7 政院管制計畫年累計預算支用比(截至 103 年 12 月底止)－依機關別

2.預算執行率（年累計實際執行數/年累計預定支用數）：各機關政院管制計畫年累計預定支用數合計約 3,053.96 億元，年累計實際執行數合計約 2,901.43 億元（含實際支用數 2651.59 億元、已執行應付未付數 135.33 億元、節餘數 24.1 億元及工程預付數 90.41 億元），整體預算執行率平均為 95%。其中以故宮(103%)最高，惟仍有預算執行率未達 95%者，依序為農委會(94%)、勞動部(93%)、環保署(92%)、科技部(91%)、交通部(89%)及文化部(81%)等 6 個機關（如圖 8）。

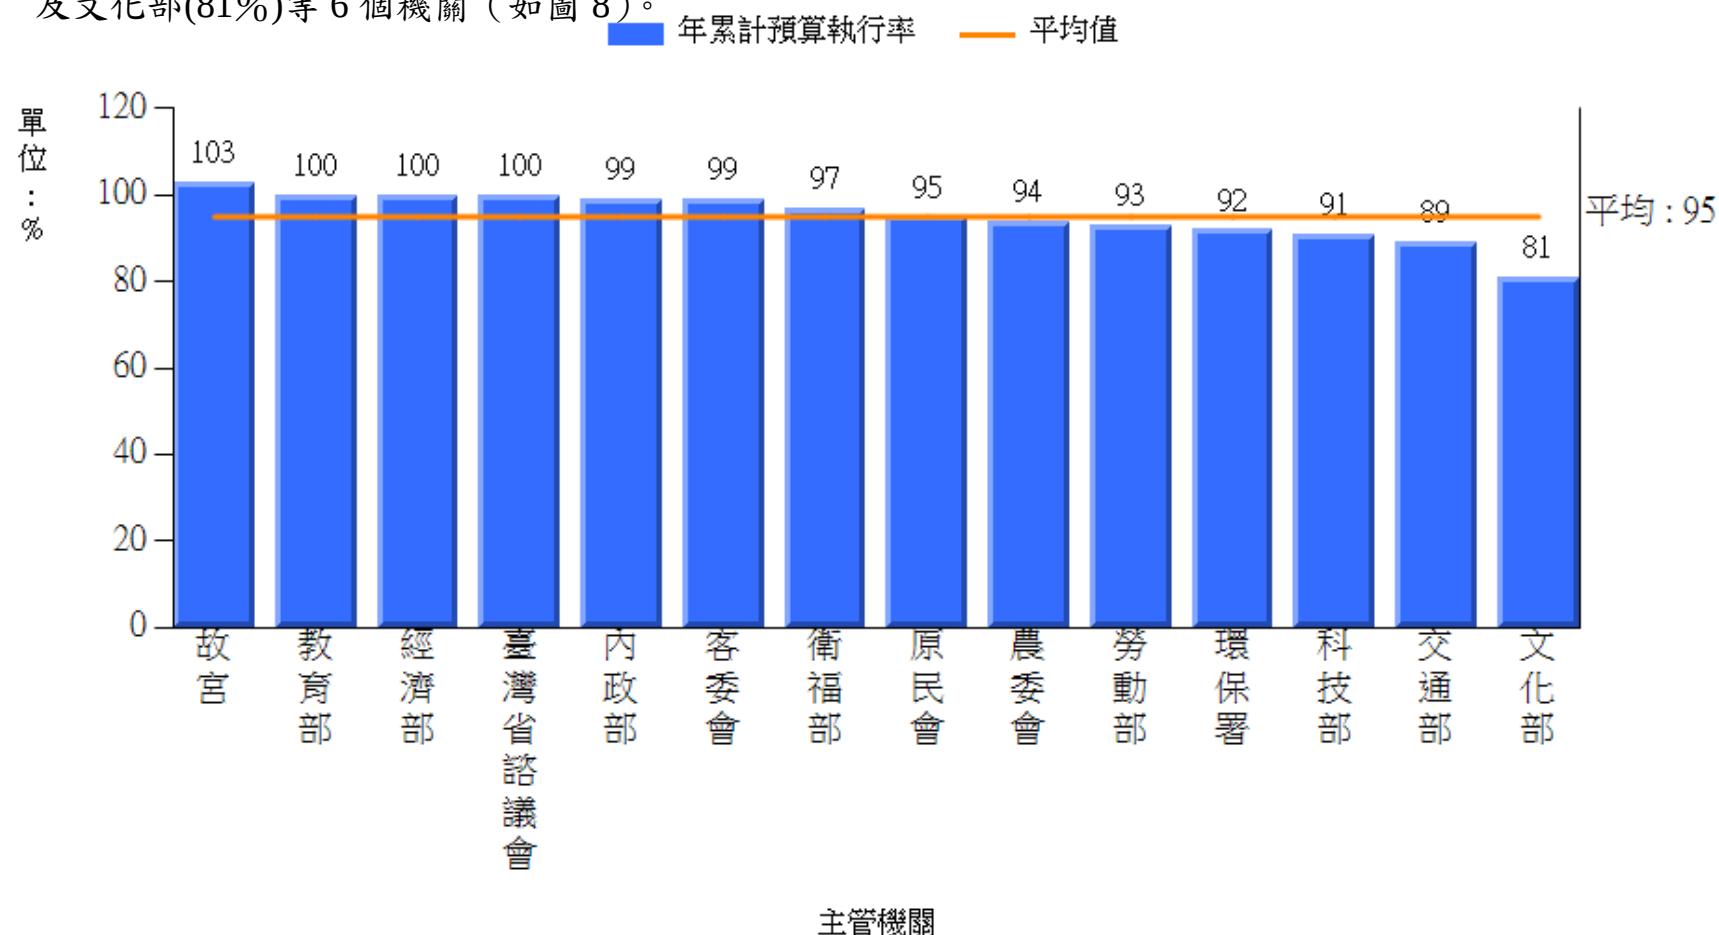


圖 8 政院管制計畫年累計預算執行率(截至 103 年 12 月底止)－依機關別

3.年度預算達成率（年累計實際執行數/年度可支用預算數）：各機關政院管制計畫年累計預定支用數合計約 3,053.96 億元，年累計實際執行數合計約 2,901.43 億元（含實際支用數 2651.59 億元、已執行應付未付數 135.33 億元、節餘數 24.1 億元及工程預付數 90.41 億元），整體預算達成率平均為 95%。其中以故宮(103%)最高，惟仍有預算執行率未達 95%者，依序為農委會(94%)、勞動部(93%)、環保署(92%)、科技部(91%)、交通部(89%)及文化部(81%)等 6 個機關（如圖 9）。

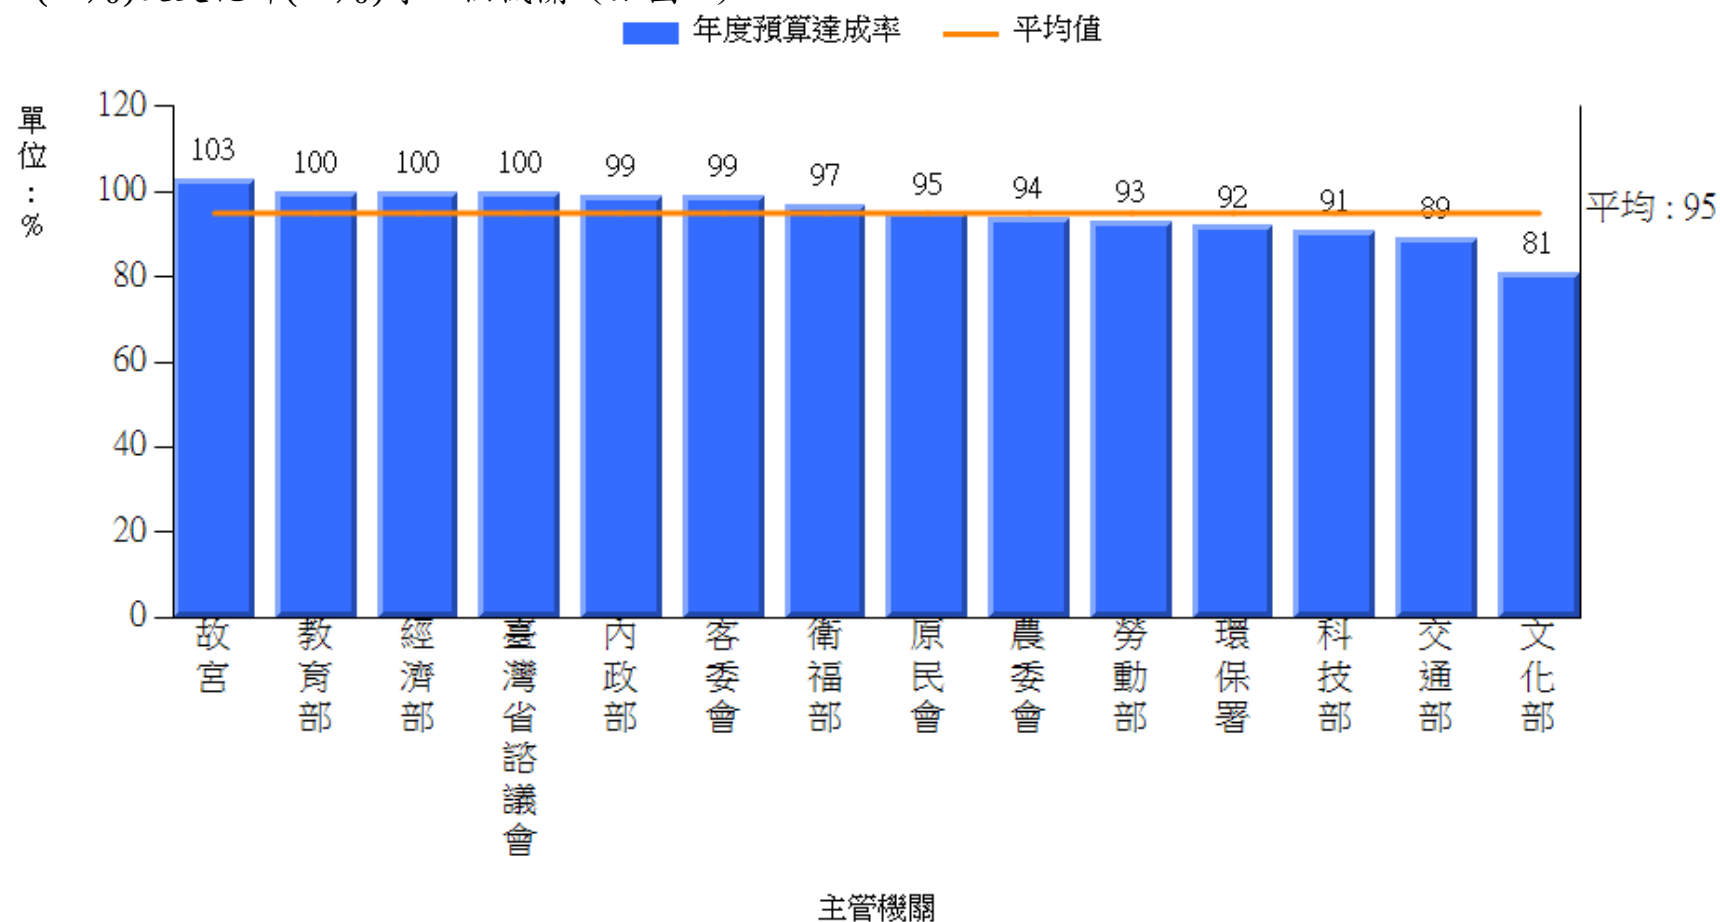


圖 9 政院管制計畫年度預算達成率(截至 103 年 12 月底止)－依機關別

二、院屬各一級機關 103 年第 4 季 7 類公文處理時效（詳如第 67 頁至第 90 頁）

- （一）一般公文發文平均使用日數之平均值為 2.10 日，較上一季月平均值 2.16 日，減少 0.06 日。
- （二）立法委員質詢已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 98.38%，較上一季月平均值 100.00%，減少 1.62 個百分點。
- （三）人民申請案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 98.74%，較上一季月平均值 98.81%，減少 0.07 個百分點。
- （四）訴願案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 99.31%，較上一季月平均值 99.90%，減少 0.59 個百分點。
- （五）人民陳情案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 96.38%，較上一季月平均值 95.68%，增加 0.70 個百分點。
- （六）專案管制案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 98.20%，較上一季月平均值 99.13%，減少 0.93 個百分點。
- （七）監察案件已結案件中，屆期應辦案件之依限辦結率平均值為 90.99%，較上一季月平均值 85.79%，增加 5.20 個百分點。

貳、列管案件執行情形一覽表

(截至 103 年 12 月底止)

※執行進度比較：實際進度小於預定進度時，以負號(-)表示。

※進度燈號：○代表超前(總累計執行進度超前 1 個百分點)；◎代表符合(總累計執行進度在±1 個百分點範圍內)；⊙代表落後(總累計執行進度落後逾 1 個百分點)。

※預算執行率=(實際支用數+已執行應付未付數+節餘數+工程預付數)/預定支用數。

※預算達成率=(實際支用數+已執行應付未付數+節餘數+工程預付數)/本年度可支用預算數。

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可支用預算數(千元)	執行進度				經費支用			預算執行率(%)	年度預算達成率(%)	進度燈號
						預定(%) (A)	實際(%) (B)	比較(%) (B)-(A)	預定(千元) (C)	實際(千元) (D)	支用比(%) (D/C)			
1	內政部	污水下水道建設計畫 (98/01/01~103/12/31)	公共建設	13,184,230	總累計	100	99.95	-0.05	84,422,121	83,412,667	98.80	99.95	99.67	◎
					年累計	100	99.67	-0.33	13,184,234	12,174,782	92.34	99.67		
2	內政部	智慧綠建築推動方案 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	207,314	總累計	75	75	符合	608,756	605,974	99.54	99.54	98.66	◎
					年累計	100	100	符合	207,314	204,532	98.66	98.66		
3	內政部	城鎮風貌型塑整體計畫 (102/01/01~105/12/31)	經濟發展	2,474,439	總累計	50	49.82	-0.19	4,663,601	4,504,889	96.60	98.07	96.36	◎
					年累計	100	99.26	-0.74	2,474,439	2,315,727	93.59	96.36		
4	內政部	災害防救深耕第 2 期計畫 (103/01/01~106/12/31)	社會發展	65,817	總累計	20	20	符合	65,817	54,400	82.65	82.65	82.65	◎
					年累計	100	100	符合	65,817	54,400	82.65	82.65		
5	內政部	地籍清理第 2 期實施計畫 (103/01/01~108/12/31)	社會發展	28,446	總累計	16	16	符合	28,446	27,098	95.26	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	28,446	27,098	95.26	100.00		
6	教育部	5 歲幼兒免學費教育計畫 (99/01/01~104/12/31)	社會發展	7,494,264	總累計	90	90	符合	34,645,508	34,645,508	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	7,494,264	7,494,264	100.00	100.00		
7	教育部	邁向頂尖大學計畫 (100/04/01~105/12/31)	社會發展	8,608,660	總累計	75	75	符合	35,981,319	35,981,319	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	8,608,660	8,608,660	100.00	100.00		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
8	教育部	十二年國民基本教育實施計畫(100/09/20~103/12/31)	社會發展	28,729,890	總累計	100	100	符合	99,444,781	100,720,719	101.28	101.28	100.33	◎
					年累計	100	100	符合	28,729,888	28,823,647	100.33	100.33		
9	教育部	獎勵大學教學卓越計畫(102/01/01~105/12/31)	社會發展	4,500,000	總累計	50	50	符合	9,000,000	4,423,762	49.15	49.15	98.31	◎
					年累計	100	100	符合	4,500,000	4,423,762	98.31	98.31		
10	教育部	優質教保發展計畫(102/01/01~105/12/31)	社會發展	2,331,600	總累計	40	40	符合	4,174,200	4,181,850	100.18	100.18	100.33	◎
					年累計	100	100	符合	2,331,600	2,339,250	100.33	100.33		
11	教育部	第二期技職教育再造計畫(102/01/01~106/12/31)	社會發展	4,050,000	總累計	40	40	符合	4,078,950	4,087,359	100.21	100.21	100.21	◎
					年累計	100	100	符合	4,050,000	4,058,409	100.21	100.21		
12	教育部	推動對外華語教育(103/01/01~109/12/31)	社會發展	200,000	總累計	6.7	6.97	0.27	200,000	208,516	104.26	104.26	104.26	◎
					年累計	100	103.98	3.98	200,000	208,516	104.26	104.26		
13	教育部	2017 臺北世界大學運動會場館興整建計畫(103/01/01~106/08/31)	公共建設	394,000	總累計	10	10	符合	394,000	59,601	15.13	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	394,000	59,601	15.13	100.00		
14	教育部	教育學術研究骨幹網路頻寬效能提升計畫(103/01/01~104/12/31)	科技發展	110,780	總累計	50	49.5	-0.50	110,780	0	0.00	0.00	0.00	◎
					年累計	100	99	-1.00	110,780	0	0.00	0.00		
15	經濟部	石門水庫及其集水區整治計畫--穩定供水設施及幹管改善(95/01/01~104/12/31)	公共建設	868,861	總累計	97.09	97.08	-0.01	7,166,401	6,451,440	90.02	99.75	97.96	◎
					年累計	100	99.52	-0.48	868,861	153,900	17.71	97.96		
16	經濟部	石門水庫及其集水區整治計畫-緊急供水工程暨水庫更新改善(95/01/01~104/06/30)	公共建設	1,627,456	總累計	93.88	91.09	-2.79	8,456,958	7,805,292	92.29	97.14	85.12	◎
					年累計	100	67.61	-32.39	1,627,456	975,790	59.96	85.12		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
17	經濟部	易淹水地區水患治理計畫- 河川排水及事業海堤改善 (95/07/01~103/12/31)	公共 建設	4,333,374	總累計	100	100	符合	73,823,801	72,843,410	98.67	99.93	99.60	◎
					年累計	100	99.8	-0.20	4,333,374	3,387,780	78.18	99.60		
18	經濟部	曾文南化烏山頭水庫治理 及穩定南部地區供水計畫 (經濟部水利署部分) (99/05/12~105/05/11)	公共 建設	3,209,757	總累計	50.41	49.84	-0.57	7,536,997	6,571,841	87.19	92.00	81.21	◎
					年累計	100	95.61	-4.39	3,209,757	2,244,601	69.93	81.21		
19	經濟部	曾文南化烏山頭水庫治理 及穩定南部地區供水計畫- 台水公司部分 (99/07/01~105/04/30)	公共 建設	3,117,000	總累計	40.64	40.64	符合	5,478,934	3,158,070	57.64	95.65	95.45	◎
					年累計	100	99.98	-0.02	3,117,000	892,790	28.64	95.45		
20	經濟部	因應貿易自由化加強輔導 型產業之共通性輔導計畫 (100/01/01~103/12/31)	科技 發展	149,597	總累計	100	100	符合	790,452	790,452	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	149,597	149,597	100.00	100.00		
21	經濟部	南部新興產業發展關鍵技 術計畫 (4/4)(100/01/01~103/12/31)	科技 發展	164,813	總累計	100	100	符合	869,483	869,483	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	164,813	164,813	100.00	100.00		
22	經濟部	智慧型自動化產業推動計 畫(101/04/01~104/12/31)	科技 發展	119,643	總累計	60	60	符合	422,963	422,512	99.89	99.92	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	119,643	119,546	99.92	100.00		
23	經濟部	數位內容創新與整合推動 計畫(101/01/01~104/12/31)	科技 發展	183,984	總累計	75	75	符合	866,870	863,672	99.63	100.99	104.67	◎
					年累計	100	100	符合	183,984	180,786	98.26	104.67		
24	經濟部	雲端運算系統及軟體技術 研發計畫 (101/01/01~103/12/31)	科技 發展	211,822	總累計	100	100	符合	824,836	824,836	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	211,822	211,822	100.00	100.00		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
25	經濟部	傳統產業加值轉型推動計畫 (3/3) (101/01/01~103/12/31)	科技發展	172,480	總累計	100	100	符合	638,971	638,971	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	172,480	172,480	100.00	100.00		
26	經濟部	機械與系統領域工業基礎技術研究計畫 (2/4)(102/01/01~105/12/31)	科技發展	181,503	總累計	50	50	符合	404,518	404,480	99.99	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	181,503	181,465	99.98	100.00		
27	經濟部	民生福祉領域工業基礎技術研究計畫 (2/4)(102/01/01~105/12/31)	科技發展	281,916	總累計	50	50	符合	620,898	620,788	99.98	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	281,916	281,806	99.96	100.00		
28	經濟部	小型企業創新研發計畫 (SBIR)(102/01/01~105/12/31)	科技發展	714,813	總累計	50	50	符合	1,389,615	1,389,615	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	714,813	714,813	100.00	100.00		
29	經濟部	A+企業創新研發淬鍊計畫 (102/01/01~105/12/31)	科技發展	1,837,983	總累計	50	50	符合	4,359,334	4,358,672	99.98	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	1,837,983	1,837,321	99.96	100.00		
30	經濟部	台灣產業形象廣宣計畫 (103/01/01~103/12/31)	經濟發展	830,000	總累計	100	100	符合	830,000	800,314	96.42	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	830,000	800,314	96.42	100.00		
31	經濟部	服務業創新研發計畫 (SIIR)(103/01/01~106/12/31)	科技發展	159,158	總累計	20	20	符合	159,158	159,158	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	159,158	159,158	100.00	100.00		
32	經濟部	提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫 (103/01/01~103/12/31)	經濟發展	3,677,384	總累計	100	100	符合	3,677,384	4,677,384	127.19	127.19	127.19	◎
					年累計	100	100	符合	3,677,384	4,677,384	127.19	127.19		
33	經濟部	協助傳統產業技術開發計畫 (103/01/01~106/12/31)	科技發展	223,225	總累計	24	24	符合	223,225	264,082	118.30	118.30	118.30	◎
					年累計	100	100	符合	223,225	264,082	118.30	118.30		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
34	經濟部	標竿新產品創新研發輔導計畫(103/01/01~106/12/31)	科技發展	1,295,997	總累計	25	25	符合	1,295,997	1,250,732	96.51	100.40	100.40	◎
					年累計	100	100	符合	1,295,997	1,250,732	96.51	100.40		
35	經濟部	智慧手持裝置核心技術攻堅計畫 (1/4)(103/01/01~106/12/31)	科技發展	813,522	總累計	20	20	符合	813,522	812,397	99.86	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	813,522	812,397	99.86	100.00		
36	經濟部	石化產業高值化系統技術與應用發展計畫 (1/4)(103/01/01~106/12/31)	科技發展	309,275	總累計	25	25	符合	309,275	309,271	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	309,275	309,271	100.00	100.00		
37	交通部	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線 (88/07/01~108/05/31)	公共建設	3,697,521	總累計	99.44	99.44	符合	135,868,531	135,868,531	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	3,697,521	3,697,521	100.00	100.00		
38	交通部	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 (92/06/01~106/12/31)	公共建設	6,314,278	總累計	95	95	符合	90,824,345	89,162,558	98.17	100.00	99.93	◎
					年累計	100	100	符合	6,314,278	4,652,490	73.68	99.93		
39	交通部	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫松山線 (93/01/01~105/12/31)	公共建設	3,724,655	總累計	99.5	99.5	符合	41,928,562	41,520,341	99.03	99.03	89.04	◎
					年累計	100	99.94	-0.06	3,724,655	3,316,434	89.04	89.04		
40	交通部	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第1階段路線)(93/01/01~103/12/31)	公共建設	8,713,000	總累計	100	76.42	-23.58	32,036,685	29,724,737	92.78	99.01	96.37	◎
					年累計	100	21.41	-78.59	8,713,000	6,401,052	73.47	96.37		
41	交通部	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(94/01/01~105/10/31)	公共建設	9,499,108	總累計	66.92	58.5	-8.42	13,673,299	6,770,577	49.52	96.46	94.91	◎
					年累計	100	70.46	-29.54	9,499,108	2,596,386	27.33	94.91		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
42	交通部	臺北機廠遷建設計畫 (94/06/01~104/12/31)	公共 建設	1,077,305	總累計	93	92.83	-0.17	13,555,374	12,760,893	94.14	96.50	55.90	◎
					年累計	100	98.24	-1.76	1,077,305	282,823	26.25	55.90		
43	交通部	高雄市區鐵路地下化計畫 (94/07/01~106/12/31)	公共 建設	5,915,468	總累計	88.7	88.7	符合	26,418,159	25,171,677	95.28	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	5,915,468	4,668,986	78.93	100.00		
44	交通部	臺中都會區鐵路高架捷運 化計畫 (95/02/13~106/03/31)	公共 建設	5,140,387	總累計	77.48	77.48	符合	21,627,000	20,520,024	94.88	98.38	93.18	◎
					年累計	100	100	符合	5,140,387	4,033,411	78.47	93.18		
45	交通部	花東線鐵路瓶頸路段雙軌 化暨全線電氣化計畫 (97/04/01~104/03/31)	公共 建設	5,899,348	總累計	98.16	93.96	-4.20	23,031,774	21,007,413	91.21	97.46	90.08	◎
					年累計	100	68.4	-31.60	5,899,348	3,874,987	65.69	90.08		
46	交通部	西濱快速公路後續建設計 畫(98/01/01~108/12/31)	公共 建設	5,996,377	總累計	48.56	48.33	-0.23	28,360,250	26,747,183	94.31	94.33	73.19	◎
					年累計	100	96.05	-3.95	5,996,377	4,383,308	73.10	73.19		
47	交通部	東西向快速公路健全路網 改善計畫 (98/01/01~105/12/31)	公共 建設	1,984,274	總累計	85	85	符合	18,881,497	18,328,105	97.07	97.97	80.68	◎
					年累計	100	100	符合	1,984,274	1,430,882	72.11	80.68		
48	交通部	環島鐵路整體系統安全提 昇計畫 (98/01/01~103/12/31)	公共 建設	729,637	總累計	100	99.96	-0.05	14,949,000	14,521,141	97.14	97.77	54.22	◎
					年累計	100	80.24	-19.76	729,637	301,778	41.36	54.22		
49	交通部	基隆火車站都市更新站區 遷移計畫 (98/04/01~104/11/30)	公共 建設	1,449,297	總累計	89.98	89.93	-0.05	2,473,533	1,408,673	56.95	62.40	35.82	◎
					年累計	100	99.1	-0.90	1,449,297	384,437	26.53	35.82		
50	交通部	台 9 線蘇花公路山區路段 改善計畫 (99/12/16~106/12/31)	公共 建設	7,414,700	總累計	40.35	39.74	-0.61	16,627,099	14,774,928	88.86	88.86	75.02	◎
					年累計	100	96.11	-3.89	7,414,700	5,562,529	75.02	75.02		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
51	交通部	災害性天氣監測與預報作業建置計畫 (99/01/01~104/12/31)	科技發展	296,122	總累計	86.6	86.19	-0.41	1,366,305	1,200,305	87.85	100.00	100.00	◎
					年累計	100	98.19	-1.81	296,122	130,122	43.94	100.00		
52	交通部	曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫 (交通部公路總局部份)(99/01/01~104/12/31)	公共建設	50,000	總累計	92	92	符合	610,000	610,000	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	50,000	50,000	100.00	100.00		
53	交通部	整備觀光遊憩設施建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	650,000	總累計	75	75	符合	1,949,992	1,914,496	98.18	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	650,000	614,504	94.54	100.00		
54	交通部	北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	204,634	總累計	71	71.14	0.14	459,500	472,834	102.90	102.90	102.44	◎
					年累計	100	100.49	0.49	204,634	209,634	102.44	102.44		
55	交通部	東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	204,317	總累計	71.61	71.39	-0.22	450,498	419,438	93.11	100.00	100.00	◎
					年累計	100	99.24	-0.76	204,317	173,257	84.80	100.00		
56	交通部	大鵬灣國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	243,707	總累計	75	75	符合	729,404	729,404	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	243,707	243,707	100.00	100.00		
57	交通部	日月潭國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	274,274	總累計	75	75	符合	821,391	811,765	98.83	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	274,274	264,648	96.49	100.00		
58	交通部	阿里山國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	342,148	總累計	76	76	符合	820,858	820,391	99.94	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	342,148	341,681	99.86	100.00		
59	交通部	茂林國家風景區建設計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟發展	277,257	總累計	82.15	82.15	符合	559,196	555,651	99.37	99.37	94.59	◎
					年累計	100	99.99	-0.01	277,257	262,255	94.59	94.59		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
60	衛福部	父母未就業家庭育兒津貼 實施計畫 (101/01/01~104/12/31)	社會 發展	5,306,743	總累計	75	75	符合	14,627,612	14,417,083	98.56	98.56	97.07	◎
					年累計	100	100	符合	5,306,743	5,151,060	97.07	97.07		
61	衛福部	推動長期照顧服務機制 (101/01/01~104/12/31)	社會 發展	3,272,546	總累計	75	75	符合	7,714,106	7,714,106	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	3,272,546	3,272,546	100.00	100.00		
62	衛福部	重建食品藥物安全(清雲行 動五五方案)計畫 (101/01/01~105/12/31)	社會 發展	367,784	總累計	60	60	符合	686,465	682,314	99.40	99.40	98.96	◎
					年累計	100	100	符合	367,784	363,924	98.95	98.96		
63	衛福部	開創全民均等健康照護計 畫(102/01/01~105/12/31)	社會 發展	1,075,020	總累計	50	49.93	-0.07	2,094,124	2,055,600	98.16	98.16	96.42	◎
					年累計	100	99.72	-0.28	1,075,020	1,036,496	96.42	96.42		
64	衛福部	食品安全管制科技發展計 畫(102/01/01~105/12/31)	科技 發展	214,429	總累計	50	50	符合	481,477	431,888	89.70	99.75	100.84	◎
					年累計	100	100	符合	214,429	167,856	78.28	100.84		
65	衛福部	台灣環境毒物健康危害之 監測、評估及對策研究 (102/01/01~105/12/31)	科技 發展	163,619	總累計	48	48	符合	348,447	348,447	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	163,619	163,619	100.00	100.00		
66	衛福部	國民心理健康促進計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	595,068	總累計	50	50	符合	1,088,397	975,037	89.58	89.58	85.97	◎
					年累計	100	100	符合	595,068	511,586	85.97	85.97		
67	衛福部	長照服務網計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	164,491	總累計	30	27.1	-2.90	312,361	136,082	43.57	60.73	78.30	◎
					年累計	100	85.5	-14.50	164,491	75,185	45.71	78.30		
68	衛福部	第三期國家癌症防治計畫 (103/01/01~107/12/31)	社會 發展	3,369,989	總累計	20	19.58	-0.42	3,369,989	2,767,719	82.13	94.95	94.95	◎
					年累計	100	97.9	-2.10	3,369,989	2,767,719	82.13	94.95		
69	衛福部	強化國民年金保險制度 (103/01/01~103/12/31)	社會 發展	62,334,670	總累計	100	98.22	-1.78	62,334,668	60,280,647	96.70	96.70	96.70	◎
					年累計	100	98.22	-1.78	62,334,668	60,280,647	96.70	96.70		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
70	衛福部	預防保健服務計畫 (103/01/01~106/12/31)	社會 發展	2,722,769	總累計	25	24.79	-0.21	2,722,769	2,715,062	99.72	100.00	100.00	◎
					年累計	100	99.16	-0.84	2,722,769	2,715,062	99.72	100.00		
71	衛福部	推動國內醫藥衛生研究 (103/01/01~105/12/31)	科技 發展	425,041	總累計	40	40	符合	425,041	425,041	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	425,041	425,041	100.00	100.00		
72	衛福部	友善關懷老人服務方案第 二期計畫 (103/01/01~105/12/31)	社會 發展	442,220	總累計	30	30	符合	442,220	442,220	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	442,220	442,220	100.00	100.00		
73	衛福部	保母托育管理與托育費用 補助(103/01/01~103/12/31)	社會 發展	1,020,860	總累計	100	100	符合	1,020,860	1,020,860	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	1,020,860	1,020,860	100.00	100.00		
74	文化部	臺中大都會歌劇院興建計 畫(92/01/01~104/12/31)	公共 建設	1,270,000	總累計	85	85	符合	4,157,500	3,619,000	87.05	87.05	100.02	◎
					年累計	100	100	符合	1,270,000	1,270,000	100.00	100.02		
75	文化部	北部流行音樂中心計畫 (94/01/01~105/12/31)	公共 建設	747,178	總累計	22.5	23.67	1.17	1,023,602	639,018	62.43	86.50	81.42	○
					年累計	100	95.47	-4.53	747,178	361,975	48.45	81.42		
76	文化部	衛武營藝術文化中心興建 計畫 (94/01/01~105/10/31)	公共 建設	3,188,003	總累計	89.56	85.38	-4.18	7,675,239	5,633,887	73.40	97.59	93.87	◎
					年累計	100	40.34	-59.66	3,188,003	1,136,470	35.65	93.87		
77	文化部	文化創意產業發展(第二 期)第三次修正計畫 (97/01/01~103/12/31)	經濟 發展	672,199	總累計	100	99.01	-0.99	7,292,766	6,471,582	88.74	91.58	83.88	◎
					年累計	100	80.81	-19.19	672,199	356,619	53.05	83.88		
78	文化部	海洋文化及流行音樂中心 計畫(98/10/01~104/12/31)	公共 建設	1,257,443	總累計	67.7	65.57	-2.13	1,423,277	264,907	18.61	18.63	7.79	◎
					年累計	100	90.4	-9.60	1,257,443	97,734	7.77	7.79		
79	文化部	歷史與文化資產維護發展 (第二期)計畫 (99/01/11~104/12/31)	經濟 發展	755,806	總累計	77.64	76.63	-1.01	3,049,583	2,919,648	95.74	98.59	94.30	◎
					年累計	100	95.71	-4.29	755,806	625,871	82.81	94.30		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
80	文化部	高畫質電視推展計畫 (101/01/01~104/12/31)	經濟 發展	408,003	總累計	75	75	符合	1,732,040	1,731,649	99.98	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	408,003	407,612	99.90	100.00		
81	文化部	價值產值化-文創產業價值 鏈建構與創新 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	649,083	總累計	40	39.88	-0.12	884,753	787,206	88.97	88.97	90.53	◎
					年累計	100	99.59	-0.41	649,083	587,613	90.53	90.53		
82	勞動部	辦理職業訓練，協助勞工提 升職場所需之能力 (103/01/01~103/12/31)	社會 發展	2,855,991	總累計	100	100.7	0.70	2,855,991	2,812,069	98.46	98.46	98.46	◎
					年累計	100	100.7	0.70	2,855,991	2,812,069	98.46	98.46		
83	勞動部	辦理多元就業開發方案及 推動培力就業計畫，促進社 會企業的發展 (103/01/01~103/12/31)	社會 發展	1,324,219	總累計	100	100	符合	1,324,219	1,088,045	82.17	82.17	82.17	◎
					年累計	100	100	符合	1,324,219	1,088,045	82.17	82.17		
84	科技部	中部科學工業園區建設計 畫(92/07/01~110/12/31)	公共 建設	6,997,111	總累計	81.52	81.21	-0.31	83,341,167	82,917,234	99.49	99.65	95.89	◎
					年累計	100	95.89	-4.11	6,997,111	6,573,178	93.94	95.89		
85	科技部	奈米國家型科技計畫 (98/01/01~103/12/31)	科技 發展	2,530,485	總累計	100	100	符合	17,199,556	14,331,217	83.32	83.32	99.43	◎
					年累計	100	100	符合	2,530,485	2,516,006	99.43	99.43		
86	科技部	中興新村高等研究園區計 畫(99/01/01~108/12/31)	公共 建設	265,635	總累計	62.61	62.53	-0.09	6,593,847	6,586,435	99.89	99.89	97.24	◎
					年累計	100	97.24	-2.76	265,635	258,223	97.21	97.24		
87	科技部	生技醫藥國家型科技計畫 (100/01/01~105/12/31)	科技 發展	1,512,815	總累計	55	54.88	-0.12	6,887,008	5,791,922	84.10	84.10	83.43	◎
					年累計	100	98.8	-1.20	1,512,815	1,262,138	83.43	83.43		
88	科技部	智慧電子國家型科技計畫 (100/01/01~104/12/31)	科技 發展	1,673,093	總累計	80	80	符合	7,362,018	7,022,371	95.39	95.39	95.67	◎
					年累計	100	100	符合	1,673,093	1,600,626	95.67	95.67		
89	科技部	第二期能源國家型科技計 畫(103/01/01~107/12/31)	科技 發展	4,838,609	總累計	20	19.65	-0.35	4,838,609	3,927,926	81.18	81.18	81.18	◎
					年累計	100	98.27	-1.73	4,838,609	3,927,926	81.18	81.18		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
90	環保署	資源永續循環利用推動計畫(102/01/01~106/12/31)	社會發展	434,220	總累計	18.81	18.2	-0.61	630,249	458,154	72.69	94.41	91.89	◎
					年累計	100	94.7	-5.30	434,220	262,125	60.37	91.89		
91	故宮	故宮南部院區籌建(92/01/01~104/12/31)	公共建設	1,665,193	總累計	71.38	73.61	2.23	4,665,423	4,631,552	99.27	101.28	103.59	○
					年累計	100	106.65	6.65	1,665,193	1,631,322	97.97	103.59		
92	故宮	大故宮計畫(103/01/01~103/12/31)	公共建設	5,000	總累計	100	48	-52.00	5,000	0	0.00	0.00	0.00	◎
					年累計	100	48	-52.00	5,000	0	0.00	0.00		
93	農委會	屏東農業生物科技園區(92/02/25~103/12/31)	經濟發展	168,619	總累計	100	99.96	-0.04	8,249,110	8,225,747	99.72	99.91	95.44	◎
					年累計	100	98.18	-1.82	168,619	145,246	86.14	95.44		
94	農委會	曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(農委會水土保持局部分)」(99/05/12~104/12/31)	公共建設	233,811	總累計	90	90	符合	1,541,482	1,472,482	95.52	99.12	94.23	◎
					年累計	100	100	符合	233,811	164,811	70.49	94.23		
95	農委會	「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(農委會林務局部分)」(99/05/12~104/12/31)	公共建設	159,897	總累計	90	90	符合	1,698,290	1,680,457	98.95	99.00	94.71	◎
					年累計	100	100	符合	159,897	150,590	94.18	94.71		
96	農委會	漁業多元化經營建設(102/01/01~105/12/31)	經濟發展	1,566,155	總累計	50	45.02	-4.98	2,064,696	1,417,148	68.64	83.27	77.94	◎
					年累計	100	83.8	-16.20	1,566,155	918,607	58.65	77.94		
97	農委會	加強農田水利建設(102/01/01~105/12/31)	經濟發展	3,137,519	總累計	50	50	符合	5,487,345	4,918,544	89.63	95.18	91.57	◎
					年累計	100	100	符合	3,137,519	2,568,718	81.87	91.57		
98	農委會	調整耕作制度活化農地計畫(102/01/01~105/12/31)	經濟發展	7,170,941	總累計	50	50	符合	14,158,161	16,269,543	114.91	114.91	115.95	◎
					年累計	100	100	符合	7,170,941	8,315,000	115.95	115.95		
99	農委會	生態旅遊系統建置發展(102/01/01~105/12/31)	經濟發展	386,030	總累計	50	49.25	-0.75	772,915	754,228	97.58	97.85	95.69	◎
					年累計	100	97	-3.00	386,030	367,343	95.16	95.69		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
100	農委會	植樹造林計畫 (102/01/01~105/12/31)	公共 建設	1,329,044	總累計	50	49.92	-0.08	2,851,125	2,755,447	96.64	98.23	96.20	◎
					年累計	100	99.7	-0.30	1,329,044	1,233,366	92.80	96.20		
101	農委會	休閒農業加值發展 (102/01/01~104/12/31)	經濟 發展	330,000	總累計	66	66	符合	660,000	615,505	93.26	98.24	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	330,000	297,122	90.04	100.00		
102	農委會	強化農產品全球市場深耕 計畫(103/01/01~103/12/31)	經濟 發展	191,605	總累計	100	100	符合	191,605	151,950	79.30	86.43	86.43	◎
					年累計	100	100	符合	191,605	151,950	79.30	86.43		
103	農委會	穩定肥料及相關資材供需 計畫(103/01/01~103/12/31)	經濟 發展	2,569,745	總累計	100	98.75	-1.25	2,569,745	1,562,647	60.81	60.81	60.81	◎
					年累計	100	98.75	-1.25	2,569,745	1,562,647	60.81	60.81		
104	農委會	流域綜合治理計畫-農田排 水(103/01/01~108/12/31)	公共 建設	255,000	總累計	17.2	0	-17.20	255,000	11,282	4.42	13.59	13.59	◎
					年累計	100	0	-100.00	255,000	11,282	4.42	13.59		
105	農委會	流域綜合治理計畫-上游坡 地水土保持及治山防洪 (103/01/01~108/12/31)	公共 建設	1,000,000	總累計	11.98	11.98	符合	1,000,000	607,146	60.71	74.30	74.30	◎
					年累計	100	100	符合	1,000,000	607,146	60.71	74.30		
106	農委會	推動農業科技產業全球運 籌(103/01/01~106/12/31)	科技 發展	431,491	總累計	25	25	符合	431,491	413,376	95.80	95.80	95.80	◎
					年累計	100	100	符合	431,491	413,376	95.80	95.80		
107	原民會	原住民族社會安全發展第 二期四年計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	2,681,745	總累計	50	50	符合	5,335,653	5,330,046	99.89	99.89	99.79	◎
					年累計	100	100	符合	2,681,745	2,676,138	99.79	99.79		
108	原民會	輔導原住民產業發展 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	332,200	總累計	50	36.51	-13.49	388,200	199,129	51.30	78.15	51.18	◎
					年累計	100	46.5	-53.50	332,200	65,778	19.80	51.18		
109	原民會	原住民族住宅改善計畫 (102/01/01~105/12/31)	社會 發展	179,940	總累計	50	49.46	-0.54	320,343	269,974	84.28	100.00	100.00	◎
					年累計	100	98.25	-1.75	179,940	129,571	72.01	100.00		

項次	主管機關	計畫名稱 (期程)	計畫類別	本年度可 支用預算 數(千元)	執行進度				經費支用			預算執 行率 (%)	年度預 算達成 率(%)	進度 燈號
						預定 (%) (A)	實際 (%) (B)	比較 (%) (B)-(A)	預定 (千元) (C)	實際 (千元) (D)	支用比 (%) (D/C)			
110	客委會	客家文化發展中心南北園區設施管理及擴充計畫 (101/01/01~104/12/31)	公共建設	420,293	總累計	68	66.54	-1.46	1,483,666	1,621,220	109.27	115.85	100.00	◎
					年累計	100	93.04	-6.96	420,293	322,721	76.78	100.00		
111	客委會	客家傳播行銷計畫 (103/01/01~108/12/31)	社會發展	599,726	總累計	16	15.9	-0.10	599,726	588,239	98.08	98.38	98.38	◎
					年累計	100	99.36	-0.64	599,726	588,239	98.08	98.38		
112	客委會	客家文化生活環境營造計畫 (103/01/01~108/12/31)	公共建設	762,608	總累計	10	9.72	-0.28	762,608	692,567	90.82	99.75	99.75	◎
					年累計	100	97.24	-2.76	762,608	692,567	90.82	99.75		
113	臺灣省 諮議會	研究發展及諮詢 (103/01/01~103/12/31)	社會發展	3,746	總累計	100	100	符合	3,746	3,746	100.00	100.00	100.00	◎
					年累計	100	100	符合	3,746	3,746	100.00	100.00		

參、列管案件階段性重要執行成效一覽表
(截至 103 年 12 月底止)

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
智慧綠建築推動方案	內政部	經濟發展	完成智慧建築及綠建築標章或證書評定共 596 案。
污水下水道建設計畫	內政部	公共建設	自 98 年至 103 年 12 月止用戶接管普及率已由 19.50%提高至 37.96%，已提升 18.46%，達成 6 年提升用戶接管普及率 18%之目標。
城鎮風貌型塑整體計畫	內政部	經濟發展	於 103 度完成 181 件補助計畫之核定作業；截至 103 年 12 月 31 日止，共召開 10 次城鎮風貌管考會議及 21 次跨域計畫審查會議。
地籍清理第 2 期實施計畫	內政部	社會發展	一、督導並協助地方政府辦理代為標售作業，已累計辦理標售公告 1 萬 1,069 筆，其中 103 年度已辦理 2,971 筆。 二、督導並協助地方政府清理登記名義人無登載統一編號作業，已累計辦理 13 萬 2,366 筆。
邁向頂尖大學計畫	教育部	社會發展	一、補助學校 102 年度產學合作經費達 192 億元，專利數與新品種數計 1,498 件，智慧財產衍生收入達 4.76 億元。 二、補助學校 102 年共舉辦 665 場國際會議，吸引 9,452 位國外學者來訪，並提供國內 4,464 位學生出國交換學習，就讀學位之國際生 9,394 人，擴大了學生之國際視野。QS(Quacquarelli Symonds)公司排名結果，本計畫獲補助學校已有 11 校進入世界前 500 名並持續進步，其中國立臺灣大學 103 年排名第 76 名，英國泰晤士報 103 年公布公布之亞洲地區前 100 名大學之排名結果，我國共有 13 所大學上榜，國立臺灣大學排名第 14 名；另根據上海交通大學世界大學前 500 大評比，103 年共有 7 校進榜，國立臺灣大學排名第 141 名，為兩岸三地大學之首。
5 歲幼兒免學費教育計畫	教育部	社會發展	一、103 年度就學補助補助經費約 66.64 億元，受益人數達 19 萬餘人。 二、103 年度整體 5 歲幼兒入園率達 96%、經濟弱勢之 5 歲幼兒入園率為 96%；整體 5 歲原住民幼兒入園率為 97%、原住民地區 5 歲原住民幼兒入園率為 98%。 三、103 年度補助經濟弱勢幼兒免費參加公幼課後留園，受益人次約 2 萬 8,000 人次。 四、103 年度補助 22 縣市一般及國幼班地區之公立幼兒園改善教學及環境設備，總計 1,409 園次。 五、103 年度國幼班家長對於幼兒在幼兒園學習成效之整體滿意度達 97.7%。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
優質教保發展計畫	教育部	社會發展	一、臺北市、新竹市、臺南市及高雄市已設立 10 園非營利幼兒園。 二、迄今核定新北市等 14 縣(市)政府增設公立幼兒園(班)計 142 班。 三、補助核定各地方政府轄內公立幼兒園改善環境及設備計約 1,360 餘園。 四、102 學年度全國計約 1,400 餘園幼兒園完成基礎評鑑。
服務業創新研發計畫(SIIR)	經濟部	科技發展	一、103 年度完成受理創新個案計畫申請計 377 案。 二、103 年度核定補助研發個案計畫計 113 案。 三、協助 20 家廠商辦理計畫轉介服務，如 GSP 計畫等。 四、103 年計畫效益計引導受補助業者相對投入研發經費 1.7 億元，協助業者增加營業額 9.3 億元，促成業者增加投資 1.3 億元，增加就業人數 369 人次。
石門水庫及其集水區整治計畫--穩定供水設施及幹管改善	經濟部	公共建設	一、改善尖山中繼加壓站-大湳淨水場鳶山堰取水口原水供應能力提高至 35 萬 CMD 以上，換言之增加原水量 10 萬 CMD，當原水濁度在 8,000~10,000 NTU 出水率約為 50~60%時，經產製後增加 6 萬 CMD 供水量，目前已併入營運中。 二、石門淨水場增設 50 萬 M3 原水蓄水池已全部完工。 三、板新南調桃園送水管(七)及(三)分別於 103 年 3 月 29 日及 31 日竣工。
石門水庫及其集水區整治計畫-緊急供水工程暨水庫更新改善	經濟部	公共建設	一、調查、規劃、試驗及研究-水庫防淤隧道局部水工模型建置及全模型水工試驗各 1 座。 二、中庄調整池工程計畫-中庄調整池-輸水路鋼管 278 公尺、引水路箱涵 310 公尺。
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-台水公司部分	經濟部	公共建設	竹寮集水管已施工完成，準備整體試車。
易淹水地區水患治理計畫-河川排水及事業海堤改善	經濟部	公共建設	已完成 84 件堤防、護岸、抽水站及滯洪池等工程。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
因應貿易自由化加強輔導型產業之共通性輔導計畫	經濟部	科技發展	一、維運 MIT 微笑標章免付費檢舉專線，103 年累計檢舉達 31 案次，並開放 9 線專線電話，受理民眾及業者各式諮詢服務達 4,677 案次。另提供驗證機構諮詢服務 103 年 1~12 月累計達 3,610 案次。 二、「MIT 微笑標章網站」103 年瀏覽人次累計為 184 萬 8,455 人次。 三、MIT 微笑標章印製作業 103 年 1 月至 12 月已完成發放吊牌 2,940 萬 1,503 張及貼紙 1,321 萬 2,943 張，共計 4,261 萬 4,446 張。 四、103 年 MIT 微笑標章民眾知名度調查，知名度達 76.8%、認知度達 69.1%、信賴度達 53.7%、行動度達 40.2%，4 大成效指標皆逐年上升，其中行動度上升幅度較高，較 102 年增加 6%；MIT 微笑標章驗證制度廠商滿意度調查，廠商整體滿意度達 80%，較 102 年增加 2.1%。 五、103 年度完成 20 家次、382 案驗證機構追蹤查核及 8,957 案次各式通路業者市場稽查，合計查核 9,339 案次。 六、103 年度媒合 20 家連鎖通路之 5,706 家門市成為 MIT 微笑協力店，銷售 8,789 款 MIT 微笑標章產品，累計銷售金額達 387 億元。 七、於 Yahoo、Pchome、樂天市場及 Autobuy 設立 4 家 MIT 網路商店，計有 9,156 款 MIT 產品上架，103 年新增上架 3,245 款產品，103 年度累計銷售金額達 328 萬元。 八、完成洛杉磯「華人工商大展」(1/18~1/19)、貴州(貴陽)臺灣品名展(4/30~5/3)及吉隆坡國際禮品及文具展(6/4~6/6) 等 3 場次國外展售會，參展廠商 69 家，參觀人次達 24 萬人次，現場銷售金額 178 萬元，後續商機預估 8,670 萬元。 九、完成加強輔導型產業即時技術輔導 151 案，協助業者增加產值 4.4 億元，降低成本 0.38 億元。
智慧型自動化產業推動計畫	經濟部	科技發展	一、完成拜訪全省北中南東共 12 個工業區服務中心，並於臨海等 5 個工業區舉辦 5 場智慧自動化供需媒合活動，共計 283 家廠商(657 人次)參與，促成 255 件媒合洽談案。 二、完成自動化業者諮詢訪視累計 91 案，並輔導業界開發智慧型自動化設備\產品與建置示範案例共計 27 案，於 103 年共計增加廠商產值新臺幣 4.8 億元、促成投資新臺幣 6.8 億元、降低生產成本 0.5 億元。
機械與系統領域工業基礎技術研究計畫(2/4)	經濟部	科技發展	完成論文發表 41 篇及技術報告 66 篇，分包學界 9 家(金額 405 萬元)，國際合作 3 件(金額 625 萬 5,000 元)，技術移轉 19 件(收入金額 1,780 萬 4,000 元)，委託及工業服務 26 件(金額 4,185 萬 3,000 元)
小型企業創新研發計畫(SBIR)	經濟部	科技發展	小型企業創新研發計畫(SBIR)-截至 103 年 12 月底已完成 961 件小型企業創新研發計畫(SBIR)申請案之審查作業(其中包含 SBIR Phase 1：306 案、SBIR Phase 2：622 案、SBIR Phase 2+：33 案)。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
智慧手持裝置核心技術攻堅計畫(1/4)	經濟部	科技發展	一、智慧裝置核心技術-推動業界衍生科專金額 2 億 8,120 萬元、專利申請 49 件。 二、軟性 AMOLED 顯示器核心技術-推動業界衍生科專金額 14 億 3,580 萬元、專利申請 50 件。 三、人機介面觸控核心技術-推動業界衍生科專金額 8,850 萬元、專利申請 11 件。
石化產業高值化系統技術與應用發展計畫(1/4)	經濟部	科技發展	一、截至 12 月底，已完成論文發表 47 篇，技術授權 48 家，舉辦產業聯結/群聚推動會議 22 場次，帶動產業群聚共計 1,520 人次。 二、協助廠商通過 A+業科計畫通過技術處構想審查 3 項，其中已完成簽約 1 件，並完成產業聯盟籌組 4 項。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	交通部	公共建設	一、機電系統設備（A21 至 A1）已於 103 年 6 月底前全數安裝完成。 二、ME01 標號誌系統動態測試部分，環北站(A21)至新莊副都心站(A4)已於 12 月 26 日完成動態測試，另 A2 至 A21 已於 103 年 12 月 31 日實質完工。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	交通部	公共建設	一、CJ920 區段標 G7 基樁於 103 年 7 月 31 日完成施工。 二、一般場站及路線 103 年 9 月 26 日完成用地交付。
花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫	交通部	公共建設	一、於 103 年 6 月 28 日完成花東鐵路全線電氣化通車之目標。 二、光復、玉里、關山及臺東等 4 座變電站於 7 月 11 日完工。 三、CL113 標鳳林至光復站路段土建工程於 7 月 21 日完工。 四、CL211Z 標瑞穗站至三民站(不含自強隧道)路段土建工程於 8 月 8 日完工。 五、CL212 標隧道上半部開挖截至 10 月 31 日累計完成 2,412 公尺。 六、花東線花蓮至臺東站場(不含瑞穗~關山間)電車線架設工程於 11 月 1 日完工。 七、臺東至知本間正線及花東各站側線(第二階段)電氣化通車路段，於 12 月 31 日准予啟用。 八、花東線(玉里至知本間)電氣化單線區間通訊纜線暨 SMC 電纜線槽(花蓮至知本)新建工程，於 12 月 31 日完工。
高雄市區鐵路地下化計畫	交通部	公共建設	一、於 103 年 4 月 27 日完成愛河過河段三階段河道版施作。 二、於 4 月 30 日高雄車站代辦高雄捷運 R11 永久站月臺層結構施築完成，並交付予高雄市政府捷運工程局進行後續軌道鋪設及切換作業。 三、於 7 月間完成機務段進出庫路線之切換工程，切換完成後高雄車站東側站體與東隧道區段連續壁與中間樁得進場施工。 四、於 10 月 23 日完成愛河段貫通。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線	交通部	公共建設	一、新莊線 CK570J 區段標新莊機廠山岳隧道結構於 103 年 1 月 26 日完成。 二、新莊線 CK570J 區段標新莊機廠維修工廠 B1F 揚水泵浦已於 5 月 25 日組裝完成。 三、新莊線 CK570J 區段標新莊機廠明挖覆蓋隧道結構已於 8 月 31 日完成。 四、新莊線 CK570J 區段標新莊機廠明挖覆蓋延伸段北側隧道結構已於 10 月 10 日完成。 五、低汙染滅火設備材料已進場，本項因受土木未完成油漆作業影響，土木油漆於 10 月中旬完成，並於 11 月 29 日完成組裝。 六、新莊線 CK570J 區段標新莊機廠維修工廠 B1F 空調泵浦組裝已於 11 月 12 日完成。
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫松山線	交通部	公共建設	一、CG590B 區段標龍江路以西路段人行道施作於 103 年 1 月 31 日完成。 二、CG296 標八德路 4 段人行道復舊於 3 月 31 日完成。 三、松山線全系統模擬測試於 3 月 25 日開始。 四、CG591 標軌道工程依規定於 4 月 10 日提報完工。 五、松捷主變電站設備安裝於 3 月 1 日開始。 六、CG590B 區段標敦化北路以東路段人行道施作除臺北市立網球場前方約 40 公尺(南側)配合松捷主變電站施工尚未完成，其餘於 6 月 15 日完成。 七、機電系統動態及整合測試於 4 月 12 日完成。 八、CG590A 區段標道路及人行道於 7 月 9 日復舊完成。 九、CG590B 區段標龍江路至敦化北路路段人行道於 7 月 20 日復舊施工完成。 十、松山線於 11 月 15 日全線通車營運。
台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫	交通部	公共建設	於 103 年 12 月 24 日（A1 標）蘇澳隧道北洞口中央導坑貫通。
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	交通部	經濟發展	一、野柳地區環境及景觀改善工程結案。 二、白沙灣公共設施及景觀改善工程結案。 三、金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程結案。 四、三芝濱海步道工程結案。 五、觀音山步道及公共設施景觀改善工程結案。 六、北海岸自行車系統改善工程結案。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
日月潭國家風景區建設計畫	交通部	經濟發展	一、「環潭遊憩系統公共設施整建工程」於 103 年 7 月 30 日竣工。 二、「全區環境景觀改善」於 103 年 9 月 19 日竣工。 三、「松柏崙至大竹湖步道串聯工程」於 103 年 2 月 11 日竣工。 四、「慈恩塔災修工程」於 103 年 3 月 26 日竣工。 五、「蔣公行館災修工程」於 103 年 10 月 23 日竣工。 六、「日月潭埔里資訊站新建工程」於 103 年 11 月 1 日竣工。 七、「埔里魚池地區景點暨周邊景觀改善工程」於 103 年 10 月 3 日竣工。 八、「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」於 103 年 11 月 30 日竣工。 九、「地利旅遊中心整建工程第一期」於 103 年 12 月 19 日竣工。
阿里山國家風景區建設計畫	交通部	經濟發展	一、完成景點建設牛埔仔青青草原遊憩動線工程等 14 項遊憩設施工程。 二、103 年阿里山國家風景區遊客量達 393 萬人次。 三、103 年下半年阿里山國家風景區遊客滿意度達 82.6 分。
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(交通部公路總局部份)	交通部	公共建設	辦理省道道路水土保持及路面維護道路水土保持及路面維護 1000 平方公尺。
環島鐵路整體系統安全提昇計畫	交通部	公共建設	一、二層行溪橋-東正線於 102 年 12 月 29 日切換完成，西正線於 103 年 1 月 13 日切換完成，並於 103 年 4 月 9 日申報竣工。 二、南太麻里溪橋已於 103 年 11 月 11 日及 12 日完成切換。
長照服務網計畫	衛福部	社會發展	一、於 103 年 6 月核定 23 個失智症服務據點。 二、於 103 年新增偏遠(含山地離島)及長照資源不足地區長照服務據點 16 家。
保母托育管理與托育費用補助	衛福部	社會發展	103 年度於全國 22 個直轄市、縣(市)成立 70 個(處)社區保母系統，截至 12 月底止，社區保母系統之保母數為 4 萬 1,744 人，在職保母數為 3 萬 7,594 人，托嬰中心保母數 3,295 人，合計受托幼童數為 7 萬 3,218 人。
第三期國家癌症防治計畫	衛福部	社會發展	持續透過健保特約醫療院所，全面提供民眾子宮頸癌、乳癌（含 40-44 歲高危險群）、大腸癌及口腔癌篩檢服務，共計提供 502.4 萬人次，發現癌症病變約 4.6 萬名及癌症約 1 萬名。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
強化國民年金保險制度	衛福部	社會發展	一、督導勞工保險局辦理國民年金老年基本保證年金及身心障礙基本保證年金之給付業務，103 年度受益或服務對象人數 74 萬 9,935 人。 二、督導勞工保險局辦理國民年金保險老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、遺屬年金給付及喪葬給付之給付業務，103 年度受益或服務對象人數 67 萬 320 人。
預防保健服務計畫	衛福部	社會發展	一、103 年 1 月至 9 月兒童牙齒塗氟服務人次 68 萬 4,453 人次，3 至 5 歲兒童至少一次牙齒塗氟利用率為 79.3%。 二、截至 103 年 12 月底止參加本服務方案之醫師服務涵蓋率約 77.4%之 7 歲以下兒童(以 102 年兒童預防保健服務量計算)；自本方案開始推動至 103 年 6 月止，已有 18 萬 5,000 名兒童及家長受惠。 三、103 年接受孕婦產前健康照護衛教指導服務方案教育訓練之醫師服務涵蓋率約 66.8%之孕婦。 四、103 年 1 月至 9 月成人預防保健服務申報人數為 153 萬人。
友善關懷老人服務方案第二期計畫	衛福部	社會發展	一、培訓失智症守護天使 5,000 人。 二、新增社區照顧關懷據點 100 點，並補助購置低地板公車 100 輛。 三、補助設計銀髮族專屬資通訊設備研究計畫 20 件。 四、補助民間辦理老人社團活動 700 案。 五、開設數位學習課程 110 班及辦理樂齡學習活動及研習 3 萬 1,783 場次。
父母未就業家庭育兒津貼實施計畫	衛福部	社會發展	辦理育兒津貼補助-受益或服務對象人數 24 萬 9,099 人。
推動長期照顧服務機制	衛福部	社會發展	103 年度提供失能老人多元長期照顧服務計 11 萬 4,482 人，並結合民間資源辦理長期照顧服務人員專業訓練 3,744 人次，辦理照顧服務管理資訊系統教育訓練 1,413 人次。
國民心理健康促進計畫	衛福部	社會發展	一、促進全民心理健康-辦理安心專線服務 7 萬 3,309 人次。 二、落實精神疾病防治與照護服務-追蹤關懷社區精神病人平均年訪視次數 4.15 人次。 三、強化成癮防治服務-指定藥癮戒治機構逐年共累計 158 家，並提升替代治療個案留置率為 60.99%，提供鴉片類物質成癮者替代治療服務累計 4 萬 1,017 人。 四、加強特殊族群處遇服務-家庭暴力及性侵害加害人社區處遇執行率為 99%，並提供男性關懷專線服務累計 1 萬 8,457 人次。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
重建食品藥物安全（清雲行動五五方案）計畫	衛福部	社會發展	一、10月13日發布「103年6月份禽畜水產品殘留動物用藥聯合稽查成果」，共計抽驗86件市售蛋品針對雞蛋、鴨蛋及液體蛋進行檢驗，檢驗結果有74件與規定相符（合格率86%），12件檢出殘留動物用藥不符合規定，相關結果已立即通知農業單位及抽樣衛生局，依法進行後續處理。 二、10月29日發布執行103年度市售及包裝場農產品殘留農藥監測計畫成果，8月份共抽驗農產品184件，檢驗結果有164件與規定相符（合格率89.1%）。不符規定之20件農產品均立即通知衛生局追查來源並副知農政單位，依法進行後續處理。 三、11月14日發布103年度7-8月份禽畜水產品殘留動物用藥聯合稽查，共計抽驗176件市售禽畜產品成果。 四、9月11日發布103年針對高雄屏東地區產品監測禽畜水產品45件、五穀雜糧31件，蔬果類22件及加工食品22件，共計120件。於7月28日確認1隻鴨檢出戴奧辛當量濃度15.1皮克/克脂肪，超過管制標準(1.75皮克/克脂肪)，即刻於7月29日召開農委會、環保署及衛福部三部會署緊急應變會議，並擴大調查8家養殖場之鴨隻、飼料及周遭環境等，並由地方政府進行必要之移動管制，該8場調查結果均未發現超標。 五、12月24日發布103年度市售及包裝場農產品殘留農藥監測結果，103年度共抽驗農產品2,402件，結果有2,145件符合規定，合格率为89.3%。 六、12月29日發布市售食品真菌毒素含量監測計畫抽驗結果：103年下半年共抽驗食品11類217件，其中212件檢驗合格(合格率为97.7%)。 七、劣質豬油處理情形：「食品安全衛生管理法」部分條文修正草案已於103年11月18日經立法院三讀通過，並提出八項強化食品安全措施包括：加重刑責罰金、提高檢舉獎金、中央檢舉專線、油品分流管制、廢油回收管理、落實三級品管、食品追溯追蹤及食品GMP改革。
文化創意產業發展（第二期）第三次修正計畫	文化部	經濟發展	臺中文化創意產業園區統計至103年12月31日止，辦理444場活動，入園人數達60萬9,000餘人（已超越去(102)年總人次52萬7,847人）。（含委外展館部份總計辦理528場活動，達80萬1,000餘人）。
臺中大都會歌劇院興建計畫	文化部	公共建設	完成建築裝修、特殊設備及景觀工程及設備測試-活動中心1處。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
歷史與文化資產維護發展(第二期)計畫	文化部	經濟發展	一、完成高雄市市定古蹟打狗公學校(旗津國小)、基隆市定古蹟市長官邸及歷史建築南投稅務出張所修復工程等古蹟、歷史建築、文化景觀及聚落之文化資產保存維護5處。 二、無形文化資產與保存技術推廣計畫受益或服務對象人數28萬9,700人。 三、辦理歷史文化場域保存活化計畫34案及辦理文化資產人才培訓958人。
辦理職業訓練，協助勞工提升職場所需之能力	勞動部	社會發展	一、辦理就業導向職前訓練，累計訓練5萬3,655人。 二、辦理產業人才投資方案，累計協助在職勞工8萬1,012人參訓。 三、辦理「企業人力資源提升計畫」，已完成結案核銷作業達1,024案。 四、辦理訓練品質系統(TTQS)輔導、評核及教育訓練等業務服務，合計2萬403人時，並提供教育訓練服務1,843人次。
辦理多元就業開發方案及推動培力就業計畫，促進社會企業的發展	勞動部	社會發展	一、辦理多元就業開發方案：核定民間團體計畫案量582案，受益或服務對象人數為4,382人，並提供進用人員教育訓練平均時數66.5小時。 二、推動培力就業計畫：輔導民間團體發展社會企業14案，受益或服務對象人數1,127人。
智慧電子國家型科技計畫	科技部	科技發展	一、醫療電子分項-發展智慧電子關鍵技術綱要計畫：完成7篇論文(國內3篇,國外4篇)，研究報告11篇，技轉及委託工服計7件，金額374萬8,438元，促成9家廠商投資金額3,072萬8,000元。 二、綠能電子分項-發展智慧電子關鍵技術綱要計畫：完成論文發表14篇，專利申請17篇，技術移轉/服務共4,856萬4,904元。 三、本計畫已促成上、下游廠商成立5件研發聯盟，新增1個聲學感測元件事業部及1條側進音MEMS麥克風封測生產線，另有89位廠商核心工程師投入計畫研發，學術界培育產業所需之高科技人才29人(包含博士生9位及碩士生20位)，並產出國內外專利14件以及國內外論文著作12篇等學術科技成就。
第二期能源國家型科技計畫	科技部	科技發展	一、發表國內外期刊論文1,885篇，並培育研究生1,546人。 二、取得國內外專利獲證484件，申請中469件。 三、辦理技術移轉275件，獲得權利金2億1,461萬8,000元。 四、促進廠商投資生產及研發經費258億3,144萬元。 五、創業育成3家，並促進798人就業。

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
資源永續循環利用推動計畫	環保署	社會發展	興設離島地區生質能源中心-地方生質能源中心計畫 103 年度總計補助 8,06 萬 9,000 元轉運 2 萬 7,700 噸垃圾，103 年垃圾妥善處理率達 98.97%。
故宮南部院區籌建	故宮	公共建設	一、建築工程（含景觀橋）：完成橋體結構現場吊裝。 二、博物館軟體建置：累計完成圖書編目 7,957 冊、累計購得圖書 2,114 冊，累計文物購藏 1,638 件。
調整耕作制度活化農地計畫	農委會	經濟發展	一、本計畫活化休耕農地，鼓勵轉(契)作進口替代、具外銷潛力、有機及地區特產作物，並給予轉(契)作補貼，整體推動面積為 12.5 萬公頃；其中推動契作進口替代作物(硬質玉米、大豆、小麥、原料甘蔗、短期經濟林、牧草及青割玉米等)面積 3 萬 697 公頃。 二、配合計畫推動小地主大佃農政策，截至 103 年 12 月底，大佃農總經營土地面積為 1 萬 5,024 公頃。 三、103 年種植綠肥或辦理生產環境維護措施，發放直接給付，整體推動面積 10 萬公頃。 四、103 年活化休耕地，復耕種植水稻及各項轉(契)作物增產約 127.5 萬公噸。 五、本計畫落實將休耕給付轉為具農業生產價值之轉(契)作補貼，推估創造農業及周邊產業發展等整體產值效益達 182 億元。
穩定肥料及相關資材供需計畫	農委會	經濟發展	一、迄 103 年 12 月份 10 種主要化學肥料補貼農民漲幅價差每包(40 公斤)31 元至 157 元不等，經本計畫執行補貼作業後，國內農民購肥價格穩定，確已減輕農民農業生產成本之負擔。 二、本計畫實施後國內化肥施用量逐年已呈遞減趨勢。(97 年 101.4 萬公噸，98 年 104.2 萬公噸，99 年 103.1 萬公噸，100 年 100.8 萬公噸，101 年 101.1 萬公噸，102 年 100 萬公噸、103 年約 98 萬公噸)。 三、迄 12 月底累計約 1,688 個經銷點完成資訊化工作，自 104 年 1 月 1 日起，已全面推行農民購買補貼肥料以身分證統編登錄新措施，促進補貼作業資訊化。
漁業多元化經營建設	農委會	經濟發展	一、沿近海漁業永續經營-辦理漁業之監控、管制及調查 5 萬筆、魚苗放流 1,046 萬尾及漁船筏收購 57 艘。 二、促進養殖漁業與環境和諧-陸上及海洋養殖區養殖公共設施整建 12 處。 三、振興漁港設施機能-辦理漁港疏浚、防減災工程等 13 港次、漁港多元化營造 5 項及維護漁港功能與適正建設 10 港次。 四、石斑魚及其他養殖產業-石斑魚產值增加至 76 億元(其中出口值達 53.2 億元)及輔導漁船運搬養殖

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
			活魚作業 927 航次。
休閒農業加值發展	農委會	經濟發展	一、完成 103 年度在學學生產學合作(暑期實習、三明治教學、長期契約及雙軌制)需求調查，共計 38 家農場釋出 342 個實習名額，已媒合 144 位學生於 17 家農場辦理產學合作；完成 103 年度就業媒合徵才調查，共計 36 家農場釋出 317 個職缺，已媒合 75 位新進人員於 18 家農場工作。辦理農民學院及從業人員職能訓練 4 場次，計 121 人次參加。完成農業專業導遊培訓 4 場次，計 225 人次參與。 二、休閒農業旅遊資訊平臺(農業易遊網)已完成英日語版網站之建置及農旅玩家 APP 改版，並辦理網路行銷推廣活動 4 場次，新增特色遊程中英雙語影音導覽 20 則、語音導覽 30 則，提供國內外遊客更便利之查詢服務。 三、參加香港、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、大陸上海、泰國及日本東京等 14 場國際性旅遊展會及臺北國際旅展共 6 次國內旅展行銷推廣，完成新加坡、港澳、大陸、印尼及菲律賓旅行業者或媒體等參訪國內休閒農業旅遊場域 25 團次，國外交流推廣會 28 場次。
生態旅遊系統建置發展	農委會	經濟發展	一、完成森林遊樂區公共服務設施及景觀改善工程 8 件，步道整理修建及改善維護工程 16 件，累計 103 年度整建維護步道 90 公里。 二、完成森林遊樂區公共服務設施及景觀改善 102 年度保留工程共 12 件，步道整修及改善維護 102 年度保留工程共 10 件。 三、推展 8 處自然教育中心，辦理各項生態旅遊、環境解說、教育訓練及推廣行銷活動 135 場次，累計 103 年度提供森林生態旅遊人數約 514 萬人，創歷年新高，並提供約 11 萬人優質森林環境教育機會。 四、奧萬大自然教育中心榮獲第三屆國家環境教育獎南投縣機關組特優及南投縣綠色觀光評比環保資源回收績優單位之肯定。 五、知本國家森林遊樂區日前榮獲內政部 103 年度友善建築獎，獲選為「遊憩場所」類別「友善建築」之殊榮。園區內無障礙步道約 1,000 公尺，並提供 4 種不同之無障礙遊程，讓身心障礙者、銀髮族、娃娃車及輪椅族有更安全、方便之遊憩空間。 六、自 101 年 7 月著手進行阿里山國家森林遊樂區祝山林道人車分道整建工程，繼第二期工程獲得農業委員會 102 年度優良農建工程-優等獎後，第三期工程再度榮獲 103 年度優良農建工程-優等

計畫名稱	主管機關	計畫類別	重要執行成效
			獎。
屏東農業生物科技園區	農委會	經濟發展	第3期標準廠房第2標工程之動物舍、疫苗廠房完成周邊道路AC鋪設、室內裝修、屋頂防水、景觀植栽等，已於103年12月29日陳報竣工。
強化農產品全球市場深耕計畫	農委會	經濟發展	103年1月至11月農產品出口值為48.8億美元，較102年同期成長4.5%。
植樹造林計畫	農委會	公共建設	加強造林-推動植樹造林面積1,396公頃前期山坡地及平地造林撫育面積4萬8,933公頃、培育苗木400萬株。
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(農委會水土保持局部分)」	農委會	公共建設	一、103年原核定18處工程已全部驗收。 二、完成防災資訊調查更新8處、土石流警戒值更新6區及多元尺度環境調查3處。 三、山坡地違規開發查通報35處。 四、102年度保留工程全部完工及驗收。
「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(農委會林務局部分)」	農委會	公共建設	一、租地補償收回99年至103年12月底累計收回375.62公頃。 二、林班地治理(含造林)-野溪整治、崩塌地整治及植生截至12月底累計完成222處。
原住民族社會安全發展第二期四年計畫	原民會	社會發展	一、103年由原住民就業服務專員(100名)提供陪同求職者面試7,943人/次、媒合成功3,096人/次、追蹤關懷後續輔導3萬6,351人/次、推(轉)介就業媒合7,528人/次、推介參加職業訓練結訓1,271人/次、穩定就業3個月4,392人/次。 二、103年12月行政院暨所屬機關(構)學校應進用原住民1,699人，實際為1萬993人。得標廠商應進用8,236人次/月平均，實際為1萬6,478人次/月平均。 四、核定補助12縣市政府設置99站原住民部落老人日間關懷站，聘用342位服務員；補助14縣市政府設置55處家庭暨婦女服務中心進用186位原住民社工員。 五、截至103年10月補助原住民健保費，受益原住民55萬2,248人次。 六、截至103年12月底前核發10月原住民給付人數3萬4,836人。

肆、落後案件執行情形及原因分析表

(截至 103 年 12 月底止)

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
大故宮計畫	故宮	總累計	100	48	落後 52.00	5,000	0	0.00	0.00	0.00
		年累計	100	48	落後 52.00	5,000	0	0.00		
執行情形	一、綜合規劃依原經建會意見需待環評結果確認後始能再辦理。有關環評作業進入第 2 階段審查程序，環保署已於 103 年 6 月 9、16、23 日及 7 月 1 日召開 4 次範疇界定會議，為趕辦進度，已於 7 月 28 日開始進行調查，12 月份仍持續進行相關調查，後續將依範疇界定會議所確認之調查項目、調查頻率及其他應辦事項進行相關作業。 二、103 年 12 月份無辦理國際競圖相關前置作業，需俟綜合規劃奉院核定後始進行國際競圖相關作業。									
重要成果	無。									
落後原因	環評報告未完成審議，因環評因素無法提送綜合規劃報告予行政院審查，進而影響後續新興立案時程及國際競圖相關作業。									
因應對策	一、因 102 年數件經環保署審查通過環評之開發案，因行政法院認為有進入較嚴格之第 2 階段環境影響評估需要，故撤銷其「環評通過」之決議。行政院環境保護署為因應行政法院之判決，並加強公民參與及避免爭議，傾向將民眾有疑義之開發案皆要求進入較嚴格之第 2 階段環評，故本計畫環評說明書經環保署 102 年 12 月 25 日會議決議直接進入第 2 階段環評。 二、因第 2 階段環評之環境調查時空、範圍及標準，皆較第 1 階段環評作業不論廣度與深度均有所擴充且更為提高，故需時較長，現戮力趕辦作業，期能於最快時間內依環評程序送環評審議。									
管考建議(國發會)	本計畫目前尚在辦理第 2 階段環境影響評估作業，整體進度及預算支用情形大幅落後，請主辦機關 104 年 2 月底前於因核定免予評分需提交執行現況報告中，進一步說明調查範圍、標的、項目、頻率及其他應辦事項等內容，並預先規劃排定審議作業時程，俾利後續進度管控。									

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
臺北捷運系統環狀線 建設計畫(第 1 階段路 線)	交通部	總累計	100	76.42	落後 23.58	32,036,685	29,724,737	92.78	96.37	96.37
		年累計	100	21.41	落後 78.59	8,713,000	6,401,052	73.47		
執行情形	一、土木細設標各項細設作業施工中服務。 二、土木工程施工： (一)CF640 區段標：排水箱涵、潛盾隧道、明挖覆蓋隧道、車站及高架段橋樑結構工程，機廠則進行土方開挖、結構及鋼構吊裝等工作。 (二)CF650 區段標：管線遷移、新建箱涵施築、車站出入口及站體結構、高架段橋樑結構及鋼構件吊裝等工作。 (三)CF660A 區段標：管線遷移、聯開共構連續壁、高架段橋樑結構及新設匝道基樁基礎施作。 (四)CF660B 區段標：管線遷移、排水箱涵施築、車站出入口結構、高架段橋樑結構施作等工作。 三、機電工程細部設計及文件審查：機電系統標細部設計文件送審，電聯車子系統合格測試、機電系統設備製造、廠測。 四、土地取得作業： (一)中和區徵收地上權及所有權：新北市政府已於 103 年 12 月 29 日及 30 日辦理補償費發放作業。 (二)板橋區徵收地上權：新北市政府已於 103 年 12 月 26 日辦理補償費發放作業。 五、工務行政：工務行政及準備金支付。									
重要成果	一、土木細設標各項細設作業-進行土木細部設計施工中服務 1 案。 二、土木工程施工-土木工程查核點施作 7 項。 三、機電工程細部設計及文件審查-機電工程查核點施作 5 項。 四、土地取得作業-用地取得查核點施作 3 項。 五、工務行政-工務行政及準備金支付作業 1 案。									
落後原因	一、CF640 區段標：機廠受古蹟、劉氏家廟及斯馨祠(碑)等影響造成停工，工區發現契約圖未標示之排水箱涵，需配合辦理遷移，並施作臨時箱涵及吊掛保護作業，影響施工進度。 二、CF650 區段標：基礎位置位於未徵收之私有地上，需進行土地徵收，在未完成徵收前高架橋基樁無法施工。									

	三、CF660B 區段標：基礎結構與臺電高低壓、161KV 特高壓、自來水 ψ200 管路及瓦斯 ψ250 管路位置衝突，以及部分基樁與現有中正路匝道橋介面施工衝突，致機具無法安置施工，影響中正路匝道拆除及後續橋墩工程進度。 四、CF660A 區段標：受文化路 1 段及民生路 3 段部分管線尚未遷移影響，致進度稍有落後。 五、電聯車 DDR 文件提送及合格測試、供電及機廠設備 DDR 文件提送未能如期完成、通訊製造作業未能如期開始。
因應對策	一、CF640 區段標目前古蹟、家廟等地上物等及箱涵已遷移施作完成，但已對進度造成影響，施工廠商提報加速施工計畫，並依契約提出工期展延調整施工進度。 二、CF650 區段標：臺北市政府捷運工程局路權室已於 103 年 5 月 16 日辦理設定地上權及協議價購會議，民眾 103 年 7 月 21 日前未申請辦理設定地上權及協議價購相關手續者，已改採徵收方式辦理，現正辦理相關程序，預計 104 年 1 月底前完成移轉登記。 三、CF660B 區段標(1)迴避 161KV 特高壓衝突，調整基樁或墩柱位置，臺電高低壓管線委由臺電公司遷入共同管溝，配合現地基樁施工分階段進行第 2 階段交維改道，縮短影響時程，並調整增加機具進行基樁施工。(2)瓦斯及自來水已埋設完成。廠商已增加機具進行基樁趕工，並進行基礎開挖。(3)臺北市政府捷運工程局已要求廠商增加工班進行大漢溪跨越橋基礎、墩柱及鋼橋吊裝。 四、CF660A 區段標：積極協調管線單位配合儘速完成管線遷移作業，並督促廠商全力趲趕工進。 五、廠商提出電聯車進度落後追趕計畫之時程目標，來追趕電聯車要徑工項之負浮時降到 30 天以內，臺北市政府捷運局在月進度追蹤列管，要求廠商改善並追趕 DDR 文件送審進度，每月檢討廠商追趕成效。
管考建議(國發會)	一、本計畫修正計畫遲未獲院核定，且計畫實際進度推展速率緩慢，致落後幅度持續擴大，請針對進度落後工項加強督導承商積極趲趕工進。 二、本計畫年累計支用比 73.47%，已執行應付未付數達 19.96 億元，較上月增加 11 億餘元，請督促承商儘速提出計價資料請款，並完成經費核撥作業。 三、本計畫土地取得作業查核點進度落後，請確依預定完成時程加強管控土地徵收辦理進度。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
流域綜合治理計畫-農 田排水	農委會	總累計	17.2	0	落後 17.20	255,000	11,282	4.42	13.59	13.59
		年累計	100	0	落後 100.00	255,000	11,282	4.42		
執行情形	103 年度農田排水治理及改善工程共計核定 14 件工程，截至 12 月底完成發包 13 件；農業水井複查作業執行計畫書已核定，現二縣府正辦理相關招標作業。									
重要成果	無。									
落後原因	流域綜合治理計畫第 1 期(103-104 年)特別預算案，已於 103 年 5 月 30 日立法院三讀通過，因預算經費尚未支用，故執行進度落後。									
因應對策	已辦理計畫相關先期作業等程序，將儘速趕辦。因立法院通過時程較晚，為符合計畫管考期程，已提出調整需求。									
管考建議(國發會)	本計畫預算係屬特別預算，對 103 年度經費無預算保留程序待辦；104 年度預算業經立法院三讀通過、總統公布，分月預算亦已獲行政院主計總處審核同意，請計畫主辦機關充分運用 104 年度完整年度可執行期程，加速辦理。									

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
輔導原住民產業發展	原民會	總累計	50	36.51	落後 13.49	388,200	199,129	51.30	51.18	51.18
		年累計	100	46.5	落後 53.50	332,200	65,778	19.80		
執行情形	一、建立跨域合作機制：跨域合作計畫業於 103 年 8 月份啟動，並於 103 年 12 月 8 日至 9 日召開產業示範區三年推動計畫審查會議，並責成專案辦公室依國家發展委員會意見落實各計畫跨域資源整合部分。 二、原住民族創意經濟研發加值與應用： (一)原住民族經濟產業資訊網初步架構業經討論，預計 104 年度完成第 1 階段建構事宜。 (二)傳統智慧創作保護專案辦公室勞務採購尚在招標程序中。 (三)103 年度未辦理產業政策及應用研究計畫。 (四)因傳動智慧創作保護專案辦公室尚未成立，故數位典藏庫業務未執行。 (五)完成印製部落旅遊宣傳摺頁 4 式及手札 1 本。 三、原住民族知識發展創意經濟計畫-選定產業示範區（與農委會、文化部、交通部觀光局共同辦理）：103 年 12 月 8 日至 9 日完成 14 件產業示範區先期規劃執行單位所提三年推動計畫審查會議，審核通過 10 件計畫，自 104 年度起執行。另因政策變更，104 年度不受理先期規劃計畫。 四、原住民族知識發展創意經濟計畫-建構產業營運平臺： (一)招標情形：本案業於 103 年 5 月 7 日至 5 月 26 日上網招標，於 6 月 4 日辦理評選會議，6 月 17 日決標。 (二)營運會報：於 7 月 16 日、8 月 14 日、9 月 2 日及 10 月 8 日、11 月 28 日召開 5 次營運會報。 (三)推廣活動：截至 103 年 11 月 30 日止，總計辦理 9 場次活動，包括阿優依開幕記者會、臺北國際旅展、南京臺灣名品展、北京臺灣名品展、北京參訪團會前展、2014 年微型企業創業楷模頒獎典禮及鳳凰商展、2014 第 1 屆原遊會【原湯樂遊。部落樂活】開幕式暨溫泉成果發表記者會 2 場 DIY 體驗活動等。 (四)情境佈置：9 月及 12 月份主題展覽分別以「歡迎來我家坐坐」及「來自山林溫暖的呵護」為題進行情境式佈展，合計 2 場次。 (五)各期撥款：10 月 3 日撥付第 1 期款。 五、原住民族知識發展創意經濟計畫-建構產業營運平臺(南澳泰雅文化園區計畫)：「南澳泰雅園區規劃案－願景規劃及可行性評估報告」(修正版)於 104 年 1 月 5 日報會，刻正審核中。 六、原住民族知識發展創意經濟計畫-培育產業人才：本案業於 103 年 10 月 8 日至 10 月 27 日上網招標，於 11 月 3									

	日及 21 日辦理評選會議及決標，刻正辦理細部執行計畫書調整、說明會籌備及計畫行銷宣傳等事宜。
重要成果	一、建立跨域合作機制-辦理業務研討會、座談會 4 場次。 二、原住民族創意經濟研發增值與應用：辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)4 場次；辦理業務研討會、座談會 1 場次；印製宣導品 5 份；修訂法規 2 則。 三、原住民族知識發展創意經濟計畫-選定產業示範區（與農委會、文化部、交通部觀光局共同辦理）：辦理業務講習會 6 場次(223 人)；辦理補助地方政府計畫 21 案及業務查訪 8 場次；輔導縣市及社區 105 場次。 四、原住民族知識發展創意經濟計畫-建構產業營運平臺：辦理營運平臺推廣活動 9 場、原住民產品拓銷據點內部主題式情境佈置 2 場及原住民族產業品牌輔導及諮詢服務 10 案。
落後原因	一、依國發會審查中長程計畫之綜提意見，產業示範區計畫 103 年度僅得執行第 1 階段先期規劃，故第 2 階段推動計畫(含資本門經費)未能執行。 二、南澳泰雅園區案，因地方協調未取得共識，宜蘭縣政府於 104 年 1 月 5 日甫提出「願景規劃及可行性評估報告」(修正版)報會，故原編經費全數未執行。 三、「建構產業營運平臺」原訂 103 年 2 月 1 日辦理公開招標，惟因內部調整修正計畫招標文件，致實際於 5 月 7 日辦理招標，爰計畫整體期程往後推延約 3 個月。 四、「培育產業人才」原訂於 3 月 31 日前辦理上網招標作業，因機關內部重新研議計畫內容，至 10 月份辦理招標作業，延後計畫執行期程約 6 個月。 五、因傳統智慧創作保護專案辦公室勞務採購尚在招標程序中，故業務檢討會及數位典藏庫未及於 103 年辦理。
因應對策	一、產業示範區計畫依國發會綜提意見積極趕辦各示範區推動計畫報院審議事宜。 二、南澳泰雅園區規劃案，預定於 104 年 1 月 14 日召開審查會議。 三、產業營運平臺及培育產業人才案，積極依招標需求趕辦。 四、完成傳統智慧創作保護專案辦公室勞務採購決標作業後，積極趕辦 103 年度未及完成事項。
管考建議(國發會)	總累計執行進度落後 13.49%，年累計支用比 19.80%，本計畫雖已奉核定同意 103 年免予評分，惟仍請積極完成未盡事宜，並於 104 年 2 月底前提報執行現況。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
臺中都會區大眾捷 運系統烏日文心北 屯線建設計畫	交通部	總累計	66.92	58.5	落後 8.42	13,673,299	6,770,577	49.52	94.91	94.91
		年累計	100	70.46	落後 29.54	9,499,108	2,596,386	27.33		
執行情形	一、用地取得： (一)CJ920 區段標路線轉彎段(松竹路轉北屯路)施工用地迄今仍尚未取得，已影響既定里程碑交付時程，施工廠商已自 103 年 3 月 10 日起提報部分停工迄今，本用地依臺中市政府捷工處規劃，協調私地主同意以租用土地方式進行施工。 (二)CJ930 區段標筏子溪箱涵段及 G13 站(出入口)至 G16 站(出入口)施工用地部分尚未取得，已影響既定里程碑交付日期，施工廠商已自 102 年 10 月 15 日起提報部分停工迄今。									
	二、土木工程： (一)CJ910 區段標(北屯機廠、G0 站及全線軌道區段標工程)：101 年 12 月 31 日開工，惟開工後施工廠商進場施工受居民阻撓且工區內尚有住戶未遷出，致辦理工程停工至 102 年 7 月 23 日復工。本項停工案(含颱風免計工期 2 天)影響計 204 天，辦理第 1 次工期展延，並簽奉核定在案，展延後本區段標竣工日為 107 年 6 月 26 日。另為降低停工影響，本標目前積極辦理預埋管線、污水管、排水箱涵、擋土牆、明隧道、高架橋、北駐車廠、主維修廠、主變電站及行政大樓等施工作業中。 (二)CJ920 區段標(G03 至 G09 站及全線環控監控系統區段標工程)：102 年 3 月 15 日開工，目前進行高架橋之井式基礎、墩柱及帽梁等下部結構工程，預鑄 U 型梁生產及吊裝、場鑄梁等上構作業於 103 年 4 月份開始進行，另懸臂工法梁、連續鋼箱梁、車站鋼帽梁等亦於 103 年 5 月份啟動施工作業；惟本標路線轉彎段(松竹路轉北屯路)施工用地因延遲交付，導致施工廠商已自 103 年 3 月 10 日起提報部分停工迄今，已影響既定里程碑交付時程，目前本用地已由臺中市政府捷工處協調私地主同意租用。 (三)CJ930 區段標(G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程)：102 年 3 月 1 日開工，依施工作業進行圍籬佈設含交維設施、全套管基樁、基礎開挖擋土支撐、下部結構(墩柱、帽梁)、G10a、G12 及 G14~G16 車站帽梁軌道梁吊裝、筏子溪箱涵段等施工，另預鑄場已設置完成進行 U 梁生產作業中，迄 103 年 12 月 27 日已完成 178 支 U 梁吊裝作業；惟本標筏子溪箱涵段及 G13 站(出入口)至 G15 站(出入口)施工用地部分尚未取得，已影響既定里程碑交付日期，施工廠商已自 102 年 10 月 15 日起提報部分停工迄今。									
	三、機電工程 (一)99 年 12 月 6 日辦理本標第 3 次公告招標，100 年 3 月 9 日決標，100 年 4 月 1 日簽約，100 年 4 月 21 日開工日，預計 106 年 10 月 3 日實質完工。 (二)依契約提供開工後，60 天、90 天及 120 天機電參數予土建細部設計顧問作業。 (三)本工程契約金額約為 55 億 2,226 萬元及美金 1 億 8,529 萬元，總計約為新臺幣 109 億 800 萬元，目前已依契約完成 3 階									

	段預付款支付作業，合計約新臺幣 33 億 342 萬元。 (四)本工程電聯車、行車監控及機廠維修設備系統正進行概念設計(CDR)送審作業，另供電、通訊及自動收費系統則已進入細部設計(DDR)送審階段。
重要成果	一、CJ920 區段標 G7 基樁於 103 年 7 月 31 日完成施工。 二、一般場站及路線 103 年 9 月 26 日完成用地交付。
落後原因	一、CJ920 區段標路線轉彎段(松竹路轉北屯路)施工用地迄今仍尚未取得，已影響既定里程碑交付時程，施工廠商已自 103 年 3 月 10 日起提報部分停工迄今。CJ930 區段標筏子溪箱涵段及 G13 站(出入口)至 G16 站(出入口)施工用地部分尚未取得，已影響既定里程碑交付日期，施工廠商已自 102 年 10 月 15 日起提報部分停工迄今。 二、本計畫機電系統標案於 99 年 8 月 26 日開啟標封，因投標家數不足三家，宣告流標，流標後依採購法檢討相關規定，99 年 9 月 17 日辦理第 2 次招標、99 年 11 月 30 日均無廠商符合資格標規定，當場宣佈廢標。99 年 12 月 6 日重新辦理第 3 次招標作業，目前機電工程已於 100 年 3 月 9 日由川崎重工業株式會社/法商阿爾斯通運輸股份有限公司/中鼎工程股份有限公司共同投標商得標，並於 100 年 4 月 21 日開工，較原計畫 98 年 5 月 15 日開工時程落後約 23 個月。 三、臺中交通局 103.6.5 行動不便及防災計畫第 1 次聯審委員會結論：本次審查就捷運車站不同類型之捷 G0、捷 G4、捷 G7 等 3 站審查，本案防災計畫均未通過。
因應對策	一、CJ920 區段標路線轉彎段(松竹路轉北屯路)施工用地，依臺中市政府捷工處規畫，協調私地主同意以租用土地方式進行施工。 二、臺北市捷運局已採各項積極作為如規劃先期工程，調整原計畫里程碑等方式因應，惟因計畫時程目前已大幅度落後，勢已無法依原訂計畫時程於 104 年 10 月通車，經北市捷運局於交通部重大工程督導會報提報，並依高鐵局 102 年 6 月 17 日專案會議紀錄，以 103 年 4 月取得用地為基礎評估對整體計畫時程之影響，已於 102 年 7 月 22 日將評估後之修正時程提報高鐵轉交通部，依現況完工時程為 107 年 12 月，將配合交通部高鐵局、臺中市政府檢討修正內容與時機，以利整體計畫時程合理之控管。 三、「特種建照取得」部分，須具備「防災計畫」及、「行動不便者使用設施設置計畫」，防災計畫因第 1 次委員會未通過，後於 103 年 9 月 11 日召開第 3 次委員會，會中經與會委員原則同意修正後通過。
管考建議(國發會)	一、本計畫 103 年第 4 季起計畫實際進度推展速率緩慢，致落後幅度持續擴大，請針對進度落後工項加強督導承商積極趕工進。 二、本計畫年累計支用比 27.33%，請督促承商儘速提出計價資料請款，並完成經費核撥作業。 三、本計畫因部分用地未取得，致「CJ930 區段標主線段全套管基樁全部完成」、「CJ901 標軌道鋼軌材料進場」查核點進度落後，請積極因應辦理，追趕落後進度。 四、本計畫已無法於計畫期程 105 年 10 月 31 日前完成，請儘速協調提報修正計畫，並循序完成報核程序。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
漁業多元化經營建設	農委會	總累計	50	45.02	落後 4.98	2,064,696	1,417,148	68.64	77.94	77.94
		年累計	100	83.8	落後 16.20	1,566,155	918,607	58.65		
執行情形	一、沿近海漁業永續經營： (一)魚苗放流計畫已核定，持續辦理相關事宜，已放流 1,046 萬尾魚苗。 (二)已核定沿近海漁業之監控、管制及調查計畫，刻正辦理計畫相關工作推動事宜。 (三)有關 102 年度第 2 階段漁船筏收購辦理情形，已核定「103 年度漁船筏收購及處理計畫(一)」計畫，已完成搗毀作業，續辦計畫結案事宜。「103 年度漁船漁筏收購及處理作業程序」業於 4 月 29 日公告，受理登記時間至 5 月 30 日止。業已完成審查核定並通知 11 個縣市政府核定結果及辦理簽約事宜，共計辦理 57 艘船筏，已全數完成搗毀工作，並辦理結案中。 (四)餘各工作計畫均依預定進度執行，部分辦理結案中。 二、促進養殖漁業與環境和諧： (一)102 年度保留 21 件養殖工程已完工。 (二)103 年度截至 12 月 31 日已核定補助地方政府及漁業團體共 26 件養殖工程，目前相關工程辦理情形如下：20 件工程已完工，6 件工程已發包目前施工中。 (三)為落實地方政府工程進度管考，漁業署定期邀集地方政府辦理「公共建設推動會報」會議，103 年 12 月 15 日於漁業署已召開 103 年度第 11 次會前工作會議，由漁業署陳副署長君如主持，另 18 日於農委會召開前開會報會議，由王副主任委員政騰主持，藉以督促地方政府趕辦，並檢討工程落後原因及協助解決所遭遇問題。 三、振興漁港設施機能： (一)103 年度部分至 103 年 12 月底止已同意辦理：資本門工作 93 項(漁業署自辦 17 項，委辦及補助 76 項)，其中已核定 93 項(漁業署自辦 17 項，委辦及補助 76 項)；另經常門工作已同意辦理 26 項(漁業署自辦 20 項，委辦及補助 6 項)，其中已核定 26 項(漁業署自辦 20 項，委辦及補助 6 項)。 (二)102 年度保留部分：保留 62 件工程計畫，現階段均已完成設計發包，已開工 62 件，竣工 62 件，驗收 62 件，結案 53 件。 3.103 年工程計畫核定率為 99.9%，工程決標達成率為 87.80%。 四、加速漁產品運銷通路相關設施建設： (一)已核定 37 件工程,完工 23 件，14 件辦理保留。核定率為 100%，決標達成率為 100%。									

	(二)102 年保留工程已完成 10 件，尚餘 5 件未完工，辦理保留中。 五、石斑魚及其他養殖產業： (一)103 年 1 月至 12 月石斑魚出口量(值)統計 1 萬 8,302.85 公噸(新臺幣 59.8 億元)。 (二)截至 103 年 12 月底輔導活魚運搬船運搬至大陸及香港地區 927 航次。 (三)漁業署已於 103 年 3 月 28 日公告「輸大陸地區石斑魚養殖場及中轉養殖場登錄管理作業要點」，將依積極輔導輸大陸地區石斑魚養殖示範場，並辦理該作業要點輔導說明會 5 場次及石斑魚養殖場日常生產管理教育訓練 8 場次。 (四)完成 103 年度 3 萬 8,525.54 公頃(87.72%)養殖漁業放養量申(查)報資料。
重要成果	一、沿近海漁業永續經營-辦理漁業之監控、管制及調查 5 萬筆、魚苗放流 1,046 萬尾及漁船筏收購 57 艘。 二、促進養殖漁業與環境和諧-陸上及海洋養殖區養殖公共設施整建 12 處。 三、振興漁港設施機能-辦理漁港疏浚、防減災工程等 13 港次、漁港多元化營造 5 項及維護漁港功能與建設 10 港次。 四、石斑魚及其他養殖產業-石斑魚產值增加至 76 億元(其中出口值達 53.2 億元)及輔導漁船運搬養殖活魚作業 927 航次。
落後原因	一、103 年度因計畫研提單位未及時提送計畫，且部分工程因配合養殖期程、各縣市政府後續工程規劃設計發包作業期程較晚且有流(廢)標情形等因素造成工程延宕，計畫執行進度落後。 二、另地方政府工程承辦人員更迭頻繁，業務交接亦影響工程推動進度。部分工程現階段工程進行中，惟未辦理估驗計價，致支用比及查核點落後。
因應對策	一、已完工之工程已請執行單位加速辦理結案，未完工之工程辦理保留，且為落實地方政府工程進度管考，漁業署定期邀集地方政府辦理「公共建設推動會報」會議，督促執行單位趲趕工進、持續施作，以利早日完成。 二、另為於工程執行期間針對執行落後案件進行個案管控，漁業署亦不定時至各工程現場瞭解工程執行狀況，協助地方政府檢討落後原因及問題改善。
管考建議(國發會)	工程進度仍有落後情形，請儘速辦理，以提升工進，並檢討年度執行績效及困難，以為後續執行之因應。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
花東線鐵路瓶頸 路段雙軌化暨全 線電氣化計畫	交通部	總累計	98.16	93.96	落後 4.20	23,031,774	21,007,413	91.21	90.08	90.08
		年累計	100	68.4	落後 31.60	5,899,348	3,874,987	65.69		
執行情形	一、土木工程： (一)CL112 標豐田站至鳳林站(不含)路段土木工程本期累計進度 98.7%，進行剩餘土石方遠運工作。 (二)CL212 標自強隧道土木工程本期累計進度為 84.48%，南口上半開挖累計 774m、中導坑開挖累計 84m，北口上半開挖累計 1,674m；隧道仰拱襯砌總累計完成 1,899m。 二、系統機電工程： (一)CL421 標光復電力分駐所新建工程(接續工程)本期累計進度為 78.15%，維修車庫與辦公室 RF 結構及油脂品室 1F 結構施工。 (二)CL422 標玉里電力分駐所新建工程(接續工程)本期累計進度為 21.4%(自 103 年 11 月 19 日起復工)，進行維修車庫、辦公室、油脂品房及發電機房基礎施工。 (三)CL423 標關山電力分駐所新建工程，本期累計進度 86.13%，進行辦公室機電與消防設備安裝、維修車庫頂版施工。 (四)花東線(玉里~知本間)電氣化單線區間通訊纜線暨 SMC 電纜線槽(花蓮~知本)新建工程，於 103 年 12 月 31 日完工。 (五)花東線電氣化電子聯鎖修改暨部分新建工程，本期累計進度 81.6%，辦理部分驗收作業中，自 103 年 12 月 4 日起停工。 (六)花東線(花蓮~臺東間)電氣化雙線區間通訊纜線新建工程，本期累計進度 79.81%，進行山里隧道南口至臺東機房纜線拆除。 (七)花東線電氣化計軸器系統修改暨部分新建工程，本期累計進度 90.11%，辦理部分驗收作業中，自 103 年 12 月 9 日起停工。 (八)花東線電氣化號誌電纜佈放及專用傳輸系統工程，本期累計進度 89.31%，辦理部分驗收作業中，自 103 年 12 月 3 日起停工。 (九)花東線行車調度無線電話系統新建工程，本期累計進度 83.3%，進行光復新機房轉播站施設。 (十)臺東站站場照明新建工程，本期累計進度 0.39%，辦理各項計畫書送審作業。 三、用地取得及拆除補償：本計畫花東沿線用地取得僅餘光復、瑞穗都市計畫用地及部分零星土地，依規定續辦徵收作業。 四、已執行應付未付數說明：購置電車線設備、鋼軌及安全裝置等材料款 2,133 萬 4,000 元、委託臺鐵局代辦新鋪路線維護、淨空檢查及電化宣導、訓練等作業費 1 億 1,664 萬元、土地協議價購及農林作物補償費 39 萬 2,000 元，承商已執行尚未完成計價程序與履約爭議待調解計 13 億元，總計 14 億 3,836 萬 6,000 元。 五、本計畫第 2 次修正計畫，業奉行政院 103 年 12 月 16 日院臺交字第 1030073199 號函同意在總經費維持不變下，計畫期程修正至 107 年 6 月，據以調整本期計畫預定進度為 93.96%，即無落後。									
重要成果	一、於 103 年 6 月 28 日完成花東鐵路全線電氣化通車之目標。 二、光復、玉里、關山及臺東等 4 座變電站於 7 月 11 日完工。 三、CL113 標鳳林至光復站路段土木工程於 7 月 21 日完工。 四、CL211Z 標瑞穗站至三民站(不含自強隧道)路段土木工程於 8 月 8 日完工。									

	五、CL212 標隧道上半部開挖截至 10 月 31 日累計完成 2,412 公尺。 六、花東線花蓮至臺東站場(不含瑞穗~關山間)電車線架設工程於 11 月 1 日完工。 七、臺東至知本間正線及花東各站側線(第 2 階段)電氣化通車路段，於 12 月 31 日准予啟用。 八、花東線(玉里至知本間)電氣化單線區間通訊纜線暨 SMC 電纜線槽(花蓮至知本)新建工程，於 12 月 31 日完工。
落後原因	一、因系統機電工程契約變更屢次議價不成，肇致變更作業程序耗時，影響估驗計價。 二、因契約爭議待調解，致無法撥款。 三、承商已執行而未提出估驗及已完工工程因驗收程序未完成，尚未結算付款。 四、因「自強隧道土建」、「壽豐車站高架段系統機電」及「電力分駐所」等工程，遭遇天然地質災害、建照核發延遲及廠商解約等不可抗力因素，影響工程推展，經詳實檢討結果，以 107 年 6 月完成整體計畫，並提報第 2 次修正計畫。 五、CL212 標自強隧道因適處沉泥層地質，開挖作業推進不易，影響工進落後。 六、CL422 標玉里電力分駐所因承商初期動員緩慢、建照及五大管線申請耗時，致影響施工進度。 七、CL423 標關山電力分駐所因承商施工人力不足及財務因素，致工進持續落後。
因應對策	一、年累計支用比因應對策： (一)已督請系統機電監造與業務單位依契約相關規定，辦理契約變更議價不成後續事宜，俾利估驗計價。 (二)契約爭議待調解案件，現依調處程序辦理。 (三)已執行而承商未提出估驗，已請承商依實際執行進度辦理計價作業；另督請監造單位與工程段(隊)加速辦理驗收與部分驗收之相關作業，以利工程結案，撥付末期工程款。 二、計畫進度落後因應對策： (一)影響整體計畫執行因素，已納入第 2 次修正計畫，並奉行政院 103 年 12 月 16 日院臺交字第 1030073199 號函同意在總經費維持不變下，計畫期程修正至 107 年 6 月，據以調整本期計畫預定進度為 93.96%，即無落後。 (二)CL212 標自強隧道工程因地質因素影響工進推展，已納入第 11 次工期展延案，俾使工進符合實際。 (三)CL422 標已督促承商依施工進度控管人、機、料進場時程，並加速趕工進。 (四)CL423 標工進持續落後情形，已召開 8 次工程進度嚴重落後檢討會，並訂定里程碑，督促承商提升工進，鐵工局東部工程處於 103 年 12 月 1 日(第 3 次)函知承商已符政府採購法 101 條第 1 項第 10 款等規定，除依契約相關規定辦理行政程序，亦督促承商積極趕辦施工，達成里程碑目標。
管考建議 (國發會)	一、本計畫年累計支用比 65.69%，較上月提升，惟仍未達 9 成，且應付未付數達 14.38 億元，請督促儘速辦理計價請款、經費核撥作業。 二、請依本計畫第 2 次修正案之核定時程，加強督導工程施工進度，列管追蹤各要徑工項之管控里程碑。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
衛武營藝術文化中心 興建計畫	文化部	總累計	89.56	85.38	落後 4.18	7,675,239	5,633,887	73.40	93.87	93.87
		年累計	100	40.34	落後 59.66	3,188,003	1,136,470	35.65		
執行情形	一、第 1 標：已於 103 年 7 月 25 日完成驗收作業。 二、第 2 標：分項施工計畫、施工圖編撰及繪製；圖面澄清事宜；建築裝修、機電及空調，輕隔間、天花及地坪工序檢討；追蹤發包，進行請購、廠商說明作業；曲面屋頂鋼表皮施作；A 區地下層及 1F~2MF 裝修工程施作、2~3F 地坪整理、輕隔間施作；C 區地下層及 1F~2MF 裝修工程施作、音樂廳 B1F~B2F 輕隔間施作、RH-B3F 天花板工程施作、RH-B1F 天花板工程安裝作業；B 區 B1F~B2F 及 1F~2MF 裝修工程施作；戶外機房空調設備及裝修施作；帷幕牆工廠加工組裝；各區水電、空調與消防工程施作；截至 103 年 12 月 31 日止，預定進度 100%，實際進度 73.50%，落後 26.50 個百分點。 三、第 3 標：各項計畫書編排製作及設備型錄送審；各廳院施工圖面繪製；座椅設備工廠製造；鋼棚進場安裝施作；廊道、鋼棚等工項查驗；燈光音響設備進場查驗；各廳院上部機械設備進場施作；中劇院、音樂廳下部機械設備進場施作；截至 103 年 12 月 31 日止，預定進度 99.51%，實際進度 61.14%，落後 38.37 個百分點。 四、第 4 標：廠製作業。 五、第 5 標：分項施工計畫編撰、圖面澄清事宜、介面施工工序檢討；東側(RCP 管理設)；西側、東側、北側、南側(匯流井施工)；北側排水系統(卵石排水溝施工)；東側、北側、南側排水系統(建築周邊排水溝施工)；北側 RC 座椅(設施工程)；土坵噴關、機電系統管線埋設(北側)；截至 103 年 12 月 31 日止，預定進度 48.22%，實際進度 40.58%，落後 7.64 個百分點。 六、第 7 標：各工項圖說套繪及檢核；辦理分項工程議價發包作業；各項計畫書、施工圖及廠商資格材料送審；現場會勘及初始放樣；廠商資料彙整及材料彙整；截至 103 年 12 月 31 日止，預定進度 41.22%，實際進度 2.31%，落後 38.91 個百分點。 七、衛武營製播 103 年藝文活動廣播宣導節目案及衛武營活動月訊文宣委託設計案均於 103 年 12 月 31 日執行完畢。另於 12 月提供 3 場次表演活動、展覽及講座。									
重要成果	一、藝文活動欣賞人口培植-策辦展演活動 48 場次。 二、國際藝術文化交流合作、人才培育-完成國際藝術文化交流及培育課程 7 場次。									

	三、舊有空間劇場管理-舊有劇場空間提供表演活動、展覽及講座 53 場次。
落後原因	一、施工圖繪製速度慢，相關資料送審及核定作業慢，計畫書圖送審慢，影響出工數。 二、工程界面複雜，第 2、3、5、6、7 標工項交互重疊，承商間被動配合（本位主義心態）且對於界面會勘結論執行成效不彰，導致工進推展進度緩慢。 三、各分標履約爭議不斷。 四、第 2 標及第 5 標缺工。 五、第 2 標及第 3 標對於國外廠商之掌控協調度不佳（LC 問題），影響工進。
因應對策	一、持續於每週工地工務會議追蹤控管，並要求承商增加繪圖人力，另對於送審超過 2 版次仍無法決定者，則要求設計監造召開審查會討論。另每日控管第 2 標 3 大工項及第 3 標實際出工人數，持續要求承商投入人機料趕趕工進。並每周召開 2、3、7 標趕工會議，並視情形要求公司高層參與。 二、透過每週 CIP、界面會議持續檢討，對於較複雜、具時效性之部分，則另召開專業技術會議討論，並每周針對 2 標 5 大機房及 5 標戶外景觀等施作範圍進行相關工項界面現勘，以利工進；另對於急迫議題，則召開密集性檢討，以期問題解決。另對於物料放置影響他標工項施作者，如逾協調期限未能遷移，將請受影響標逕為遷移，並向影響方請求遷移費用。另對於未依界面會勘結論執行者，如受影響方有因而衍生費用求償時，將轉由影響方負擔。 三、對於工程履約疑義，由承商依約提出釋疑，由設計監造單位回答，如承商對於設計監造之答覆無法接受或有其他困難，則由 PCM 召開專業技術協調會討論，如仍無法建立共識，則請承商儘速循履約爭議處理方式向工程會提出，後續將依工程會調解意見辦理。 四、邀請 2 標及第 5 標施工廠商高層會談，要求公司協助加派現場工班。 五、有關涉及第 2 標金屬屋頂廠商 BEMO 公司、第 3 標 JV 廠商 WB 公司相關書圖資料送審及現場執行等，請代表廠商確實負起契約權責，持續與其溝通並要求配合工進。
管考建議(國發會)	一、本計畫 103 年度多項標案工作落後甚多，請文化部強化各項管考機制，積極協助解決執行單位所遭遇之問題。 二、另執行單位應確實督促承商積極趕工，尤其加強協調各標案間之施工界面，增加出工人數，以有效提升執行效率，相關執行問題並請納入下年度執行改善規劃，並儘早趕辦完成落後工項。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
長照服務網計畫	衛福部	總累計	30	27.1	落後 2.90	312,361	136,082	43.57	78.30	78.30
		年累計	100	85.5	落後 14.50	164,491	75,185	45.71		
執行情形	一、長照資源不足地區建置失智症社區服務計畫共計服務 4,313 位失智長者，並於 11 月 21 日辦理據點成效檢討會議。 二、獎勵偏遠(含山地離島)及長照資源不足地區設置在地且社區化長期照護服務據點計畫各據點已陸續繳交期末報告。 三、辦理在地長期照護人員教育訓練及社區化長期照護資源管理與輔導專案計畫，受委託單位已繳交服務據點輔導期末報告，另已辦理計畫經費核銷作業。 四、在地長期照護人員教育訓練屬跨年度計畫，103 年度計畫於 11 月簽約執行 1 年，刻正辦理第 1 期款撥付事宜。									
重要成果	一、獎勵長照資源不足地區發展長照資源計畫：於 103 年 6 月核定 23 個失智症服務據點，並辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)計 2 場次共 100 人參與。 二、獎勵偏遠(含山地離島)及長照資源不足地區設置在地且社區化長期照護服務據點計畫：於 103 年新增偏遠(含山地離島)及長照資源不足地區長照服務據點 16 家，並辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)1 場次、長照服務宣導 40 場。 三、在地長期照護人員教育訓練及社區化長期照護資源管理與輔導專案計畫：已輔導據點共計 41 場，並辦理教育訓練 2 場次。									
落後原因	一、發展入住機構式服務設置計畫：為儘早完成長照資源不足區域設置入住機構式服務，共辦理 2 次公開徵求(1 月 24 日及 7 月 1 日)，並召開 2 次審查會議(4 月 18 日及 9 月 19 日)，共計核定 3 個次區補助案：惟補助案通過後，仍應按護理人員法等相關規定辦理設置許可後，始辦理簽約及撥款程序，故目前完成 1 件簽約及核銷案件，另 2 件申辦機構設置許可法定程序中。 二、獎助日照中心設置計畫：為配合社家署「368 鄉鎮推動日照行動方案」，其中針對日照中心建置之規劃，擬以長照服務網區域之小區(即鄉鎮市)為建置目標單位，其中衛政單位設置 80 所。本案係今年度新增計畫，經衛福部醫療發展基金審查會於 9 月 16 日審查原則通過，並於 11 月 10 日公開徵求計畫，經各縣市衛生局									

	初審後於12月22日層轉計畫致衛福部，故今年執行進度為新興計畫審定及彙整全國日照中心設置申請計畫。 三、長照資源不足地區建置偏遠(含山地離島)地區設置在地且社區化長照服務據點計畫，103年度共計辦理3次申請作業，審查長照資源不足地區服務據點分為兩階段辦理，第1階段召開專家委員審查會議審查申請計畫書及第2階段實地輔導延續型據點辦理據點服務之成果，經由兩階段專家委員考評結果分析其未提高服務量、目標未具體呈現、未連結和開發在地新案及未擴展服務全鄉民眾及輔導後無具體改善作為等之據點，不予補助，故核定通過據點較預計數少。
因應對策	一、發展入住機構式服務設置計畫：針對2件申辦機構設置許可法定程序中之補助案，儘快完成核定許可，以利後續進行簽約及核銷程序。 二、獎助日照中心設置計畫：衛福部將儘速進行複審全國日照中心設置申請補助計畫，惟補助案通過後，仍應按護理人員法等相關規定辦理設置許可後，始辦理簽約及撥款程序。 三、持續公開徵求服務據點，並依103年底盤點結果修正資源不足區服務據點數。
管考建議(國發會)	本計畫因設置規定、補助期程等因素影響，103年度執行進度落後及經費支用情形偏低，且服務據點設置數未達預定目標，建請檢討相關補助期程，後續年度提前辦理相關行政作業，並研議提升服務據點設置之因應措施(如主動開發據點、輔導據點通過下年度審核等)，以提升計畫執行成效。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
石門水庫及其集水區 整治計畫-緊急供水工 程暨水庫更新改善	經濟部	總累計	93.88	91.09	落後 2.79	8,456,958	7,805,292	92.29	85.12	85.12
		年累計	100	67.61	落後 32.39	1,627,456	975,790	59.96		
執行情形		一、本計畫中庄調整池工程因受 103 年 2 月至 6 月連續降雨影響土方工程工進，修正計畫業於 103 年 11 月 14 日奉行政院院臺經字第 1030066826 號函同意中庄調整池計畫展期至 105 年 12 月，爰 103 年度可支用預算由原 16 億 2,745 萬 6,000 元調整為 13 億 7,582 萬 7,000 元，103 年度預算達成率可由計畫修正前 85.12%調整為計畫修正後 100.69%；另計畫修正後年累計進度 104.29%，計畫總進度 91.09%尚符合修正計畫之計畫總進度 90.85%。 二、調查、規劃、試驗及研究：石門水庫防淤隧道水工模型試驗作業，已於 103 年 10 月 15 日及 11 月 26 日以艾利颱風為情境辦理防淤隧道水工全模型試驗，並已完成試驗成果分析及報告撰寫(進度 100%)。 三、中庄調整池工程計畫： (一)攔河堰工程：工程進度 53.10%，左岸 4 道排洪道倒伏閘門已於 12 月 15 日前全部完成安裝。目前右側第 8-9 道排洪道基礎開挖中。 (二)引水路工程，已於 103 年 7 月 29 日完工。 (三)調整池工程，工程進度 43.22%，池區土方開挖已完成 162 萬方(占全數 29.8%)、圍堤填築已完成 5.4 萬方(占全數 6.8%)、截水牆施作已完成 396 公尺(占全數 14.6%)。 (四)輸水路工程(共構段):工輸水路工程(共構段)進度 99%，2455 公尺輸水鋼管已全部埋設，目辦辦理電氣管線、排水溝、擋土牆、路燈基座等配合工作。 (五)輸水路工程（過河段）：工程進度 99.11%，輸水鋼管 897 公尺已全數及設備已全數完成，目前辦理右岸上坡面工程，預計 104 年 1 月中旬完工。 (六)廢棄物清理第 2 期：進度 73.09%，可燃廢棄物送岡山焚化廠 542.7 公噸。累計開挖量 14 萬 2,520 立方公尺(含調整池廢棄物篩分量 17 萬 9,758 公噸，運至景觀土丘土方量 28 萬 6,253 公噸) (七)有價料挖裝及周邊配合工程：工程進度 32.25%，第 1 階段周邊配合工程已全部完成。 (八)管理大樓工程：工程進度 47.75%，已完成管理大樓結構及水泥粉刷，目前辦理瓷磚工程。 四、水庫更新改善及其它： (一)電廠防淤改善 2 期工程：工程進度 57.47%，落後 39.33%，已完成分歧管組裝及焊接，閘室地下層已全數完成及地面第 3 昇層(EL153M)(共 4 昇層)。另為免複葉閘一再履約爭議致工進延阻，已於 103 年 12 月 4 日函施工廠商終止部分契約。 (二)榮華壩發電進水口排淤改善工程：施工便道於 103 年 12 月中旬打設完畢，基樁打設相關重型機具業於 103 年 12 月 25 日順利進場，目前刻正辦理基樁鋼筋籠組立作業，預計 104 年 6 月完工。								

重要成果	一、調查、規劃、試驗及研究-水庫防淤隧道局部水工模型建置及全模型水工試驗各 1 座。 二、中庄調整池工程計畫-中庄調整池-輸水路鋼管 278 公尺、引水路箱涵 310 公尺。
落後原因	一、中庄調整池工程計畫—攔河堰及調整池工程預付款，須配合工程進度 20%至 80%按比例由契約費用扣抵並核銷轉正，致影響支用比。 二、因受桃園地區 103 年 2 月至 6 月持續降雨，影響攔河堰、輸水路及調整池土方工程等作業，其中圍堤填築含水量易受降雨影響甚無法施工，嚴重影響工程進度。 三、廠商人員機具及人員動員不足，無法展開工程面。 四、中庄調整池工程-輸水路(共構段)工程，輸水鋼管 2,455 公尺已全數完工，目前施作工程為地方要求增作項目(擋土牆及道路等)，工程展延至 104 年 1 月底。 五、輸水路(過河段)工程：輸水鋼管已全數埋設完成，目前零星收尾工作面多，致工程尚未完工。 六、電廠防淤改善二期工程廠商簽約後一再提複葉閘分包商履約爭議(占契約 35%工項)，因不符契約及複葉閘分包契約書規定，致複葉閘無法依契約辦理設計圖審查及廠商作業而影響工進。 七、分歧管及鋼管接合銲道射線檢測(RT)不合格需重新辦理檢測，影響鎮墩段後續混凝土施工。
因應對策	一、持續要求施工廠商增加機具及人力趕辦工程，儘速依契約請款核銷並提高支用比。 二、中庄調整池之攔河堰及調整池工程，已要求施工廠商儘速加派機具人員增加工作面鑽趕工進，其中調整池工程施工廠商已於 103 年 9 月 5 日開挖工作面增加為 6 組，開挖量目前每日平均約 0.8 萬方，將朝每日 1.2 萬方目標努力，另調整池施工廠商亦於 103 年 9 月 23 日增加 1 截水牆施工機具進場，並要求廠商儘速增加第 3 截水牆施工機具。 三、持續督請廠商積極備料降低降雨施工影響。 四、為免複葉閘一再爭議影響工進，水利署北水局已於 103 年 12 月 4 日函施工廠商終止部分契約。另為避免影響石門電廠發電功能，北水局已另案辦理新增鋼管接續發電，預計可配合土建完工工期完工並恢復電廠發電。 五、分歧管及鋼管 RT 檢驗不合格部分需重新辦理檢測，施工廠商已於 103 年 12 月 26 日前提改善方案，目前審查中。
管考建議(國發會)	一、總累計執行進度落後 2.79 個百分點(年累計執行進度落後 32.38 個百分點)，年累計支用比 59.96%。 二、中庄調整池工程計畫落後 32.98 個百分點，水庫更新改善工程落後 33.48 個百分點，落後幅度較 11 月增加 25 至 30 個百分點，請主管機關加強督導。 三、中庄調整池工程計畫雖奉院同意展延至 105 年 12 月，仍請主管機關加強督導控管，並請主辦機關督促廠商趕工進，以利計畫如期如質完成。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支出			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
海洋文化及流行音樂 中心計畫	文化部	總累計	67.7	65.57	落後 2.13	1,423,277	264,907	18.61	7.79	7.79
		年累計	100	90.4	落後 9.60	1,257,443	97,734	7.77		
執行情形	一、綠建築候選證書刻正進行申請作業中。 二、第 2 標工程建照相關審查作業： (一)結構外審：已於 10 月 20 日原則通過。 (二)環境影響評估：已提送環境差異影響分析報告予高市府環保局，12 月 5 日召開審查會，初審已通過，刻正依初審意見修正報告。 (三)交通影響評估：經事務所洽高市府交通局研議後，該局同意修正方案，事務所已進行設計修正，送交通局再次審議中。 (四)都市設計審議：已於 11 月 13 日召開幹事會審查，並原則通過本設計案，刻正進行設計修正。 (五)防火性能審查：已於 10 月 24 日召開審查會預審會，並已提送設計計畫書予建築中心。建築物防火避難性能設計計畫書專案評定小組第 1 次審議會議將於 104 年 1 月 7 日召開，由高市府出席。 三、高市府已於 103 年 12 月 30 日來函申請海洋文化及流行音樂中心硬體及軟體經費保留及核銷轉正。									
重要成果	一、第 1 標工程工進微幅超前。 二、文化部於 9 月 3 日辦理第 3 次硬體平臺會議，責請高市府新工處於 103 年 11 月 5 日辦理第 2 標工程招標文件與圖說公開閱覽；103 年 11 月 21 日第 1 次招標，至 12 月 17 日截標，因無人投標流標；12 月 19 日第 2 次招標，至 12 月 23 日截標，仍無人投標，致第 2 次流標。後該府已於 12 月 29 日召開工法說明會，並召開內部檢討會議，初步決議將修改招標圖說，提高招標金額為 39 億 3581 萬 4525 元，並請建築師於 104 年 1 月底前提送修正後之圖說預算，預計於 104 年 2 月初重新辦理招標，等標期 45 天，預計於 104 年 3 月中旬截標、3 月底舉行審查會議及辦理決標。 三、辦理校園原創音樂樂團徵選及演出發表(2014 青春尬歌校園原創音樂演唱會)： (一)第 1 季：計有 5 組樂團入選，原創音樂演唱會已於 5 月 3 日在駁二藝術特區 the wall 月光劇場舉辦。 (二)第 2 季：計有 6 組樂團入選，原創音樂演唱會已於 12 月 7 日在駁二藝術特區 the wall 月光劇場舉辦。 四、文化部自辦軟體計畫「金曲音樂節旗艦商展計畫」已順利辦畢。									

	五、103 年度完成 2013 南面而歌-「新世代臺語歌」創作專輯出版及 MV 創作獎助結案。專輯於 50 首入圍作品中挑選 11 首交由製作人重新錄製，於 103 年 5 月出版。MV 部份 103 年有 25 件提案獲得拍攝獎助，各獲得 10 萬至 20 萬不等之獎助金，103 年已陸續完成拍攝結案。 六、由高雄市電影館代辦「南臺灣流行音樂發展歷程影音紀錄拍攝製作計畫」，委託南風影視傳播有限公司執行「南臺灣海洋流行音樂發展歷程影音紀錄拍攝製作」勞務採購案，訪談南部地區具代表性之流行音樂從業人士，完成良山、良林、紀露霞、林松義等 4 部人物紀錄影像檔案。 七、海洋文化及流行音樂中心展示區域調查規劃委託計畫:完成「高雄流行音樂紀錄片拍攝計畫」系列紀錄片《重相逢 (老歌手 vs 老樂師)》，拍攝人物為高雄夢幻爵士樂團團員、資深藝人林松義、高雄夢幻大樂團團員。 八、碼頭音樂節：103 年 10 月 4 日至 5 日結合 2014 大彩虹音樂節於高雄真愛碼頭及駁二藝術特區辦理完竣，吸引約 4 萬人次到場參與。
落後原因	本案工程因行政作業、規劃設計、招標作業流標影響，設計團隊內部紛爭作業延誤及受主體工程延宕影響而進度落後，原因說明如下： 一、高雄環狀輕軌捷運建設之影響。 二、本計畫基地特性涉及多方主管單位造成外審作業冗長，內部協調延誤。 三、海音中心空間屬性具專業性及特殊性，為國內首創重大公共服務建設。 四、設計團隊內部紛爭。 五、國際競圖徵案，作業複雜度高，致工期延宕。 六、第 2 標預算金額 38 億 660 萬元，高市府於 11 月 4 日辦理招標文件與圖說公開閱覽，103 年 11 月 21 日第 1 次招標，至 12 月 17 日截標，因無人投標流標；12 月 19 日第 2 次招標，至 12 月 23 日截標，仍無人投標，致第 2 次流標。
因應對策	一、為督導工程及招標進度，文化部已將流行音樂中心興建計畫納入「公共建設推動會報」，每月定期檢討執行進度，加強控管；另成立「海洋文化及流行音樂中心」軟體及硬體工作平臺會議，加強與高市府之聯繫合作、進度管控與政策督導等，並協助解決困難。 (一)文化部於 103 年 9 月 3 日第 3 次硬體平臺會議請高市府務必確實掌控工程發包進度，並加速預付款、設計規劃管理契約價金之完撥時程，俾提高 103 年度預算執行率。 (二)持續透過公共建設推動會報平臺及軟、硬體工作平臺會議，積極與高雄市政府溝通連繫，加強督進並協助高雄市政府解決困難，加速各工項款項之完撥時程，俾提升預算執行率。 二、請高雄市政府提報修正計畫，俾儘速完成修正計畫奉院核定。

	三、請高雄市政府檢討第 2 標工程流標原因，督促高市府如期完成發包作業，俾後續工進順利推動:經洽高市府新工處表示，該府已於 12 月 29 日召開工法說明會，並召開內部檢討會議，初步決議將修改招標圖說，提高招標金額為 39 億 3,581 萬 4,525 元，並請建築師於 104 年 1 月底前提送修正後之圖說預算，預計於 104 年 2 月初重新辦理招標，等標期 45 天，預計於 104 年 3 月中旬截標、3 月底舉行審查會議及辦理決標。
管考建議(國發會)	一、高雄市政府於 103 年 12 月 30 日函文化部申請海洋文化及流行音樂中心硬體及軟體經費保留及核銷轉正。年累計執行進度落後 9.60%，年累計支用比 7.77%。 二、請持續透過公共建設推動會報平臺及軟、硬體工作平臺會議，積極與高雄市政府溝通連繫，加強督進，並協助高雄市政府解決困難，加速各工項款項之完撥時程，俾提升預算執行率。 三、請儘速完成修正計畫奉院核定，俾利研訂(修)104 年作業計畫；另請高市府於期限內儘速提送第 2 標工程修正圖說預算送審，督促高市府如期完成發包作業，俾後續工進順利推動。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
強化國民年金保險制度	衛福部	總累計	100	98.22	落後 1.78	62,334,668	60,280,647	96.70	96.70	96.70
		年累計	100	98.22	落後 1.78	62,334,668	60,280,647	96.70		
執行情形	一、完成核發 103 年各月老年基本保證年金及身心障礙基本保證年金 74 萬 9,935 至 78 萬 3,276 人次，並召開 2 場國民年金制度及法規檢討諮詢會議 二、完成核發 103 年各月國民年金保險給付 53 萬 1,564 至 63 萬 6,368 人次。									
重要成果	一、督導勞工保險局辦理國民年金老年基本保證年金及身心障礙基本保證年金之給付業務，103 年度受益或服務對象人數 74 萬 9,935 人。 二、督導勞工保險局辦理國民年金保險老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、遺屬年金給付及喪葬給付之給付業務，103 年度受益或服務對象人數 67 萬 320 人。									
落後原因	依國發會管考建議，建請本部分析造成人數落差之影響因素，茲說明如下： 一、基本保證年金實際核發人數與預定核發人數有所落差之影響因素為 103 年之核付人數係以 102 年 12 月核付人數，扣除每月因請領者死亡而停止發放者 3,000 人後預估，惟因老年基本保證年金有多項排除因素，且勞保局核發給付係比對各相關機關提供之媒體資料，當民眾資格發生異動或各相關機關資料提供延遲或有誤時，即會影響老年基本保證年金之核發，另身心障礙基本保證年金申請屆滿 5 年須複檢案件，勞保局已提早通知辦理自我查核或複檢，但如經醫院評估或自我查核有工作能力，或未依限辦理複檢者，均陸續辦理核定不予給付並結案，造成預估數及實際數之差異。 二、各項保險給付實際核發人數與預定核發人數有所落差之影響因素為原預估各項給付核發人數及金額係以當月符合國保保險事故條件者估算，例如老年年金給付係以預估合格人數(當月滿 65 歲者)推估核發人數及金額，且預估數中 A 式核發件數比例約佔 92%，惟其涉及國民年金法第 30 條第 2 項之排除條件，致實際數中 A 式核發件數比例約佔 90.8%，且預估數中並未扣除每月因不符給付條件停止發給之件數，另部分被保險人未於屆滿 65 歲當月提出申請。									
因應對策	一、宣導資源整合方面：本部、勞保局及各地方政府針對符合給付條件且未及於當月申請各項給付之被保險人，透過各種傳播管道賡續辦理宣導，且由國保服務員進行家戶訪視，透過當地里長或其家人、鄰居予以協助並提供相關資訊，以確保民眾給付權益。									

	二、行政簡化申請程序方面：勞保局按月針對將屆滿 65 歲之被保險人或曾參加國民年金保險者，寄發通函時併附老年年金給付申請書，如該被保險人有積欠保險費者，並一併補發保險費繳款單，俾提醒其儘速繳費以保障給付權益，且針對將屆滿 5 年請求權時效，惟遲未提出老年年金給付申請之被保險人主動寄發通知函及申請書。 三、跨機關外部協調方面：勞保局給付作業所需比對之資料來源多由外部機關提供，而該等資料變動十分頻繁，爰為符合國民年金法等相關規定按月核發給付，需加強相關機關資料比對，將不符合老年基本保證年金及身心障礙基本保證年金請領資格之民眾即時停止發給。 四、勞保局內部協調方面：衛福部督導勞保局辦理國民年金老年基本保證年金、身心障礙基本保證年金以及各項保險給付業務，爰勞保局業管國保給付各科將持續觀察每月核付情形，做為日後預估人數之參考，以減少預估數與實際數之落差。
管考建議(國發會)	本計畫易因民眾資格異動或延遲申請等因素導致實際補助人數無法達成目標值，建議 104 年度作業計畫可參考歷年補助情形及核發人數差異數，改以預定核發人數區間(如國民年金保險給付預定核發人數 1 月份為 64 萬至 65 萬人)作為各月份查核點。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
客家文化發展中心 南北園區設施 管理及擴充計畫	客委會	總累計	68	66.54	落後 1.46	1,483,666	1,621,220	109.27	100.00	100.00
		年累計	100	93.04	落後 6.96	420,293	322,721	76.78		
執行情形	一、研究發展設施管理及六堆園區二期開發計畫： (一)「六堆園區水陸域生態調查計畫」，承商已於 12 月 10 日提送成果報告，屏東縣環保局並於 12 月 22 日同意備查。 (二)「六堆園區環境監測計畫」，承商已於 12 月 10 日提送成果報告，屏東縣環保局並於 12 月 22 日同意備查。 二、文資典藏設施管理計畫： (一)「圖書資料中心館藏充實計畫」，已完成 103 年度中西文館藏及電子資源等之採購，計新增中西文圖書、論文及研究報告 2,289 冊、視聽資料 92 件、電子書 266 件、電子資料庫 5 種、數位論文 39 件，並完成核銷作業。 (二)「桃竹苗地區鸞堂收藏文獻調查暨數位化典藏計畫」，已於 11 月 28 日提送第 2 期成果報告書，12 月 12 日召開審查會議原則通過。 三、藝文展演設施管理計畫： (一)六堆園區「103 年樂揚客庄一假日音樂饗宴活動」已於 12 月 11 日完成結案驗收，12 月 25 日撥付尾款。 (二)「103 年苗栗園區表演藝術系列活動案」已於 12 月 23 日完成結案驗收，12 月 31 日撥付尾款。 四、公共服務及苗栗園區遊客服務中心新建工程計畫： (一)「苗栗園區公共服務暨設施維護業務委外服務」勞務採購案，已於 12 月 31 日完成結案驗收，並於 104 年 1 月 6 日撥付尾款。 (二)辦理「六堆園區及苗栗園區文創傳習」計畫-「六堆園區 3 周年慶宣傳短片製作暨託播執行委託專業服務勞務採購案」於 12 月 1 日履約完成，並於 12 月 9 日完成驗收。 五、園區設施基本維持計畫： (一)「六堆客家文化園區整體景觀改善工程案」，共計辦理 3 次上網公告作業，第 1、2 次公告因無廠商投標流標，經檢討另案辦理「103 年度六堆園區部分設施修復工作」採購案，已於 12 月 26 日開標並完成決標，刻正執行中，預定工期為 120 日曆天。 (二)「103 年度全球資訊網網站維護及功能擴充」網站功能擴充案，已於 12 月 31 日辦理完成，並於 104 年 1 月 6 日完成結案驗收並撥付尾款。									

重要成果	無。
落後原因	一、研究發展設施管理及六堆園區二期開發計畫：「六堆園區生態島嶼亮點計畫--客庄水圳聚落生態場域統包工程」及「六堆園區生態島嶼亮點計畫--客庄水圳聚落生態場域專案管理(含監造)委託技術服務」2案，因六堆園區二期計畫開發許可於103年5月方經屏東縣政府准予備查，影響招標完成期程，致支用比未達預期。 二、藝文展演設施管理計畫： (一)「六堆園區兒童探索空間常設展設計施作及推廣管理」，因進度展示評量及進度基本設計相關規劃幾經多次審查、修正及確認，致不及撥付第3期款，預計104年2月前核撥，致支用比未達預期。 (二)「六堆園區演藝廳及多媒體館外牆防水整修工程」，因有採購法第58條之情形致遲至103年10月3日申報開工，不及撥付尾款，致支用比未達預期。 (三)「六堆園區演藝廳及多媒體館外牆防水整修工程設計及監造委託技術服務」，因監造部分需配合工程結算驗收合格始能撥付尾款，致支用比未達預期。 (四)「六堆園區藝文景觀表演平臺工程」，因廠商部分材料供貨不及爰延至12月25日竣工，業於12月29日驗收，惟尚有需改善事項要求廠商改正中，預計於104年1月13日辦理複驗，致支用比未達預期。 (五)「六堆園區藝文觀景表演平臺設計及監造委託技術服務」，因監造部分需配合工程結算驗收合格方撥付尾款，目前工程經初驗尚有需改善事項要求，刻正由廠商改正中，致支用比未達預期。 三、公共服務及苗栗園區遊客服務中心新建工程計畫：(一)「苗栗園區人行入口景觀及遊客服務中心新建工程」及「苗栗園區人行入口景觀及遊客服務中心新建工程設計規劃監造委託服務」2案，因水土保持計畫變更審查、變更設計、天候展延工期等因素，不及撥付款項，致支用比未達預期。 (二)「苗栗園區擴增用電配電系統財物及勞務採購」，工期需配合他案(即「苗栗園區人行入口景觀及遊客服務中心新建工程案」)管線施作後方得進行本案施作，致支用比未達預期。 (三)「六堆園區遊客導覽諮詢服務設施設備及志工備勤空間設置工程」及「六堆園區遊客導覽諮詢服務設施設備及志工備勤空間規劃設計及監造」2案，因變更設計致延長契約期程，致支用比未達預期。 四、園區設施基本維持計畫： (一)「103年度六堆園區部分設施修復工作」，因103年9月發包期間適逢高雄氣爆案，相關廠商皆於高雄施工，致無法參與本案，後因本中心年度計畫調整，改以勞務方式發包，且因施作項目繁複、工區範圍較大，致使多次流標，致支用比未達預期。 (二)「六堆客家文化園區整體景觀改善工程設計及監造」，已完成50%工作進度，因本中心年度計畫調整，無法執行後續工作，刻正辦理函報客家委員會終止契約程序致支用比未達預期。 (三)「103年度六堆客家文化園區機電設備設施更新及增設」案，103年度預定完成80%進度，尚未完成驗收付款作業，致支

	用比未達預期。 (四)「103 年度六堆客家文化園區太陽能光電系統逆變器更新及展示系統軟體升級」，因相關設備具專業性致需費時設計，致支用比未達預期。現已由廠商加緊施作，預計 1 月下旬可全數完成。 (五)「103 年度六堆園區安全防護設備修繕」，現已完成撥付款項 90%，因工期延後，預計 1 月下旬完成驗收付款作業，致支用比未達預期。
因應對策	一、研究發展設施管理及六堆園區二期開發計畫：「六堆園區生態島嶼亮點計畫--客庄水圳聚落生態場域統包工程」及「六堆園區生態島嶼亮點計畫--客庄水圳聚落生態場域專案管理(含監造)委託技術服務」等 2 案，將儘速依期程趕辦後續作業。 二、藝文展演設施管理計畫：「六堆園區兒童探索空間常設展設計施作及推廣管理」、「六堆園區演藝廳及多媒體館外牆防水整修工程」、「六堆園區演藝廳及多媒體館外牆防水整修工程設計及監造委託技術服務」、「六堆園區藝文景觀表演平臺工程」、「六堆園區藝文景觀表演平臺設計及監造委託技術服務」等 5 案，將儘速依期程趕辦後續作業。 三、公共服務及苗栗園區遊客服務中心新建工程計畫：「苗栗園區人行入口景觀及遊客服務中心新建工程」、「苗栗園區人行入口景觀及遊客服務中心新建工程設計規劃監造委託服務」、「苗栗園區擴增用電配電系統」、「六堆園區遊客導覽諮詢服務設施設備及志工備勤空間設置工程」、「六堆園區遊客導覽諮詢服務設施設備及志工備勤空間規劃設計及監造」等 5 案，將儘速依期程趕辦後續作業。 四、園區設施基本維持計畫：「103 年度六堆園區部分設施修復工作」、「六堆客家文化園區整體景觀改善工程設計及監造」、「103 年度六堆客家文化園區機電設備設施更新及增設」、「103 年度六堆客家文化園區太陽能光電系統逆變器更新及展示系統軟體升級」、「103 年度六堆園區安全防護設備修繕」等 5 案，將儘速依期程趕辦後續作業。
管考建議 (國發會)	一、總累計執行進度落後 1.46 百分點，年累計支用比 76.78%。 二、請持續加強管考機制，就落後原因積極改善，俾如期如質完成計畫總目標。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
穩定肥料及相關資材 供需計畫	農委會	總累計	100	98.75	落後 1.25	2,569,745	1,562,647	60.81	60.81	60.81
		年累計	100	98.75	落後 1.25	2,569,745	1,562,647	60.81		
執行情形		一、統計各區分署已完成 103 年化學肥料補貼數量總計 76 萬 5,080 公噸，補貼經費 12 億 8,568 萬 1,000 元審核作業。 二、經初步檢討，前開補貼數量及經費，較預定數分別減少 3.5 萬公噸及 9 億元，另較 102 年度亦分別減少 7.1 萬公噸及 14.4 億元；補貼數量減少部分，除受尿素於 102 年 10 月退出補貼因素影響外，103 年度國內整體化肥用量較 102 年度減少約 2.6 萬公噸，補貼數量併同減少約 1.9 萬公噸，顯示推廣農民合理用肥漸具成效，國內整理化肥用量逐年遞減。 三、103 年度已輔導肥料經銷點運用電腦、網際網路及購肥系統銷售補貼肥料，迄 12 月底累計約 1,688 個經銷點完成資訊化工作。爰 104 年 1 月 1 日起，已全面推行農民購買補貼肥料以身分證統編登錄新措施，肥料補貼作業邁入資訊化。 四、配套措施 (一)持續追蹤輔導合理化施肥示範點 1,424 個，輔導農友作物健康管理減肥減藥，友善環境耕作。 (二)舉辦各類作物健康管理減化肥等教育講習會累計 273 場次，暨辦理相關研討會 3 場次，累計參與約 1 萬 7,124 人次。 (三)提供農民土壤肥力檢測及作物需肥診斷技術服務累計約 3 萬 2,228 件。 (四)各區分署辦理國產有機質肥料現場製程查核，與品牌推薦作業，迄 12 月底網路公布登載推薦計 71 家業者 157 個品牌。 (五)獎勵施用國產有機質肥料執行面積 2 萬 3,500 公頃及臺中市政府配合推廣 4,400 公頃，合計推廣 2 萬 7,900 公頃，11 萬 1,600 公噸。 (六)監測調查各廠牌農民習慣施用肥料登記成分及重金屬含量 100 件。 (七)辦理有機農業適用肥料推廣面積約 1,318 公頃，1 萬 544 公噸。 (八)冬季休閒期綠肥推廣面積 4 萬 3,850 公頃。								
重要成果		一、迄 103 年 12 月份 10 種主要化學肥料補貼農民漲幅價差每包(40 公斤)31 元至 157 元不等，經本計畫執行補貼作業後，國內農民購肥價格穩定，確已減輕農民農業生產成本之負擔。								

	二、本計畫實施後國內化肥施用量逐年已呈遞減趨勢。(97 年 101.4 萬公噸，98 年 104.2 萬公噸，99 年 103.1 萬公噸，100 年 100.8 萬公噸，101 年 101.1 萬公噸，102 年 100 萬公噸、103 年約 98 萬公噸)。 三、迄 12 月底累計約 1,688 個經銷點完成資訊化工作，自 104 年 1 月 1 日起，已全面推行農民購買補貼肥料以身分證統編登錄新措施，促進補貼作業資訊化。
落後原因	一、有機農業適用肥料推廣計畫之執行，有機農戶申請比例偏低(約 26%)。 二、冬季休閒期綠肥推廣計畫，因種苗場綠肥種子庫存數不足因素。 三、103 年國際製肥原物料行情維持低檔，低於原計畫預估值，致政府差額補貼額度減少所致。 四、實際補貼數量較計畫預估數減少約 3.5 萬公噸。
因應對策	一、有機農業適用肥料推廣計畫之執行率偏低部分，將於後續年度計畫檢討執行內容，俾符合有機農戶輔導需求。 二、將加強計畫各執行機關橫向聯繫，確保各配合事項(綠肥種子等)按計畫內容達成預定目標。 三、國際製肥原物料行情屬不可控制因素，仍將依歷史波動走勢，加強原料行情與計畫經費之評估作業。 四、補貼肥料數量之預估，將加強肥料替代、價格漲跌及相關減肥措施等因素之影響。
管考建議(國發會)	本案 103 年度預算執行率偏低，請主辦機關深入檢討相關缺失，並應依補助對象規劃實際補助需求，或應適時辦理計畫調整，俾便符合計畫目標。

計畫名稱	主管機關		執行進度			經費支用			預算執行率 (%)	年度預算 達成率 (%)
			預定 (%)	實際 (%)	比較 (個百分點)	預定 (千元)	實際 (千元)	支用比 (%)		
歷史與文化資產維護 發展(第二期)計畫	文化部	總累計	77.64	76.63	落後 1.01	3,049,583	2,919,648	95.74	94.30	94.30
		年累計	100	95.71	落後 4.29	755,806	625,871	82.81		
執行情形			一、有形文化資產管理體系計畫--古蹟聚落組：已完成高雄市歷史建築「逍遙園（起居空間）」調查研究與修復計畫、澎湖縣望安花宅古厝規劃設計、市定古蹟高雄州水產試驗場（英國領事館）及前清打狗英國領事館登山古道修復工程等 45 處（件）古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀調查研究或修復工程。 二、有形文化資產管理體系計畫--古物遺址組： (一)已辦理遺址、水下文資之各項計畫審查及工作會議等 14 場次，如「臺灣附近海域水下文資調查第 3 階段第 2 年期末報告暨第 3 年計畫審查」、「國定八仙洞遺址違章建築拆除工作協調會議」、「自由中國號展存保護建物規劃設計服務案細設審查會議」，累計共 123 場。 (二)已辦理遺址審查委員會 1 次，累計 6 場。 (三)已辦理國定遺址範圍調查、保存等計畫(跨年 103~104 年)2 案委辦案-「國定遺址萬山岩雕群保存維護研究計畫」、「遺址土地使用現況及管制規範調查計畫」審查及第 1 期撥款程序。 (四)辦理有形文化資產維運案年底工作會議，檢核完成 10 處有形文化資產空間資訊。 三、有形文化資產管理體系計畫--國家人權博物館籌備處：景美人權文化園區仁愛樓二、三期修復工程 100%；完成政治受難者(醫生群像)研究暨展示腳本規劃案結案審查作業；人權主題展示計畫結案。 四、有形文化資產管理體系計畫--臺博館：臺博館鐵道部博物館古蹟修復工程門窗整修開始；臺博館鐵道部博物館景觀工程細部設計修訂；臺博館鐵道部博物館室內裝修工程設計審查中(4、8、9 號建物)；臺博館本館再利用展覽工程(三樓)設計完成；臺博館本館再利用裝飾工程設計完成。 五、無形文化資產與保存技術推廣計畫--傳藝民俗組：重要傳統藝術傳習計畫完成第 3 期款撥；重要傳統工藝美術藝生習藝成果展完成撥付第 3 期款並結案；傳統工具特展撥付第 5 期款結案；103 年無形文化資產校園推廣計畫完成 100%場次，撥付第 4 期款結案；103 年輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫完成核撥第 2 期款。 六、文化資產保存修護研究領航計畫--文化資產保存研究中心：完成設備採購驗收；提送技術支援及檢測服務成果報告。							

	七、歷史文化場域保存活化計畫--綜合規劃組： (一)已完成產業文化資產再生計畫補助案 7 處期中報告審查會及 1 處期末報告審查；至有關公有文化資產潛力建築調查，文資局已於 8 月 28 日、9 月 1 日辦理潛力建築評鑑會議，本案研究團隊已於第 3 階段報告書彙整提出潛力建物名單(初稿)至局，於 11 月 20 日經文資局審查通過。 (二)20 號倉庫創意加值計畫第 3 期款因部分驗收未通過，擬於 104 年 1 月份驗收通過後辦理撥付；至鐵道藝術網絡計畫已完成第 2 期款撥付。 (三)已完成眷村多元文化保存計畫補助案第 2 期款撥付及結案作業。 (四)已完成文化資產區域環境整合計畫補助案第 2 期款撥付作業。 八、文化資產育成中心建置計畫--文化資產保存研究中心： (一)「傳說、歌謠與文化」音樂文化講座活動於 12 月 15 日驗收通過。 (二)油畫鑑賞與科學管理研習(本案因故改辦理古蹟歷史建築塗鴉處理研習)於 12 月 12 日驗收通過。 (三)文化資產氣候地圖建置技術研習於 10 月 29 日驗收通過。 (四)兩岸出土遺物保存修復特展及座談會(本案因故更名為「科技探秘—科技探秘-文化資產保存與環境特展暨座談會」)：本案因執行期程為 103 年 6 月 12 日至 104 年 2 月 27 日，爰於 104 年 2 月辦理驗收審查。 (五)古蹟構件保存包裝運送研習於 11 月 19 日驗收通過。 九、文化資產育成中心建置計畫--秘書室：育成中心整修案部分驗收結算書已獲准另召開會議辦理；育成中心內裝工程案已於 103 年 12 月 24 日准部分驗收，另剩餘部分，俟取得使照、室修證後再予驗收；道路景觀工程進度達 100%，將另排定日期驗收。 十、文化資產育成中心建置計畫--綜合規劃組： (一)於 12 月完成「文化資產資訊出版推廣服務計畫」，包括圖書編目典藏、3 場導讀活動、參加國際書展等各項工作。 (二)於 12 月完成「全國文化資產管理系統維運案」，本案網站為運成果獲文化部評選為第 1 組優選推薦網站。 (三)已於 12 月辦理文化資產個案資料徵集及典藏計畫(跨年度計畫)第 2 階段報告書審查通過，截至 12 月已徵集成果報告書 49 萬 2,462 筆。
重要成果	一、完成高雄市市定古蹟打狗公學校(旗津國小)、基隆市定古蹟市長官邸及歷史建築南投稅務出張所修復工程等古蹟、歷史建築、文化景觀及聚落之文化資產保存維護 5 處。 二、無形文化資產與保存技術推廣計畫受益或服務對象人數 28 萬 9,700 人。 三、辦理歷史文化場域保存活化計畫 34 案及辦理文化資產人才培訓 958 人。
落後原因	一、有形文化資產管理體系計畫--古蹟聚落組：有關推動有形文化資產管理體系計畫之「古蹟歷史建築修復再利用示

	範計畫」及「聚落文化景觀潛力點發展計畫」2項子計畫支用比未達9成，其除依文化資產保存法規定古蹟、歷史建築、聚落及文化景觀保存維護之過程較為嚴謹，易受外在因素如縣市政府納入預算延宕、發包過程中數度流標、變更設計或設計書圖審核不過等等不可抗力因素，以致延宕各計畫之撥款進度。 二、文化資產育成中心建置計畫--秘書室： (一)育成中心整修案因承造人對部分驗收結算數額異議，致未能付款。 (二)育成中心內裝工程案因未領得使照、室修證，目前僅得部分驗收。 (三)道路景觀工程進度達100%，尚未進行驗收。
因應對策	一、有形文化資產管理體系計畫--古蹟聚落組： (一)本計畫主要以輔助縣市政府辦理古蹟歷史建築聚落及文化景觀保存維護工作，為督導各縣市確實執行計畫，文資局雖每3個月邀集各縣市召開進度及經費執行控管會議，以加強各項計畫之執行，惟因修復工程進行期間，往往因施作拆解時方見古蹟歷史建築隱蔽部分毀損情形嚴重，若為求儘速完工置之不理，未來修復成效不彰，因此易有變更設計、工程爭議或停工等問題，此情無法於工程之初即可洞見。 (二)本計畫雖支用比未達9成，但倘包含各項計畫發包或結案後之節餘款，則達成率88%。 二、文化資產育成中心建置計畫--秘書室： (一)育成中心整修案，已獲准另召開會議辦理結算數額討論，俟獲決議後辦理。 (二)育成中心內裝工程案，已積極依臺中市政府要求補正，俟獲使照、室修證後，辦理剩餘部分驗收撥款。 (三)道路景觀工程，將積極辦理驗收後，結算付款。俟執行期程到期(104年2月27日)儘速趕辦驗收撥款事宜。
管考建議(國發會)	請文化部確實督導所屬加速驗收撥款行政作業，並督促縣市政府趕辦。

伍、行政院及所屬一級機關公文時效分類統計表

103年10月份統計分析

期間／類別		10月份 (1)	上季月平均值 (2)	增減值 (1)-(2)	尚待改進機關
一般公文	各機關平均辦結率(%)	90.90	90.47	0.43	國防部(85.15) 行政院陸委會(86.11) 教育部(87.11)
	發文平均使用日數	2.12	2.16	-0.04	行政院陸委會(4.24) 金融監督管理委員會(3.55) 教育部(3.36)
	待辦公文之逾限率(%)	7.60	9.57	-1.97	行政院陸委會(20.76) 交通部(17.29) 國家發展委員會(16.43)
立法委員質詢案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.59	100.00	-1.41	外交部(0.00) 行政院農委會(66.67) 交通部(96.43)
人民申請案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.33	98.81	-0.48	行政院原能會(84.05) 內政部(84.25) 原住民族委員會(95.24)
訴願案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.79	99.90	-0.11	內政部(98.65)
人民陳情案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		97.08	95.68	1.40	法務部(79.84) 外交部(80.22) 僑務委員會(83.13)
專案管制案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.97	99.13	-0.14	行政院(50.00) 金融監督管理委員會(66.67) 衛生福利部(66.67)
監察案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		86.05	85.79	0.26	交通部(63.64) 外交部(75.00)

103年11月份統計分析

期間／類別		11月份 (1)	上季月平均值 (2)	增減值 (1)-(2)	尚待改進機關
一般公文	各機關平均辦結率(%)	90.07	90.47	-0.40	國防部(83.96) 金融監督管理委員會(84.57) 教育部(84.90)
	發文平均使用日數	2.11	2.16	-0.05	行政院陸委會(3.90) 法務部(3.55) 教育部(3.44)
	待辦公文之逾限率(%)	8.79	9.57	-0.78	國防部(21.43) 法務部(21.14) 行政院陸委會(20.76)
立法委員質詢案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		97.93	100.00	-2.07	國家發展委員會(83.33) 內政部(89.47) 交通部(95.45)
人民申請案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.74	98.81	-0.07	臺灣省政府(0.00) 內政部(88.10) 僑務委員會(89.29)
訴願案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.79	99.90	-0.11	內政部(98.68) 教育部(99.22)
人民陳情案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		95.68	95.68	0.00	法務部(70.13) 文化部(75.82) 國家發展委員會(77.97)
專案管制案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		96.96	99.13	-2.17	行政院(0.00) 行政院人事行政總處(66.67) 行政院農委會(83.33)
監察案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		93.17	85.79	7.38	行政院農委會(60.00) 交通部(66.67) 法務部(90.91)

103年12月份統計分析

期間／類別		12月份 (1)	上季月平均值 (2)	增減值 (1)-(2)	尚待改進機關
一般公文	各機關平均辦結率(%)	91.00	90.47	0.53	國防部(84.02) 金融監督管理委員會(86.00) 教育部(87.47)
	發文平均使用日數	2.06	2.16	-0.10	行政院陸委會(4.23) 金融監督管理委員會(3.55) 教育部(3.34)
	待辦公文之逾限率(%)	7.95	9.57	-1.62	交通部(20.86) 行政院陸委會(19.24) 國防部(18.36)
立法委員質詢案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.55	100.00	-1.45	國家發展委員會(50.00) 行政院農委會(80.00)
人民申請案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		99.08	98.81	0.27	原住民族委員會(89.74) 行政院原能會(92.58) 內政部(95.52)
訴願案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.36	99.90	-1.54	外交部(62.71)
人民陳情案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		96.15	95.68	0.47	行政院陸委會(71.62) 法務部(74.14) 國家發展委員會(77.98)
專案管制案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		98.31	99.13	-0.80	行政院陸委會(0.00) 國立故宮博物院(0.00) 行政院(66.67)
監察案件 (屆期應辦案件之依限辦結率)(%)		93.36	85.79	7.57	行政院農委會(80.00) 法務部(88.89) 衛生福利部(93.33)

一、一般公文時效統計表

103年10月份

項目 數 量 機關	應辦公文統計				已 辦 結 公 文 統 計										待辦公文統計					
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	本月 創稿數 (3)	案件總數 (1)+(2)+(3) (4)	發 文 統 計							存查 件數 (10)	辦 結 公 文 合 計 (8)+(10)		待辦公文 (4)-(11)		未逾辦理 期限件數 (13)	已逾辦理期限		
					6日以內辦結		6日以上至30日辦結		30日以上辦結	小 計	發文平均		件數 (11)	件數 (11)/(4)	件 數 (12)	件數 (12)/(4)		期 限 件 數 (14)	件數 (14)/(12)	
					件數 (5)	% (5)/(8)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)	(5)+(6)+(7) (8)	使用日數 (9)									
行政院	5,877	499	1,987	8,363	1,916	95.13	97	4.82	1	2,014	1.58	5,810	7,824	93.55	539	6.45	504	35	6.49	
內政部	53,791	5,496	13,218	72,505	20,292	93.33	1,435	6.60	15	21,742	2.14	45,494	67,236	92.73	5,269	7.27	4,858	411	7.80	
外交部	25,681	1,747	6,708	34,136	6,811	97.29	189	2.70	1	7,001	1.73	25,800	32,801	96.09	1,335	3.91	1,212	123	9.2	
國防部	24,447	4,287	4,313	33,047	11,811	85.20	1,902	13.72	150	13,863	2.15	14,277	28,140	85.15	4,907	14.85	4,228	679	13.84	
財政部	3,058	300	868	4,226	1,268	99.45	7	0.55	0	1,275	1.43	2,682	3,957	93.63	269	6.37	265	4	1.49	
教育部	11,173	2,338	4,498	18,009	7,261	86.72	1,097	13.10	15	8,373	3.36	7,315	15,688	87.11	2,321	12.89	2,312	9	0.39	
法務部	5,821	593	758	7,172	1,785	91.82	156	8.02	3	1,944	3.08	4,510	6,454	89.99	718	10.01	613	105	14.62	
經濟部	15,670	1,496	2,360	19,526	4,938	94.87	262	5.03	5	5,205	2.14	12,384	17,589	90.08	1,937	9.92	1,810	127	6.56	
交通部	10,505	1,363	1,531	13,399	3,583	89.98	377	9.47	22	3,982	2.67	7,931	11,913	88.91	1,486	11.09	1,229	257	17.29	
文化部	2,636	717	2,624	5,977	1,756	95.96	73	3.99	1	1,830	2.29	3,401	5,231	87.52	746	12.48	718	28	3.75	
衛生福利部	7,708	934	3,110	11,752	3,894	91.82	333	7.85	14	4,241	2.63	6,446	10,687	90.94	1,065	9.06	992	73	6.85	
勞動部	2,878	577	1,445	4,900	1,815	95.98	76	4.02	0	1,891	1.80	2,787	4,678	95.47	222	4.53	209	13	5.86	
科技部	3,135	395	683	4,213	2,558	99.19	21	0.81	0	2,579	1.68	1,095	3,674	87.21	539	12.79	539	0	0.00	
蒙藏委員會	355	39	174	568	68	95.77	3	4.23	0	71	1.61	451	522	91.90	46	8.10	45	1	2.17	
僑務委員會	2,706	416	752	3,874	1,013	86.95	152	13.05	0	1,165	3.01	2,295	3,460	89.31	414	10.69	372	42	10.14	
中央銀行	3,807	467	1,126	5,400	709	100.00	0	0.00	0	709	1.79	4,151	4,860	90.00	540	10.00	540	0	0.00	
行政院主計總處	2,823	304	679	3,806	649	98.93	7	1.07	0	656	1.30	2,827	3,483	91.51	323	8.49	323	0	0.00	
行政院人事行政總處	2,195	435	1,427	4,057	1,364	97.64	33	2.36	0	1,397	1.24	2,299	3,696	91.10	361	8.90	332	29	8.03	
行政院環保署	10,485	1,625	2,961	15,071	3,683	97.15	108	2.85	0	3,791	1.63	9,481	13,272	88.06	1,799	11.94	1,795	4	0.22	
國立故宮博物院	847	152	1,076	2,075	484	94.16	30	5.84	0	514	2.08	1,393	1,907	91.90	168	8.10	167	1	0.60	
行政院陸委會	1,995	403	828	3,226	524	79.15	135	20.39	3	662	4.24	2,116	2,778	86.11	448	13.89	355	93	20.76	
國家發展委員會	4,160	604	1,520	6,284	1,096	92.26	90	7.58	2	1,188	1.85	4,609	5,797	92.25	487	7.75	407	80	16.43	
金融監督管理委員會	588	175	714	1,477	337	88.68	42	11.05	1	380	3.55	959	1,339	90.66	138	9.34	138	0	0.00	
國軍退除役官兵輔導委員會	7,019	789	1,102	8,910	2,295	94.95	121	5.01	1	2,417	2.76	5,545	7,962	89.36	948	10.64	948	0	0.00	
行政院原能會	1,013	177	634	1,824	620	96.27	20	3.11	4	644	2.45	1,023	1,667	91.39	157	8.61	136	21	13.38	
行政院農委會	6,017	615	1,045	7,677	2,319	96.58	81	3.37	1	2,401	1.95	4,621	7,022	91.47	655	8.53	591	64	9.77	
公平交易委員會	1,751	4	506	2,261	738	100.00	0	0.00	0	738	0.84	1,513	2,251	99.56	10	0.44	10	0	0.00	
行政院工程會	1,835	268	313	2,416	690	97.87	15	2.13	0	705	2.34	1,435	2,140	88.58	276	11.42	276	0	0.00	
原住民族委員會	3,444	443	1,805	5,692	2,151	96.72	73	3.28	0	2,224	1.43	2,949	5,173	90.88	519	9.12	499	20	3.85	
行政院海巡署	1,513	298	1,023	2,834	879	97.99	18	2.01	0	897	2.31	1,670	2,567	90.58	267	9.42	267	0	0.00	
客家委員會	975	170	816	1,961	788	98.99	8	1.01	0	796	2.02	1,032	1,828	93.22	133	6.78	130	3	2.26	
國家通訊傳播委員會	3,160	335	936	4,431	1,402	96.36	53	3.64	0	1,455	1.60	2,728	4,183	94.40	248	5.60	241	7	2.82	
中央選舉委員會	945	69	194	1,208	477	99.79	1	0.21	0	478	1.42	690	1,168	96.69	40	3.31	40	0	0.00	
臺灣省政府	335	61	167	563	209	95.87	9	4.13	0	218	1.62	295	513	91.12	50	8.88	44	6	12.00	
福建省政府	214	32	68	314	48	96.00	2	4.00	0	50	2.42	250	300	95.54	14	4.46	14	0	0.00	
總 計	230,562	28,623	63,969	323,154	92,231	92.70	7,026	7.06	239	99,496	2.12	194,264	293,760	90.90	29,394	9.10	27,159	2,235	7.60	

附註：公文時效管理作業係以分層方式管制統計，表列數字為機關內部單位處理數量，以下各表均同。

103年11月份

項 目 數 量 機 關	應辦公文統計				已 辦 結 公 文 統 計												待辦公文統計					
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	本月 創稿數 (3)	案件總數 (1)+(2)+(3) (4)	發 文 統 計							存 查 件數 (10)	辦 結 公 文 合 計 (8)+(10)		待辦公文 (4)-(11)		未逾辦理 期限件數 (13)	已逾辦理期限				
					6日以內辦結		6日以上至30日辦結		30日以上辦結	小 計	發文平均		件數	件數	%	件 數		%	期限件數	件數	%	
					件數	%	件數	%	件數	(5)+(6)+(7)	使用日數											
					(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(8)	(9)		(11)	(11)/(4)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	(14)/(12)			
行政院	5,405	539	1,707	7,651	1,729	95.16	88	4.84	0	1,817	1.58	5,387	7,204	94.16	447	5.84	396	51	11.41			
內政部	46,651	5,222	12,577	64,450	18,225	93.32	1,296	6.64	9	19,530	2.11	39,727	59,257	91.94	5,193	8.06	4,828	365	7.03			
外交部	24,009	1,355	5,881	31,245	6,056	97.60	146	2.35	3	6,205	1.75	22,961	29,166	93.35	2,079	6.65	1,966	113	5.44			
國防部	22,221	4,907	4,029	31,157	11,168	86.82	1,647	12.80	48	12,863	1.88	13,296	26,159	83.96	4,998	16.04	3,927	1,071	21.43			
財政部	2,646	270	923	3,839	1,220	99.67	4	0.33	0	1,224	1.29	2,359	3,583	93.33	256	6.67	255	1	0.39			
教育部	10,892	2,309	4,466	17,667	7,118	86.36	1,109	13.46	15	8,242	3.44	6,757	14,999	84.90	2,668	15.10	2,664	4	0.15			
法務部	5,126	683	727	6,536	1,558	90.01	168	9.71	5	1,731	3.55	4,228	5,959	91.17	577	8.83	455	122	21.14			
經濟部	13,167	1,828	2,183	17,178	4,351	94.65	245	5.33	1	4,597	2.01	10,948	15,545	90.49	1,633	9.51	1,438	195	11.94			
交通部	9,525	1,477	1,411	12,413	3,411	89.25	396	10.36	15	3,822	2.68	7,236	11,058	89.08	1,355	10.92	1,101	254	18.75			
文化部	2,430	723	2,482	5,635	1,712	96.23	67	3.77	0	1,779	2.05	3,226	5,005	88.82	630	11.18	612	18	2.86			
衛生福利部	6,793	1,025	2,864	10,682	3,570	92.90	266	6.92	7	3,843	2.39	5,803	9,646	90.30	1,036	9.70	982	54	5.21			
勞動部	2,482	220	1,320	4,022	1,726	98.52	26	1.48	0	1,752	1.39	2,012	3,764	93.59	258	6.41	256	2	0.78			
科技部	2,641	520	777	3,938	2,296	99.14	20	0.86	0	2,316	1.44	1,288	3,604	91.52	334	8.48	318	16	4.79			
蒙藏委員會	335	45	166	546	70	89.74	8	10.26	0	78	2.37	422	500	91.58	46	8.42	45	1	2.17			
僑務委員會	2,127	414	785	3,326	1,140	89.20	138	10.80	0	1,278	2.65	1,719	2,997	90.11	329	9.89	290	39	11.85			
中央銀行	3,085	529	1,085	4,699	674	100.00	0	0.00	0	674	1.93	3,567	4,241	90.25	458	9.75	458	0	0.00			
行政院主計總處	2,739	322	637	3,698	606	99.02	6	0.98	0	612	1.32	2,757	3,369	91.10	329	8.90	329	0	0.00			
行政院人事行政總處	2,273	361	1,362	3,996	1,387	97.95	29	2.05	0	1,416	1.23	2,327	3,743	93.67	253	6.33	242	11	4.35			
行政院環保署	9,304	1,732	2,628	13,664	3,211	97.36	87	2.64	0	3,298	1.60	8,592	11,890	87.02	1,774	12.98	1,770	4	0.23			
國立故宮博物院	759	167	1,029	1,955	396	91.03	39	8.97	0	435	2.62	1,360	1,795	91.82	160	8.18	160	0	0.00			
行政院陸委會	1,811	448	715	2,974	510	82.13	111	17.87	0	621	3.90	1,958	2,579	86.72	395	13.28	313	82	20.76			
國家發展委員會	3,700	487	1,238	5,425	968	93.08	72	6.92	0	1,040	1.80	3,816	4,856	89.51	569	10.49	493	76	13.36			
金融監督管理委員會	623	136	563	1,322	317	92.15	27	7.85	0	344	3.17	774	1,118	84.57	204	15.43	204	0	0.00			
國軍退除役官兵輔導委員會	6,377	940	1,060	8,377	2,147	95.17	107	4.74	2	2,256	2.81	5,219	7,475	89.23	902	10.77	902	0	0.00			
行政院原能會	906	143	499	1,548	485	94.17	28	5.44	2	515	2.41	854	1,369	88.44	179	11.56	169	10	5.59			
行政院農委會	5,466	655	1,028	7,149	2,161	96.73	73	3.27	0	2,234	2.03	4,163	6,397	89.48	752	10.52	691	61	8.11			
公平交易委員會	1,797	10	405	2,212	647	100.00	0	0.00	0	647	0.93	1,558	2,205	99.68	7	0.32	7	0	0.00			
行政院工程會	1,539	238	267	2,044	621	96.13	25	3.87	0	646	2.43	1,138	1,784	87.28	260	12.72	260	0	0.00			
原住民族委員會	2,958	457	1,688	5,103	1,966	95.11	101	4.89	0	2,067	1.53	2,656	4,723	92.55	380	7.45	373	7	1.84			
行政院海巡署	1,364	262	961	2,587	789	98.38	13	1.62	0	802	2.26	1,527	2,329	90.03	258	9.97	258	0	0.00			
客家委員會	975	133	864	1,972	754	98.56	11	1.44	0	765	2.19	999	1,764	89.45	208	10.55	205	3	1.44			
國家通訊傳播委員會	2,784	174	844	3,802	1,175	94.99	61	4.93	1	1,237	1.64	2,330	3,567	93.82	235	6.18	232	3	1.28			
中央選舉委員會	1,004	40	166	1,210	524	99.62	2	0.38	0	526	1.33	644	1,170	96.69	40	3.31	40	0	0.00			
臺灣省政府	305	48	153	506	201	97.57	5	2.43	0	206	1.46	259	465	91.90	41	8.10	35	6	14.63			
福建省政府	183	16	41	240	23	85.19	4	14.81	0	27	2.59	193	220	91.67	20	8.33	18	2	10.00			
總 計	206,402	28,835	59,531	294,768	84,912	92.86	6,425	7.03	108	91,445	2.11	174,060	265,505	90.07	29,263	9.93	26,692	2,571	8.79			

103年12月份

項 目 數 量 機 關	應辦公文統計				已 辦 結 公 文 統 計										待辦公文統計				
	本月	截至上月	本月	案件總數	發 文 統 計							存查	辦結公文合計		待辦公文		未逾辦理	已逾辦理期限	
	新收件數	待辦件數	創稿數	(1)+(2)+(3)	6日以內辦結		6日以上至30日辦結		30日以上辦結	小 計	發文平均	件數	(8)+(10)		(4)-(11)		期限件數	已逾辦理期限	
	(1)	(2)	(3)	(4)	件數	%	件數	%	件數	(5)+(6)+(7)	使用日數		件數	%	件 數	%		件數	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(4)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	(14)/(12)
行政院	6,381	445	2,067	8,893	1,827	93.98	116	5.97	1	1,944	1.74	6,353	8,297	93.30	596	6.70	536	60	10.07
內政部	57,979	5,010	15,689	78,678	21,950	93.36	1,554	6.61	7	23,511	2.21	49,391	72,902	92.66	5,776	7.34	5,445	331	5.73
外交部	23,995	2,100	7,039	33,134	7,401	97.97	152	2.01	1	7,554	1.86	24,077	31,631	95.46	1,503	4.54	1,363	140	9.31
國防部	24,817	4,998	4,223	34,038	11,017	81.78	2,338	17.36	116	13,471	2.30	15,127	28,598	84.02	5,440	15.98	4,441	999	18.36
財政部	3,496	256	1,009	4,761	1,355	99.49	7	0.51	0	1,362	1.35	3,063	4,425	92.94	336	7.06	335	1	0.30
教育部	12,541	2,586	6,333	21,460	8,892	87.46	1,264	12.43	11	10,167	3.34	8,604	18,771	87.47	2,689	12.53	2,683	6	0.22
法務部	6,515	635	971	8,121	1,946	92.58	149	7.09	7	2,102	3.07	5,503	7,605	93.65	516	6.35	441	75	14.53
經濟部	17,867	1,794	3,186	22,847	6,472	96.10	258	3.83	5	6,735	1.97	14,307	21,042	92.10	1,805	7.90	1,670	135	7.48
交通部	12,001	1,341	1,761	15,103	3,887	90.54	400	9.32	6	4,293	2.32	9,166	13,459	89.11	1,644	10.89	1,301	343	20.86
文化部	3,450	628	3,647	7,725	2,075	96.65	72	3.35	0	2,147	1.92	4,934	7,081	91.66	644	8.34	611	33	5.12
衛生福利部	8,993	1,014	3,575	13,582	4,395	93.02	314	6.65	16	4,725	2.58	7,325	12,050	88.72	1,532	11.28	1,394	138	9.01
勞動部	2,971	255	1,655	4,881	2,018	97.72	47	2.28	0	2,065	1.55	2,571	4,636	94.98	245	5.02	241	4	1.63
科技部	2,928	322	727	3,977	2,442	99.27	18	0.73	0	2,460	1.53	1,154	3,614	90.87	363	9.13	361	2	0.55
蒙藏委員會	489	44	276	809	104	97.20	3	2.80	0	107	1.74	632	739	91.35	70	8.65	70	0	0.00
僑務委員會	3,036	334	1,177	4,547	1,612	92.80	125	7.20	0	1,737	2.31	2,442	4,179	91.91	368	8.09	354	14	3.80
中央銀行	4,307	447	1,311	6,065	779	100.00	0	0.00	0	779	1.81	4,802	5,581	92.02	484	7.98	484	0	0.00
行政院主計總處	3,493	327	789	4,609	731	99.19	6	0.81	0	737	1.30	3,561	4,298	93.25	311	6.75	311	0	0.00
行政院人事行政總處	2,673	241	1,492	4,406	1,573	98.50	24	1.50	0	1,597	1.21	2,429	4,026	91.38	380	8.62	374	6	1.58
行政院環保署	11,936	1,732	3,395	17,063	4,356	96.56	147	3.26	8	4,511	1.78	10,711	15,222	89.21	1,841	10.79	1,838	3	0.16
國立故宮博物院	964	160	1,529	2,653	524	95.27	26	4.73	0	550	2.00	1,902	2,452	92.42	201	7.58	201	0	0.00
行政院陸委會	2,325	390	980	3,695	538	80.90	124	18.65	3	665	4.23	2,609	3,274	88.61	421	11.39	340	81	19.24
國家發展委員會	4,836	569	1,589	6,994	1,219	91.59	112	8.41	0	1,331	1.93	4,995	6,326	90.45	668	9.55	589	79	11.83
金融監督管理委員會	718	192	818	1,728	382	87.41	54	12.36	1	437	3.55	1,049	1,486	86.00	242	14.00	242	0	0.00
國軍退除役官兵輔導委員會	7,580	888	1,311	9,779	2,566	95.60	117	4.36	1	2,684	2.63	6,253	8,937	91.39	842	8.61	842	0	0.00
行政院原能會	1,149	153	563	1,865	606	96.96	15	2.40	4	625	2.19	1,047	1,672	89.65	193	10.35	180	13	6.74
行政院農委會	6,976	752	1,394	9,122	2,792	96.91	89	3.09	0	2,881	1.98	5,327	8,208	89.98	914	10.02	865	49	5.36
公平交易委員會	1,876	7	556	2,439	918	100.00	0	0.00	0	918	0.87	1,483	2,401	98.44	38	1.56	38	0	0.00
行政院工程會	1,951	227	370	2,548	818	97.85	18	2.15	0	836	2.28	1,425	2,261	88.74	287	11.26	287	0	0.00
原住民族委員會	3,688	380	2,126	6,194	2,359	96.84	77	3.16	0	2,436	1.40	3,280	5,716	92.28	478	7.72	465	13	2.72
行政院海巡署	1,671	253	1,118	3,042	906	98.80	11	1.20	0	917	2.25	1,827	2,744	90.20	298	9.80	298	0	0.00
客家委員會	1,585	208	1,612	3,405	1,373	98.35	23	1.65	0	1,396	2.54	1,605	3,001	88.14	404	11.86	401	3	0.74
國家通訊傳播委員會	3,116	178	890	4,184	1,226	95.56	57	4.44	0	1,283	1.78	2,628	3,911	93.48	273	6.52	269	4	1.47
中央選舉委員會	1,282	40	219	1,541	576	100.00	0	0.00	0	576	1.46	894	1,470	95.39	71	4.61	71	0	0.00
臺灣省政府	444	39	243	726	304	98.38	5	1.62	0	309	1.24	353	662	91.18	64	8.82	58	6	9.38
福建省政府	312	20	75	407	56	98.25	1	1.75	0	57	1.98	329	386	94.84	21	5.16	19	2	9.52
總 計	250,341	28,965	75,715	355,021	101,995	92.80	7,723	7.03	187	109,905	2.06	213,158	323,063	91.00	31,958	9.00	29,418	2,540	7.95

二、立法委員質詢案件時效統計表

103年10月份

項目 數量 機關	應辦案件統計				已 辦 結 案 件 統 計												待 辦 案 件 統 計			
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	案件總數 (1)+(2) (3)	屆期應辦案件 之依限辦結率 (5) (3)-(14) (4)	依限辦結		逾 限 辦 結					辦結案件		發文平 均使用 日數 (12)	待辦案件 (3)-(11) (13) (13)/(3) (14) (15)		未逾 辦理 期限 件數 (14)	已逾 辦理 期限 件數 (15)		
												合 計								
							逾限5日 以內辦結	逾限5以上 至10日辦結	逾限10以上 至15日辦結	逾限15日 以上辦結	小 計 (6)+(7)+(8)+(9) (10)									
					件數 (5)	% (5)/(11)	件數 (6)	件數 (7)	件數 (8)	件數 (9)	件數 (10)	件數 (11)	% (11)/(3) (11)/(3)							
行政院	153	74	227	100.00	178	100.00	0	0	0	0	0	178	78.41	9.00	49	21.59	49	0		
內政部	28	3	31	100.00	25	100.00	0	0	0	0	0	25	80.65	4.76	6	19.35	6	0		
外交部	2	0	2	0.00	0	0.00	1	0	0	0	1	1	50.00	13.00	1	50.00	1	0		
國防部	5	0	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100.00	3.00	0	0.00	0	0		
財政部	13	0	13	100.00	10	100.00	0	0	0	0	0	10	76.92	2.90	3	23.08	3	0		
教育部	19	4	23	100.00	18	100.00	0	0	0	0	0	18	78.26	4.33	5	21.74	5	0		
法務部	1	0	1	--	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	100.00	1	0		
經濟部	25	11	36	100.00	30	100.00	0	0	0	0	0	30	83.33	5.27	6	16.67	6	0		
交通部	28	6	34	96.43	27	96.43	1	0	0	0	1	28	82.35	6.82	6	17.65	6	0		
文化部	6	0	6	100.00	6	100.00	0	0	0	0	0	6	100.00	0.83	0	0.00	0	0		
勞動部	9	1	10	100.00	10	100.00	0	0	0	0	0	10	100.00	2.70	0	0.00	0	0		
科技部	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	100.00	3.47	0	0.00	0	0		
行政院主計總處	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	100.00	4.38	0	0.00	0	0		
行政院人事行政總處	6	0	6	100.00	6	100.00	0	0	0	0	0	6	100.00	2.00	0	0.00	0	0		
行政院環保署	14	1	15	100.00	8	100.00	0	0	0	0	0	8	53.33	4.38	7	46.67	7	0		
行政院陸委會	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	5.50	0	0.00	0	0		
國家發展委員會	7	2	9	100.00	6	100.00	0	0	0	0	0	6	66.67	3.58	3	33.33	3	0		
行政院農委會	9	2	11	66.67	6	75.00	2	0	0	0	2	8	72.73	3.80	3	27.27	2	1		
行政院工程會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	3.40	0	0.00	0	0		
國家通訊傳播委員會	2	1	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	4.33	0	0.00	0	0		
中央選舉委員會	2	0	2	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	50.00	3.00	1	50.00	1	0		
總 計	340	105	445	98.59	350	98.87	4	0	0	0	4	354	79.55	4.31	91	20.45	90	1		

附註：1.本表期限計算係以行政院及所屬各機關辦理答復立法委員質詢案件處理原則及其相關規定之日數為基準。

2.行政院所列資料係代表該院自立法院提出質詢至函復之時效統計，其發文平均使用日數即為結案平均使用日數。

103年11月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已 辦 結 案 件 統 計											待 辦 案 件 統 計			
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	案件總數 (1)+(2) (3)	屆期應辦案件 之依限辦結率 (5) (3)-(14) (4)	依限辦結		逾 限 辦 結					辦結案件		發文平 均使用 日數 (12)	待辦案件		未逾 辦理 期限 件數 (14)	已逾 辦理 期限 件數 (15)	
												合 計							
							逾限5日 以內辦結	逾限5以上 至10日辦結	逾限10以上 至15日辦結	逾限15日 以上辦結	小 計 (6)+(7)+(8)+(9)	(5)+(10)			(3)-(11)				
					件數	%	件數	件數	件數	件數	件數	%	件數		%	件數			%
(5)	(5)/(11)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)/(3)	(13)	(13)/(3)	(14)	(15)							
行政院	109	49	158	100.00	119	100.00	0	0	0	0	0	119	75.32	10.00	39	24.68	39	0	
內政部	13	6	19	89.47	17	89.47	2	0	0	0	2	19	100.00	4.63	0	0.00	0	0	
外交部	1	1	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	9.00	0	0.00	0	0	
國防部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	3.00	0	0.00	0	0	
財政部	7	3	10	100.00	10	100.00	0	0	0	0	0	10	100.00	2.70	0	0.00	0	0	
教育部	9	5	14	100.00	14	100.00	0	0	0	0	0	14	100.00	4.79	0	0.00	0	0	
法務部	1	1	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	3.00	0	0.00	0	0	
經濟部	16	6	22	95.45	21	95.45	1	0	0	0	1	22	100.00	4.91	0	0.00	0	0	
交通部	20	6	26	95.45	21	95.45	1	0	0	0	1	22	84.62	6.91	4	15.38	4	0	
衛生福利部	26	10	36	97.22	35	97.22	1	0	0	0	1	36	100.00	4.69	0	0.00	0	0	
勞動部	10	0	10	100.00	10	100.00	0	0	0	0	0	10	100.00	1.80	0	0.00	0	0	
行政院主計總處	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	2.50	0	0.00	0	0	
行政院人事行政總處	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	2.50	0	0.00	0	0	
行政院環保署	1	7	8	100.00	8	100.00	0	0	0	0	0	8	100.00	4.94	0	0.00	0	0	
行政院陸委會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	1.00	0	0.00	0	0	
國家發展委員會	3	3	6	83.33	5	83.33	1	0	0	0	1	6	100.00	5.50	0	0.00	0	0	
行政院農委會	3	3	6	100.00	6	100.00	0	0	0	0	0	6	100.00	2.50	0	0.00	0	0	
行政院工程會	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0	0	0	0	2	100.00	3.65	0	0.00	0	0	
國家通訊傳播委員會	5	0	5	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	100.00	4.12	0	0.00	0	0	
中央選舉委員會	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	6.00	0	0.00	0	0	
總 計	232	101	333	97.93	284	97.93	6	0	0	0	6	290	87.09	4.41	43	12.91	43	0	

103年12月份

項目 數量 機關	應辦案件統計				已 辦 結 案 件 統 計											待 辦 案 件 統 計			
	本月 新收件數 (1)	截至上月 待辦件數 (2)	案件總數 (1)+(2) (3)	屆期應辦案件 之依限辦結率 (5) (3)-(14) (4)	依限辦結		逾 限 辦 結					辦結案件		發文平 均使用 日數 (12)	待辦案件 (3)-(11) (13)		未逾 辦理 期限 件數 (14)	已逾 辦理 期限 件數 (15)	
							逾 限 辦 結		合 計										
					逾限5日 以內辦結	逾限5以上 至10日辦結	逾限10以上 至15日辦結	逾限15日 以上辦結	小 計 (6)+(7)+(8)+(9) (10)	(5)+(10) (11) (11)/(3) (11) (11)/(3)									
					件數 (5)	% (5)/(11)	件數 (6)	件數 (7)	件數 (8)	件數 (9)	件數 (10)	件數 (11)	% (11)/(3)						
行政院	213	39	252	100.00	164	100.00	0	0	0	0	0	164	65.08	11.00	88	34.92	88	0	
內政部	20	0	20	100.00	15	100.00	0	0	0	0	0	15	75.00	5.27	5	25.00	5	0	
外交部	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	100.00	5.00	0	0.00	0	0	
財政部	7	0	7	100.00	7	100.00	0	0	0	0	0	7	100.00	3.00	0	0.00	0	0	
教育部	23	0	23	100.00	16	100.00	0	0	0	0	0	16	69.57	4.38	7	30.43	7	0	
法務部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	7.00	0	0.00	0	0	
經濟部	42	0	42	100.00	33	100.00	0	0	0	0	0	33	78.57	6.03	9	21.43	9	0	
交通部	31	4	35	100.00	26	100.00	0	0	0	0	0	26	74.29	6.96	9	25.71	9	0	
文化部	6	0	6	100.00	5	100.00	0	0	0	0	0	5	83.33	0.50	1	16.67	1	0	
衛生福利部	45	0	45	100.00	31	100.00	0	0	0	0	0	31	68.89	4.77	14	31.11	14	0	
勞動部	14	0	14	100.00	10	100.00	0	0	0	0	0	10	71.43	1.80	4	28.57	4	0	
科技部	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	4.27	0	0.00	0	0	
行政院主計總處	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	0.00	0	0.00	0	0	
行政院人事行政總處	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	2.00	0	0.00	0	0	
行政院環保署	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	5.17	0	0.00	0	0	
國立故宮博物院	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	8.00	0	0.00	0	0	
行政院陸委會	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	6.67	0	0.00	0	0	
國家發展委員會	10	0	10	50.00	4	50.00	3	1	0	0	4	8	80.00	4.00	2	20.00	2	0	
行政院農委會	5	0	5	80.00	4	80.00	1	0	0	0	1	5	100.00	4.20	0	0.00	0	0	
公平交易委員會	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0	0	0	0	4	100.00	1.63	0	0.00	0	0	
國家通訊傳播委員會	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0	0	0	0	3	100.00	5.25	0	0.00	0	0	
中央選舉委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0	0	0	0	1	100.00	3.00	0	0.00	0	0	
總 計	441	43	484	98.55	340	98.55	4	1	0	0	5	345	71.28	4.54	139	28.72	139	0	

三、人民申請案件時效統計表

103年10月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦	已逾辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理期限	理期限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	1	2	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0
內政部	2,648	1,380	4,028	84.25	2,407	88.75	305	11.25	2,712	67.33	1,316	32.67	1,171	145
外交部	169	39	208	99.51	203	99.51	1	0.49	204	98.08	4	1.92	4	0
國防部	42	13	55	100.00	35	100.00	0	0.00	35	63.64	20	36.36	20	0
教育部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
經濟部	22,491	701	23,192	99.77	22,897	99.79	48	0.21	22,945	98.93	247	1.07	243	4
文化部	410	25	435	100.00	357	100.00	0	0.00	357	82.07	78	17.93	78	0
衛生福利部	10,253	34,806	45,059	99.95	8,606	99.97	3	0.03	8,609	19.11	36,450	80.89	36,449	1
僑務委員會	86	2	88	100.00	84	100.00	0	0.00	84	95.45	4	4.55	4	0
中央銀行	214	15	229	100.00	221	100.00	0	0.00	221	96.51	8	3.49	8	0
行政院主計總處	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院人事行政總處	1	1	2	100.00	1	100.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0
行政院環保署	308	78	386	100.00	269	100.00	0	0.00	269	69.69	117	30.31	117	0
國立故宮博物院	126	14	140	100.00	133	100.00	0	0.00	133	95.00	7	5.00	7	0
國軍退除役官兵輔導委員會	161	5	166	100.00	157	100.00	0	0.00	157	94.58	9	5.42	9	0
行政院原能會	660	423	1,083	84.05	606	93.09	45	6.91	651	60.11	432	39.89	362	70
行政院農委會	303	33	336	97.92	283	97.92	6	2.08	289	86.01	47	13.99	47	0
公平交易委員會	261	4	265	100.00	260	100.00	0	0.00	260	98.11	5	1.89	5	0
行政院工程會	198	68	266	100.00	204	100.00	0	0.00	204	76.69	62	23.31	62	0
原住民族委員會	38	7	45	95.24	40	95.24	2	4.76	42	93.33	3	6.67	3	0
客家委員會	177	28	205	100.00	192	100.00	0	0.00	192	93.66	13	6.34	13	0
國家通訊傳播委員會	427	227	654	98.82	418	98.82	5	1.18	423	64.68	231	35.32	231	0
臺灣省政府	2	0	2	100.00	1	100.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0
總 計	38,977	37,872	76,849	98.33	37,379	98.90	415	1.10	37,794	49.18	39,055	50.82	38,835	220

附註：本表期限計算係以各類別申請案件項目之公告處理日數為基準。

103年11月份

項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦	已逾辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
機 關														
行政院	7	0	7	100.00	3	100.00	0	0.00	3	42.86	4	57.14	4	0
內政部	2,487	1,334	3,821	88.10	2,236	90.27	241	9.73	2,477	64.83	1,344	35.17	1,283	61
外交部	118	4	122	99.03	102	99.03	1	0.97	103	84.43	19	15.57	19	0
國防部	35	20	55	100.00	41	100.00	0	0.00	41	74.55	14	25.45	14	0
財政部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
經濟部	19,508	618	20,126	99.78	19,650	99.81	37	0.19	19,687	97.82	439	2.18	433	6
交通部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
文化部	488	78	566	100.00	502	100.00	0	0.00	502	88.69	64	11.31	64	0
衛生福利部	10,730	36,572	47,302	99.94	9,584	99.96	4	0.04	9,588	20.27	37,714	79.73	37,712	2
僑務委員會	52	4	56	89.29	50	89.29	6	10.71	56	100.00	0	0.00	0	0
中央銀行	197	8	205	100.00	182	100.00	0	0.00	182	88.78	23	11.22	23	0
行政院人事行政總處	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	266	119	385	100.00	285	100.00	0	0.00	285	74.03	100	25.97	100	0
國立故宮博物院	121	7	128	100.00	123	100.00	0	0.00	123	96.09	5	3.91	5	0
國軍退除役官兵輔導委員會	164	9	173	100.00	172	100.00	0	0.00	172	99.42	1	0.58	1	0
行政院原能會	1,072	448	1,520	91.45	877	91.93	77	8.07	954	62.76	566	37.24	561	5
行政院農委會	338	47	385	98.12	314	98.13	6	1.88	320	83.12	65	16.88	65	0
公平交易委員會	209	5	214	100.00	211	100.00	0	0.00	211	98.60	3	1.40	3	0
行政院工程會	176	61	237	100.00	163	100.00	0	0.00	163	68.78	74	31.22	74	0
原住民族委員會	42	3	45	94.74	36	94.74	2	5.26	38	84.44	7	15.56	7	0
客家委員會	156	13	169	100.00	153	100.00	0	0.00	153	90.53	16	9.47	16	0
國家通訊傳播委員會	444	229	673	100.00	418	100.00	0	0.00	418	62.11	255	37.89	255	0
臺灣省政府	0	1	1	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0
總 計	36,612	39,581	76,193	98.74	35,105	98.94	375	1.06	35,480	46.57	40,713	53.43	40,639	74

103年12月份

項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦	已逾辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)／(3)－(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)／(7)	(6)	(6)／(7)	(7)	(7)／(3)	(8)	(8)／(3)	(9)	(10)
機 關														
行政院	8	4	12	100.00	8	100.00	0	0.00	8	66.67	4	33.33	4	0
內政部	2,544	1,361	3,905	95.52	2,709	95.62	124	4.38	2,833	72.55	1,072	27.45	1,069	3
外交部	161	20	181	99.43	175	99.43	1	0.57	176	97.24	5	2.76	5	0
國防部	50	14	64	100.00	49	100.00	0	0.00	49	76.56	15	23.44	15	0
法務部	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
經濟部	25,306	1,390	26,696	99.42	25,037	99.63	92	0.37	25,129	94.13	1,567	5.87	1,513	54
交通部	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
文化部	336	64	400	100.00	388	100.00	0	0.00	388	97.00	12	3.00	12	0
衛生福利部	10,466	38,873	49,339	99.85	12,639	99.87	17	0.13	12,656	25.65	36,683	74.35	36,681	2
僑務委員會	49	0	49	97.92	47	97.92	1	2.08	48	97.96	1	2.04	1	0
中央銀行	211	23	234	100.00	224	100.00	0	0.00	224	95.73	10	4.27	10	0
行政院人事行政總處	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	387	97	484	100.00	368	100.00	0	0.00	368	76.03	116	23.97	116	0
國立故宮博物院	82	5	87	100.00	83	100.00	0	0.00	83	95.40	4	4.60	4	0
國家發展委員會	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
金融監督管理委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	145	1	146	100.00	146	100.00	0	0.00	146	100.00	0	0.00	0	0
行政院原能會	1,261	595	1,856	92.58	1,335	98.67	18	1.33	1,353	72.90	503	27.10	414	89
行政院農委會	295	65	360	99.36	312	99.36	2	0.64	314	87.22	46	12.78	46	0
公平交易委員會	231	3	234	100.00	215	100.00	0	0.00	215	91.88	19	8.12	19	0
行政院工程會	226	74	300	100.00	234	100.00	0	0.00	234	78.00	66	22.00	66	0
原住民族委員會	45	7	52	89.74	35	89.74	4	10.26	39	75.00	13	25.00	13	0
客家委員會	171	16	187	100.00	160	100.00	0	0.00	160	85.56	27	14.44	27	0
國家通訊傳播委員會	261	151	412	98.33	236	98.33	4	1.67	240	58.25	172	41.75	172	0
臺灣省政府	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
總 計	42,245	42,763	85,008	99.08	44,410	99.41	263	0.59	44,673	52.55	40,335	47.45	40,187	148

四、訴願案件時效統計表

103年10月份

項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計										待辦案件統計				
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結				逾限辦結				合 計		待辦案件		未逾辦理期限	已逾辦理期限	本月份被合併審議決定辦結案件數
	案件數	案件數	(1)+(2)-(13)	(5)+(6)/(3)-(11)	3個月內		3～5個月		3～5個月		逾5個月		(5)+(6)+(7)+(8)		(3)-(9)		案 件 數	案 件 數	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(9)	(6)	(6)/(9)	(7)	(7)/(9)	(8)	(8)/(9)	(9)	(9)/(3)	(10)	(10)/(3)	(11)	(12)	(13)
機 關																			
行政院	221	591	812	100.00	145	66.82	72	33.18	0	0.00	0	0.00	217	26.72	595	73.28	595	0	0
內政部	203	401	595	98.65	164	73.87	56	25.23	0	0.00	2	0.90	222	37.31	373	62.69	372	1	9
外交部	54	13	67	100.00	52	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	52	77.61	15	22.39	15	0	0
國防部	28	16	44	100.00	33	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	33	75.00	11	25.00	11	0	0
財政部	202	644	846	100.00	118	79.73	30	20.27	0	0.00	0	0.00	148	17.49	698	82.51	698	0	0
教育部	118	276	394	100.00	164	99.39	1	0.61	0	0.00	0	0.00	165	41.88	229	58.12	229	0	0
法務部	43	4	47	100.00	42	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	42	89.36	5	10.64	5	0	0
經濟部	164	426	590	100.00	77	54.23	65	45.77	0	0.00	0	0.00	142	24.07	448	75.93	448	0	0
交通部	51	42	93	100.00	28	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	28	30.11	65	69.89	65	0	0
文化部	12	3	15	100.00	15	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	100.00	0	0.00	0	0	0
衛生福利部	85	142	227	100.00	81	98.78	1	1.22	0	0.00	0	0.00	82	36.12	145	63.88	145	0	0
勞動部	250	603	853	100.00	121	66.48	61	33.52	0	0.00	0	0.00	182	21.34	671	78.66	671	0	0
科技部	8	0	8	100.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	75.00	2	25.00	2	0	0
行政院環保署	53	111	164	100.00	44	86.27	7	13.73	0	0.00	0	0.00	51	31.10	113	68.90	113	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	5	0	5	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	80.00	1	20.00	1	0	0
行政院農委會	76	124	196	100.00	65	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	65	33.16	131	66.84	131	0	4
行政院工程會	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0
國家通訊傳播委員會	0	3	3	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	3	0	0
中央選舉委員會	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0	0
臺灣省政府	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0	0
總 計	1,578	3,400	4,965	99.79	1,165	79.79	293	20.07	0	0.00	2	0.14	1,460	29.41	3,505	70.59	3,504	1	13

附註：本表期限計算係以訴願法及其相關規定之處理期限為基準。

103年11月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計										待辦案件統計				
	本月新收	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結				逾限辦結				合 計		待辦案件		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限	本月份被合 併審議決定 辦結案件數
					3個月內		3～5個月		3～5個月		逾5個月		(5)+(6)+(7)+(8)		(3)～(9)				
					件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)／(9)	(6)	(6)／(9)	(7)	(7)／(9)	(8)	(8)／(9)	(9)	(9)／(3)	(10)	(10)／(3)	(11)	(12)	(13)	
行政院	172	591	760	100.00	162	81.00	38	19.00	0	0.00	0	0.00	200	26.32	560	73.68	560	0	3
內政部	144	381	521	98.68	122	80.26	28	18.42	0	0.00	2	1.32	152	29.17	369	70.83	369	0	4
外交部	55	15	70	100.00	47	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	47	67.14	23	32.86	23	0	0
國防部	23	11	34	100.00	26	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	26	76.47	8	23.53	8	0	0
財政部	155	698	851	100.00	200	84.75	36	15.25	0	0.00	0	0.00	236	27.73	615	72.27	615	0	2
教育部	114	229	343	99.22	128	99.22	0	0.00	1	0.78	0	0.00	129	37.61	214	62.39	214	0	0
法務部	36	3	39	100.00	32	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	32	82.05	7	17.95	7	0	0
經濟部	159	448	607	100.00	81	70.43	34	29.57	0	0.00	0	0.00	115	18.95	492	81.05	492	0	0
交通部	33	65	98	100.00	45	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	45	45.92	53	54.08	53	0	0
文化部	5	0	5	100.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0	0
衛生福利部	59	145	204	100.00	76	98.70	1	1.30	0	0.00	0	0.00	77	37.75	127	62.25	127	0	0
勞動部	202	671	873	100.00	163	73.76	58	26.24	0	0.00	0	0.00	221	25.32	652	74.68	652	0	0
科技部	6	2	8	100.00	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	100.00	0	0.00	0	0	0
行政院人事行政總處	1	0	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0	0
行政院環保署	57	113	170	100.00	50	86.21	8	13.79	0	0.00	0	0.00	58	34.12	112	65.88	112	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	2	1	3	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	1	0	0
行政院農委會	56	131	185	100.00	53	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	53	28.65	132	71.35	132	0	2
行政院海巡署	1	0	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0	0
國家通訊傳播委員會	0	3	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0	0
中央選舉委員會	2	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	1
臺灣省政府	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0	0
總 計	1,285	3,507	4,780	99.79	1,207	85.42	203	14.37	1	0.07	2	0.14	1,413	29.56	3,367	70.44	3,367	0	12

103年12月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計										待辦案件統計					
	本月新收	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結				逾限辦結				合 計		待辦案件		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限	本月份被合 併審議決定 辦結案件數	
					3個月內		3～5個月		3～5個月		逾5個月		(5)+(6)+(7)+(8)		(3)－(9)					
					件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%				案件數
(1)	(2)	(1)+(2)-(13)	(5)+(6)/(3)-(11)	(5)	(5)／(9)	(6)	(6)／(9)	(7)	(7)／(9)	(8)	(8)／(9)	(9)	(9)／(3)	(10)	(10)／(3)	(11)	(12)	(13)		
行政院	226	559	785	100.00	152	71.70	60	28.30	0	0.00	0	0.00	212	27.01	573	72.99	573	0	0	
內政部	203	339	537	98.87	142	80.23	33	18.64	0	0.00	2	1.13	177	32.96	360	67.04	360	0	5	
外交部	43	23	66	62.71	37	62.71	0	0.00	22	37.29	0	0.00	59	89.39	7	10.61	7	0	0	
國防部	47	8	54	100.00	23	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23	42.59	31	57.41	31	0	1	
財政部	191	615	806	100.00	236	91.12	23	8.88	0	0.00	0	0.00	259	32.13	547	67.87	547	0	0	
教育部	109	214	323	100.00	119	93.70	8	6.30	0	0.00	0	0.00	127	39.32	196	60.68	196	0	0	
法務部	47	7	54	100.00	50	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	92.59	4	7.41	4	0	0	
經濟部	264	492	756	100.00	80	67.23	39	32.77	0	0.00	0	0.00	119	15.74	637	84.26	637	0	0	
交通部	35	53	88	100.00	40	97.56	1	2.44	0	0.00	0	0.00	41	46.59	47	53.41	47	0	0	
文化部	20	0	20	100.00	19	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19	95.00	1	5.00	1	0	0	
衛生福利部	66	127	193	100.00	76	98.70	1	1.30	0	0.00	0	0.00	77	39.90	116	60.10	116	0	0	
勞動部	227	652	879	100.00	113	68.48	52	31.52	0	0.00	0	0.00	165	18.77	714	81.23	714	0	0	
科技部	5	0	5	100.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0	0	
行政院人事行政總處	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0	
行政院環保署	65	107	172	100.00	65	91.55	6	8.45	0	0.00	0	0.00	71	41.28	101	58.72	101	0	0	
國軍退除役官兵輔導委員會	3	1	4	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	2	50.00	2	0	0	
行政院農委會	59	132	191	100.00	54	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	54	28.27	137	71.73	137	0	0	
行政院海巡署	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0	
中央選舉委員會	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0	0	
臺灣省政府	2	0	2	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0	0	
總 計	1,613	3,331	4,938	98.36	1,218	83.14	223	15.22	22	1.50	2	0.14	1,465	29.67	3,473	70.33	3,473	0	6	

五、人民陳情案件時效統計表

103年10月份

項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未逾辦理期限	已逾辦理期限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數
機 關	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	632	27	659	100.00	616	100.00	0	0.00	616	93.47	43	6.53	43	0
內政部	1,520	226	1,746	99.57	1,606	99.88	2	0.12	1,608	92.10	138	7.90	133	5
外交部	81	20	101	80.22	73	82.02	16	17.98	89	88.12	12	11.88	10	2
國防部	103	30	133	85.45	94	89.52	11	10.48	105	78.95	28	21.05	23	5
財政部	45	4	49	100.00	39	100.00	0	0.00	39	79.59	10	20.41	10	0
教育部	719	199	918	99.35	770	99.61	3	0.39	773	84.20	145	15.80	143	2
法務部	1,159	140	1,299	79.84	927	81.75	207	18.25	1,134	87.30	165	12.70	138	27
經濟部	89	27	116	100.00	95	100.00	0	0.00	95	81.90	21	18.10	21	0
交通部	1,393	277	1,670	98.48	1,427	98.69	19	1.31	1,446	86.59	224	13.41	221	3
文化部	86	12	98	100.00	82	100.00	0	0.00	82	83.67	16	16.33	16	0
衛生福利部	69	36	105	98.85	86	98.85	1	1.15	87	82.86	18	17.14	18	0
勞動部	1,226	95	1,321	100.00	1,179	100.00	0	0.00	1,179	89.25	142	10.75	142	0
科技部	16	4	20	100.00	16	100.00	0	0.00	16	80.00	4	20.00	4	0
僑務委員會	71	19	90	83.13	69	84.15	13	15.85	82	91.11	8	8.89	7	1
中央銀行	116	18	134	100.00	124	100.00	0	0.00	124	92.54	10	7.46	10	0
行政院主計總處	59	10	69	100.00	58	100.00	0	0.00	58	84.06	11	15.94	11	0
行政院人事行政總處	409	37	446	100.00	410	100.00	0	0.00	410	91.93	36	8.07	36	0
行政院環保署	42	14	56	93.62	44	95.65	2	4.35	46	82.14	10	17.86	9	1
國立故宮博物院	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院陸委會	69	12	81	86.57	58	90.63	6	9.38	64	79.01	17	20.99	14	3
國家發展委員會	75	12	87	93.75	75	93.75	5	6.25	80	91.95	7	8.05	7	0
金融監督管理委員會	6	3	9	100.00	8	100.00	0	0.00	8	88.89	1	11.11	1	0
國軍退除役官兵輔導委員會	141	7	148	100.00	128	100.00	0	0.00	128	86.49	20	13.51	20	0
行政院農委會	191	27	218	97.94	190	100.00	0	0.00	190	87.16	28	12.84	24	4
公平交易委員會	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
行政院工程會	5	0	5	100.00	3	100.00	0	0.00	3	60.00	2	40.00	2	0
原住民族委員會	28	3	31	96.30	26	100.00	0	0.00	26	83.87	5	16.13	4	1
行政院海巡署	48	11	59	100.00	52	100.00	0	0.00	52	88.14	7	11.86	7	0
客家委員會	18	6	24	100.00	22	100.00	0	0.00	22	91.67	2	8.33	2	0
國家通訊傳播委員會	2,998	1,335	4,333	99.63	3,273	99.63	12	0.37	3,285	75.81	1,048	24.19	1,048	0
中央選舉委員會	93	24	117	100.00	111	100.00	0	0.00	111	94.87	6	5.13	6	0
總 計	11,512	2,635	14,147	97.08	11,666	97.52	297	2.48	11,963	84.56	2,184	15.44	2,130	54

附註：本表期限計算係以行政院暨所屬各機關處理人民陳情案件要點規定之日數為基準。

103年11月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上 月待辦	案件總 數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未 逾 辦 理 期 限	已 逾 辦 理 期 限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	559	43	602	100.00	575	100.00	0	0.00	575	95.51	27	4.49	27	0
內政部	1,271	139	1,410	99.05	1,253	99.37	8	0.63	1,261	89.43	149	10.57	145	4
外交部	110	13	123	84.11	90	89.11	11	10.89	101	82.11	22	17.89	16	6
國防部	95	28	123	94.55	104	95.41	5	4.59	109	88.62	14	11.38	13	1
財政部	27	10	37	100.00	34	100.00	0	0.00	34	91.89	3	8.11	3	0
教育部	654	145	799	99.54	650	99.69	2	0.31	652	81.60	147	18.40	146	1
法務部	844	142	986	70.13	608	72.21	234	27.79	842	85.40	144	14.60	119	25
經濟部	88	20	108	100.00	75	100.00	0	0.00	75	69.44	33	30.56	33	0
交通部	1,194	227	1,421	97.66	1,171	98.49	18	1.51	1,189	83.67	232	16.33	222	10
文化部	85	16	101	75.82	69	75.82	22	24.18	91	90.10	10	9.90	10	0
衛生福利部	46	28	74	98.55	68	98.55	1	1.45	69	93.24	5	6.76	5	0
勞動部	708	143	851	100.00	738	100.00	0	0.00	738	86.72	113	13.28	113	0
科技部	10	4	14	100.00	7	100.00	0	0.00	7	50.00	7	50.00	7	0
僑務委員會	38	6	44	91.43	32	91.43	3	8.57	35	79.55	9	20.45	9	0
中央銀行	105	10	115	100.00	101	100.00	0	0.00	101	87.83	14	12.17	14	0
行政院主計總處	64	11	75	100.00	68	100.00	0	0.00	68	90.67	7	9.33	7	0
行政院人事行政總處	237	36	273	100.00	250	100.00	0	0.00	250	91.58	23	8.42	23	0
行政院環保署	30	10	40	96.15	25	96.15	1	3.85	26	65.00	14	35.00	14	0
行政院陸委會	85	18	103	78.31	65	81.25	15	18.75	80	77.67	23	22.33	20	3
國家發展委員會	55	7	62	77.97	46	80.70	11	19.30	57	91.94	5	8.06	3	2
金融監督管理委員會	5	1	6	100.00	6	100.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	0	0
國軍退除役官兵輔導委員會	120	14	134	100.00	122	100.00	0	0.00	122	91.04	12	8.96	12	0
行政院農委會	149	28	177	98.09	154	100.00	0	0.00	154	87.01	23	12.99	20	3
公平交易委員會	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
行政院工程會	3	2	5	100.00	4	100.00	0	0.00	4	80.00	1	20.00	1	0
原住民族委員會	27	4	31	100.00	28	100.00	0	0.00	28	90.32	3	9.68	3	0
行政院海巡署	44	7	51	100.00	44	100.00	0	0.00	44	86.27	7	13.73	7	0
客家委員會	27	2	29	100.00	26	100.00	0	0.00	26	89.66	3	10.34	3	0
國家通訊傳播委員會	1,962	1,037	2,999	99.85	2,058	99.85	3	0.15	2,061	68.72	938	31.28	938	0
中央選舉委員會	170	6	176	100.00	150	100.00	0	0.00	150	85.23	26	14.77	26	0
總 計	8,816	2,157	10,973	95.68	8,625	96.27	334	3.73	8,959	81.65	2,014	18.35	1,959	55

103年12月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上 月待辦	案件總 數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件 (3)－(7)		未 逾 辦 理 期 限	已 逾 辦 理 期 限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)／(3)－(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)／(7)	(6)	(6)／(7)	(7)	(7)／(3)	(8)	(8)／(3)	(9)	(10)
行政院	643	27	670	100.00	634	100.00	0	0.00	634	94.63	36	5.37	36	0
內政部	1,283	150	1,433	99.23	1,286	99.54	6	0.46	1,292	90.16	141	9.84	137	4
外交部	48	21	69	83.87	52	85.25	9	14.75	61	88.41	8	11.59	7	1
國防部	112	14	126	99.06	105	100.00	0	0.00	105	83.33	21	16.67	20	1
財政部	35	3	38	100.00	32	100.00	0	0.00	32	84.21	6	15.79	6	0
教育部	692	148	840	99.87	748	99.87	1	0.13	749	89.17	91	10.83	91	0
法務部	941	144	1,085	74.14	731	75.36	239	24.64	970	89.40	115	10.60	99	16
經濟部	96	31	127	100.00	103	100.00	0	0.00	103	81.10	24	18.90	24	0
交通部	1,295	232	1,527	98.51	1,194	98.84	14	1.16	1,208	79.11	319	20.89	315	4
文化部	72	10	82	100.00	77	100.00	0	0.00	77	93.90	5	6.10	5	0
衛生福利部	56	11	67	92.98	53	94.64	3	5.36	56	83.58	11	16.42	10	1
勞動部	887	112	999	99.78	898	100.00	0	0.00	898	89.89	101	10.11	99	2
科技部	46	8	54	100.00	44	100.00	0	0.00	44	81.48	10	18.52	10	0
僑務委員會	48	6	54	94.00	47	94.00	3	6.00	50	92.59	4	7.41	4	0
中央銀行	105	14	119	100.00	107	100.00	0	0.00	107	89.92	12	10.08	12	0
行政院主計總處	55	7	62	100.00	57	100.00	0	0.00	57	91.94	5	8.06	5	0
行政院人事行政總處	235	23	258	100.00	236	100.00	0	0.00	236	91.47	22	8.53	22	0
行政院環保署	31	13	44	91.43	32	91.43	3	8.57	35	79.55	9	20.45	9	0
行政院陸委會	68	23	91	71.62	53	72.60	20	27.40	73	80.22	18	19.78	17	1
國家發展委員會	120	5	125	77.98	85	77.98	24	22.02	109	87.20	16	12.80	16	0
金融監督管理委員會	18	0	18	100.00	15	100.00	0	0.00	15	83.33	3	16.67	3	0
國軍退除役官兵輔導委員會	70	12	82	100.00	76	100.00	0	0.00	76	92.68	6	7.32	6	0
行政院農委會	146	23	169	97.92	141	100.00	0	0.00	141	83.43	28	16.57	25	3
公平交易委員會	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
行政院工程會	1	1	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
原住民族委員會	36	3	39	100.00	33	100.00	0	0.00	33	84.62	6	15.38	6	0
行政院海巡署	31	7	38	100.00	32	100.00	0	0.00	32	84.21	6	15.79	6	0
客家委員會	23	3	26	100.00	23	100.00	0	0.00	23	88.46	3	11.54	3	0
國家通訊傳播委員會	1,754	919	2,673	99.69	1,949	99.69	6	0.31	1,955	73.14	718	26.86	718	0
中央選舉委員會	134	26	160	100.00	158	100.00	0	0.00	158	98.75	2	1.25	2	0
臺灣省政府	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0
總 計	9,088	1,996	11,084	96.15	9,010	96.49	328	3.51	9,338	84.25	1,746	15.75	1,713	33

六、專案管制案件時效統計表

103年10月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計				待辦案件統計			
	本月新增	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結	逾限辦結	辦結案件合計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	專 案 數	專案數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案 件 數	案 件 數	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	3	1	4	50.00	1	1	2	50.00	2	50.00	2	0
外交部	1	0	1	100.00	1	0	1	100.00	0	0.00	0	0
國防部	13	20	33	96.15	25	0	25	75.76	8	24.24	7	1
財政部	3	6	9	100.00	3	0	3	33.33	6	66.67	6	0
教育部	2	111	113	100.00	102	0	102	90.27	11	9.73	11	0
法務部	16	12	28	68.42	13	6	19	67.86	9	32.14	9	0
文化部	13	27	40	96.67	29	1	30	75.00	10	25.00	10	0
衛生福利部	28	389	417	66.67	16	7	23	5.52	394	94.48	393	1
科技部	3,738	2,166	5,904	99.20	3,459	4	3,463	58.66	2,441	41.34	2,417	24
行政院人事行政總處	2	3	5	100.00	3	0	3	60.00	2	40.00	2	0
行政院環保署	13	0	13	--	0	0	0	0.00	13	100.00	13	0
國立故宮博物院	0	2	2	100.00	1	0	1	50.00	1	50.00	1	0
金融監督管理委員會	1	7	8	66.67	2	1	3	37.50	5	62.50	5	0
行政院農委會	15	18	33	85.00	17	2	19	57.58	14	42.42	13	1
行政院工程會	1,000	283	1,283	100.00	1,036	0	1,036	80.75	247	19.25	247	0
國家通訊傳播委員會	10	39	49	100.00	8	0	8	16.33	41	83.67	41	0
總 計	4,858	3,084	7,942	98.97	4,716	22	4,738	59.66	3,204	40.34	3,177	27

附註：本表期限計算係以各專案規定程序申請奉核之處理期限為基準。

103年11月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計				待辦案件統計			
	本月新增	截至上 月待辦	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結	逾限辦結	辦結案件合計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	專 案 數	專案數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案 件 數	案 件 數	案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	0	2	2	0.00	0	0	0	0.00	2	100.00	1	1
外交部	4	2	6	100.00	4	0	4	66.67	2	33.33	2	0
國防部	16	8	24	93.75	15	1	16	66.67	8	33.33	8	0
財政部	2	6	8	100.00	2	0	2	25.00	6	75.00	6	0
教育部	83	13	96	100.00	11	0	11	11.46	85	88.54	85	0
法務部	10	11	21	88.89	16	2	18	85.71	3	14.29	3	0
文化部	5	15	20	92.86	13	1	14	70.00	6	30.00	6	0
衛生福利部	76	397	473	91.18	31	1	32	6.77	441	93.23	439	2
科技部	2,178	2,456	4,634	96.17	2,308	29	2,337	50.43	2,297	49.57	2,234	63
行政院人事行政總處	1	3	4	66.67	2	0	2	50.00	2	50.00	1	1
行政院環保署	10	15	25	100.00	1	0	1	4.00	24	96.00	24	0
國立故宮博物院	0	2	2	100.00	1	0	1	50.00	1	50.00	1	0
金融監督管理委員會	0	2	2	100.00	1	0	1	50.00	1	50.00	1	0
行政院原能會	0	1	1	--	0	0	0	0.00	1	100.00	1	0
行政院農委會	21	14	35	83.33	15	1	16	45.71	19	54.29	17	2
行政院工程會	842	280	1,122	100.00	873	0	873	77.81	249	22.19	249	0
國家通訊傳播委員會	16	46	62	100.00	23	0	23	37.10	39	62.90	39	0
總 計	3,264	3,273	6,537	96.96	3,316	35	3,351	51.26	3,186	48.74	3,117	69

103年12月份

項 目 數 量 機 關	應辦案件統計				已辦結案件統計				待辦案件統計			
	本月新增	截至上	案件總數	屆期應辦案件 之依限辦結率	依限辦結	逾限辦結	辦結案件合計		待辦案件		未逾辦	已逾辦
	專 案 數	月待辦			案 件 數	案 件 數	(5)+(6)		(3)-(7)		理 期 限	理 期 限
		專案數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)			案件數	%	案件數	%	案 件 數	案 件 數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	1	2	3	66.67	2	1	3	100.00	0	0.00	0	0
外交部	1	1	2	100.00	2	0	2	100.00	0	0.00	0	0
國防部	19	8	27	93.75	15	1	16	59.26	11	40.74	11	0
財政部	4	6	10	100.00	2	0	2	20.00	8	80.00	8	0
教育部	87	163	250	99.24	131	1	132	52.80	118	47.20	118	0
法務部	29	3	32	100.00	30	0	30	93.75	2	6.25	2	0
經濟部	0	1	1	--	0	0	0	0.00	1	100.00	1	0
文化部	8	6	14	100.00	10	0	10	71.43	4	28.57	4	0
衛生福利部	85	463	548	80.00	20	3	23	4.20	525	95.80	523	2
科技部	2,482	2,314	4,796	98.03	3,185	62	3,247	67.70	1,549	32.30	1,547	2
行政院人事行政總處	2	2	4	100.00	2	0	2	50.00	2	50.00	2	0
行政院環保署	7	24	31	100.00	26	0	26	83.87	5	16.13	5	0
國立故宮博物院	0	1	1	0.00	0	1	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院陸委會	0	2	2	0.00	0	1	1	50.00	1	50.00	1	0
金融監督管理委員會	1	7	8	--	0	0	0	0.00	8	100.00	8	0
行政院原能會	0	1	1	--	0	0	0	0.00	1	100.00	1	0
行政院農委會	32	19	51	86.96	20	2	22	43.14	29	56.86	28	1
行政院工程會	940	270	1,210	100.00	1,026	0	1,026	84.79	184	15.21	184	0
國家通訊傳播委員會	7	32	39	100.00	12	0	12	30.77	27	69.23	27	0
總 計	3,705	3,325	7,030	98.31	4,483	72	4,555	64.79	2,475	35.21	2,470	5

七、監察案件時效統計表

103年10月份

項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計 (5)+(6)		待辦案件 (3)-(7)		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	案件數 (1)	案件數 (2)	(1)+(2) (3)	(5)/(3)-(9) (4)	案件數 (5)	% (5)/(7)	案件數 (6)	% (6)/(7)	案件數 (7)	% (7)/(3)	案件數 (8)	% (8)/(3)	案件數 (9)	案件數 (10)
機 關														
行政院	77	189	266	63.83	30	71.43	12	28.57	42	15.79	224	84.21	219	5
內政部	16	45	61	100.00	11	100.00	0	0.00	11	18.03	50	81.97	50	0
外交部	4	1	5	75.00	3	75.00	1	25.00	4	80.00	1	20.00	1	0
國防部	13	7	20	100.00	19	100.00	0	0.00	19	95.00	1	5.00	1	0
財政部	4	0	4	100.00	3	100.00	0	0.00	3	75.00	1	25.00	1	0
教育部	16	16	32	100.00	11	100.00	0	0.00	11	34.38	21	65.63	21	0
法務部	10	2	12	87.50	7	100.00	0	0.00	7	58.33	5	41.67	4	1
經濟部	18	30	48	100.00	9	100.00	0	0.00	9	18.75	39	81.25	39	0
交通部	8	4	12	63.64	7	87.50	1	12.50	8	66.67	4	33.33	1	3
文化部	3	0	3	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	3	0
衛生福利部	3	18	21	100.00	12	100.00	0	0.00	12	57.14	9	42.86	9	0
勞動部	13	9	22	100.00	5	100.00	0	0.00	5	22.73	17	77.27	17	0
科技部	3	5	8	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	100.00	8	0
行政院主計總處	5	1	6	100.00	6	100.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	0	0
行政院人事行政總處	1	1	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	3	7	10	100.00	1	100.00	0	0.00	1	10.00	9	90.00	9	0
國軍退除役官兵輔導委員會	2	0	2	100.00	1	100.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	1	0
行政院農委會	8	1	9	87.50	7	100.00	0	0.00	7	77.78	2	22.22	1	1
行政院工程會	8	1	9	100.00	9	100.00	0	0.00	9	100.00	0	0.00	0	0
原住民族委員會	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
行政院海巡署	0	1	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0
國家通訊傳播委員會	1	3	4	100.00	1	100.00	0	0.00	1	25.00	3	75.00	3	0
總 計	220	341	561	86.05	148	91.36	14	8.64	162	28.88	399	71.12	389	10

附註：本表期限計算係以監察法及監察法施行細則規定之處理期限為基準。

103年11月份

項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未 逾 辦	已 逾 辦
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	理 期 限	理 期 限
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
機 關														
行政院	47	224	271	90.91	50	96.15	2	3.85	52	19.19	219	80.81	216	3
內政部	10	49	59	100.00	14	100.00	0	0.00	14	23.73	45	76.27	45	0
外交部	5	1	6	100.00	6	100.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00	0	0
國防部	5	1	6	100.00	5	100.00	0	0.00	5	83.33	1	16.67	1	0
財政部	0	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
教育部	7	21	28	100.00	5	100.00	0	0.00	5	17.86	23	82.14	23	0
法務部	8	5	13	90.91	10	100.00	0	0.00	10	76.92	3	23.08	2	1
經濟部	8	38	46	100.00	10	100.00	0	0.00	10	21.74	36	78.26	36	0
交通部	6	4	10	66.67	6	66.67	3	33.33	9	90.00	1	10.00	1	0
文化部	0	3	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0
衛生福利部	3	13	16	100.00	8	100.00	0	0.00	8	50.00	8	50.00	8	0
勞動部	3	17	20	100.00	2	100.00	0	0.00	2	10.00	18	90.00	18	0
科技部	1	8	9	100.00	2	100.00	0	0.00	2	22.22	7	77.78	7	0
行政院主計總處	10	0	10	100.00	7	100.00	0	0.00	7	70.00	3	30.00	3	0
行政院人事行政總處	4	0	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	0	9	9	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	100.00	9	0
國軍退除役官兵輔導委員會	5	1	6	100.00	3	100.00	0	0.00	3	50.00	3	50.00	3	0
行政院農委會	7	2	9	60.00	3	60.00	2	40.00	5	55.56	4	44.44	4	0
行政院工程會	7	0	7	100.00	6	100.00	0	0.00	6	85.71	1	14.29	1	0
原住民族委員會	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0
行政院海巡署	0	1	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0
國家通訊傳播委員會	0	3	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	1	0
總 計	139	401	540	93.17	150	95.54	7	4.46	157	29.07	383	70.93	379	4

103年12月份

項 目 數 量	應辦案件統計				已辦結案件統計						待辦案件統計			
	本月新收	截至上月待辦	案件總數	屆期應辦案件之依限辦結率	依限辦結		逾限辦結		合 計		待辦案件		未逾辦 理期限	已逾辦 理期限
	案件數	案件數	(1)+(2)	(5)/(3)-(9)	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	%	案件數	案件數
機 關	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(7)	(6)	(6)/(7)	(7)	(7)/(3)	(8)	(8)/(3)	(9)	(10)
行政院	42	219	261	89.53	77	98.72	1	1.28	78	29.89	183	70.11	175	8
內政部	15	46	61	100.00	11	100.00	0	0.00	11	18.03	50	81.97	50	0
外交部	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0
國防部	7	1	8	100.00	5	100.00	0	0.00	5	62.50	3	37.50	3	0
教育部	8	23	31	93.75	15	93.75	1	6.25	16	51.61	15	48.39	15	0
法務部	9	3	12	88.89	8	100.00	0	0.00	8	66.67	4	33.33	3	1
經濟部	6	36	42	100.00	14	100.00	0	0.00	14	33.33	28	66.67	28	0
交通部	2	1	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0
文化部	3	0	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0
衛生福利部	5	15	20	93.33	14	93.33	1	6.67	15	75.00	5	25.00	5	0
勞動部	4	18	22	100.00	7	100.00	0	0.00	7	31.82	15	68.18	15	0
科技部	2	7	9	100.00	3	100.00	0	0.00	3	33.33	6	66.67	6	0
行政院主計總處	8	3	11	100.00	10	100.00	0	0.00	10	90.91	1	9.09	1	0
行政院人事行政總處	1	0	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0
行政院環保署	2	9	11	100.00	4	100.00	0	0.00	4	36.36	7	63.64	7	0
國軍退除役官兵輔導委員會	4	3	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	0	0.00	0	0
行政院農委會	8	4	12	80.00	8	80.00	2	20.00	10	83.33	2	16.67	2	0
行政院工程會	2	1	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	1	0
行政院海巡署	0	1	1	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	0
國家通訊傳播委員會	2	1	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	1	0
總 計	133	391	524	93.36	197	97.52	5	2.48	202	38.55	322	61.45	313	9
