

基本設施補助計畫 107 年度第 2 季執行情形季報

國家發展委員會

107 年 7 月

基本設施補助計畫 107 年度第 2 季執行情形季報

目 次

1、建議事項.....	XI
2、圖表.....	XI
圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖.....	XI
圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市.....	XV
圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市.....	XVII
圖 2、預算支用情形—依縣市別.....	XIX
圖 3、預算支用情形—依計畫類別.....	XXI
圖 4、標案執行進度.....	XXII
圖 5、預算達成率—依計畫類別.....	XXIII
.....	XXIII

圖 6、落後標案件數比率—依縣市別.....	XXIV
圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別.....	XXV
圖 8、落後標案原因分析.....	XXVIII
表 1、預算執行情形一覽表.....	XXIX
表 2、標案執行進度.....	XXXI
表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別.....	XXXII
表 4、落後標案統計表—依計畫類別.....	XXXV
表 5、落後標案統計表—依查核點.....	XXXVII
表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因.....	XXXIX
3、各縣市執行分析.....	XL
1.新北市.....	XL
2.臺北市.....	XLVII
3.桃園市.....	XLVIII

4.臺中市.....	LIII
5.臺南市.....	LX
6.高雄市.....	LXIX
7.宜蘭縣.....	LXXVII
8.新竹縣.....	LXXXIV
9.苗栗縣.....	XCIII
10.彰化縣.....	CV
11.南投縣.....	CXII
12.雲林縣.....	CXXVII
13.嘉義縣.....	CXXXIII
14.屏東縣.....	CXLIII
15.臺東縣.....	CXLVIII
16.花蓮縣.....	CLVI

17.澎湖縣.....	CLXV
18.基隆市.....	CLXXV
19.新竹市.....	CXCIV
20.嘉義市.....	CCVI
21.金門縣.....	CCXIV
22.連江縣.....	CCXXXIV

一、107年第2季基本設施管考重點說明

- (一) 第2季基本設施管考重點在於6月底各縣市平均發包率及預算達成率之達成情形，以「發包率」達85%為預定目標值，預算達成率達27%為預定目標值。因此著重各縣市標案「設計完成」與「發包決標」及「預算達成」之完成比率，並就各縣市於該指標之達成度予以說明。
- (二) 經檢視各縣市6月份平均累計預算分配比例為25.85%，(詳第17頁圖2)。各縣市情形如次：臺北市(75.48%)、桃園市(46.38%)、新北市(42.86%)、高雄市(37.78%)、新竹市(31.17%)、屏東縣(30.23%)、澎湖縣(29.43%)、連江縣(29.25%)、苗栗縣(27.79%)及基隆市(26.41%)等10個縣市達平均值(25.85%)以上；而臺東縣(25.24%)、宜蘭縣(24.18%)、嘉義市(22.83%)、南投縣(21.67%)、金門縣(20.01%)、花蓮縣(14.95%)、新竹縣(13.71%)、嘉義縣(12.81%)、臺南市(12.70%)、雲林縣(10.21%)、彰化縣(5.91%)及臺中市(4.96%)等12個縣市則未達平均值。
- (三) 經檢視各縣市6月份平均發包率為87.60%，較上月成長17.45個百分點，與預定目標值85%比較，符合預期執行進度(詳第19頁圖4、第25頁表2、第28頁表5)。各縣市情形如次：臺北市(100%)、新北市(100%)、屏東縣(94.78%)、臺中市(94.44%)、嘉義縣(94.02%)、桃園市(93.42%)、基隆市(93.17%)、高雄市(93.10%)、花蓮縣(91.19%)、臺東縣(90.73%)、彰化縣

(88.39%)、臺南市(88.04%)、澎湖縣(87.76%)、新竹市(87.72%)、新竹縣(86.55%)及雲林縣(86.02%)等16個縣市達預定目標值(85%)以上；而金門縣(84.67%)、南投縣(84.35%)、連江縣(83.58%)、宜蘭縣(82.02%)、嘉義市(73.48%)及苗栗縣(71.84%)等6個縣市則未達85%。

(四) 經檢視各縣市6月份平均預算達成率為36.76%，與預定目標值27%比較，符合預期執行進度(詳第19頁圖4、第25頁表2、第28頁表5)。各縣市情形如次：臺北市(90.00%)、新北市(51.92%)、高雄市(51.76%)、桃園市(49.71%)、彰化縣(38.88%)、雲林縣(35.21%)、花蓮縣(35.08%)、新竹縣(34.54%)、臺中市(33.68%)、屏東縣(32.90%)、臺南市(32.24%)、嘉義縣(31.96%)、澎湖縣(30.48%)、新竹市(30.19%)、基隆市(30.01%)、臺東縣(27.72%)及苗栗縣(27.53%)等17個縣市達27%以上；而宜蘭縣(25.98%)、嘉義市(25.18%)、連江縣(24.53%)、南投縣(20.38%)及金門縣(20.19%)等5個縣市則未達27%。

二、截至107年6月整體概況說明

(一) 107年度一般性補助款基本設施總經費為新臺幣(以下同)361.30億元(包括中央補助357億元及縣市自籌4.30億元)。

(二) 累計預定支用數為93.39億元，累計實際支用數106.69億元，已執行應付未付數25.60億元，發包結餘數0.53億元，合計預算執行數為132.82億元，預算執行率142.23%。另累計實際支用比為29.53%，較累計預定支用比(25.85%)高3.68個百分點。(詳第24頁表1)

(三) 平均預算達成率為36.76%，較歷年同期之平均值(27.02%)高9.74個百分點，較106年度同期(38.46%)低1.7個百分點。

(四) 標案總數計3,661件，較上月增加100件，其中3,207件標案已完成發包，發包率87.60%。776件標案完工，完工率21.20%；另648件標案完成驗收，驗收率17.70%。(詳第25頁表2)

(五) 依查核點檢視，標案計有445件落後，落後比率為12.16%，較歷年同期平均值(13.34%)降低1.18個百分點。(詳第28頁表5)

三、預算執行情形

(一) 截至107年6月底，年度預算達成率高於平均預算達成率(36.76%)者，計有臺北市(90.00%)、新北市(51.92%)、高雄市(51.76%)、桃園市(49.71%)及彰化縣(38.88%)等5個縣

市，其中以屏東縣增長幅度最大，較5月份提升19.82個百分點；低於平均預算達成率(36.76%)者計有17縣市，分別為雲林縣(35.21%)、花蓮縣(35.08%)、新竹縣(34.54%)、臺中市(33.68%)、屏東縣(32.90%)、臺南市(32.24%)、嘉義縣(31.96%)、澎湖縣(30.48%)、新竹市(30.19%)、基隆市(30.01%)、臺東縣(27.72%)、苗栗縣(27.53%)、宜蘭縣(25.98%)、嘉義市(25.18%)、連江縣(24.53%)、南投縣(20.38%)及金門縣(20.19%)。(詳第13頁圖1-1、第24頁表1)

- (二) 依各縣市累計實際支用比情形分析，計有宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、金門縣及連江縣等9縣市低於本月累計預定支用比，與5月份比較計減少臺東縣，惟增加宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣及新竹市。(詳第17頁圖2、第18頁圖3、第24頁表1)
- (三) 依基本設施補助經費9類分析，低於平均預算達成率(36.76%)有「體育」、「道路養護及道安計畫」、「水利建設」、「農業建設」、「公有建物及設施」等5類。(詳第20頁圖5、第26頁表3、第27頁表4)

1. 「體育」執行情形

(1) 執行經費占年度預算2.77%，年度預算達成率為29.24%，標案件數總計145件，尚在規劃階段計13件，占總件數8.97%。

(2) 各縣市預算執行情形，其中宜蘭縣預算尚未執行；而基隆市(12.05%)、新北市(15.36%)、臺北市(19.47%)、嘉義市(21.14%)、雲林縣(22.06%)、高雄市(24.21%)及新竹市(28.85%)等7個縣市低於年度預算達成率平均值(29.24%)。

2. 「道路養護及道安計畫」執行情形

(1) 執行經費占年度預算9.01%，年度預算達成率為29.64%，標案件數總計165件，尚在規劃階段計11件，占總件數6.67%。

(2) 各縣市預算執行情形，其中臺東縣(0.80%)、基隆市(3.56%)、花蓮縣(5.72%)、新北市(7.00%)、嘉義市(7.93%)、南投縣(10.26%)、苗栗縣(16.41%)、嘉義縣(18.85%)及屏東縣(28.21%)等9個縣市低於年度預算達成率平均值(29.64%)。

3. 「水利建設」執行情形

(1) 執行經費占年度預算12.82%，年度預算達成率為29.87%，標案件數總計293件，尚在規

劃階段計 20 件，占總件數 6.83%。

(2)各縣市預算執行情形，其中金門縣預算尚未執行；而澎湖縣(0.52%)、基隆市(1.71%)、新竹市(11.25%)、連江縣(12.42%)、嘉義縣(16.92%)、新竹縣(17.41%)、臺中市(18.26%)、彰化縣(19.18%)、宜蘭縣(21.01%)、雲林縣(21.50%)、苗栗縣(23.21%)、南投縣(24.74%)、嘉義市(26.03%)、桃園市(28.50%)、高雄市(29.01%)、花蓮縣(29.25%)及屏東縣(29.53%)等 17 個縣市低於年度預算達成率平均值(29.87%)。

4. 「農業建設」執行情形

(1)執行經費占年度預算 3.41%，年度預算達成率為 32.11%，標案件數總計 105 件，尚在規劃階段計 12 件，占總件數 11.43%。

(2)各縣市預算執行情形，其中新竹縣(1.15%)、澎湖縣(3.13%)、雲林縣(3.90%)、臺中市(5.47%)、苗栗縣(9.60%)、南投縣(17.37%)、嘉義縣(24.21%)、屏東縣(30.00%)及新北市(31.36%)等 9 個縣市低於年度預算達成率平均值(32.11%)。

5. 「公有建物及設施」執行情形

(1)執行經費占年度預算 11.61%，年度預算達成率為 30.78%，標案件數總計 400 件，尚在規劃階段計 15 件，占總件數 3.75%。

(2)各縣市預算執行情形，其中臺東縣(0.17%)、連江縣(1.57%)、嘉義市(2.03%)、澎湖縣(3.15%)、新竹市(9.26%)、彰化縣(10.80%)、雲林縣(13.55%)、臺南市(15.53%)、臺中市(16.18%)、嘉義縣(21.47%)、屏東縣(26.59%)及南投縣(28.55%)等 12 個縣市低於年度預算達成率平均值(30.78%)。

四、標案執行進度說明

截至 107 年 6 月底，總計 3,661 件標案，各階段完成情形：已設計完成者 3,435 件(93.83%)，已發包決標者 3,207 件(87.60%)，已開工者 2,605 件(71.16%)，施工進度已達 50%者 1,314 件(35.89%)，已完工者 776 件(21.20%)，已驗收完成者 648 件(17.70%)。(詳第 19 頁圖 4、第 25 頁表 2)

五、標案落後情形說明

(一)依管考要點規定，所謂「標案落後」係指預算執行率未達 80%或查核點進度落後者。截至 107

年6月底，3,661件標案計有445件落後，標案落後比率為12.16%。其中苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、澎湖縣及新竹市等5縣市落後比率偏高。(詳第21頁圖6、第28頁表5)

(二) 依基本設施補助經費9類分析，超出年度落後比率計有「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」等3類。(詳第22頁圖7、第27頁表4)

1. 「交通建設」標案落後比率為22.4%，其中基隆市為66.67%、金門縣為57.14%、新北市為50%。

基隆市計4件，落後案件為「中和路拓寬工程用地補償費」係因土地所有人資料延誤導致落後；「中和路拓寬工程」係因剛開工施作項目較少落後；「工東街道路拓寬工程」係因第一次工程採購部分流標，導致期程延誤；「月眉路都市計畫道路改善拓寬工程(第二標)」係因工程用地範圍為線性狀，又因位於山區，受制於地形起伏因素，致使工作面不易展開。金門縣計16件，落後案件為「金寧鄉東洲鄉村整建工程」係因廠商未計價，致經費執行落後；「烈嶼鄉后頭社區活動中心暨周邊環境整建工程-二期工程」係因開工遲延，致進度落後；「烈嶼鄉聚落環境整建工程」係因施工進度落後；「金門縣金城鎮天后宮廣場與周邊景觀改善工程」係因廠商材料進場時程遲延及道路開挖許可申請遲延；「金寧鄉安岐聚落文化風華再現計畫」因施工放樣後民眾反映施工位置未盡完善致停工34天，已於6月1日復工；「光點聚焦-金湖鎮海岸門戶再生計畫」因廠商工班調派不足致落後，目前已加強施作中；「水岸、綠地、老聚落-金沙鎮后浦頭村門戶再造計畫」；「金沙鎮官嶼里聚落周邊環境發展委託設計監造」等2案因發包作業落後；「106年度金城鎮庵前社區活動中心周邊景觀改善工程」係因配合主體建築工程變更設計調整規劃設計工項，且配合社區意見調整工項，致整體進度落後；「金沙鎮汶沙里農田排水暨產業道路整建」因縣府重新發包致進度落後；「北九劃段1468地號農田排水暨產業道路整建工程」已完工，惟尚未完成經費核銷作業，致經費執行落後；「金湖鎮太湖劃測段233-1地號等農路改善工程」係因施工進度落後；「金城鎮泗湖海邊聯外道路工程」因配合現況土質辦理變更設計，致進度落後；「為後豐新村開發，辦理範圍內道路與公共管線設施新建、箱涵石籠與明渠改道等作業」因承商備料及進場期間延遲、變更增加工項，致進度落後；「辦理金門醫院聯外道路新建暨排水暗溝、RC擋土牆、單孔箱涵、路燈工程，全長約605公尺，寬8公尺。」係因施工進度落後；「辦理烈嶼鄉九井路道路AC

面層刨鋪、標線等改善工程」係因規劃設計落後。新北市計 1 件，落後案件為「中和區公 29 公園有償撥用用地費」係因國產署北區分署尚未辦理轉正導致落後。

2. 「水利建設」標案落後比率為 21.84%，其中澎湖縣為 85.71%、基隆市為 80%、苗栗縣為 76%。

澎湖縣計 6 件，落後案件為「辦理各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修護工程水利構造物檢查與工程設」係因於 107 年 6 月 7 日完成初步設計審查，尚未完成細部設計審查作業；「補助各鄉市區域及中小排水路清淤疏浚工程」、「補助各鄉市區域及中小排水路清淤疏浚工程(疏浚清淤部分)」係因中央檢核提報之請款資料，工管費計算有誤退回修正，尚無法請款；「山水西衛污水處理廠、大倉污水淨化設施代操作及修繕維護費」係因配合契約價金給付致落後；「辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程」係因尚於細部設計審查中；「辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程(疏浚清淤部分)」係因尚未有疏浚案件，故未達付款條件。基隆市計 4 件，落後案件為「基隆市區域排水改善工程(A)」、「基隆市區域排水改善工程(B)」2 案係因成立預算簽核作業稍有延誤，造成進度些許落後；「基隆市都市排水疏濬工程(A)」係因設計書圖部份資料尚需依審查意見修正致落後；「全市雨水下水道零星維護工程」係因此標案分 3 標均為單價標，依實際施作數量計價，因開工至今，地方建議施作改善數量不足落後。苗栗縣計 19 件，落後案件為「全縣區域排水水利零星相關工程」係因部份工程較晚發包落後；「全縣區域排水水利建造物維護管理」係因年度汛期後進行檢查落後；「流域綜合治理計畫-蚬仔溝排水出口滯洪池興建工程用地費」係因用地範圍內發現廢棄物，正釐清責任中；「全縣縣管河川水利零星相關工程」係因部份工程尚未發包落後；「全縣縣管河川水利建造物維護管理」係因年度汛期後進行檢查落後；「全縣縣管河川防救災暨自來水延管配合業務」係因配合議會墊付期程，較晚發包落後；「縣管河川應急、疏濬清淤工程經費」係因修正招標文件內容致上網發包時間延遲；「雨水下水道清淤工程開口合約」係因招標作業流標 2 次延誤期程；「107 年度苗栗縣雨水下水道系統興建及改善工程(開口合約)」係因於 107 年 5 月 15 日簽准預訂施作地點落後；「107 年度苗栗縣頭份鎮永貞抽水站維護保養及代操作」招標文件研擬中；「流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設計畫雨水工程地方配合款」係因三義水美工程計畫書因營建署有意見退回修正；「苗栗地區、

明德水庫特定區北岸暨南岸水資源回收中心委外代操作維護工作」係因第一次後續擴充之保險單有部分日數未保落後；「明德水庫汙水下水道工程電費」係因依據電費收據始得辦理繳款作業落後；「苗栗市南苗地區汙水下水道系統分支管網及用戶接管工程」係因該府於107年7月4日召開座談會落後；「苗栗地區汙水下水道南苗主次幹管工程」係因請款作業落後；「苗栗市、頭屋鄉汙水下水道相關工程」係因招標作業流標落後；「苗栗地區汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(北中苗第五標)」係因採購審查會落後；「苑裡鎮汙水下水道系統主次幹管第一期工程」係因涉及汙水處理廠廠址變更，故尚未辦理招標落後；「苗栗縣苑裡鎮水資源回收中心第一期工程(含三年試運轉)」係因汙水處理廠土地取得作業尚未完成，尚未辦理招標落後。

3. 「農業建設」標案落後比率為23.81%，其中臺中市為60%、苗栗縣為60%、新竹縣為50%。臺中市計3件，落後案件為「補助農民團體、產銷班及班員辦理現代化農業生產機具及設備補助計畫」係因執行單位執行計畫中，驗收作業需安排請購之農友較費時；「資本門：補助各級農會、漁會、農業合作社場、產銷班及其他與農業有關之非營利性團體推展農業經營企業化、自動化，農特產品集貨包裝場及加工廠設施(備)、農夫市集等計畫」係因受補助單位陸續辦理採購或發包施工，其餘所研提補助案尚在審核中；「資本門：補助各級農會、漁會、農業合作社場、產銷班及其他與農業有關之非營利性團體輔導臺中市農產品產業升級設施(備)補助計畫」係因研提補助案尚在審核中。苗栗縣計3件，落後案件為「治山防災及野溪坑溝整治工程」係因施工部分請廠商在期限內完工，尚未發包部分已請設計公司將預算書送縣府審查，辦理發包事宜；「農路改善」係因工程預算書審查及上網發包中；「漁港工程改善」係因配合預算延誤致落後。新竹縣計1件，落後案件為「辦理重劃區農水路整修改善工程」係因招標作業107年4月24日決標，5月23日簽奉核准訂約，5月28日通知廠商文到30日內設計完成。

- (三) 在已填寫落後原因標案404件中，落後原因除「其他」因素209件外，以「招標作業」原因所占87件占21.53%最高，其次依序為「規劃設計」59件、「預算編列」13件、「驗收作業」10件、「計畫變更」7件、「天然因素」6件、「土地取得」5件、「施工作業」5件、「人力需求」2件、「拆遷補償」1件。另未填寫落後原因計41件，以金門縣20件占48.78%

最多，顯示對計畫執行狀況掌握度有待加強。(詳第 23 頁圖 8、第 29 頁表 6)


1、建議事項

- 一、第 2 季各縣市於 6 月底之「發包率」預定目標值為 85%，未達目標值計有金門縣(84.67%)、南投縣(84.35%)、連江縣(83.58%)、宜蘭縣(82.02%)、嘉義市(73.48%)及苗栗縣(71.84%)等 6 個縣市；「預算達成率」預定目標值為 27%，未達目標值計有宜蘭縣(25.98%)、嘉義市(25.18%)、連江縣(24.53%)、南投縣(20.38%)及金門縣(20.19%)等 5 個縣市。以上未達目標值之縣市，請加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按標案期程適時上網填報，以落實自主管理，提升發包率與預算達成率。
- 二、第 2 季落後標案，以「交通建設」、「水利建設」、「農業建設」等 3 類別，在比率上較為偏高；經查落後原因，除「其他」及「未填寫」因素外，以「招標作業」及「規劃設計」所占比率較高。請苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、澎湖縣、新竹市、南投縣、連江縣、新竹縣、基隆市及臺東縣等落後比率高於平均值(12.16%)之縣市政府積極辦理。
- 三、為確實掌握標案落後原因，研提具體解決對策，對於未填寫標案落後原因比例偏高縣市(金門縣、宜蘭縣)，請縣市政府列管單位加強查核資料，並依標案期程適時至管考系統檢視，以落實管考作業。

2、圖表

圖 1-1、預算達成率—各縣市分布圖

截至 107 年 6 月底止

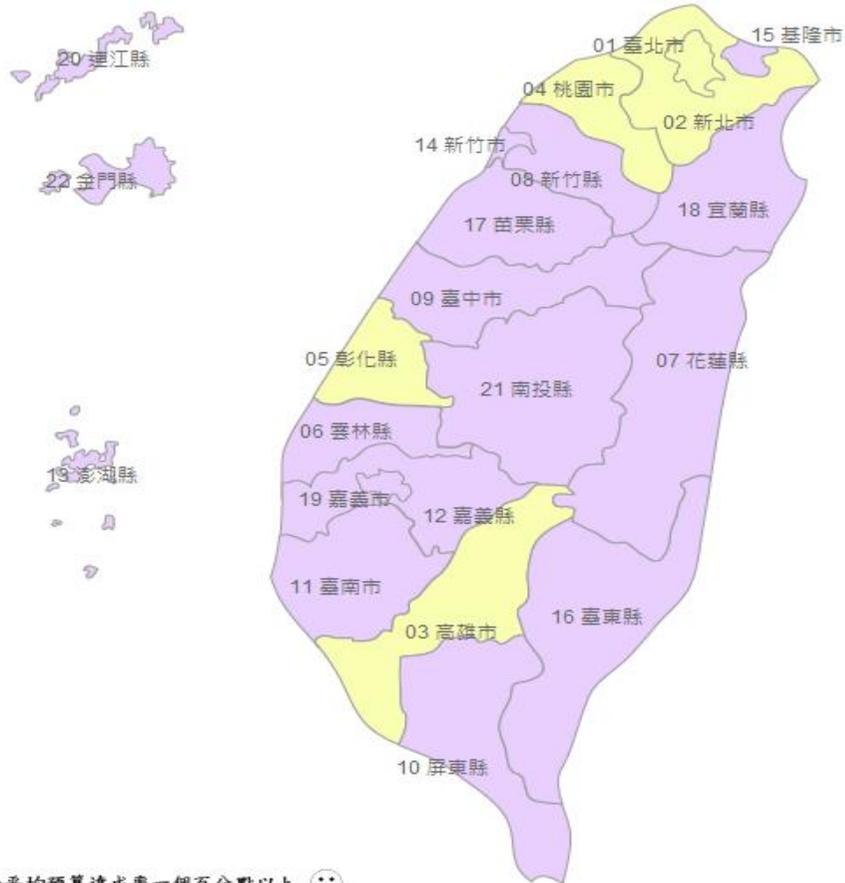

- 高於平均預算達成率一個百分點以上 😊
- 介於預算達成率正負一個百分點之間 😐
- 低於平均預算達成率一個百分點以上 ☹️

平均預算達成率 36.76%

圖示	縣市排名	達成率(%)	較上個月增加(百分點)
😊	01 臺北市	90	13.98
😊	02 新北市	51.92	9.06
😊	03 高雄市	51.76	10.53
😊	04 桃園市	49.71	14.22
😊	05 彰化縣	38.88	8.05
😐	06 雲林縣	35.21	8.04
😐	07 花蓮縣	35.08	6.63
😐	08 新竹縣	34.54	5.32
😐	09 臺中市	33.68	7.48
😐	10 屏東縣	32.9	19.82
😐	11 臺南市	32.24	13.11
😐	12 嘉義縣	31.96	9.83
😐	13 澎湖縣	30.48	12.36
😐	14 新竹市	30.19	14.77
😐	15 基隆市	30.01	6.12
😐	16 臺東縣	27.72	19.64
😐	17 苗栗縣	27.53	12.92
😐	18 宜蘭縣	25.98	5.99
😐	19 嘉義市	25.18	7.93
😐	20 連江縣	24.53	3.89
😐	21 南投縣	20.38	12.9
😐	22 金門縣	20.19	9.11

圖 1-2、預算達成率—依縣市別

截至 107 年 6 月底止

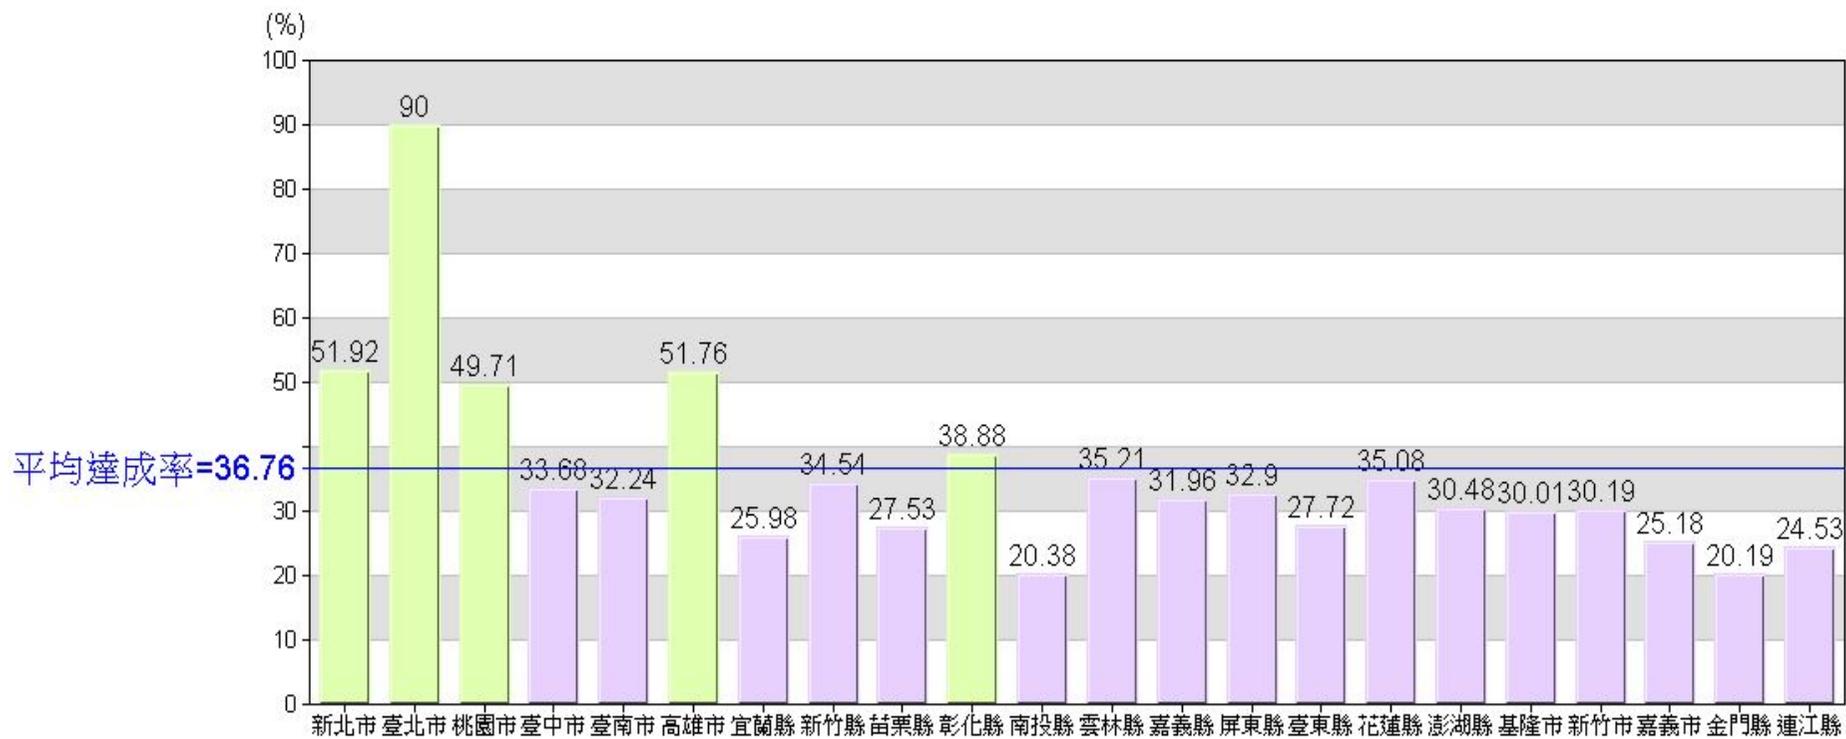


圖 1-3、執行情形—各計畫類別預算達成率最高縣市

截至 107 年 6 月底止

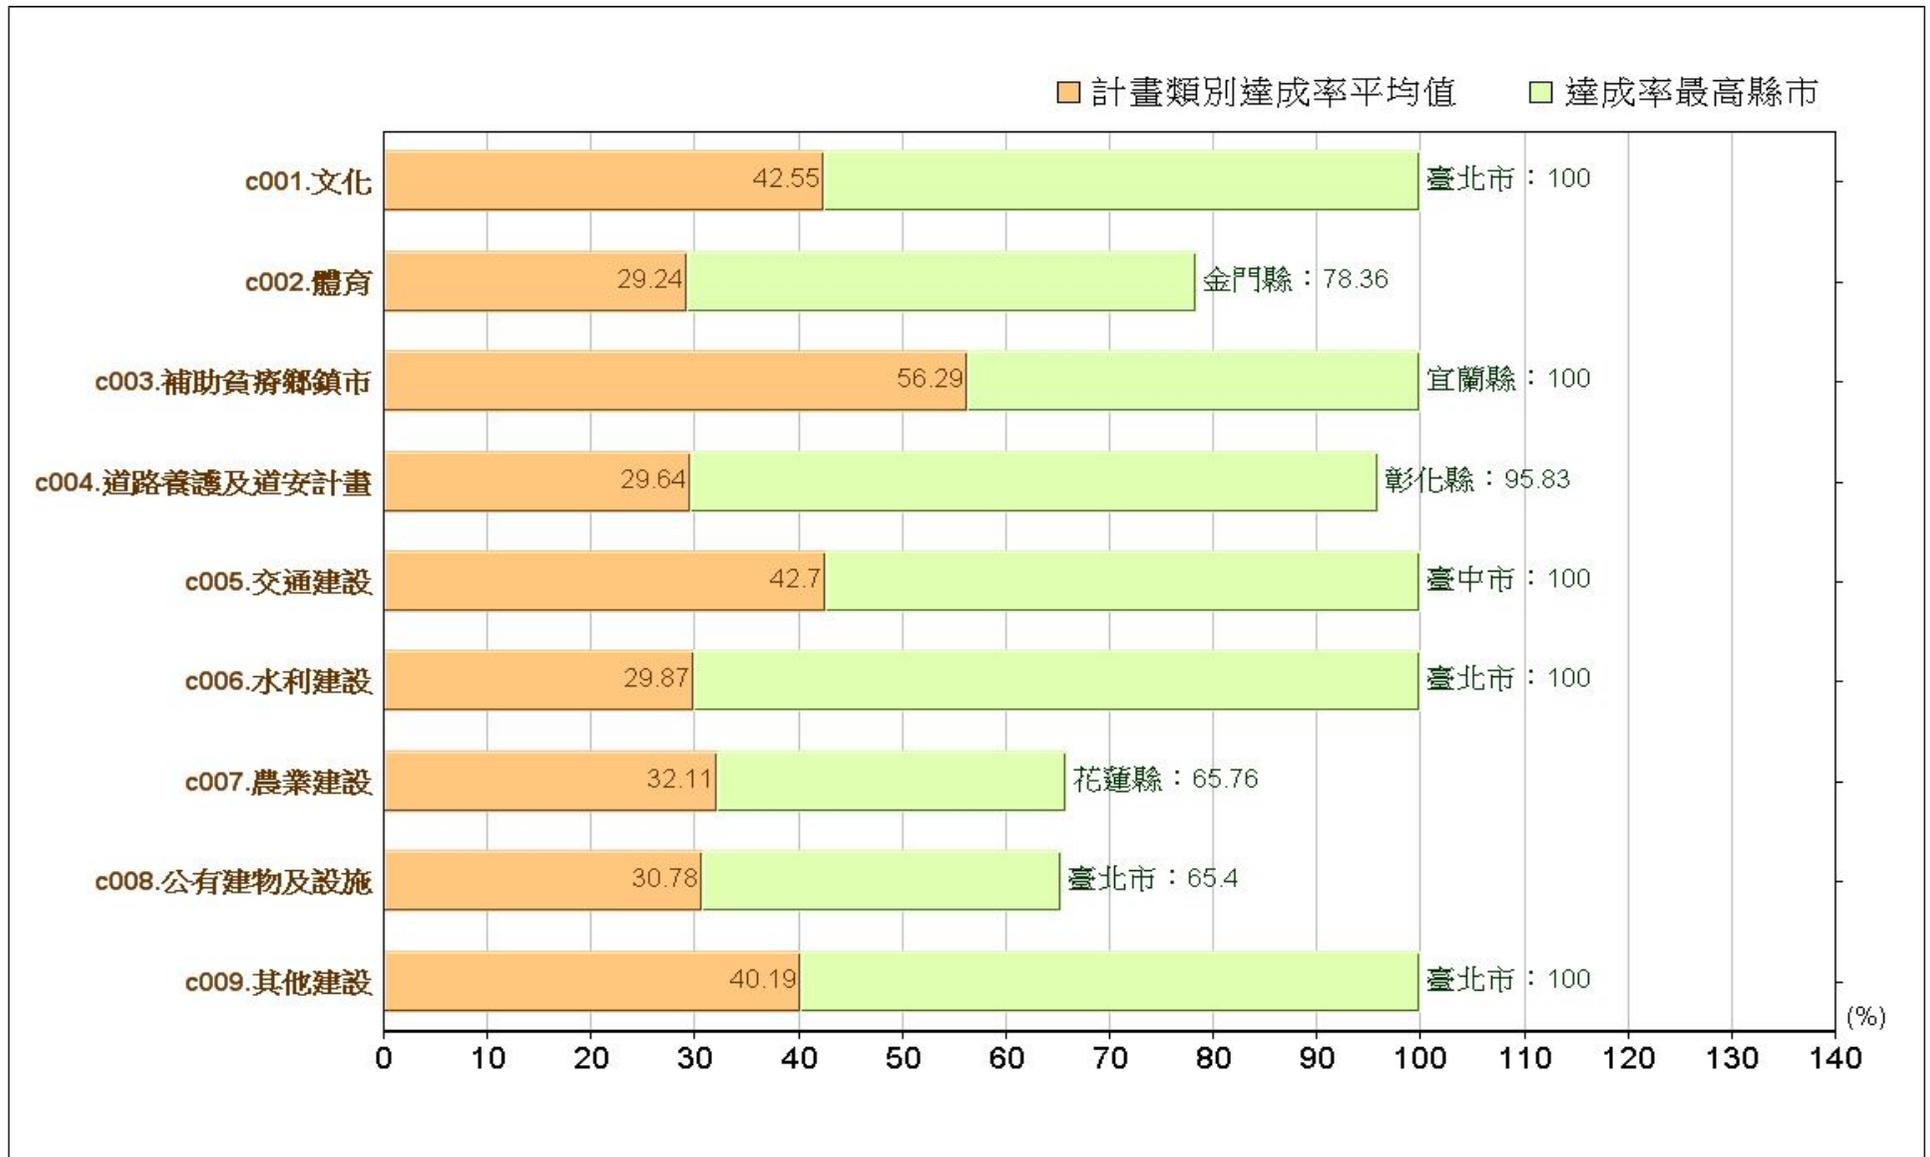


圖 1-4、落後情形—各計畫類別落後幅度最大縣市

截至 107 年 6 月底止

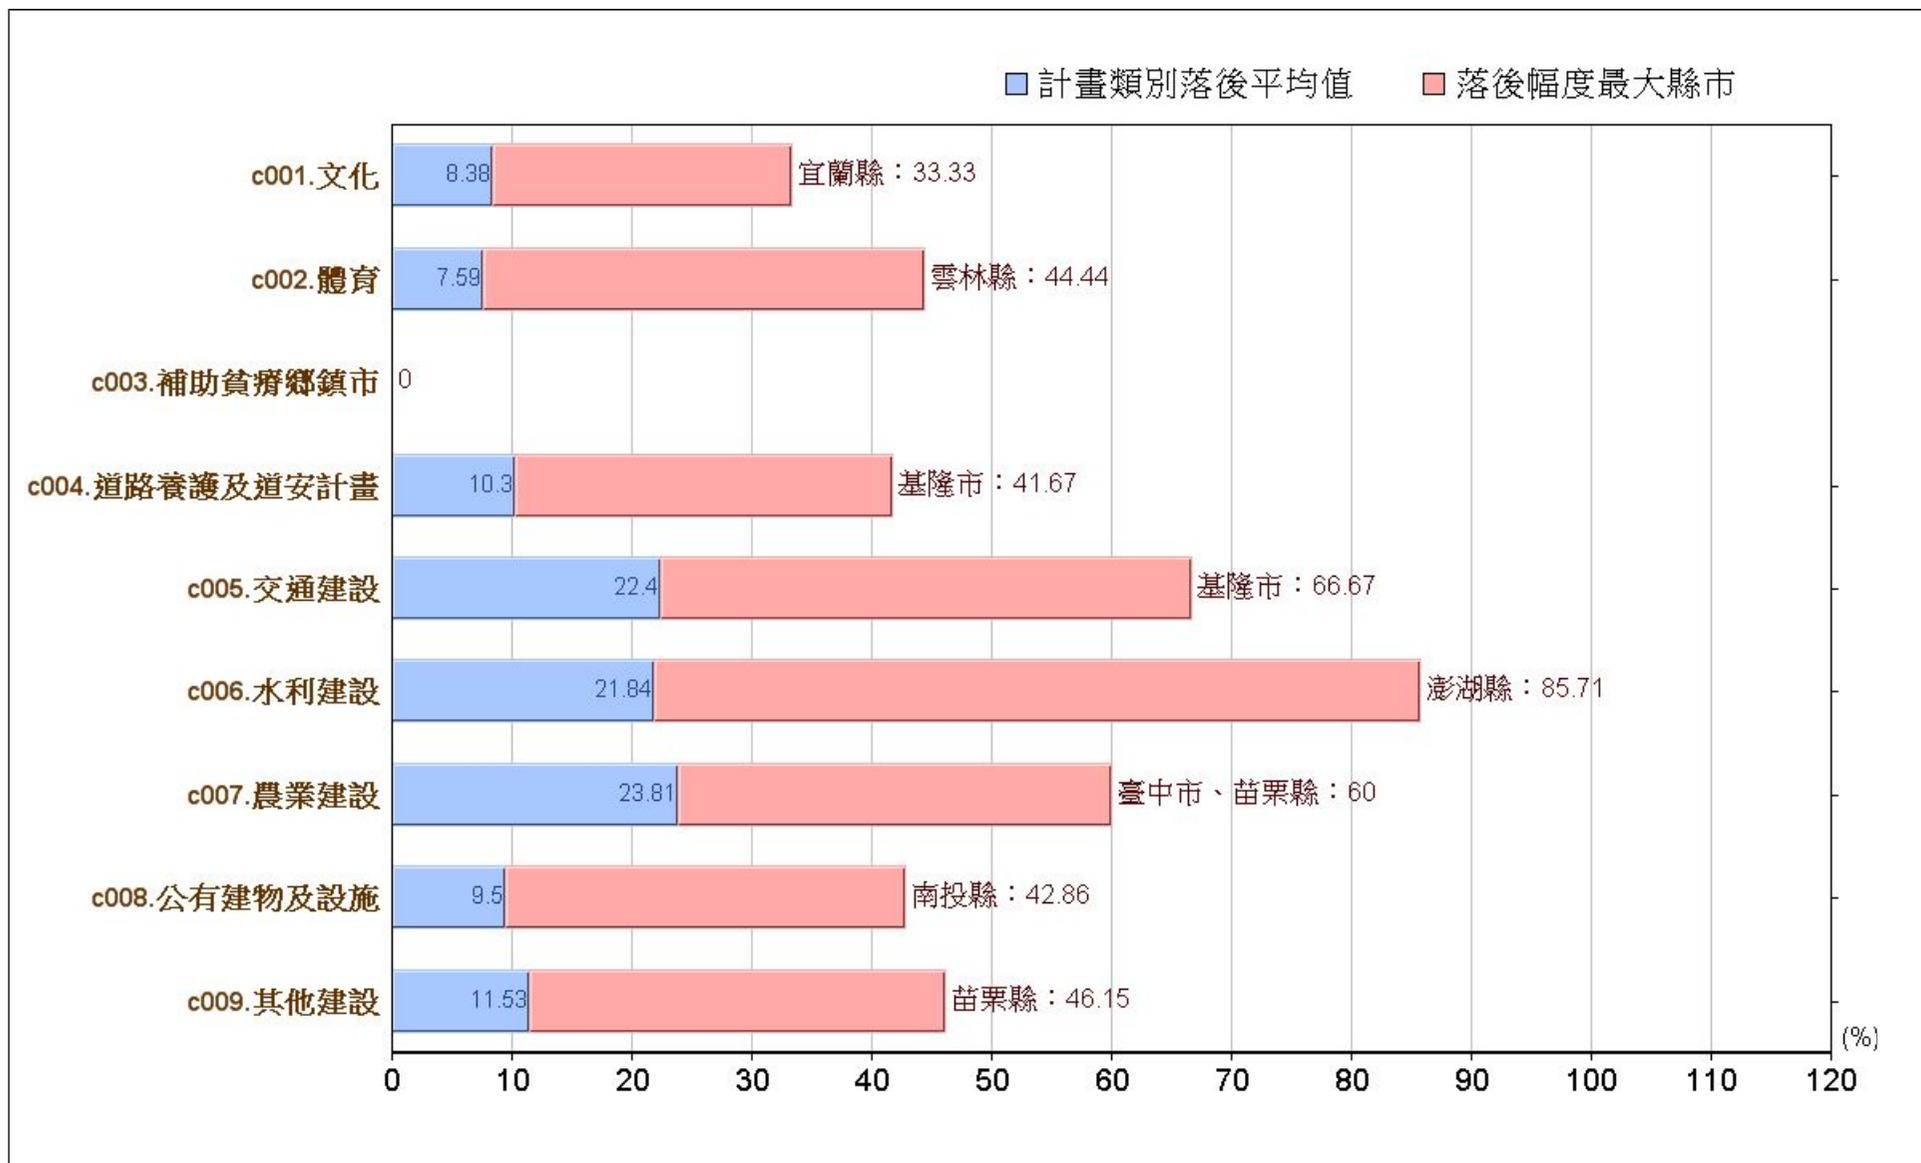


圖 2、預算支用情形—依縣市別

截至 107 年 6 月底止

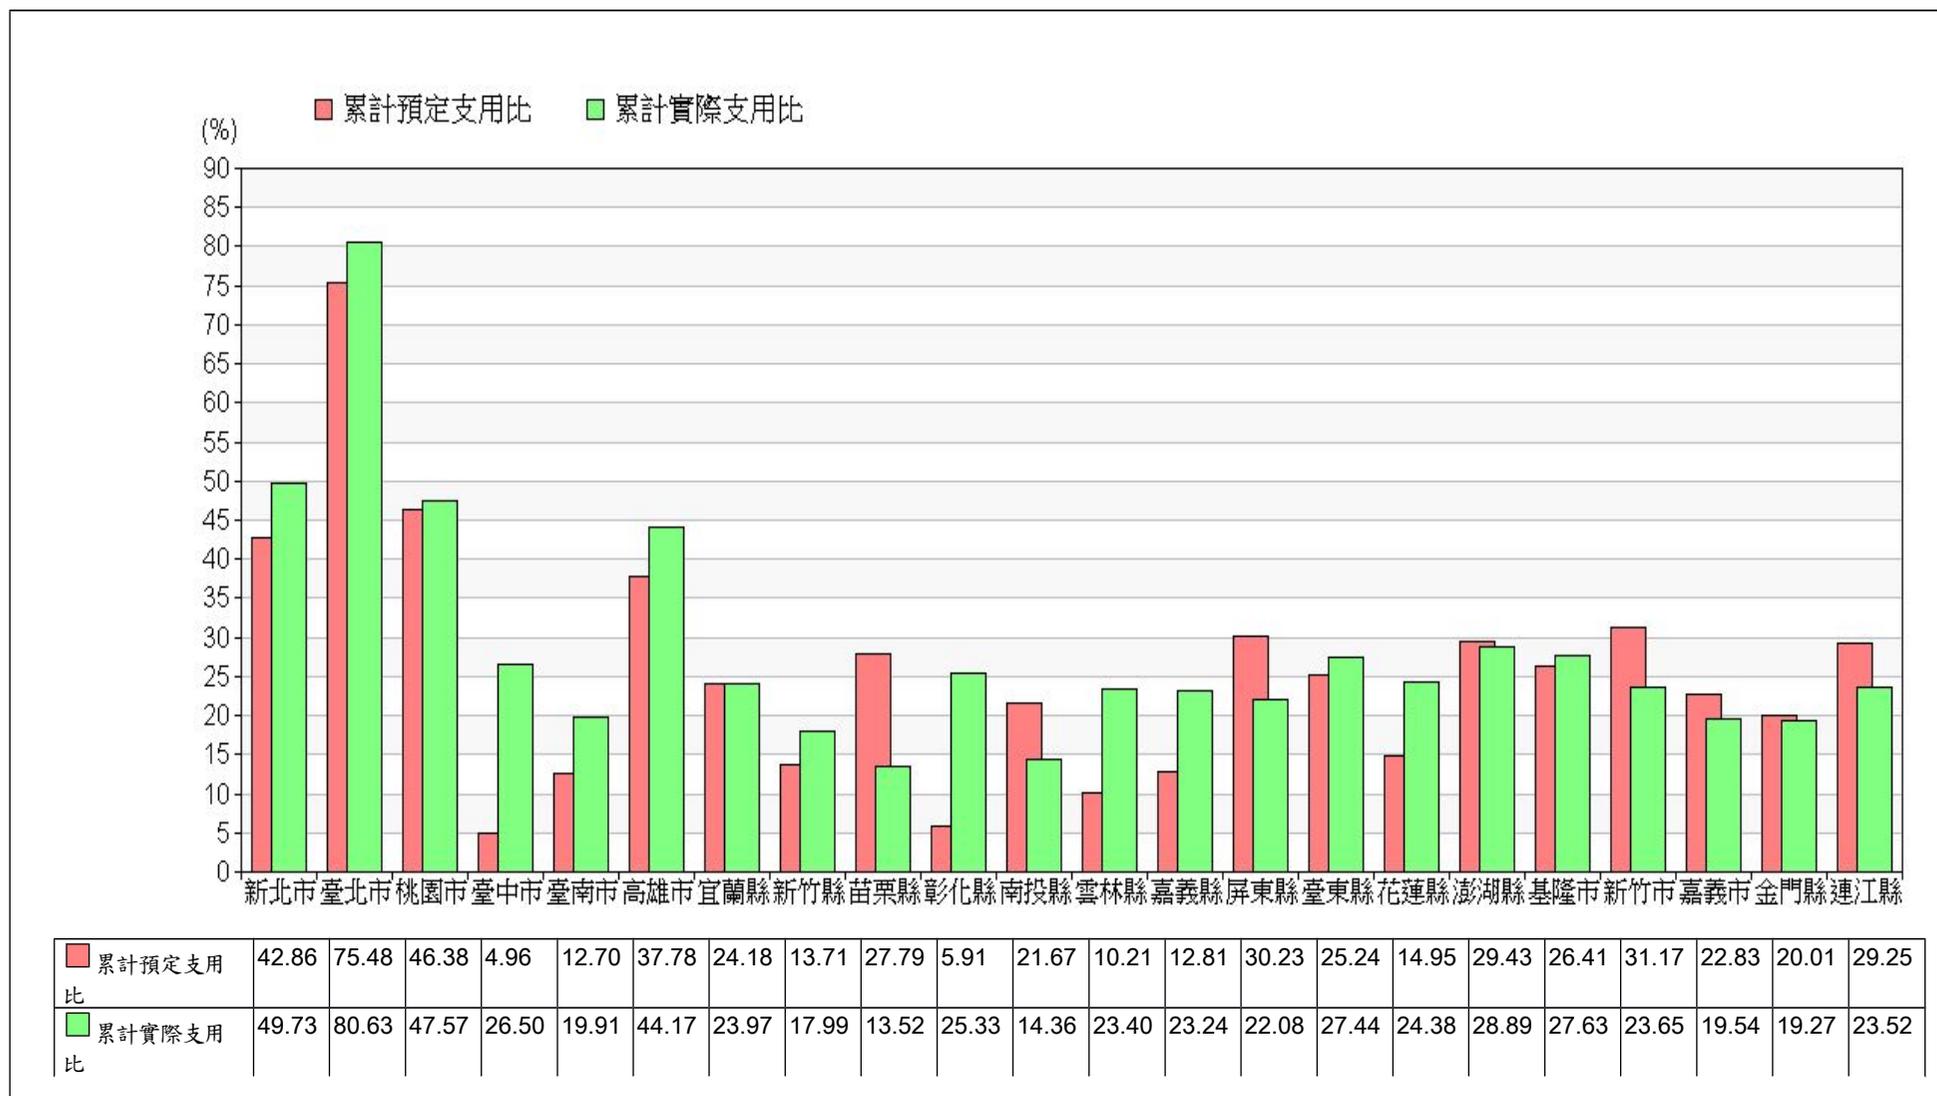


圖 3、預算支用情形—依計畫類別

截至 107 年 6 月底止

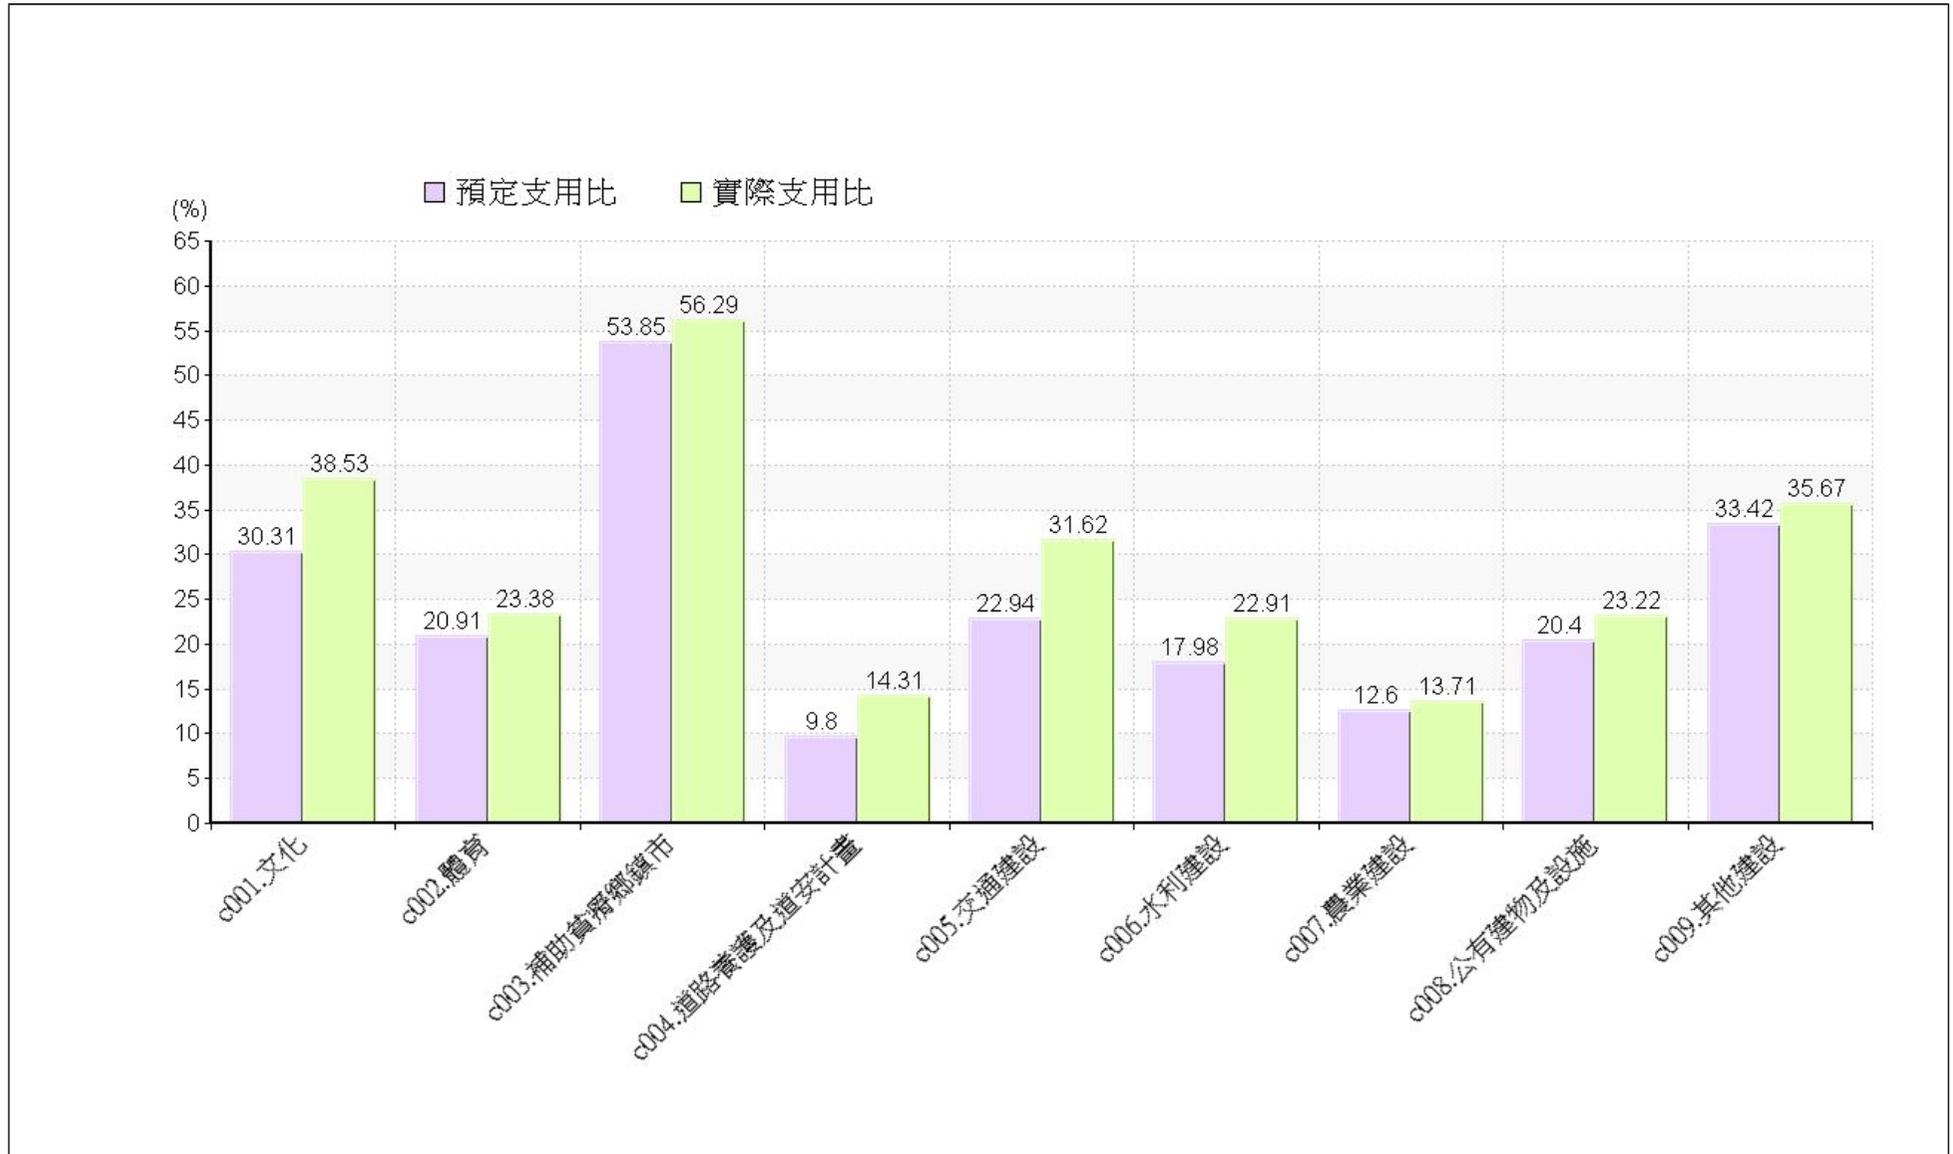


圖 4、標案執行進度

截至 107 年 6 月底止

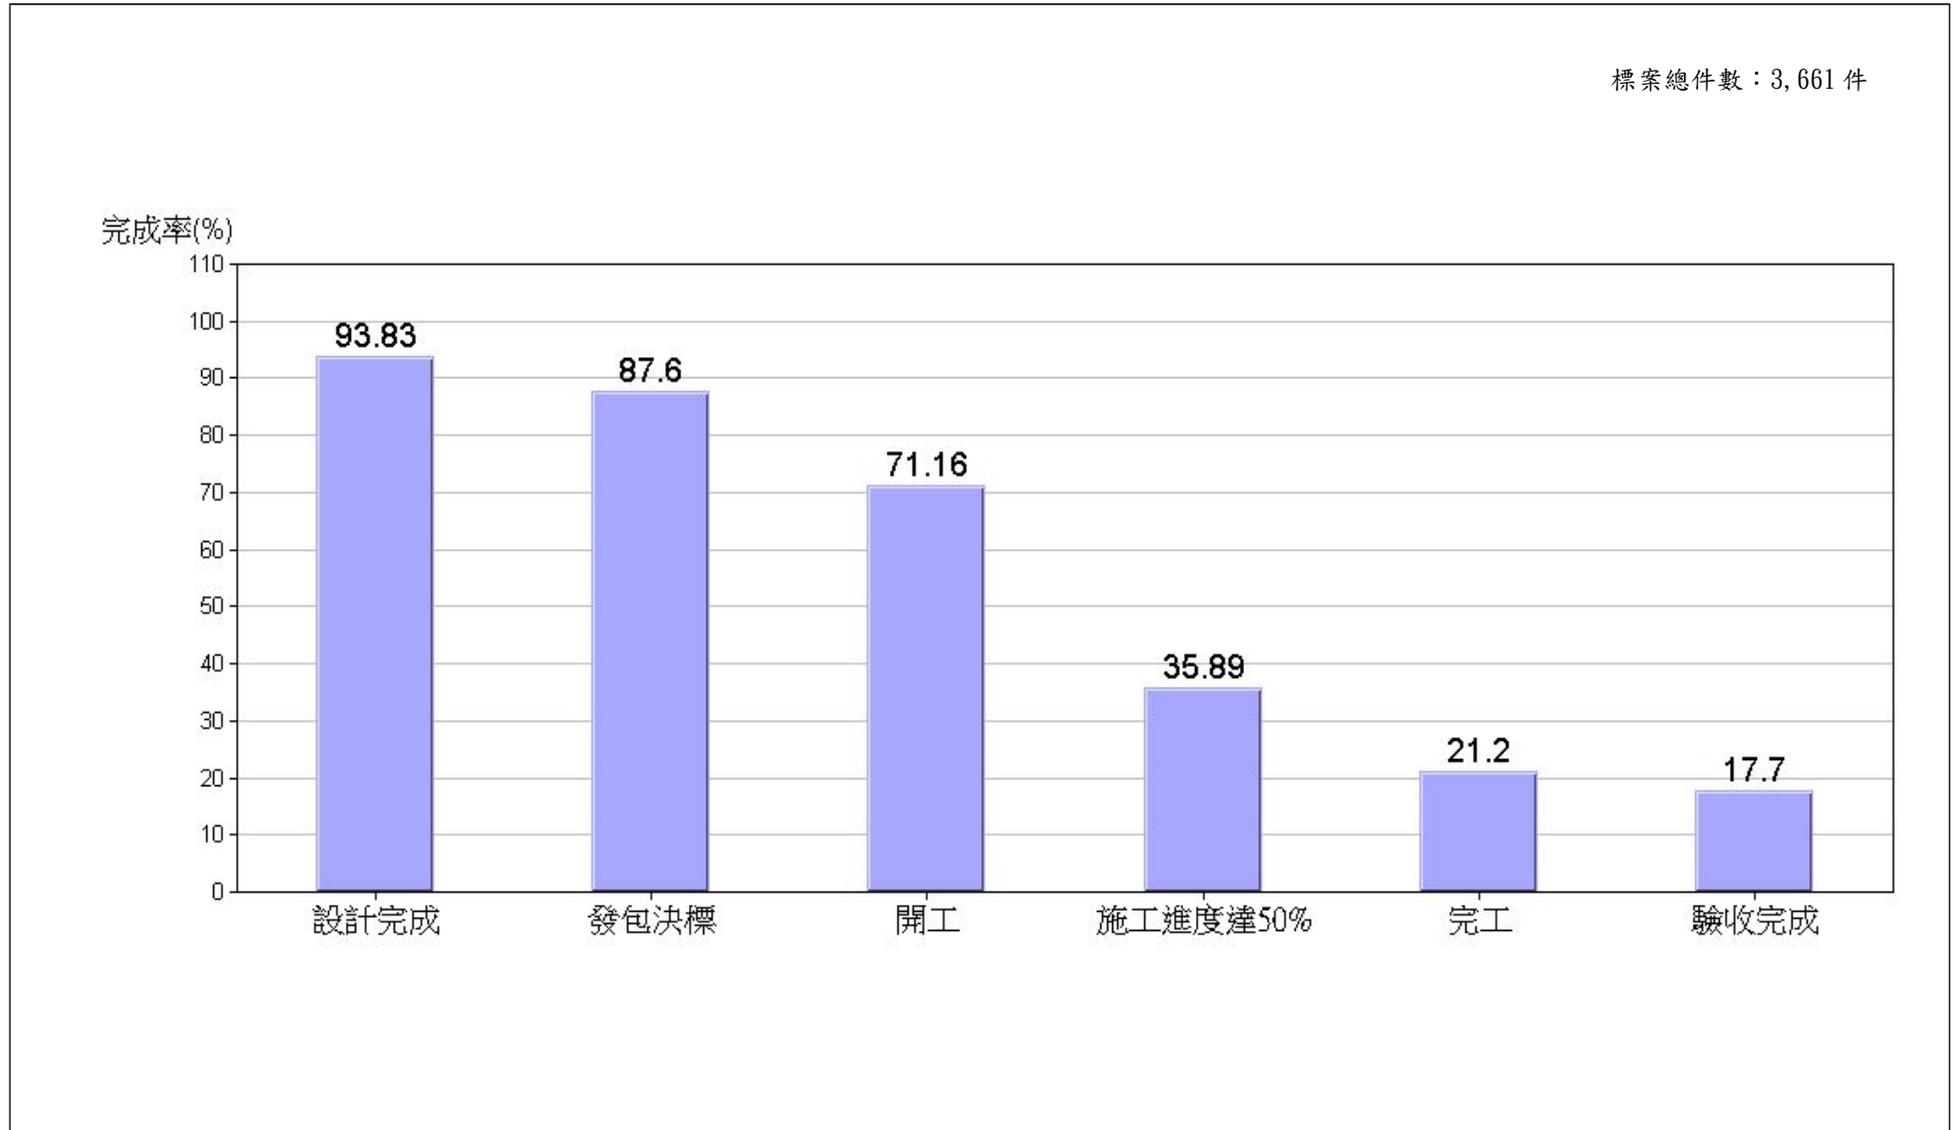


圖 5、預算達成率—依計畫類別

截至 107 年 6 月底止


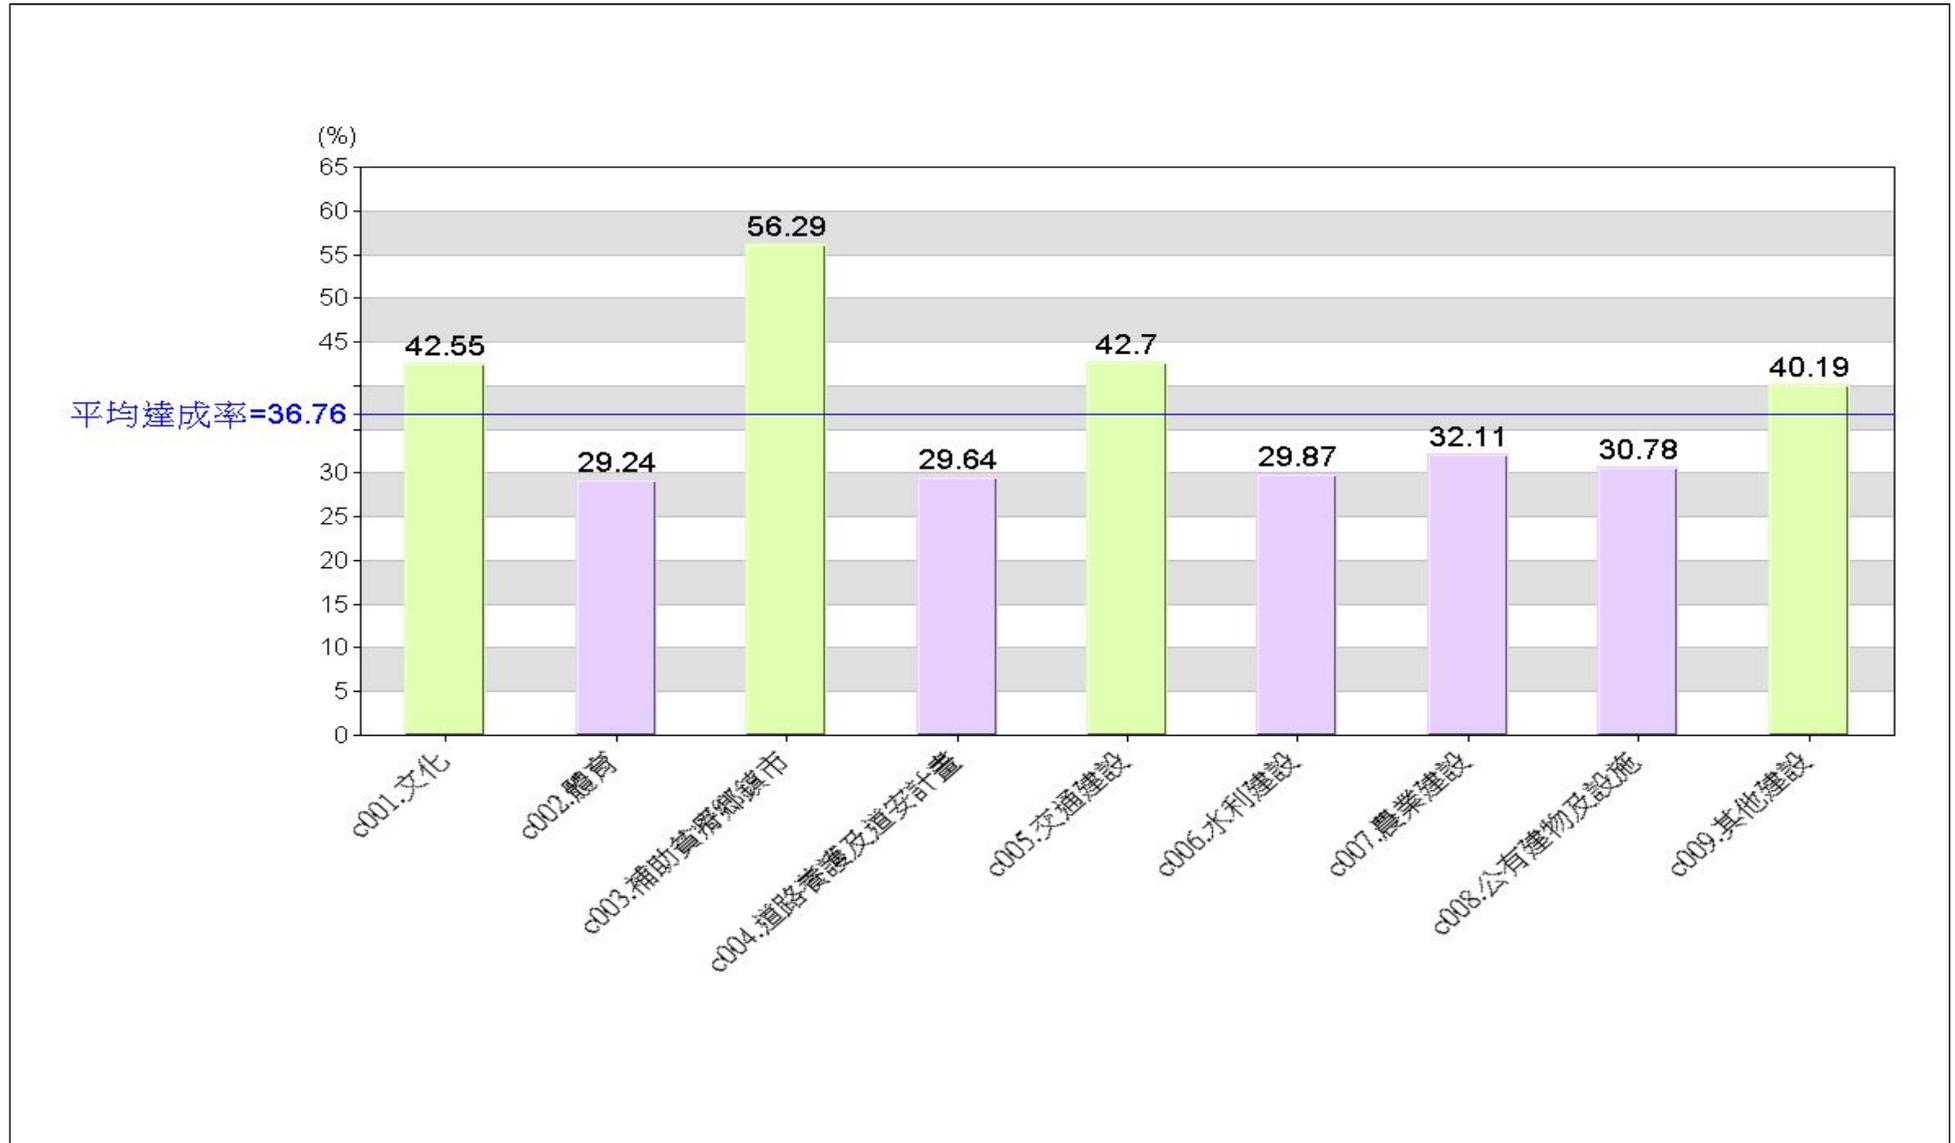


圖 6、落後標案件數比率—依縣市別


截至 107 年 6 月底止

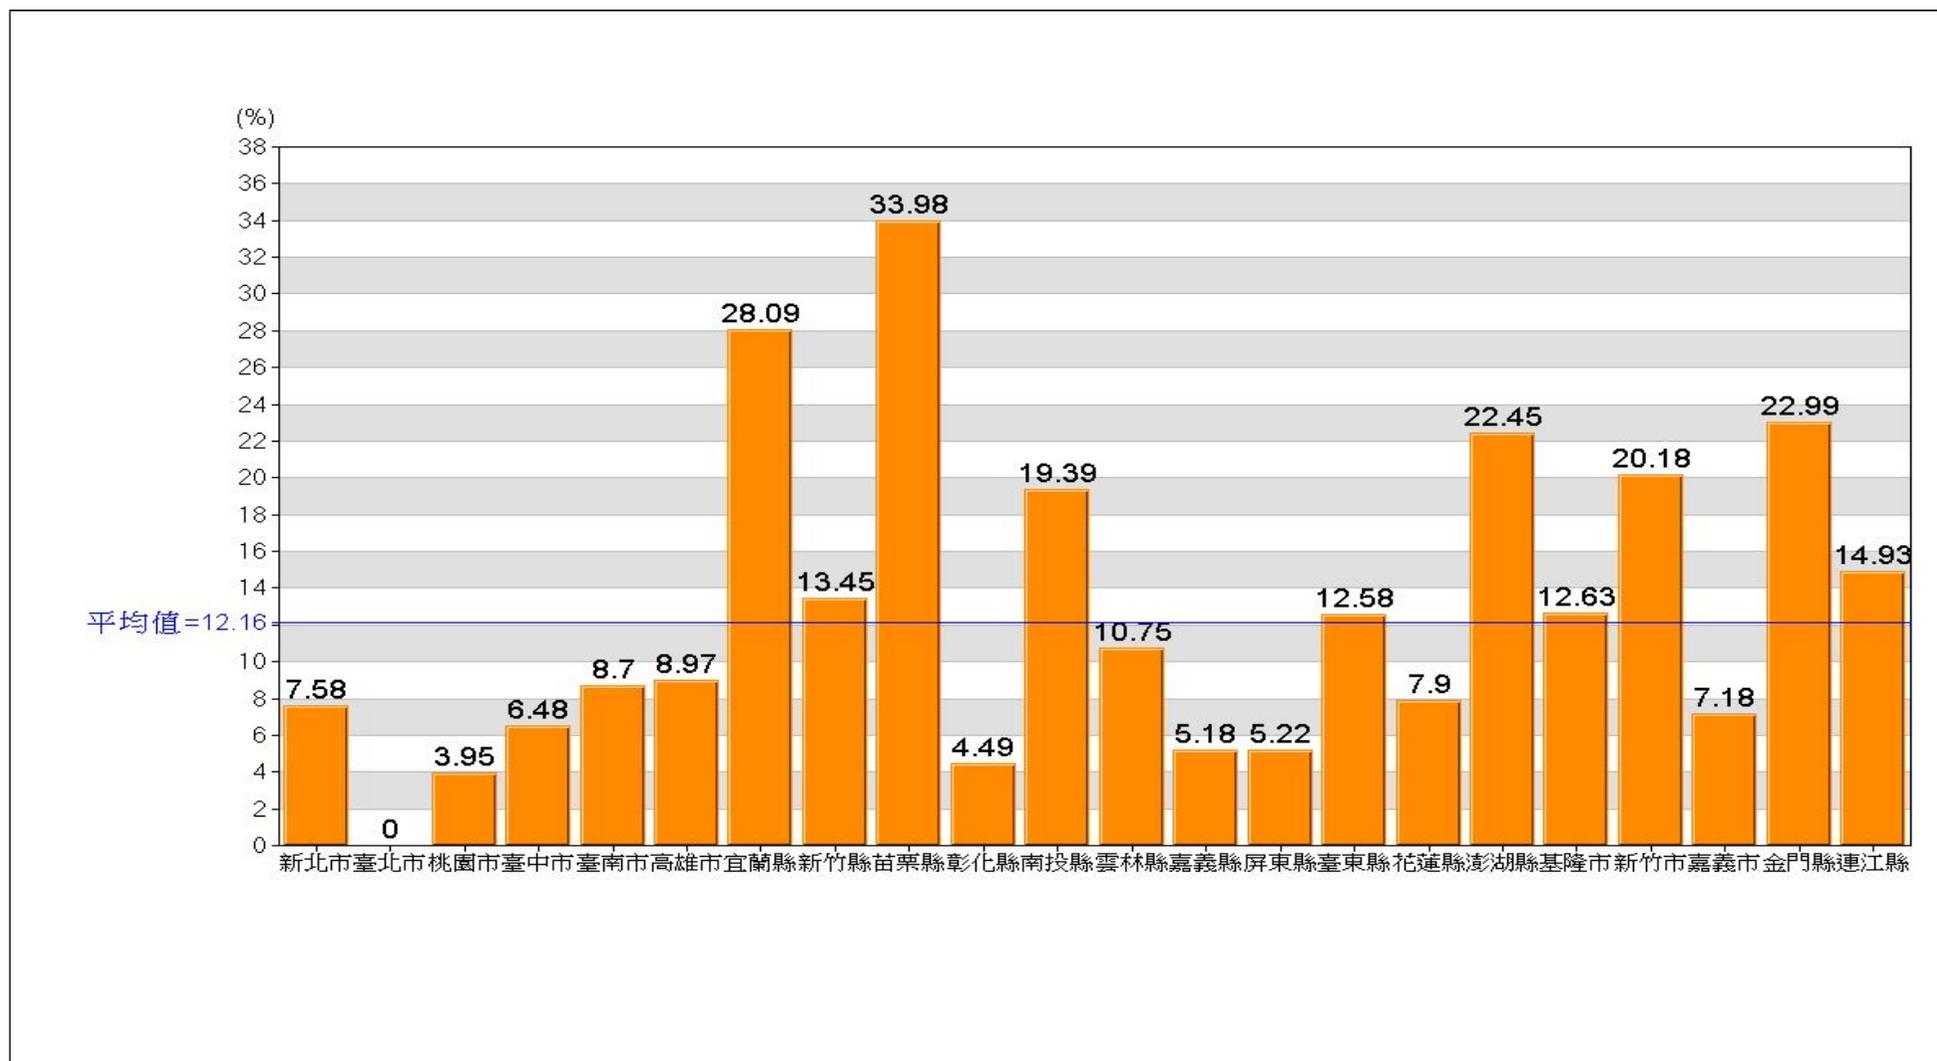

註：「落後標案」指各標案預算執行率未達 80% 或查核點進度落後。

圖 7、落後標案件數比率—依計畫類別

截至 107 年 6 月底止

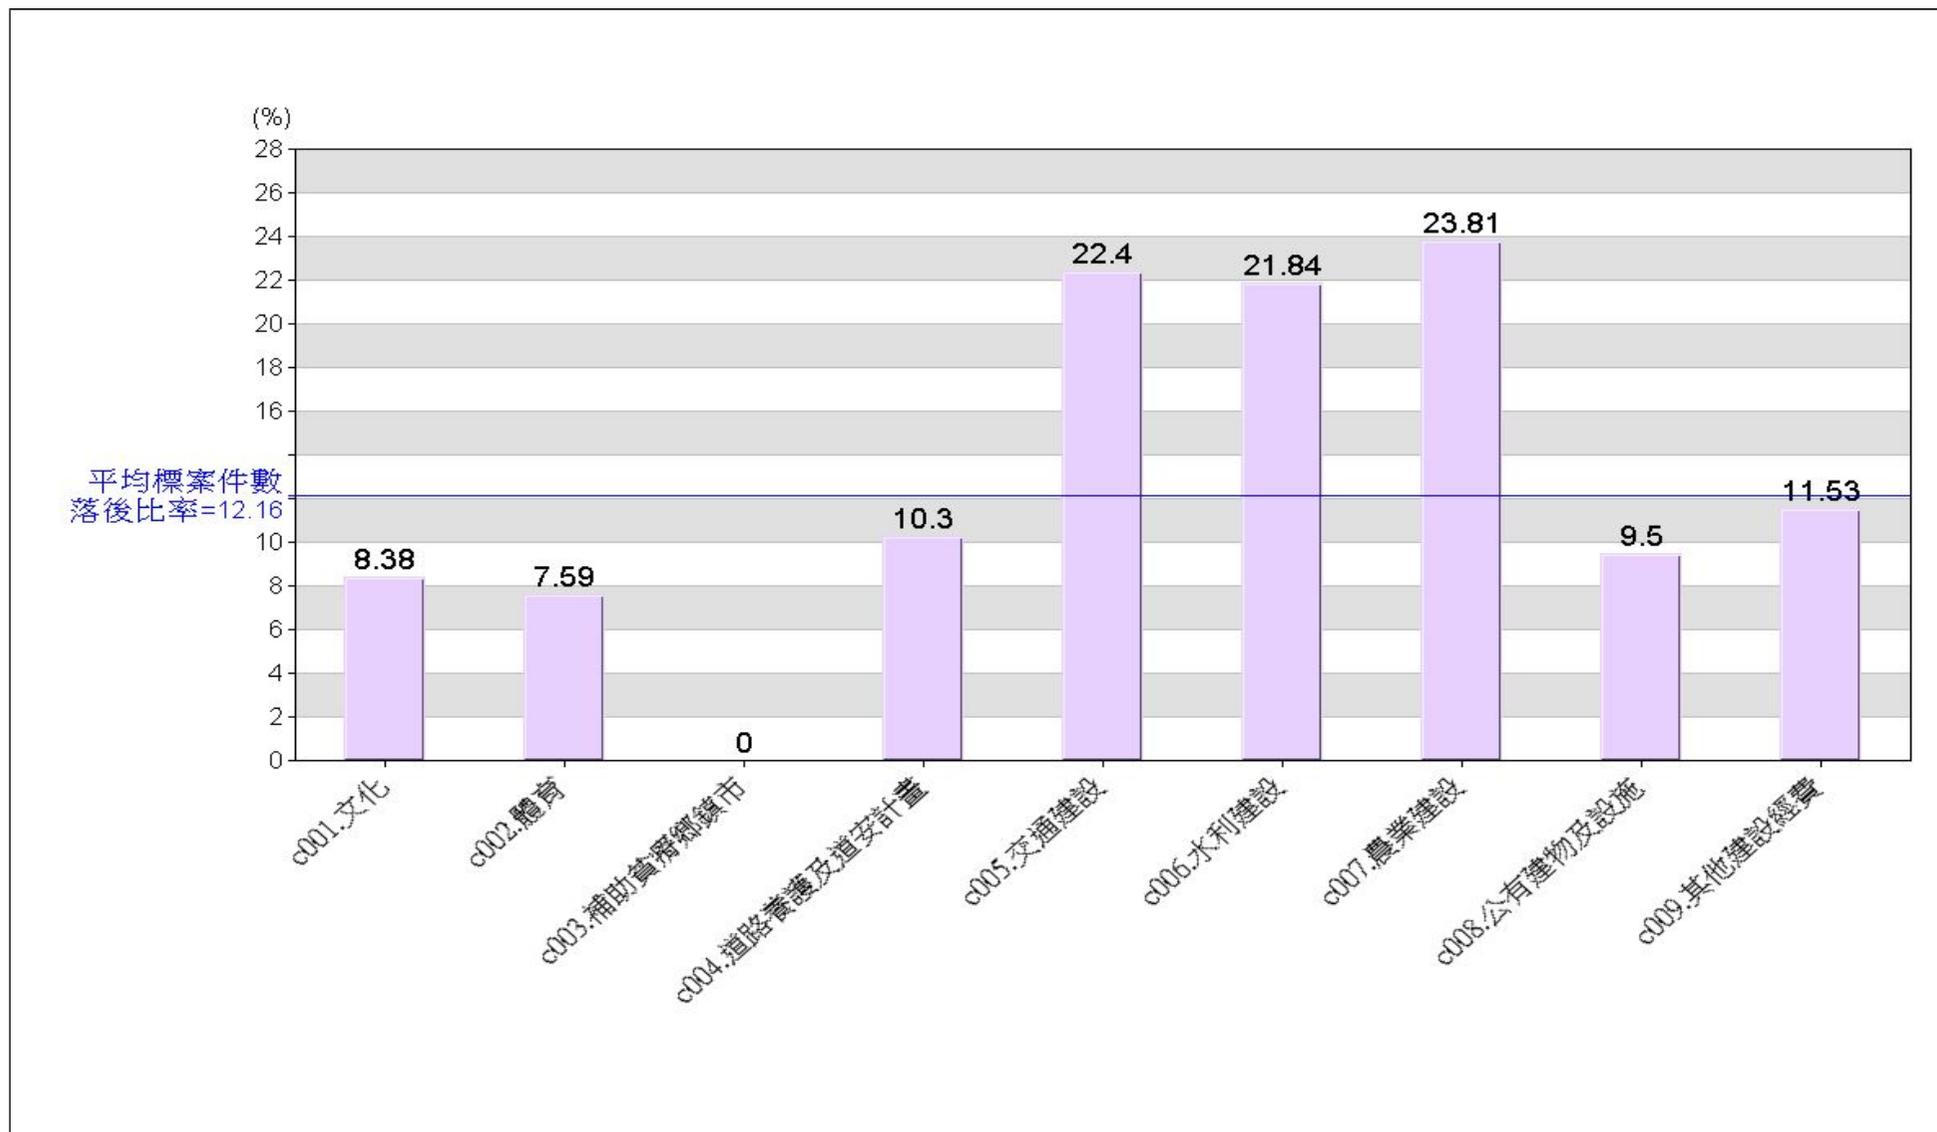




圖 8、落後標案原因分析

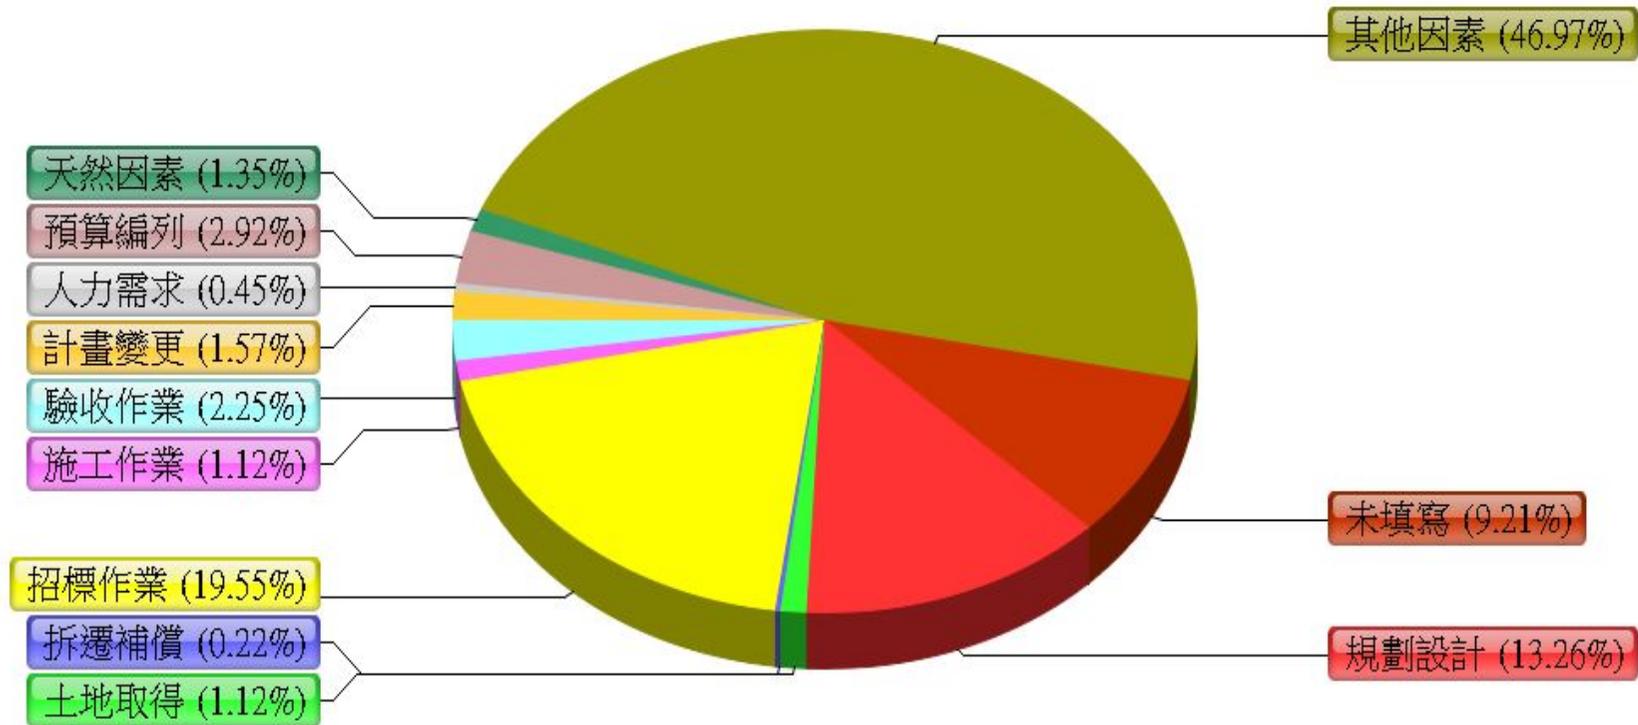


表 1、預算執行情形一覽表

107 年 6 月份各縣市政府基本設施補助計畫預算執行情形一覽表

單位：億元

縣市別	已核定經費 (A)	累計預定支 用數(B)	累計實際支用 數(C)	累計預定 支用比(%) (B/A)	累計實際支 用比(%) (C/A)	已執行應付 未付數(D)	發包節餘數 (E)	預算執行數 (F=C+D+E)	執行率 (%)(F/B)	達成率 (%)(F/A)
合計	361.30	93.39	106.69	25.85	29.53	25.60	0.53	132.82	142.23	36.76
01 臺北市	14.10	10.65	11.37	75.48	80.63	1.31	0.01	12.69	119.24	90.00
02 新北市	20.27	8.69	10.08	42.86	49.73	0.38	0.07	10.52	121.14	51.92
03 高雄市	37.57	14.20	16.59	37.78	44.17	2.79	0.07	19.45	137.00	51.76
04 桃園市	10.71	4.97	5.10	46.38	47.57	0.18	0.05	5.33	107.19	49.71
05 彰化縣	17.23	1.02	4.36	5.91	25.33	2.33	0.00	6.70	657.49	38.88
06 雲林縣	14.06	1.44	3.29	10.21	23.40	1.66	0.00	4.95	344.87	35.21
07 花蓮縣	16.03	2.40	3.91	14.95	24.38	1.67	0.04	5.62	234.65	35.08
08 新竹縣	9.35	1.28	1.68	13.71	17.99	1.54	0.00	3.23	251.87	34.54
09 臺中市	18.44	0.91	4.89	4.96	26.50	1.32	0.00	6.21	679.10	33.68
10 屏東縣	21.09	6.37	4.66	30.23	22.08	2.28	0.00	6.94	108.82	32.90
11 臺南市	26.09	3.31	5.19	12.70	19.91	3.21	0.01	8.41	253.86	32.24
12 嘉義縣	14.82	1.90	3.44	12.81	23.24	1.27	0.02	4.74	249.42	31.96
13 澎湖縣	7.65	2.25	2.21	29.43	28.89	0.12	0.00	2.33	103.57	30.48
14 新竹市	13.87	4.32	3.28	31.17	23.65	0.90	0.00	4.19	96.86	30.19
15 基隆市	35.74	9.44	9.88	26.41	27.63	0.75	0.10	10.73	113.63	30.01
16 臺東縣	14.03	3.54	3.85	25.24	27.44	0.03	0.01	3.89	109.82	27.72
17 苗栗縣	10.65	2.96	1.44	27.79	13.52	1.49	0.00	2.93	99.07	27.53

18 宜蘭縣	10.53	2.55	2.52	24.18	23.97	0.14	0.07	2.74	107.46	25.98
19 嘉義市	21.18	4.83	4.14	22.83	19.54	1.17	0.03	5.33	110.30	25.18
20 連江縣	5.53	1.62	1.30	29.25	23.52	0.06	0.00	1.36	83.86	24.53
21 南投縣	16.32	3.54	2.34	21.67	14.36	0.97	0.01	3.33	94.08	20.38
22 金門縣	6.03	1.21	1.16	20.01	19.27	0.04	0.02	1.22	100.94	20.19

註：1. 107 年度各縣市基本設施補助計畫經費為 361.30 億元。(中央補助 357 億元，縣市自籌 4.30 億元)

2. 預算執行率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案累計預定支用數總金額之百分比。

預算達成率：所有計畫標案之預算執行數總金額占所有計畫標案核定經費總金額之百分比。

表 2、標案執行進度

107 年 6 月份基本設施補助計畫標案執行進度（標案總件數：3,661）

單位：件數

項目	設計完成	發包決標	開工	施工進度達 50%	完工	驗收完成
預定完成	3,518	3,346	2,343	931	513	424
實際完成	3,435	3,207	2,605	1,314	776	648
達成率(%)	93.83	87.6	71.16	35.89	21.2	17.7

表 3、各縣市預算執行進度—依計畫類別

107 年 6 月份縣市預算執行進度—依計畫類別

單位：千元

縣市別	合計			c001.文化部分			c002.體育部分			c003.補助貧弱鄉鎮市部分			c004.道路養護及道安計畫部分			c005.交通建設(不含道路養護及道安計畫)			c006.水利建設			c007.農業建設			c008.公有建物及設施			c009.其他建設		
	總經費	執行率 (%)	達成率 (%)	經費	執行率 (%)	達成率 (%)	經費	執行率 (%)	達成率 (%)	經費	執行率 (%)	達成率 (%)	經費	執行率 (%)	達成率 (%)	經費	執行率 (%)	達成率 (%)	經費	執行率 (%)	達成率 (%)	經費	執行率 (%)	達成率 (%)	經費	執行率 (%)	達成率 (%)	經費	執行率 (%)	達成率 (%)
總計	36,129,664	142.23	36.76	1,344,108	140.41	42.55	1,001,062	139.84	29.24	420,750	104.54	56.29	3,253,922	302.43	29.64	3,515,719	186.1	42.7	4,632,026	166.14	29.87	1,233,126	254.96	32.11	4,196,219	150.86	30.78	16,532,732	120.24	40.19
新北市	2,026,608	121.14	51.92	62,000	173.89	33.66	63,000	101.88	15.36	0	0	0	100,000	100	7	67,835	32.12	8.44	243,966	213.69	80.8	48,500	104.54	31.36	466,283	112.93	35.91	975,024	110.92	64.52
臺北市	1,410,311	119.24	90	100,000	100	100	51,082	287.51	19.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,048	183.23	100	0	0	0	288,635	525.7	65.4	870,546	100	100
桃園市	1,071,254	107.19	49.71	42,843	125.83	70.03	40,083	116.69	37.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,810	120.6	28.5	0	0	0	494,199	90.04	33.98	283,319	115.97	91.56
臺中市	1,844,408	679.1	33.68	92,430	250.21	51.05	89,580	100	37.81	0	0	0	0	0	0	200,000	100	100	256,775	100	18.26	116,185	100	5.47	580,892	163.14	16.18	508,546	1285.96	37.93
臺南市	2,608,673	253.86	32.24	423,035	193.2	38.01	50,000	166.98	68.46	0	0	0	87,215	429.54	30.67	281,475	100	29.52	629,000	321.75	35.72	140,000	100	55.47	73,000	263.7	15.53	924,948	151.1	24.05
高雄市	3,756,946	137	51.76	50,073	101.56	52.83	77,633	101.62	24.21	0	0	0	0	0	0	1,730,490	136.67	51.48	344,400	142.25	29.01	120,176	106.95	35.75	329,428	162.38	49.51	1,104,746	137.16	63.6
宜蘭縣	1,053,161	107.46	25.98	38,878	103.95	2.67	22,468	0	0	9,750	157.41	100	149,480	102.67	40.18	0	0	0	157,377	142.62	21.01	0	0	0	78,617	137.15	32.46	596,591	97.99	24.17
新竹縣	935,245	251.87	34.54	13,506	155.81	59.8	20,668	124.07	32.57	0	0	0	199,116	1365.22	51.72	13,500	0	0	99,018	83.33	17.41	4,800	100	1.15	101,373	183.68	43.65	483,264	219.97	29.73
苗栗縣	1,064,710	99.07	27.53	37,049	153.2	43.0	24,746	100	52.53	42,750	100	100	235,462	222.65	16.41	66,320	131.3	39.4	272,727	75.45	23.21	107,560	64.79	9.6	189,693	93.5	37.67	88,403	71.47	13.1

				9	6											2														
彰化縣	1,722,541	657.4 9	38.88	21,869	146.2 6	44.6	32,774	100	37.38	26,250	100	50	312,993	100	95.83	384,951	853.4 3	41.69	266,240	858.16	19.18	94,532	399.7 1	37.97	228,985	153.3 9	10.8	353,947	313.34	17.67
南投縣	1,631,824	94.08	20.38	48,240	108.7 8	13.7 6	23,500	105.4 1	33.19	37,500	100	49.95	292,260	124.4	10.26	161,085	92.47	0.26	136,000	55.25	24.74	190,000	173.6 8	17.37	84,245	73.41	28.55	658,994	96.87	27.06
雲林縣	1,405,998	344.8 7	35.21	20,638	100.9 9	34.4 5	27,607	124.0 2	22.06	79,500	100	50.02	422,767	919.02	41.07	0	0	0	381,960	100	21.5	28,480	193.4 1	3.9	152,223	100	13.55	292,823	227.5	56.23
嘉義縣	1,481,539	249.4 2	31.96	14,492	116.0 9	31.2 4	23,174	100	56.38	91,500	100	50	285,730	166.38	18.85	155,800	731.1 4	36.6	302,992	100	16.92	111,500	465.3 6	24.21	119,977	219.2 5	21.47	376,374	236.76	51.88
屏東縣	2,108,858	108.8 2	32.9	22,810	100	27.3 1	28,452	100	38.03	81,000	100	50	285,390	100	28.21	0	0	0	368,032	107.24	29.53	8,000	100	30	92,640	108.8 4	26.59	1,222,534	112.58	34.35
臺東縣	1,403,371	109.8 2	27.72	20,454	66.68	17.8 3	23,457	119.0 4	44.3	0	0	0	144,805	100	0.8	0	0	0	366,454	95.77	35.45	71,838	108.3 5	44.45	69,424	100	0.17	706,939	121.12	29.96
花蓮縣	1,603,105	234.6 5	35.08	59,014	230.8 7	39.7 1	23,030	95.7	44.51	0	0	0	176,709	202.24	5.72	0	0	0	197,895	380.04	29.25	153,521	745.5 9	65.76	113,722	531.0 5	43.87	879,214	176.42	35.25
澎湖縣	765,409	103.5 7	30.48	30,619	113.9 1	53.1 3	20,009	100	38.98	43,500	121	49.4	99,617	178.54	31.28	76,878	136.8 8	16.38	47,585	2.71	0.52	8,000	100	3.13	117,888	252.5 8	3.15	321,313	94.36	43.51
基隆市	3,574,366	113.6 3	30.01	97,960	92.79	28.9 4	205,724	100	12.05	0	0	0	259,848	134.3	3.56	70,685	47.39	14.66	56,846	16.2	1.71	30,034	222.6 1	36.32	374,694	200.2 9	36.79	2,478,575	108.97	34.3
新竹市	1,386,515	96.86	30.19	22,617	135.4 2	36.8 2	22,722	105.7 6	28.85	0	0	0	82,530	100	36.35	82,200	100	27.36	52,692	37.76	11.25	0	0	0	95,248	69.59	9.26	1,028,506	99.27	32.72
嘉義市	2,118,067	110.3	25.18	83,835	139.0 4	43.4 4	95,527	160.8 4	21.14	0	0	0	120,000	134.09	7.93	66,000	130	9.85	58,000	100	26.03	0	0	0	32,500	100	2.03	1,662,205	106.72	26.76
金門縣	603,374	100.9 4	20.19	19,582	333.3 3	22.9 8	16,501	82.36	78.36	6,000	100	50	0	0	0	157,500	80.14	15.67	49,081	0	0	0	0	0	84,053	133.0 8	43.29	270,657	95.12	14.91

連江縣	553,381	83.86	24.53	22,164	235.8 6	28.9 1	19,325	204.5 4	43.46	3,000	100	66.67	0	0	0	1,000	114.1 9	67.37	34,128	100	12.42	0	0	0	28,500	149.4	1.57	445,264	74.64	25.51
-----	---------	-------	-------	--------	------------	-----------	--------	------------	-------	-------	-----	-------	---	---	---	-------	------------	-------	--------	-----	-------	---	---	---	--------	-------	------	---------	-------	-------

表 4、落後標案統計表—依計畫類別

107 年 6 月份各縣市政府執行基本設施補助計畫落後標案統計表—依計畫類別

單位：件數

縣市別	合計			文化			體育			補助貧瘠鄉鎮市			道路養護及道安計畫			交通建設			水利建設			農業建設			公有建物及設施			其他建設		
	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率	標案 件數	落後 件數	落後 比率
總計	3,661	445	12.16%	334	28	8.38%	145	11	7.59%	65	0	0%	165	17	10.3%	125	28	22.4%	293	64	21.84%	105	25	23.81%	400	38	9.5%	2,029	234	11.53%
新北市	66	5	7.58%	1	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	2	1	50%	9	0	0%	12	2	16.67%	17	1	5.88%	20	1	5%
臺北市	44	0	0%	1	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	21	0	0%	13	0	0%
桃園市	76	3	3.95%	9	0	0%	20	3	15%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	20	0	0%	21	0	0%
臺中市	108	7	6.48%	20	1	5%	6	1	16.67%	0	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	7	0	0%	5	3	60%	49	2	4.08%	20	0	0%
臺南市	184	16	8.7%	57	4	7.02%	9	1	11.11%	0	0	0%	8	0	0%	13	5	38.46%	23	1	4.35%	1	0	0%	9	0	0%	64	5	7.81%
高雄市	145	13	8.97%	10	0	0%	8	1	12.5%	0	0	0%	0	0	0%	11	0	0%	18	2	11.11%	5	1	20%	22	3	13.64%	71	6	8.45%
宜蘭縣	89	25	28.09%	6	2	33.33%	1	0	0%	1	0	0%	4	1	25%	0	0	0%	9	4	44.44%	0	0	0%	8	1	12.5%	60	17	28.33%
新竹縣	119	16	13.45%	17	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	2	1	50%	9	2	22.22%	2	1	50%	8	0	0%	73	12	16.44%
苗栗縣	103	35	33.98%	18	2	11.11%	1	0	0%	10	0	0%	10	0	0%	2	1	50%	25	19	76%	5	3	60%	19	4	21.05%	13	6	46.15%
彰化縣	267	12	4.49%	4	0	0%	15	0	0%	6	0	0%	55	0	0%	32	0	0%	38	0	0%	17	3	17.65%	40	2	5%	60	7	11.67%

南投縣	294	57	19.39 %	43	10	23.26 %	4	0	0%	7	0	0%	8	0	0%	2	0	0%	18	7	38.89 %	2	0	0%	7	3	42.86 %	203	37	18.23 %
雲林縣	93	10	10.75 %	6	0	0%	9	4	44.44 %	16	0	0%	12	0	0%	0	0	0%	27	2	7.41%	7	2	28.57 %	15	2	13.33 %	1	0	0%
嘉義縣	251	13	5.18%	7	0	0%	9	0	0%	15	0	0%	17	4	23.53 %	12	0	0%	12	0	0%	7	3	42.86 %	17	4	23.53 %	155	2	1.29%
屏東縣	134	7	5.22%	3	0	0%	11	0	0%	1	0	0%	6	0	0%	0	0	0%	19	2	10.53 %	1	0	0%	9	2	22.22 %	84	3	3.57%
臺東縣	151	19	12.58 %	4	1	25%	3	0	0%	0	0	0%	8	3	37.5%	0	0	0%	12	5	41.67 %	11	1	9.09%	10	1	10%	103	8	7.77%
花蓮縣	329	26	7.9%	58	3	5.17%	2	0	0%	0	0	0%	6	1	16.67 %	0	0	0%	20	0	0%	22	5	22.73 %	52	4	7.69%	169	13	7.69%
澎湖縣	98	22	22.45 %	12	0	0%	5	0	0%	7	0	0%	7	1	14.29 %	5	0	0%	7	6	85.71 %	2	1	50%	15	3	20%	38	11	28.95 %
基隆市	293	37	12.63 %	20	5	25%	3	0	0%	0	0	0%	12	5	41.67 %	6	4	66.67 %	5	4	80%	6	0	0%	25	1	4%	216	18	8.33%
新竹市	114	23	20.18 %	3	0	0%	7	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	4	0	0%	9	5	55.56 %	0	0	0%	7	2	28.57 %	83	16	19.28 %
嘉義市	362	26	7.18%	31	0	0%	15	0	0%	0	0	0%	5	2	40%	3	0	0%	6	3	50%	0	0	0%	8	0	0%	294	21	7.14%
金門縣	274	63	22.99 %	2	0	0%	2	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	28	16	57.14 %	3	2	66.67 %	0	0	0%	18	2	11.11 %	220	43	19.55 %
連江縣	67	10	14.93 %	2	0	0%	6	1	16.67 %	1	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	4	1	25%	48	8	16.67 %

表 5、落後標案統計表—依查核點

107年6月份各縣市政府基本設施補助計畫落後標案統計表—依查核點

單位：件數

縣市別	標案件數	落後件數	標案落後比率(%)	預算執率低於80%件數	發包率	完工率	驗收率	設計完成			發包決標			開工			施工進度達50%			完工			驗收完成		
								預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數	預定完成件數	實際完成件數	落後件數
總計	3,661	445	12.16	229	87.60	21.20	17.70	3,518	3,435	124	3,346	3,207	220	2,343	2,605	120	931	1,314	44	513	776	25	424	648	29
新北市	66	5	7.58	4	100.00	22.73	12.12	66	66	0	66	66	0	64	64	1	20	30	1	8	15	0	5	8	2
臺北市	44	0	0.00	0	100.00	63.64	52.27	44	44	0	44	44	0	42	44	0	24	29	0	21	28	0	19	23	0
桃園市	76	3	3.95	0	93.42	36.84	31.58	75	73	2	72	71	1	64	67	1	30	34	0	25	28	0	21	24	0
臺中市	108	7	6.48	0	94.44	23.15	22.22	108	107	1	108	102	6	46	83	0	6	40	0	4	25	0	4	24	1
臺南市	184	16	8.70	2	88.04	15.22	10.33	178	180	0	165	162	12	108	143	4	34	65	1	17	28	0	13	19	1
高雄市	145	13	8.97	5	93.10	29.66	20.69	134	141	0	127	135	1	120	125	3	52	70	2	35	43	3	20	30	3
宜蘭縣	89	25	28.09	9	82.02	16.85	14.61	84	76	9	83	73	11	65	58	10	24	24	5	11	15	0	9	13	1
新竹縣	119	16	13.45	7	86.55	25.21	15.97	112	111	4	111	103	11	77	85	2	36	45	3	21	30	3	16	19	5
苗栗縣	103	35	33.98	29	71.84	19.42	16.50	99	87	13	88	74	15	59	63	6	23	27	0	15	20	0	13	17	0
彰化縣	267	12	4.49	1	88.39	23.60	15.73	252	254	4	239	236	9	146	210	7	60	105	1	23	63	1	17	42	0
南投縣	294	57	19.39	31	84.35	13.61	12.59	291	268	24	286	248	39	166	167	22	51	70	4	23	40	1	17	37	0
雲林縣	93	10	10.75	1	86.02	23.66	17.20	93	88	5	85	80	9	44	68	0	19	48	0	0	22	0	0	16	0
嘉義縣	251	13	5.18	6	94.02	17.53	15.94	247	243	4	238	236	6	187	199	2	44	110	0	8	44	0	7	40	0
屏東縣	134	7	5.22	3	94.78	38.06	37.31	134	131	3	131	127	5	85	90	2	60	72	1	47	51	0	46	50	0
臺東縣	151	19	12.58	9	90.73	34.44	26.49	137	143	1	131	137	6	104	112	6	65	74	1	46	52	1	30	40	1
花蓮縣	329	26	7.90	11	91.19	17.93	15.50	322	313	9	314	300	16	215	247	6	77	115	1	25	59	0	20	51	0
澎湖縣	98	22	22.45	9	87.76	12.24	11.22	98	90	8	98	86	12	73	68	8	22	29	1	5	12	1	4	11	1
基隆市	293	37	12.63	28	93.17	2.39	1.02	289	286	3	278	273	10	220	225	5	63	67	7	6	7	2	4	3	1
新竹市	114	23	20.18	17	87.72	10.53	7.02	114	110	4	112	100	12	59	71	5	19	29	0	9	12	0	5	8	0

嘉義市	362	26	7.18	17	73.48	6.63	6.08	322	326	3	268	266	9	141	157	9	38	52	2	23	24	3	20	22	3
金門縣	274	63	22.99	33	84.67	54.38	51.82	260	238	26	250	232	28	232	224	20	153	163	14	135	149	10	129	142	10
連江縣	67	10	14.93	7	83.58	13.43	13.43	59	60	1	52	56	2	26	35	1	11	16	0	6	9	0	5	9	0

表 6、落後標案統計表—依縣市別、落後原因

落後標案統計表—依縣市別、落後原因

統計截止日期：107年6月底

縣市別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
合計	59	5	1	87	5	10	7	2	13	6	209	41	445
新北市		1		2		1					1		5
臺北市													0
桃園市				1							2		3
臺中市				1		2					4		7
臺南市	5			8							3		16
高雄市				3	1	2	2			1	4		13
宜蘭縣	1	1		2		1			1			19	25
新竹縣	2			5		1					8		16
苗栗縣	5	1		7	1				2	2	17		35
彰化縣	6			1			1				4		12
南投縣	10			14	1		1				31		57
雲林縣	1			1							7	1	10
嘉義縣	1	1		1						2	8		13
屏東縣			1	4							2		7
臺東縣	3								1	1	13	1	19
花蓮縣	5			4	1				1		15		26
澎湖縣	5			3		1			1		12		22

基隆市	4			4				2	2		25		37
新竹市	2			6	1	1	1				12		23
嘉義市				5					1		20		26
金門縣	8	1		11		1	2		1		19	20	63
連江縣	1			4					3		2		10
總計	404											41	445

3、各縣市執行分析

1. 新北市

新北市 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 20.27 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工 (件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工 (件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際
66	20.27	0	1,052,131.63 1	121.14	51.92	66	66	66	66	64	64	20	30	8	15	5	8

本年度基本設施補助經費 20.27 億元(中央補助 20.27 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 66 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 868,534.7 仟元，預算實際支用數 1,007,786.325 仟元，已執行應付未付數 37,560.91 仟元，發包結餘數 6,784.396 仟元，合計預算執行數 1,052,131.631 仟元，預算執行率 121.14%，預算達成率 51.92%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 2,026,608 仟元，直轄市執行率 121.14%，預算達成率 51.92%。
- 依標案執行情形進度區分：66 件標案，已設計完成者 66 件，已發包決標者 66 件，已開工者 64 件，施工進度已達 50%者 30 件，已完工者 15

件，已驗收完成者 8 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，66 件標案計有 5 件落後，落後比率 7.58%。

落後原因：

1. 107 年 6 月落後標案 5 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 1 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 3 件。

2. 落後原因分析：因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 51.92%，較平均預算達成率 36.76%高出 15.16 個百分點，執行情形良好。惟文化經費(33.66%)、體育經費(15.36%)、道路養護及道安計畫(7.00%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(8.44%)、農業建設經費(31.36%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 5 件落後標案，分屬新北市政府消防局災害搶救科(1 件)、教育局(1 件)、農業局農業工程科(2 件)、新建工程處(1 件)等執行案件。請新北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並依期程適時時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新北市 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設											1			1
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設		1		1										2
c008. 公有建物 及設施						1								1
c009. 其他建設				1										1

新北市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新北市	c005-3-1	中和區公29公園有償撥用地費	新北市政府工務局	新建工程處	17,835	17,835	0	0	0	0	1060310	1060310	1060310	1060310	1070310	1070310	1070630	1070604	1070630	1070604	1070630	1070630	本處107年5月11日新北新企字第1073716491號函通知國產署北區分署有關本處撥款一事，經費於107年6月4日撥入該分署專戶，6月份4次致電提醒辦理核銷轉正，惟該分署表示因業務繁忙暫無暇辦理轉正事宜。	本處將再次發函請國產署北區分署辦理核銷轉正事宜。
新北市	c007-1-1	雙溪區農北雙001、008及014號農路改善工程	新北市政府農	新北市政府農	4,000	1,200	0	0	0	0	1070331	1070331	1070430	1070626	1070515	1070627	1070630		1070831		1070930	1070930	本案經107年5月9日、107	本案已於107年6

			業局	業局農 業工程 科																		年5月16日、107年5月25日及107年6月7日開標流標，已奉發請開口廠商施作。	月26日發奉核准由開口廠商施作，並於107年6月27日開工。積極督促廠商趕工，以符工進。	
新北市	c007-1-6	三峽區有木里紅龜面農路(電桿編號有木幹166)改善工程	新北市政府農業局	新北市政府農業局農業工程科	5,500	1,650	23	0	0	1	1070331	1070331	1070531	1070525	1070615	1070615	1070815		1070930	1071130		因涉及國有林地，俟林務局同意後施工。	林務局預定於下週辦理施工指界後，繼續施工。	
新北市	c008-2-2-8	救生氣墊	新北市政府消防局	新北市政府消防局災害搶救科	1,260	0	0	0	0	0	1061201	1061201	1070125	1070125	1070125	1070125	1070531	1070531	1070531	1070531	1070630	1070705	本案業於5月31日辦理第1次交貨驗收，經驗收後共計5項缺失項目，經主驗人裁示給予限期改善14日，預	已於7月5日辦理複驗及通過，刻正積極辦理核銷作業。

																						定6月15日複 驗，惟廠商於 6月14日來函 通知缺失事項 未完全改善， 延後至6月29 日改善完畢， 致影響第2次 驗收期程。
新北市	c009-1- 20	碧華國民中學校舍遷校新建工 程	新北市政府 教育局	新北市政府 教育局	30,000	3,000	2,240	0	0	75	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107053 1	107093 0	107123 1	107123 1	1070301、1070 308、1070411 及1070629， 因無廠商投標 流標4次。	1.107年 6月29 日及7月 2日召開 流標檢討 會議。 2.請建築 師於107 年7月 10日將 減項書圖 及後續擴 充之多功 能活動中 心提供給 學校審		

																								查，並於 107年7 月15日 前送本局 辦理。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

2. 臺北市

臺北市 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 14.10 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工 (件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工 (件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際	預 定	實 際
44	13.78	0.32	1,269,307.29 3	119.24	90.00	44	44	44	44	42	44	24	29	21	28	19	23

本年度基本設施補助經費 14.1 億元(中央補助 13.78 億元，地方自籌 0.32 億元)，截至 6 月底止，共有標案 44 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,064,514.609 仟元，預算實際支用數 1,137,182.275 仟元，已執行應付未付數 130,849.988 仟元，發包結餘數 1,275.03 仟元，合計預算執行數 1,269,307.293 仟元，預算執行率 119.24%，預算達成率 90.00%。
 - 依執行機關區分：由直轄市執行 1,410,311 仟元，直轄市執行率 119.24%，預算達成率 90%。
 - 依標案執行情形進度區分：44 件標案，已設計完成者 44 件，已發包決標者 44 件，已開工者 44 件，施工進度已達 50%者 29 件，已完工者 28 件，已驗收完成者 23 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，44 件標案均無落後。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 90.00%，較平均預算達成率 36.76%高出 53.24 個百分點，執行情形良好。惟體育經費(19.47%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；請臺北市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

3. 桃園市

桃園市 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.71 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
76	10.71	0	532,524.07 5	107.19	49.71	75	73	72	71	64	67	30	34	25	28	21	24

本年度基本設施補助經費 10.71 億元(中央補助 10.71 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 76 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 496,805.278 仟元，預算實際支用數 509,584.842 仟元，已執行應付未付數 17,730.63 仟元，發包結餘數 5,208.603 仟元，合計預算執行數 532,524.075 仟元，預算執行率 107.19%，預算達成率 49.71%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,071,254 仟元，縣(市)執行率 107.19%，預算達成率 49.71%。
- 依標案執行情形進度區分：76 件標案，已設計完成者 73 件，已發包決標者 71 件，已開工者 67 件，施工進度已達 50%者 34 件，已完工者 28 件，已驗收完成者 24 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，76 件標案計有 3 件落後，落後比率 3.95%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 3 件，屬查核點進度落後者 3 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 49.71%，較平均預算達成率 36.76%高出 12.95 個百分點，執行情形良好。惟水利建設經費(28.50%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，係屬體育局(3 件)之執行案件。請桃園市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

桃園市 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化													0
c002. 體育				1							2		3
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設													0

桃園市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定支 用數	實際支 用數	應付未 付數	剩餘款	執行率 (%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際												
桃園市	c002-1-4	增設辦公廳舍空間及會議室等相關	體育局	體育局	603	0	0	0	0	0	107062 9	107062 8	107062 9	107062 9	107092 8	107092 8	107113 0	107123 1	107113 0	107123 1	107113 0	107123 1	規劃設計圖說部分內容須做修正。	目前規劃設計圖說內容已完成，刻正進行準備招標文件等事宜。
桃園市	c002-1-16	參加107年全民運動會組隊所需交通車、團體服及頒獎晚宴等	體育局	體育局	2,600	0	0	0	0	0	107063 0	107090 1	107090 1	107092 9	107092 9	107092 9	107100 5	107123 1	107100 5	107123 1	107100 5	107123 1	為因應參賽之賽務所需。	因應賽務所需，刻正籌劃預算等項及作業細項。
桃園市	c002-1-18	補助各體育團體參加107年全民運動會組隊及各參賽單位所需比賽服、膳雜集訓及住宿等	體育局	體育局	875	0	0	0	0	0	107063 0	107090 1	107090 1	107092 9	107092 9	107092 9	107102 5	107123 1	107102 5	107123 1	107102 5	107123 1	為因應參賽之賽務所需。	為因應賽務所需，刻正籌劃預算等項及作業細項。

4. 臺中市

臺中市 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 18.44 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件 數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
108	18.44	0	621,199.68 2	679.10	33.68	108	107	108	102	46	83	6	40	4	25	4	24

本年度基本設施補助經費 18.44 億元(中央補助 18.44 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 108 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 91,473.751 仟元，預算實際支用數 488,843.297 仟元，已執行應付未付數 132,356.385 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 621,199.682 仟元，預算執行率 679.10%，預算達成率 33.68%。
- 依執行機關區分：由直轄市執行 1,844,408 仟元，直轄市執行率 679.1%，預算達成率 33.68%。
- 依標案執行情形進度區分：108 件標案，已設計完成者 107 件，已發包決標者 102 件，已開工者 83 件，施工進度已達 50%者 40 件，已完工者 25 件，已驗收完成者 24 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，108 件標案計有 7 件落後，落後比率 6.48%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 7 件，屬查核點進度落後者 7 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 2 件、其他因素落後者 4 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 33.68%，較平均預算達成率 36.76%落後 3.08 個百分點，執行情形待加強。其中水利建設經費(18.26%)、農業建設經費(5.47%)、公有建物及設施經費(16.18%)、其他建設經費(37.93%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 7 件落後標案，分屬文化局(1 件)、社會局(1 件)、消防局(1 件)、農業局(3 件)、運動局(1 件)等執行案件。請臺中市政府主動了解落

後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺中市 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化						1							1
c002. 體育											1		1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設						1					2		3
c008. 公有建物 及設施				1							1		2
c009. 其他建設													0

臺中市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際												
臺中市	C001-1-10	2018 兒童藝術節活動	文化局	文化局	3,700	2,548	3,524	0	0	138	107013 1	107020 5	107022 8	107031 6	107040 1	107031 6	107043 0	107032 6	107053 1	107051 9	107063 0	107070 2	承辦廠商結案報告待補充。	請承商補正資料，已於7月2日驗收完成。
臺中市	c002-1-6	補助各體育團體協助辦理全民運動會等相關經費	運動局	運動局	10,000	0	0	0	0	0	107063 0		107063 0		107093 0		107103 0		107113 0		107121 5	107年度全民運動會本市代表隊共計26隊,截至107年6月11日各競賽種類方選拔完畢,網路線上報名時間為107年6月11日至22日,各種類代表隊刻正規畫辦理代表隊培訓計畫,並盡速提	請各代表隊盡速提交選訓計畫及相關費用概算表供本局彙整並擬本案經費概算後廣續辦理相關支用事宜。	

																					送還訓計畫至 本局申請經費 核定及活動結 束後之核銷。		
臺中市	c007-2- 1	補助農民團體、產銷班及班員 辦理現代化農業生產機具及設 備補助計畫	農業局	農業局	20,000	0	0	0	0	0	107053 1	107042 3	107063 0		107093 0		107103 1		107113 0		107121 5	執行單位刻正 執行計畫中， 驗收作業需逐 一安排請購之 農友，需較費 時。	通知執行 單位盡速 辦理驗收 及核銷。
臺中市	c007-2- 3	資本門：補助各級農會、漁 會、農業合作社場、產銷班及 其他與農業有關之非營利性團 體推展農業經營企業化、自動 化，農特產品集貨包裝場及加 工廠設施(備)、農夫市集等計 畫	農業局	農業局	6,000	0	0	0	0	0	107053 1	107053 0	107063 0		107093 0		107103 1		107113 0		107121 5	1.各受補助單 為目前正陸續 辦理採購或發 包施工中。2. 其餘所研提補 助案尚在審核 中。	請各受補 助單位盡 速完成計 畫完整 性，再行 提送，以 利計畫順 利進行。
臺中市	c007-2- 4	資本門：補助各級農會、漁 會、農業合作社場、產銷班及 其他與農業有關之非營利性團 體輔導臺中市農產品產業升級 設施(備)補助計畫	農業局	農業局	3,000	0	0	0	0	0	107053 1	107053 0	107063 0		107093 0		107103 1		107113 0		107121 5	研提補助案尚 在審核中。	請各受補 助單位加 速完成計 畫完整 性，再提 送計畫， 以利計畫

																							完整性。
臺中市	c008-1-2-2	消防廳舍整建計畫(水滷分隊)	消防局	消防局	10,000	0	0	0	0	0	0	1070102	1061228	1070531	1070801	1070930	1071130	1071215					<p>本案工程招標預定於107年7月3日開資格標，惟因廢續辦理評審會及議價程序並辦理保留決標，俟議會審議通過後決標生效，將廢續辦理開工事宜。</p> <p>於107年6月4日公告，原預定6月26日開資格標，惟因有廠商於6月14日提疑義，經請本案規劃單位黃賢澤建築師事務所審視研議後表示依疑義內容檢視書圖，確實有少部分書圖及預算內容誤植，為提升招標文件合理性，該建築師事務所業將單價重新調整並修正相關書圖，本次修改及補充屬原定招標內容及條</p>

																						件非重大變更，惟考量廠商準備投標文件作業時間，視需要延長等標期。	
臺中市	c008-5-12	臺中市大里區第一公有市場閒置空間活化修繕工程	社會局	社會局	1,500	0	0	0	0	0	1070630	1070228	1070630	1070815	1071030	1071130	1071215					6/11上網招標公告，6/22開標無廠商投標，宣布流標。	辦理第二次公告。

5. 臺南市

臺南市 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 26.09 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
184	26.09	0	840,977.33 7	253.86	32.24	178	180	165	162	108	143	34	65	17	28	13	19

本年度基本設施補助經費 26.09 億元(中央補助 26.09 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 184 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 331,276.304 仟元，預算實際支用數 519,336.474 仟元，已執行應付未付數 320,565.599 仟元，發包結餘數 1,075.264 仟元，合計預算執行數 840,977.337 仟元，預算執行率 253.86%，預算達成率 32.24%。
 - 依執行機關區分：由直轄市執行 2,608,673 仟元，直轄市執行率 253.86%，預算達成率 32.24%。
 - 依標案執行情形進度區分：184 件標案，已設計完成者 180 件，已發包決標者 162 件，已開工者 143 件，施工進度已達 50%者 65 件，已完工者 28 件，已驗收完成者 19 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，184 件標案計有 16 件落後，落後比率 8.70%。
落後原因：
 - 107 年 6 月落後標案 16 件，屬查核點進度落後者 14 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 2 件。
 - 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 8 件、其他因素落後者 3 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 32.24%，較平均預算達成率 36.76%落後 4.52 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費(38.01%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(29.52%)、公有建物及設施經費(15.53%)、其他建設經費(24.05%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 16 件落後標案，分屬工務局(5 件)、文化局(4 件)、水利局(1 件)、民政局(1 件)、秘書處(2 件)、環境保護

局(1件)、體育處(1件)、觀光旅遊局(1件)等執行案件。請臺南市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺南市 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化				3							1		4
c002. 體育											1		1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設	1			3							1		5
c006. 水利建設				1									1
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施													0
c009. 其他建設	4			1									5

臺南市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策	
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
臺南市	c001-1-24	總爺藝文中心土地租金等經費	文化局	文化局	3,322	0	0	0	0	0	107050 2	107050 1	107063 0		107063 0			107073 1		107083 1		107093 0		因台糖公司尚未來文 催請台糖儘速來文以簽辦核銷，預計7月底前完成。	
臺南市	c001-1-52	藝文環境及老屋	文化局	文化局	5,000	0	0	0	0	0	107013 0	107013 0	107063 0		107073 1			107103 1		107121 5		107123 0		經3次公告結果(為3月29日、4月10日及17日流標，附件2)，於公告期間有廠商領標，卻無廠商投標，重新檢討重新公告於6月21第一次開標流標、7月3日第二次開標1家廠商	7/10 審查通過，將續辦議價事宜

																						投標，7/10 審查合格。	
臺南市	c001-1-55	文化中心自修室空間整修等經費	文化局	文化局	1,500	52	0	95	0	182	107053 1	107062 9	107063 0	107083 1	107113 0	107123 1	107123 1					發包書圖尚未提送	廠商 7/6 提送發包書圖，刻正簽辦招標作業。
臺南市	c001-1-56	新營文化中心及演藝廳頂樓防漏工程等經費	文化局	文化局	2,000	0	0	95	0	100	107053 1	107053 1	107063 0	107073 1	107113 0	107123 1	107123 1					預算書圖尚須修改	廠商已完成修正，並已上網公告，7/10 開標流標，預計 7 月 17 日第 2 次開標。
臺南市	c002-1-3	辦理龍舟競賽活動經費、獎金等	教育局	體育處	7,000	3,500	2,274	1,226	0	100	107033 0	107020 1	107043 0	107033 0	107043 0	107033 0	107053 0	107053 0	107063 0	107061 8	107063 0	承包廠商未進行請款	致電廠商要求盡速請款
臺南市	c005-2-4	北區 NC-136-15m 道路工程(前段)(立賢路 2 段)	工務局	工務局	3,500	0	0	0	0	0	107043 0	107043 0	107063 0	107073 0	107083 0	107093 0	107123 1				細部設計修正時間延宕	預計 7 月 19 日第 3 次開標	
臺南市	c005-2-6	永康區中華路 155 巷至中華路計畫道路開闢工程	工務局	工務局	2,000	0	0	0	0	0	107043 0	107043 0	107063 0	107073 1	107083 1	107093 0	107123 1				招標文件修正延宕	文件呈核後，儘速	

																							辦理上網公告
臺南市	c005-2-7	仁德區德洋路(國道1號高速公路東側涵洞口)至德洋路30巷計畫道路開闢工程	工務局	工務局	2,000	0	0	0	0	0	107043 0	107043 0	107063 0		107073 1		107083 1		107093 0		107123 1	招標文件修正中	修正後，儘速辦理上網公告
臺南市	c005-2-8	永康區次6-5(中山南路至永勝街)計畫道路開闢工程	工務局	工務局	6,000	0	0	0	0	0	107043 0	107043 0	107063 0		107073 1		107083 1		107093 0		107123 1	學校提出設計圖說建議，請顧問公司研議中	儘速辦理
臺南市	c005-2-9	七股區南31線銜接至市道176(含橋樑一座)道路拓寬工程	工務局	工務局	4,000	0	0	0	0	0	107033 1	107033 1	107053 1	107062 8	107063 0		107093 0		107103 1		107123 1	本案已於107年6月28日決標，因總統等長官將於107年9月21日至距離本案5公尺處之黃昭堂紀念公園參加啟用典禮，為避免影響典禮進行，本案開工日期將延後至啟用典禮後；又本案有一箱涵工程，因7、8月為汛	俟啟用典禮後開工，並請廠商積極辦理以符合工期。

																					期時段常有颱風豪雨，於9月後開工可避免汛期致災。	
臺南市	c006-1-13	辦理改善菁寮、墨林地區(菁寮老街)區內排水等改善整治工程經費	水利局	水利局	10,000	0	0	0	0	0	107043 0	107040 9	107053 0	107061 3	107063 0	107091 5	107121 5	107123 1			流標多次，重新檢討預算並上網，預計1070613開標	1070613 決標，預計 1070716 開工
臺南市	c009-1-6	永華大樓及市民廣場地下停車場抽排風設備更新	秘書處	秘書處	3,092	0	0	0	0	0	107051 5	107062 7	107063 0		107071 5	107083 1	107103 1	107113 0		合併循環水泵與空調箱等另2案規劃設計，故設計時程延長。	6月29日 發文核定 工程預算 書圖，工 程標發核 中，預計 7月31日 發包決 標。	
臺南市	c009-1-8	民治市政中心市民廣場水舞設備及燈具之線路汰換工程	秘書處	秘書處	2,385	183	0	167	0	91	107043 0	107032 3	107063 0		107072 0	107093 0	107113 0	107123 1		經3次公開招標均無廠商投標	技師事務所表示預算單價低為本案流標主要原因，在不影響工程	

																						品質及功能需求之前提下，修正施工規範書及減項後辦理重行招標。
臺南市	c009-1-9	新營區（民生里.三仙里.新南里.新北里）、東山區（東正里.東中里.東山里）、新營區忠政里等聯合活動中心興建經費	民政局	民政局	40,000	10,000	791	7,209	0	80	1070430	1070430	1070630	1070731	1070930	1071130	1071231		辦理都市設計審議及期末報告審查作業中	已請建築師趕辦相關作業審查		
臺南市	c009-1-40	臺南市城西底渣再利用處理廠興建工程	環境保護局	環境保護局	40,000	40,000	1,410	2,350	0	9	1061017	1061017	1070104	1070104	1070507	1070626	1070615	1070716	1070731	該案為工程統包案，工程於107年1月4日決標，因本案較為急迫故整體工程進度訂定就比其他同屬性工程案件時程較為提前，但因細部設計階段工區範圍多次調整	細設6月20日核定，6月26日辦理開工，儘速進行相關施工作業。	

																					故工作介面及設計階段皆需重新設計，故統包廠商於107年5月7日申請展延細部設計時程，本局於107年5月14日同意增加1次其修正期限為10日，該細部設計報告已於107年6月20日核定，6月26日辦理開工。	
臺南市	c009-1-58	關子嶺水火同源園區改善工程	觀光旅遊局	觀光旅遊局	3,880	450	0	0	0	0	1070430	1070626	1070531	1070630	1070731	1070831	1070930				因高程測量時程延誤細部設計作業，至發包書圖於6/26方完成。	加速辦理發包作業

6. 高雄市

高雄市 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 37.57 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工 (件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工 (件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
145	37.57	0	1,944,775.04 9	137.00	51.76	134	141	127	135	120	125	52	70	35	43	20	30

本年度基本設施補助經費 37.57 億元(中央補助 37.57 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 145 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,419,512.778 仟元，預算實際支用數 1,659,485.663 仟元，已執行應付未付數 278,561.249 仟元，發包結餘數 6,728.137 仟元，合計預算執行數 1,944,775.049 仟元，預算執行率 137.00%，預算達成率 51.76%。
 - 依執行機關區分：由直轄市執行 3,756,946 仟元，直轄市執行率 137%，預算達成率 51.76%。
 - 依標案執行情形進度區分：145 件標案，已設計完成者 141 件，已發包決標者 135 件，已開工者 125 件，施工進度已達 50%者 70 件，已完工者 43 件，已驗收完成者 30 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，145 件標案計有 13 件落後，落後比率 8.97%。
落後原因：
 - 107 年 6 月落後標案 13 件，屬預算執行未達 80%者 2 件，屬查核點進度落後者 8 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 3 件。
 - 落後原因分析：因招標作業落後者 3 件、因施工作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 2 件、因計畫變更落後者 2 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 4 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 51.76%，較平均預算達成率 36.76%高出 15.00 個百分點，執行情形良好。惟體育經費(24.21%)、水利建設經費(29.01%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 13 件落後標案，分屬高雄市政府工務局(1 件)、水利局(3 件)、

民政局(3件)、海洋局(1件)、教育局(1件)、警察局(1件)、觀光局(3件)等執行案件。請高雄市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

高雄市 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化													0
c002. 體育				1									1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設						1					1		2
c007. 農業建設										1			1
c008. 公有建物 及設施											3		3
c009. 其他建設				2	1	1	2						6

高雄市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際										
高雄市	c002-1-8	大坪頂運動公園攔球網新建工程	高雄市政府教育局	高雄市政府教育局	1,000	0	0	0	0	0	107043 0	107052 3	107051 5	107062 1	107053 1	107062 9	107063 0		107073 1		107083 1		本案因配合本處配合本處107年零星整修工程併案招標，致發包期程延宕，後續於107年5月25日公開招標，惟經1次招標於107年6月5日第1次開標流標。	已拆案將大坪頂攔球網工程獨立公告招標，業於107年6月21日決標，107年6月29日開工，將促請承商趕工，預計107年8月底完工。
高雄市	c006-1-1	石螺潭排水設置抽水站工程	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	13,000	13,000	0	0	0	0	105083 1	105083 1	105093 0	105093 0	105110 8	105110 8	106073 1	106073 1	107033 1	107041 6	107053 1		初驗缺失修正，預計107年7月3日正	已請承商儘速改正並改正完

																						驗	畢。
高雄市	c006-3-1	楠梓區右昌元帥廟舊部落排水改善工程	高雄市政府水利局	高雄市政府水利局	1,918	288	0	0	0	0	105033 0	105033 0	105051 1	105051 1	105081 9	105081 9	107073 1	107050 4	107111 5	107121 4		本案工程進度 預定 53%, 實際 82%, 惟今年支 付數皆為以前 年度保留款	儘速完成 工程
高雄市	c007-2-2	中芸漁港東防波堤延長工程第三期	高雄市政府海洋局	高雄市政府海洋局	28,000	24,000	26,089	0	0	109	105112 1	105112 1	105122 0	105122 0	106020 2	106020 2	106082 1	106081 5	107063 0	107083 1		堤面作業時間 遭遇天候及海 況浪高影響安 全, 須適時立 即停止施工, 以致影響工 進, 預定進度 100%, 實際進 度 94%。	廠商擬展 延工期, 已督促廠 商於天候 及海況穩 定時, 加 派人員及 機具, 加 速施作, 預計於 7 月底前完 工
高雄市	c008-3-5	行動載具	高雄市政府警察局	高雄市政府警察局	5,600	0	0	0	0	0	107063 0	107060 8	107063 0	107060 8	107063 0	107060 8	107063 0		107083 1	107093 0		配合警政署交 貨日期	警政署預 定於 107 年 7 月底 前辦理交 貨驗收
高雄市	c008-4-2	鳳山區八仙公園里民活動中心改造工程	高雄市政府工務局	高雄市政府工務局	4,000	1,000	0	0	0	0	106110 1	106110 1	106122 8	106122 8	107043 0		107082 0		107101 5	107122 0		本工程原定訂 4 月 30 日開工	已積極辦 理中預計

																						后因當地里長不同意公廁改造隔間範圍過大，影響活動中心使用範圍，故發動抗爭，以致工程無法開工。後經協調結果需變動男女廁所數量及隔間範圍，以致需辦理變更設計及重新申請法令規定的相關許可函。	107年7月30日以前完成相關請照程序及變更設計圖。
高雄市	c008-5-2	高雄市大樹區新建行政中心工程	高雄市政府民政局	高雄市政府民政局	90,304	50,000	85,178	0	0	170	1050628	1050628	1051117	1051117	1051209	1051210	1060808	1060808	1070203	1070203	1070630	尚有部分工程不符需求，變更設計中	已請新工處加強管控，儘速完成變更設計辦理完工驗收
高雄市	c009-1-3	第二殯儀館5套火化爐具及相對應空污設防制設備工程	高雄市政府民政局	高雄市政府民政局	26,552	3,100	0	0	0	0	1070310	1070310	1070425	1070425	1070620		1070818		1071017		1071130	5月22議約決標，因為流標，導致開工	原預填寫期程太過樂觀，導

																						落後，預計7月12日開工。	致實際與預計相差懸殊，爾後應審慎評估預定期程是否合理，可否達成。	
高雄市	c009-1-6	梓官區納骨塔無障礙設施改善工程	高雄市政府民政局	高雄市政府民政局	2,030	0	0	0	0	0	1070427	1070426	1070515	1070622	1070920	1071005	1071031					第一次公告上網，投標廠商未達3家，流標	儘速再公告上網	
高雄市	c009-1-11	金獅湖風景區整建工程	高雄市政府觀光局	高雄市政府觀光局	12,900	12,900	11,668	0	0	90	1060803	1060710	1060831	1060831	1060930	1060930	1070228	1070227	1070430	1070730		因辦理變更設計，新增新工項展延工期。	後續依契約期程辦理。	
高雄市	c009-1-15	壽山情人觀景台周邊人文空間再造工程	高雄市政府觀光局	高雄市政府觀光局	5,590	860	5,590	0	0	650	1060602	1060608	1060728	1060728	1060921	1060921	1070103	1070103	1070430	1070831		因辦理變更設計停工中。	儘速趕辦簽核作業完成變更設計。	
高雄市	c009-1-16	106年度壽山風景區整建工程	高雄市政府觀光局	高雄市政府觀光局	8,600	4,300	4,300	0	0	100	1060622	1060522	1060828	1060828	1060911	1060911	1061115	1061115	1070207	1070403	1070607		因驗收結果未符契約內容改善缺失。	已完成初驗作業，儘速趕辦正驗作業。
高雄市	c009-1-	加強山坡地水土保持計畫	高雄市政府	高雄市政府	40,195	7,000	5,100	0	0	73	107030	107030	107043	107042	107051	107050	107083		107121	107123		因6月13日連	待豪雨歇	

	19		府水利局	府水利局							1	1	0	7	0	2	1		5		0	續豪雨致廠商 無法施工，進 度些微落後	止，加強 工程進度
--	----	--	------	------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---------------------------	--------------

7. 宜蘭縣

宜蘭縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.53 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
89	10.53	0	273,658.02 2	107.46	25.98	84	76	83	73	65	58	24	24	11	15	9	13

本年度基本設施補助經費 10.53 億元(中央補助 10.53 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 89 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 254,659.251 仟元，預算實際支用數 252,459.82 仟元，已執行應付未付數 13,808 仟元，發包結餘數 7,390.202 仟元，合計預算執行數 273,658.022 仟元，預算執行率 107.46%，預算達成率 25.98%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,053,161 仟元，縣(市)執行率 107.46%，預算達成率 25.98%。
- 依標案執行情形進度區分：89 件標案，已設計完成者 76 件，已發包決標者 73 件，已開工者 58 件，施工進度已達 50%者 24 件，已完工者 15 件，已驗收完成者 13 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，89 件標案計有 25 件落後，落後比率 28.09%。
落後原因：
1. 107 年 6 月落後標案 25 件，屬預算執行未達 80%者 4 件，屬查核點進度落後者 16 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 5 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 2 件、因驗收作業落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件及未填寫落後原因 19 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 25.98%，較平均預算達成率 36.76%落後 10.78 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費均未執行，文化經費(2.67%)、水利建設經費(21.01%)、其他建設經費(24.17%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 25 件落後標

案，分屬工務處(12件)、工商旅遊處(1件)、文化局(2件)、建設處(1件)、計畫處(2件)、消防局(1件)、農業處(6件)等執行案件。未填寫落後原因19件，請宜蘭縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

宜蘭縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化				2									2
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫												1	1
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設												4	4
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	1												1
c009. 其他建設		1				1			1			14	17

宜蘭縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
宜蘭縣	c001-1-1	本局演藝廳消防警報系統設備更新工程	文化局	文化局	5,259	0	0	0	0	0	107041 5	107042 0	107051 5	107061 6	107062 5		107090 3		107091 4		107092 3		招標發核過程會辦單位較多，故招標文件於107年5月22日奉核完成。	已於6月4日公告上網，6月15日決標
宜蘭縣	c001-1-5	辦理古物遺址及水下資產活化發展計畫	文化局	文化局	1,000	0	0	0	0	0	107043 0		107043 0		107043 0		107062 9		107092 8		107123 1		評選委員於六月間難邀集。	於7/2辦理評選會議，會加快後續程序辦理進度
宜蘭縣	c004-1-1	道路及附屬設施維護及改善工程	工務處	工務處	130,946	52,378	52,378	0	0	100	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107063 0		107123 1		107123 1			
宜蘭縣	c006-1-1	河川及防洪、防潮閘門等維護管理及相關費用	工務處	工務處	28,866	4,000	0	2,000	0	50	107013 1	107013 1	107022 8	107022 8	107033 0	107033 0	107092 8		107123 1		107123 1			
宜蘭縣	c006-1-2	河川、區排及防潮閘(水)門維護改善工程	工務處	工務處	67,315	12,816	25,149	0	0	196	107013 1	107013 1	107022 8	107022 8	107033 0	107033 0	107062 9		107123 1		107123 1			
宜蘭縣	c006-2-	縣管河川及區域排水疏濬淤	工務處	工務處	10,000	0	0	0	0	0	107022	107022	107033	107040	107041		107070		107100		107113			

	1	工程								8	8	1	3	5		1		1		0				
宜蘭縣	c006-2-2	本縣各鄉鎮市河川上游清淤及整理工程	工務處	工務處	5,000	1,100	0	0	0	0	107013	107011	107022	107021	107031	107031	107083		107121		107123			
										1	2	8	3	5	2	1		5		0				
宜蘭縣	c008-1-2-2	辦理第一消防大隊暨員山消防分隊辦公廳舍新建工程。	消防局	消防局	17,700	1,650	1,191	0	0	72	107063		107063		107083		107123		107123		107123		廠商依契約所訂時間完原規劃及基本設計，惟尚未完全符合本局需求。須再行修正。	規劃及基本設計已於107年6月5日審定通過。已請廠商儘速辦理細部設計中。
										0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
宜蘭縣	c009-1-5	辦理重劃區外農路改善及維護工程計畫經費	工務處	工務處	22,950	0	0	0	0	0	107053		107063		107073		107103		107121		107123			
										1	0	0	1	1	1	1	1	5	1	1				
宜蘭縣	c009-1-10	閘門設備更新工程	工務處	工務處	29,600	1,000	0	0	0	0	107043	107041	107053		107061		107103		107121		107123			
										0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1			
宜蘭縣	c009-1-11	冬山河堤頂道路路面修復工程(第三期)	工務處	工務處	5,200	0	0	0	0	0	107061		107062		107103		107121		107122		107123			
										5	9	9	1	1	7	1	1	1	1	1	1			
宜蘭縣	c009-1-14	宜蘭橋改建工程	工務處	工務處	5,456	0	0	0	0	0	107010	107010	107010	107010	107033	107032	107063		107083		107123			
										1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1			
宜蘭縣	c009-1-15	107年度橋梁檢測、鄉道橋梁巡查作業及橋梁維修工程	工務處	工務處	23,600	0	0	0	0	0	107010	107010	107063		107063		107113		107123		107123			
										1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1			
宜蘭縣	c009-1-16	道路植栽綠美化工程	農業處	農業處	33,440	8,000	2,000	4,010	0	75	106113	106113	107012	107012	107020	107020	107073		107123		107123			
										0	0	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1			
宜蘭縣	c009-1-	補助營建署辦理104-107年度	工務處	工務處	2,399	1,399	0	0	0	0	107062		107062		107062		107103		107103		107103			
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	19	生活圈道路交通系統建設計畫-順安12號道路(永安路)拓寬工程									9		9		9		1		1		1			
宜蘭縣	c009-1-22	補助蘇澳鎮公所辦理林森橋與光復橋改建工程	工務處	工務處	6,680	0	0	0	0	0	107063		107063		107083		107123		107123		107123			
宜蘭縣	c009-1-26	辦理106年度遊憩據點特色加值計畫-清水地熱環境改善第三期工程	工商旅遊處	工商旅遊處	2,500	600	600	0	0	100	106081	106081	106102	106102	106111	106111	107063		107083		107103			
宜蘭縣	c009-1-29	辦理壯圍共乘停車場工程	建設處	建設處	1,600	100	0	98	0	98	107043	107032	107053	107061	107061		107093		107121		107123		高速公路局尚未同意本案計畫書。	已送修正之計畫書予高速公路局。
宜蘭縣	c009-1-31	宜蘭縣政府骨幹網路設備更新案	計畫處	計畫處	4,495	0	0	0	0	0	107043	107041	107043	107042	107053		107073		107073		107083			
宜蘭縣	c009-1-34	宜蘭縣政府電子票證服務案	計畫處	計畫處	2,013	0	0	0	0	0	107033	107032	107043	107041	107050		107083		107113		107123			
宜蘭縣	c009-1-38	辦理穩定養殖區生產環境計畫工程經費(漁管所)	農業處	農業處	4,200	1,000	0	0	0	0	107051		107053		107063		107090		107113		107121		與漁業署協調補助此案	經業務單位努力與漁業署協調且該署經現場勘察後表示有改善之必要性，近期經內

																							部開會討論後會核定此案之補助。	
宜蘭縣	c009-1-39	辦理漁港機能維護計畫工程經費(漁管所)	農業處	農業處	5,760	0	0	0	0	0	1070515	1070630	1070914	1071130	1071220	1071231								
宜蘭縣	c009-1-40	辦理流域綜合治理計畫-水產養殖排水計畫工程經費(漁管所)	農業處	農業處	1,383	200	0	0	0	0	1070531	1070615	1070715	1070930	1071130	1071210								
宜蘭縣	c009-1-41	辦理南方澳至東澳粉鳥林漁港及南澳朝陽漁港等海岸區域休閒漁業與觀光資源整合發展規劃設計經費	農業處	農業處	800	200	0	0	0	0	1070214	1070221	1070413	1070327	1070417	1070413	1070815	1071220	1071231					
宜蘭縣	c009-1-42	辦理106年改善政府動物管制收容設施計畫宜蘭縣流浪動物中途之家設施改善及汰換設置動物屍體焚化爐。	農業處	農業處	2,500	2,500	2,500	0	0	100	1061130	1061130	1061228	1061228	1070221	1070221	1070515	1070515	1070601	1070601	1070602	1070712	細項部分不合格	廠商改善完成

8. 新竹縣

新竹縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案件數	總經費 9.35 億元		預算執行數 (千元)	預算執行率 (%)	預算達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
119	9.35	0	322,992.31	251.87	34.54	112	111	111	103	77	85	36	45	21	30	16	19

本年度基本設施補助經費 9.35 億元(中央補助 9.35 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 119 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 128,239.998 仟元，預算實際支用數 168,245.54 仟元，已執行應付未付數 154,388.733 仟元，發包結餘數 358.037 仟元，合計預算執行數 322,992.31 仟元，預算執行率 251.87%，預算達成率 34.54%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 935,245 仟元，縣(市)執行率 251.87%，預算達成率 34.54%。
- 依標案執行情形進度區分：119 件標案，已設計完成者 111 件，已發包決標者 103 件，已開工者 85 件，施工進度已達 50%者 45 件，已完工者 30 件，已驗收完成者 19 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，119 件標案計有 16 件落後，落後比率 13.45%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 16 件，屬查核點進度落後者 9 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 7 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因招標作業落後者 5 件、因驗收作業落後者 1 件、其他因素落後者 8 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 34.54%，較平均預算達成率 36.76%落後 2.22 個百分點，執行情形待加強。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)尚未執行，水利建設經費(17.41%)、農業建設經費(1.15%)、其他建設經費(29.73%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 16 件落後標案，分屬工務處(6 件)、地政處(6 件)、原住民族行政處(3 件)、環保局(1 件)等執行案件。請新竹

縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設												1		1
c006. 水利建設												2		2
c007. 農業建設				1										1
c008. 公有建物 及設施														0
c009. 其他建設	2			4		1						5		12

新竹縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
新竹縣	c005-1-2	湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程(縣配合款)	工務處	工務處	8,300	0	0	0	0	0	107043 0	107042 7	107053 1		107063 0		107093 0		107121 5		107123 1		土地取得，協調地主不成，協議價購不成。	用以地易地方式處理，目前等待內政部釋法中。
新竹縣	c006-1-4	補助鄉鎮公所辦理河川管理工程(含疏濬清淤經費1,100千元)	工務處	工務處	1,100	0	0	0	0	0	107053 1		107062 9		107071 6		107083 1		107113 0		107123 1		本案尚未核定補助。	積極辦理申請補助。
新竹縣	c006-2-1	辦理河川管理維護工作(含疏濬清淤經費1,100千元)	工務處	工務處	1,100	0	0	0	0	0	107053 1		107062 9		107071 6		107092 8		107121 0		107123 1		本案尚未核定補助。	積極辦理申請補助。
新竹縣	c007-1-1	辦理重劃區農水路整修改善工程	地政處	地政處	4,000	0	0	0	0	0	107052 5	107070 3	107072 7		107083 1		107092 8		107103 1		107123 1		本案已107年4月24日決標予和鑫工程股和問股份有限公司，5月2日將契約書送府，5月23日簽奉核	確認設計資料後儘速辦理後續工程發包事宜。

																					准訂約，5月28日通知廠商文到30日內設計完成。	
新竹縣	c009-1-5	興建原住民族教育中心	原住民族行政處	原住民族行政處	2,000	200	0	0	0	0	1070629	1070518	1070630	1071231	1071231	1071231	1071231	1071231	1071231	前經106年11月-107年2月公開上網招標五次，均無廠商投標，本處於107年2月5日辦理第一次預算書圖修正，並於107年4月起再行上網三次，仍無廠商投標，合計歷經8次流標。	本處決議再行辦理第二次預算書圖修正。	
新竹縣	c009-1-6	原住民族基礎建設工程補助款	原住民族行政處	原住民族行政處	1,000	100	0	0	0	0	1070630	1070626	1070630	1071231	1071231	1071231	1071231	1071231	1071231	本案為本府補助公所執行之補助款，目前正在審查預算書圖中，並擬定招標文件。	持續督促並追蹤公所執行進度。	
新竹縣	c009-1-7	原住民部落聯絡道路養護費用	原住民族行政處	原住民族行政處	1,000	100	0	0	0	0	1070630	1070626	1070630	1071231	1071231	1071231	1071231	1071231	1071231	1. 預算書圖須	發函請開	

			行政處	行政處							0	2	0		1		1		1		修正。2.擬定招標文件中。	口廠商修正預算書圖及儘速擬定招標文件。	
新竹縣	c009-1-18	瀝青路面改善及無自來水地區路面修復工程	工務處	工務處	160,000	0	0	0	0	0	107053 1	107052 8	107063 0		107073 1		107113 0		107121 5		107123 1	於107年6月29日至107年7月3日公開閱覽，預計7月下旬發包	於107年6月29日至107年7月3日公開閱覽，預計7月下旬發包
新竹縣	c009-1-20	提升道路品質計畫-荳子埔溪自強北路至安溪寮橋人行計畫工程	工務處	工務處	90	90	0	0	0	0	107063 0		107063 0		107063 0		107063 0		107063 0		107063 0	營建署107年6月21日營署道字第1071223307號函表示本府歲出計畫說明提要與各項費用明細表支應計畫名稱：新竹縣既有市區道路景觀與人本環境設計畫-	已依營建署意見，簽辦透過第二預備金，修正歲出計畫說明提要與各項費用明細表。

																					新竹縣竹北市 豆子埔溪自強 北路至安溪寮 橋人行計畫委 託設計服務 費，而營建署 核定計畫名 稱：106年度 「提升道路品 質計畫(內政 部)」-新竹縣 竹北市豆子埔 溪自強北路至 安溪寮橋人行 計畫，本府匡 列之計畫名稱 與該署不符， 暫時無法提撥 補助款。	
新竹縣	c009-1- 26	新竹縣污水下水道管線設施 GIS 資訊系統建置	工務處	工務處	300	0	0	0	0	0	107063 0	107063 0	107063 0	107083 1	107103 1	107123 1	107123 1				本案為本府自 行設計訂定相 關招標文件及 需求條件，且 GIS 資訊資料 為專業項目，	加速趕辦 招標作 業。

																							收集資料耗時，於積極辦理下目前已完成設計規劃，後續依進度立即辦理上網招標作業。	
新竹縣	c009-1-33	竹北地所無障礙廁所及秘書室地板等廳舍改善工程	地政處	地政處	442	442	0	442	0	100	107031 2	107032 1	107040 3	107040 3	107041 2	107041 2	107051 1	107051 1	107061 1	107061 0	107062 0	驗收結果部分需改善	待改善後再次驗收結案	
新竹縣	c009-1-35	竹北地所 e-GPS 全球衛星接收儀	地政處	地政處	680	680	0	0	0	0	107033 0	107051 7	107040 3	107052 4	107041 7	107061 4	107060 4		107060 4		107061 5	已決標	已決標	
新竹縣	c009-1-37	竹北地所汰換冷氣機	地政處	地政處	102	0	0	102	0	100	107051 5	107051 7	107060 1	107051 7	107060 1	107051 7	107061 5	107061 3	107061 5	107061 3	107062 9	等候廠商資料發票已便辦理驗收結案	已通知廠商	
新竹縣	c009-1-38	竹北地所移動式檔案櫃	地政處	地政處	1,040	1,040	0	682	0	66	107041 6	107042 5	107042 3	107051 0	107050 7	107051 8	107053 1		107053 1		107061 5	檔案室未清理	檔案室清理整理	
新竹縣	c009-1-41	竹東地所無障礙設施改善工程	地政處	地政處	166	0	0	0	0	0	107053 1	107053 1	107063 0	107070 4	107071 5		107073 1		107081 5		107083 1	規劃設計變更	請規劃設計單位變更規劃後，隨即上網招標公告，並於 107 年 7 月 4 日	

																								決標在案。	
新竹縣	c009-1-54	竹東生態公園木棧平台翻修	環保局	環保局	1,800	200	0	0	0	0	1070508	1070524	1070612		1070702		1070814		1070928		1071031			規劃設計內容有部分需修正。	廠商已修正完成，並已於107年7月2日公告上網。

9. 苗栗縣

苗栗縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 10.65 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
103	10.65	0	293,148.32 8	99.07	27.53	99	87	88	74	59	63	23	27	15	20	13	17

本年度基本設施補助經費 10.65 億元(中央補助 10.65 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 103 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 295,906.085 仟元，預算實際支用數 143,926.983 仟元，已執行應付未付數 148,871.345 仟元，發包結餘數 350 仟元，合計預算執行數 293,148.328 仟元，預算執行率 99.07%，預算達成率 27.53%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,064,710 仟元，縣(市)執行率 99.07%，預算達成率 27.53%。
- 依標案執行情形進度區分：103 件標案，已設計完成者 87 件，已發包決標者 74 件，已開工者 63 件，施工進度已達 50%者 27 件，已完工者 20 件，已驗收完成者 17 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，103 件標案計有 35 件落後，落後比率 33.98%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 35 件，屬預算執行未達 80%者 13 件，屬查核點進度落後者 6 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 16 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 7 件、因施工作業落後者 1 件、因預算編列落後者 2 件、因天然因素落後者 2 件、其他因素落後者 17 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 27.53%，較平均預算達成率 36.76%落後 9.23 個百分點，執行情形欠佳。其中道路養護及道安計畫(16.41%)、

交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(39.40%)、水利建設經費(23.21%)、農業建設經費(9.60%)、其他建設經費(13.10%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 35 件落後標案，分屬工務處土木科(1 件)、工務處工程科(1 件)、工商發展處使用管理科(1 件)、文化觀光局觀光發展科(2 件)、水利處下水道科(12 件)、水利處土石資源科(1 件)、水利處水土保持科(1 件)、水利處水利科(7 件)、水利處城鄉發展科(1 件)、地政處(1 件)、原住民族事務中心(1 件)、農業處休閒農業科(1 件)、農業處漁業科(1 件)、警察局後勤科(3 件)、警察局資訊科(1 件)等執行案件。請苗栗縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

苗栗縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化											2		2
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設											1		1
c006. 水利建設	2	1		5					1	2	8		19
c007. 農業建設									1		2		3
c008. 公有建物 及設施	2										2		4
c009. 其他建設	1			2	1						2		6

苗栗縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支出 數	實際 支出 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實 際	預定	實 際		
苗栗縣	c001-1-17	全縣各風景區及遊憩區公共設施工程整修、整建工程	文化觀光局行政室	文化觀光局觀光發展科	744	223	0	0	0	0	107043 0	107062 0	107053 1	107070 5	107062 8		107092 8		107112 9	107122 6		於107年6月8日函送交通部觀光局審查。並經交通部觀光局107年6月20日核定在案。	加速趕辦發包作業。	
苗栗縣	c001-1-18	舊山線跨域亮點計畫	文化觀光局行政室	文化觀光局觀光發展科	11,256	3,377	1,526	1,851	0	100	107043 0	107062 0	107053 1	107070 3	107061 5		107093 0		107113 0	107123 1		經交通部觀光局107年6月2日來函，尚有待修正事項。本局預定107年6月13日修正後函送交通部觀光局續審。	趕辦發包作業。	
苗栗縣	c005-1-1	辦理全縣道路(含市區道路)及小型其他公共工程	工務處	工務處工程科	50,000	15,000	2,508	7,300	0	65	107043 0	107041 6	107053 1	107052 3	107062 9		107092 8		107123 1	108043 0		因部分計畫尚在委託規劃設計現勘，部分	工程將繼續辦理招標作業，已發包	

																					工程施工中尚未完工及部分工程公告招標中。	之工程將儘速辦理驗收結算付款。
苗栗縣	c006-1-1	全縣區域排水水利零星相關工程	水利處	水利處水利科	20,871	6,261	0	0	0	0	107060 1	107042 0	107073 1		107093 0		107113 0		108013 1	108022 8	部份工程較晚發包	後續加速辦理
苗栗縣	c006-1-2	全縣區域排水水利建造物維護管理	水利處	水利處水利科	19,877	5,963	0	798	0	13	107040 1	107033 0	107043 0	107042 0	107063 0	107051 0	107073 1		107103 1	108013 1	年度汛期後進行檢查	後續加速辦理
苗栗縣	c006-1-5	流域綜合治理計畫-蚬仔溝排水出口滯洪池興建工程用地費	水利處	水利處水利科	13,500	4,050	0	0	0	0	107040 1	107033 0	107043 0	107042 0	107053 1	107053 0	107083 1		107113 0	107123 1	由於用地範圍內發現廢棄物,刻正釐清責任中。	後續加速趕辦。
苗栗縣	c006-2-1	全縣縣管河川水利零星相關工程	水利處	水利處水利科	20,000	6,000	0	0	0	0	107040 1	107033 0	107053 1	107053 1	107073 1		107093 0		107113 0	107123 1	部份工程尚未發包	後續加速辦理。
苗栗縣	c006-2-2	全縣縣管河川水利建造物維護管理	水利處	水利處水利科	20,000	6,000	0	0	0	0	107040 1	107032 0	107043 0	107042 0	107063 0	107051 5	107073 1		107103 1	108013 1	年度汛期後進行檢查	後續加速辦理
苗栗縣	c006-2-3	全縣縣管河川防救災暨自來水延管配合業務	水利處	水利處水利科	15,000	4,500	0	0	0	0	107040 1	107033 0	107063 0	107041 8	107083 1		107103 1		107123 1	108022 8	配合議會墊付期程,故較晚發包	後續加速辦理
苗栗縣	c006-2-4	縣管河川應急、疏濬清淤工程經費	水利處	水利處水利科	20,000	6,000	0	0	0	0	107040 1	107033 0	107053 1	107052 5	107073 1		107093 0		107113 0	107123 1	招標程序依主計政風發見,多次修正招標文件內容致上網發包時間延遲	後續加速辦理
苗栗縣	c006-3-1	雨水下水道清淤工程(開口合	水利處	水利處下	10,000	3,000	4,000	0	0	133	107043	107043	107053		107061		107103		107123	108022	因招標作業流	已決標,盡速

		約)		水道科							0	0	1		5		1		1		8	標2次,故延誤 工期	趕工中
苗栗縣	c006-3-2	107年度苗栗縣兩水下水道系統興建及改善工程(開口合約)	水利處	水利處下 水道科	6,775	2,033	0	0	0	0	107033 0	107062 7	107043 0		107073 1		107113 0		108043 0		108053 1	已於107年5 月15日簽准預 訂施作地點。	工程上網發 包資料陳核 中。
苗栗縣	c006-3-3	107年度苗栗縣頭份鎮水貞抽水站維護保養及代操作	水利處	水利處下 水道科	750	225	0	188	0	83	106122 9	106122 9	107043 0		107093 0		107103 1		107121 4		107123 1	廠商對保固期 滿,成本提高 有顧慮,不願 以原契約(總包 價法)續約,故 新的契約將採 單價計算法, 招標文件研擬 中。	107-108年度 新契約(包含 107年度履約 期限自 107/9/4至 107/12/31) ,後續擴充 得以原契約 續約一年, 續約以二次 為限,招標 文件研擬 中。
苗栗縣	c006-3-4	流域綜合治理計畫及前瞻基礎 建設計畫兩水工程地方配合款	水利處	水利處下 水道科	2,600	780	0	0	0	0	107043 0		107062 9		107092 8		108062 8		108112 9		108123 1	三義水美工程 計畫書因營建 署有意見,退回 修正中	計畫書盡速 修正送審
苗栗縣	c006-3-5	苗栗地區、明德水庫特定區北 岸暨南岸水資源回收中心委外 代操作維護工作	水利處	水利處下 水道科	29,500	11,848	0	0	0	0	107033 1		107063 0		107093 0		107103 1		107123 0		108012 4	第一次後續擴 充之保險單有 部分日數未	依據相關規 定針對未保 部分簽請予

																					保。	以扣款。
苗栗縣	c006-3-6	明德水庫汙水下水道工程電費	水利處	水利處下水道科	120	36	7	0	0	20	107033 1	107063 0	107073 1	107083 1	107103 1	107123 1					依據電費收據 使得辦理繳款 作業。	已繳款，將 積極辦理。
苗栗縣	c006-3-8	苗栗市南苗地區汙水下水道系統分支管網及用戶接管工程	水利處	水利處下水道科	2,500	750	0	0	0	0	107033 1	107063 0	107073 1	108033 1	108063 0	108103 1					本府於107年7 月4日召開座 談會。	經綜合討論 請聯聖公司 就廠商資格 之限制再予 以審酌辦 理。
苗栗縣	c006-3-9	苗栗地區汙水下水道南苗主次幹管工程	水利處	水利處下水道科	200	60	0	0	0	0	106013 1	106013 1	106060 1	106060 1	106062 6	106062 6	108033 1	108113 0	108123 1		進度無落後， 將儘速請款	進度無落 後，將儘速 請款
苗栗縣	c006-3-10	苗栗市、頭屋鄉汙水下水道相關工程	水利處	水利處下水道科	3,000	0	0	0	0	0	107043 0	107053 1	107062 9	107083 1	107112 3	107123 1					委設招標作業 流標	重新辦理委 設招標作業
苗栗縣	c006-3-11	苗栗地區汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(北中苗第五標)	水利處	水利處下水道科	20	6	0	0	0	0	107043 0	107053 1	107063 0	107123 1	108073 1	108123 1					於107年6月 15日召開採購 審查會。	於107年6月 28日函京揚 公司於107年 7月6日前檢 討修正委員 意見。
苗栗縣	c006-3-13	苑裡鎮汙水下水道系統主次幹管第一期工程	水利處	水利處下水道科	100	30	0	0	0	0	107033 1	107093 0	107123 1	108123 1	109123 1	110050 1					涉及汙水處理 廠廠址變更， 故尚未辦理招 標	將俟汙水處 理廠實施計 畫通過後盡 速辦理

苗栗縣	c006-3-14	苗栗縣苑裡鎮水資源回收中心第一期工程(含三年試運轉)	水利處	水利處下水道科	100	30	0	0	0	0	107033 1	107093 0	107123 1	108123 1	109123 1	110050 1	污水處理廠土地取得作業尚未完成，故尚未辦理招標	將盡速辦理			
苗栗縣	c007-1-1	治山防災及野溪坑溝整治工程	水利處	水利處水土保持科	30,000	5,000	1,161	259	0	28	107062 9	107062 9	107083 1	107092 8	107113 0	108032 9	108062 8	施工部分請廠商在期限內完工，尚未發包部分已請設計公司將預算書送府審查，辦理發包事宜。	督促廠商盡速施工，俟完工驗收後辦理結案。		
苗栗縣	c007-1-2	農路改善	農業處	農業處休閒農業科	54,100	5,000	758	2,138	0	58	107062 9	107060 4	107092 8	107103 1	107123 1	108043 0	108062 8	目前工程預算書審查及上網發包中	目前工程預算書審查及上網發包中		
苗栗縣	c007-2-2	漁港工程改善	農業處	農業處漁業科	10,000	3,300	724	0	0	22	107020 1	107022 0	107022 8	107030 7	107030 1	107031 5	107083 0	107113 0	107121 5	配合預算延誤	加速執行進度
苗栗縣	c008-1-1-2	竹南分局造橋分駐所耐震補強工程	警察局	警察局後勤科	3,090	900	0	0	0	0	107063 0	107070 2	107083 1	107093 0	107103 1	107122 1	107123 1	設計缺失改善逾期	業於107年7月2日書面審查通過，目前辦理工程招標作業		
苗栗縣	c008-1-1-3	苗栗分局三義分駐所耐震補強工程	警察局	警察局後勤科	5,170	1,600	54	0	0	3	107063 0	107070 2	107083 1	107093 0	107103 1	107122 1	107123 1	設計缺失改善逾期	業於107年7月2日書面審查通過，目前辦理招標		

																						作業	
苗栗縣	c008-3-1	外勤單位警用行動電腦	警察局	警察局資訊科	3,800	1,520	0	950	0	63	1070531	1070629	1070629	1070713	1070831	1071214	1071231					因與內政部警政署確認是否統一採購需時，經本局與內政部警政署契約廠商中華電信企業客戶分公司協調款項支付方式未果，始於5月25日確認由本局自行招商辦理本項採購，故未能於原訂6月29日決標。	本採購案已於107年6月29日簽奉核准，刻正辦理招標相關事宜。
苗栗縣	c008-5-1	全縣城鄉風貌興建等公共設施工程	水利處	水利處城鄉發展科	33,723	10,200	1,519	6,700	0	81	1070531	1070630		1070820	1071015	1071214	1071231					目前已核定，尚在辦理設計或發包中共計9案，金額計12,640,174元，預計8月完成規劃設計作業，趕辦招標作業。	俟工程簽准發包後，盡速辦理趕工。

苗栗縣	c009-1-2	重劃工程與設施	地政處	地政處	10,000	3,000	0	0	0	0	107052	107061	107063		107073		107083		107100		107122		受5月份民眾陳情工程施作地點及項目變更，致設計作業延誤進而影響招標期程。1.107年苑裡、社南(一)農地重劃區後續農水路基本設施改善工程案，預計於107/06/27決標。2.107年苑港、社苓、社南(二)農地重劃區後續農水路基本設施改善工程案，預計107/07/11開標。3.107年苗栗維祥農地重劃區後續農水路基本設施改善工程，預	加速辦理。107年苑港、社苓、社南(二)農地重劃區後續農水路基本設施改善工程案，預計107/07/11開標。107年苗栗維祥農地重劃區後續農水路基本設施改善工程，預計107/07/11開標。
-----	----------	---------	-----	-----	--------	-------	---	---	---	---	--------	--------	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	---

																					計 107/07/11 開標。	
苗栗縣	c009-1-3	中央管河川疏濬兼供土石作業	水利處	水利處土 石資源科	31,623	6,100	0	4,655	0	76	107033 0	107013 0	107060 1	107021 3	107063 0	107022 0	107092 8		107110 1	107123 1	清疏兼供販售 土石之運輸作 業因全省進行 清疏作業而導 致車輛不足,以 致工程進度較 慢	已請施工承 商延長每日 施工作業時 間並請販售 標廠商加速 提料作業,全 案預計 8 月份 完成清疏作 業
苗栗縣	c009-1-4	城鎮風貌型塑整體計畫-推動 建築物騎樓整平計畫	工商發展 處	工商發展 處使用管 理科	520	74	0	0	0	0	107062 9	107083 1		107092 8		107113 0		108013 1	108022 8	旨案已於 107 年 5 月向內政 部營建署核 部營建署提報 計畫書,目前 尚未收到營建 署核定函,故 無法辦理上網 招標。	待收到內政 部營建署核 定函後,將 儘速辦公 開招標。	
苗栗縣	c009-1-5	全縣用地補償費	工務處	工務處土 木科	10,000	3,000	421	515	0	31	107053 1	107032 8	107073 1		107103 1		107113 0		107123 1	108022 8	全縣用地補償 費依實際需求 簽奉縣長核定 後動支,至 107 年 6 月 30 日止 實際需求「苗	「苗 26-2 線 道路拓寬工 程(第 3 標)」 等 7 項更正徵 收、補辦徵 收、一併徵

																					26-2 線道路拓寬工程(第 3 標)」等 7 項更正徵收、補辦徵收、一併徵收、補辦協議價購補償費及作業費。	收、補辦協議價購補償費及作業費，積極辦理。
苗栗縣	c009-1-10	公有建築物耐震補強工程	警察局	警察局後勤科	1,660	500	51	0	0	10	1070630	1070702	1070731	1070831	1071031	1071221	1071231			設計缺失改善逾期	業於 107 年 7 月 2 日書面審查通過，目前辦理招標作業	
苗栗縣	c009-1-12	原住民族道路及小型其他公共建設工程	原住民族事務中心	原住民族事務中心	15,000	2,500	0	2,794	0	112	1070430	1070502	1070630	1070704	1070831	1071130	1080331	1080430		6/12 辦理第一次公告招標並於 6/27 開標無廠商投標流標。	6/28 辦理第二次公告招標，於 7/4 決標。	

10. 彰化縣

彰化縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 17.23 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
267	17.21	0.01	669,782.78 7	657.49	38.88	252	254	239	236	146	210	60	105	23	63	17	42

本年度基本設施補助經費 17.23 億元(中央補助 17.21 億元，地方自籌 0.01 億元)，截至 6 月底止，共有標案 267 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 101,870.336 仟元，預算實際支用數 436,314.9 仟元，已執行應付未付數 233,256.784 仟元，發包結餘數 211.103 仟元，合計預算執行數 669,782.787 仟元，預算執行率 657.49%，預算達成率 38.88%。
 - 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,722,541 仟元，縣(市)執行率 657.49%，預算達成率 38.88%。
 - 依標案執行情形進度區分：267 件標案，已設計完成者 254 件，已發包決標者 236 件，已開工者 210 件，施工進度已達 50%者 105 件，已完工者 63 件，已驗收完成者 42 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，267 件標案計有 12 件落後，落後比率 4.49%。
落後原因：
 - 107 年 6 月落後標案 12 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 11 件。
 - 落後原因分析：因規劃設計落後者 6 件、因招標作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 4 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 38.88%，較平均預算達成率 36.76%高出 2.12 個百分點，執行情形良好。惟補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(41.69%)、水利建設經費(19.18%)、公有建物及設施經費(10.80%)、其他建設經費(17.67%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 12 件落後標案，分屬水利資源處(2 件)、城市暨觀光發展處(2 件)、計畫處(1

件)、消防局(2件)、農業處(3件)、警察局(2件)等執行案件。請彰化縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

彰化縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化													0
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設	3												3
c008. 公有建物 及設施	1										1		2
c009. 其他建設	2			1			1				3		7

彰化縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
彰化縣	c007-2-10	新寶11班哨出海道路改善工程	農業處	農業處	846	0	0	0	0	0	107043 0	107052 7	107053 1		107063 0		107093 0		107113 0		107123 1		設計作業依審查意見修改已上網招標中	預計於107年7月開標
彰化縣	c007-2-11	頂庄出海道路改善工程	農業處	農業處	1,509	0	0	0	0	0	107043 0	107052 7	107053 1		107063 0		107073 1		107092 0		107093 0		設計作業依審查意見修改已上網招標中	預計於107年7月開標
彰化縣	c007-2-12	舊照甲排水一大排五中排進排水路改善工程	農業處	農業處	1,377	0	0	0	0	0	107043 0	107050 2	107053 1	107062 8	107063 0		107093 0		107113 0		107123 1		本案係設計作業審查程序致落後	已完成發包，儘速辦理後續開工相關事宜。
彰化縣	c008-1-2-2	溪湖分隊及二林分隊耐震補強工程	消防局	消防局	2,000	0	0	0	0	0	107043 0		107063 0		107083 0		107103 1		107113 0		107123 1		委託規劃設計監造採購案作業時程落後	本案已於6月28日召開評審小組會議評定廠商序位，俟決標後儘速辦理

																								規劃設計事宜。	
彰化縣	c008-5-8	頂番派出所新建辦公廳舍空調、事務等設備	警察局	警察局	2,500	2,500	1,088	0	0	44	1070313	1070315	1070319	1070323	1070319	1070323	1070326	1070326	1070330	1070326	1070410	1070508	核銷中	核銷中	
彰化縣	c009-1-8	購置空氣灌充機	消防局	消防局	4,500	0	0	0	0	0	1070430	1070704	1070630		1070630		1071231		1071231		1071231			本案欲採購之器材係涉及高危險工作，與同仁工作安全習習相關，加上產品規格眾多，功能參差不齊，為避免降低採購標的物品質，規格研擬甚為重要，本案規格刻正研擬中，將積極簽辦採購。	本案積極辦理。
彰化縣	c009-1-19	購置資訊相關設備案	計畫處	計畫處	6,430	0	0	0	0	0	1070629		1070629		1070716		1071031		1071130		1071210			共同共應契約未上網公告	已備妥相關資料，俟共同供應契約公告後，盡速辦理

彰化縣	c009-1-30	彰化縣國3高速公路橋下空間景觀綠美化	城市暨觀光發展處	城市暨觀光發展處	4,500	0	0	0	0	0	107033 1	107033 0	107041 5	107050 1	107073 1	107083 0	107103 0	本案併入前瞻計畫-全國水環境改善-彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫納入辦理，目前辦理期初基本設計中。	辦理規劃設計中，後續將趕辦工程。		
彰化縣	c009-1-35	員林鐵路高架橋下空間(莒光路至靜修路)環境改善計畫	城市暨觀光發展處	城市暨觀光發展處	2,250	0	0	0	0	0	107043 0	107053 1	107061 5	107083 1	107113 0	107123 1	7/2與台鐵局再次研商確認執行方向，目前廠商修正基本設計中	積極辦理			
彰化縣	c009-1-36	彰化分局芬園分駐所後棟員警待勤室頂樓防水改善整修工程	警察局	警察局	700	0	0	0	0	0	107033 0	107032 9	107042 0	107043 0	107042 7	107070 2	107051 4	107053 0	107123 1	第一次變更材料設計，辦理議價及材料送審。	商請監造單位在設計時加強考量。
彰化縣	c009-1-50	田中鎮普興坑滯洪沉砂池興建工程	水利資源處	水利資源處	5,000	0	0	0	0	0	107053 0	107053 0	107062 9	107072 0	107100 5	107120 3	107123 1	發包速度較慢	已送採購科，於7/17第一次開標		
彰化縣	c009-1-52	員林市蓋母坑沉砂池興建工程	水利資源處	水利資源處	2,500	0	0	0	0	0	107053 1	107053 1	107063 0	107073 1	107103 1	107121 5	107123 1	發包速度較慢	已送採購科，7/17第一次開		

																							標
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

11. 南投縣

南投縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 16.32 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
294	16.32	0	332,617.20 7	94.08	20.38	291	268	286	248	166	167	51	70	23	40	17	37

本年度基本設施補助經費 16.32 億元(中央補助 16.32 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 294 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 353,554.012 仟元，預算實際支用數 234,389.646 仟元，已執行應付未付數 96,910.262 仟元，發包結餘數 1,317.299 仟元，合計預算執行數 332,617.207 仟元，預算執行率 94.08%，預算達成率 20.38%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,630,080 仟元，鄉鎮公所執行 1,744 仟元，縣(市)執行率 94.19%，預算達成率 20.38%；鄉鎮公所執行率 48.51%，預算達成率 24.25%。
- 依標案執行情形進度區分：294 件標案，已設計完成者 268 件，已發包決標者 248 件，已開工者 167 件，施工進度已達 50%者 70 件，已完工者 40 件，已驗收完成者 37 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，294 件標案計有 57 件落後，落後比率 19.39%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 57 件，屬預算執行未達 80%者 13 件，屬查核點進度落後者 26 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 18 件。
 - 落後原因分析：因規劃設計落後者 10 件、因招標作業落後者 14 件、因施工作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 31 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 20.38%，較平均預算達成率 36.76%落後 16.38 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(13.76%)、補助貧瘠鄉

鎮市(49.95%)、道路養護及道安計畫(10.26%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(0.26%)、水利建設經費(24.74%)、農業建設經費(17.37%)、公有建物及設施經費(28.55%)、其他建設經費(27.06%)等八類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 57 件落後標案，分屬工務處(水利工程科)(5 件)、文化局(10 件)、地政處(2 件)、南投市公所(2 件)、建設處(城鄉發展科)(1 件)、建設處(建築管理科)(1 件)、建設處(產業發展科)(4 件)、計畫處(2 件)、風景區管理所(3 件)、原住民族行政局(1 件)、消防局(8 件)、新聞及行政處(2 件)、農業處(7 件)、環境保護局(6 件)、警察局(總)(1 件)、觀光處(2 件)等執行案件。請南投縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

南投縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化	2			1			1				6		10
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設	1			1							5		7
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施	1			1							1		3
c009. 其他建設	6			11	1						19		37

南投縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
南投縣	c001-1-3	107年度「竹」博覽會藝文推廣活動及行銷計畫	文化局	文化局	800	0	0	0	0	0	107063 0	107070 6	107063 0	107070 6	107093 0		107113 0		107113 0	107123 1	107123	107123	配合2019南投燈會執行	待2019南投燈會規劃案定案後，再發包
南投縣	c001-1-9	南投學研討會	文化局	文化局	300	84	0	0	0	0	107022 3	107022 3	107063 0	107062 3	107093 0		107113 0		107123 1	107123	107123	因招標作業及簽訂契約作業流程耗時。	已加速契約簽訂後續作業。	
南投縣	c001-1-11	竹藝發展史調查研究(出版)計畫	文化局	文化局	700	200	0	0	0	0	107043 0	107042 7	107053 1	107060 1	107063 0	107063 0	107073 1		107113 0	107123	107123	竹藝發展史編輯預計7月26日召開修正後期末審查會議	加強控管辦理進度	
南投縣	c001-1-19	文化局館舍防火塗層及無障礙設施改善	文化局	文化局	2,000	0	0	0	0	0	107043 0		107063 0		107071 0		107083 1		107093 0	107103	107103	規劃設計監造案流標5次。	變更招標方式及提高服務費用百分比，並積極邀請廠商投標。	
南投縣	c001-1-21	圖書館室內空氣品質改善計畫	文化局	文化局	730	204	0	0	0	0	107053 1		107063 0		107083 1		107093 0		107103 1	107123	107123	圖書館室內空氣品質改善計畫-目前尚待環保局來函-邀請專家學者開會評估改善方案	盡速處理後續事宜	
南投縣	c001-1-22	文化局圖書館無障礙設施及設備改善計畫	文化局	文化局	570	154	0	0	15	10	107053 1		107063 0		107083 1		107093 0		107113 0	107123	107123	建築師尚在規劃中	盡速辦理後續作業。	
南投縣	c001-	南投國際沙雕藝術文化園區	文化局	文化局	7,000	0	0	0	0	0	107061		107063		107093		107113		107123	107123	107123	南投國際沙雕藝術園區換	按施工預定工期，規劃	

	1-26										0	0	0	0	1	1	展，需配合園區開放期程，於107年11月至108年1月封園期間進行施作，爰需配合該期程辦理招標作業，規劃於8月完成規格及招標文件簽辦。	招標文件辦理招標作業。												
南投縣	c001-1-27	南投縣我愛閱讀圖書館閱讀護照印製案	文化局	文化局	200	54	0	0	0	0	107063	0	107063	0	107072	0	107113	0	107113	107123	1	我愛閱讀圖書館閱讀護照之推行為全縣14個公共圖書館及各參與國民小學之活動，已實施六年，預計明(108)年度將重新改版，故今年擬設計新版護照以及須更新規劃文化局與各學校機關之執行方法。	預計下半年開會研討閱讀護照之設計改版事宜。							
南投縣	c001-1-42	南投縣文化園區私有土地有償徵收及土地租金計畫	文化局	文化局	850	400	0	0	0	0	107053	1	107053	1	107063	0	107063	0	107073	1	107083	1	土地徵收已於107年6月14日完成過戶	積極管控進度理						
南投縣	c001-1-43	續修南投縣志出版計畫	文化局	文化局	3,500	1,500	0	0	0	0	107043	0	107042	7	107053	1	107053	1	107063	0	107073	1	107113	0	107123	1	期末報告審查中	積極管控進度辦理		
南投縣	c006-1-1	區域排水興(改)建、修復及維護等改善工程	工務處	工務處	56,121	28,060	20,984	0	0	75	107042	8	107021	2	107052	8	107040	3	107062	8	107042	3	107092	8	107112	8	107122	8	水利經費設施工程需簽陳首長，據以辦理本年度水利經費設施工程	部分工程已核定，辦理工程測設作業中，部分工程俟首長安排會勘後陸續辦理各工程之測設及發包作業
南投縣	C006-	一般性補助款疏濬清淤經費	工務處	工務處	51,186	25,590	10,500	0	0	41	107042	0	107042	0	107052	0	107062	0	107062	0	107092	0	107112	0	107122	0	各鄉鎮疏濬清淤工程施做	清淤工程陸續趕辦發包		

	1-2	(區域排水)	(水利 工 程 科)	(水利 工 程 科)		3	0					8	7	8	7	8		8		8		8		區域範圍及經費書圖審查	中
南投縣	C006- 1-4	南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)	工務處 (水利 工 程 科)	工務處 (水利 工 程 科)		8,906	4,453	0	0	0	0	107042 8		107052 8		107062 8		107092 8		107112 8		107122 8	保留決標中	俟決標後將與標廠商儘速辦理訂約及開工，以期達到原定目標	
南投縣	C006- 1-8	107 南投市漳和里牛堀排水護岸改善工程	工務處 (水利 工 程 科)	南投市 公所		546	273	0	0	0	0	107042 8		107052 8		107062 8		107092 8		107112 8		107122 8	預算書內容訂正中	待修正完畢即進行招標作業	
南投縣	C006- 1-9	107 內轆排水支線護岸改善工程	工務處 (水利 工 程 科)	南投市 公所		500	250	0	0	0	0	107042 8	107071 1	107052 8		107062 8		107092 8		107112 8		107122 8	協調取得土地同意書	已委由地方人士協調	
南投縣	C006- 1-10	107 竹山鎮秀林里姜子寮溪基礎補強工程	工務處 (水利 工 程 科)	工務處 (水利 工 程 科)		400	200	20	0	0	10	107042 8	107061 5	107052 8		107062 8		107092 8		107112 8		107122 8	工程俟首長安排會勘後陸續辦理各工程之測設及發包作業	設計已完成，趕辦發包作業中	
南投縣	c006- 3-1	107 年南投縣易淹水地區水患自主防災社區後續運轉計畫	工務處 (水利 工 程 科)	工務處 (水利 工 程 科)		600	300	0	300	0	10	107042 8	107051 5	107052 8	107062 5	107062 8		107092 8		107112 8		107122 8	預算不足檢討之故	已於 107.6.25 決標訂約中，將積極趕辦以期達到原訂進度	
南投縣	c008- 1-2	消防廳舍(第二大隊日月潭分隊)	消防局	消防局		10,000	5,500	0	4,400	0	80	107061 0		107062 0		107063 0		107121 5		107122 0		107123 1	目前由建築師設計中。	加速辦理。	

南投縣	c008-2-3	垃圾車(汰換老舊垃圾車)	環境保護局	環境保護局	9,000	2,700	0	0	0	0	1070430	1070503	1070430	1070524	1070430	1070524	1071130	1071130	1071231	已完成3部垃圾車下訂作業，預訂於107/8/30(廠商重新承諾完成履約期限)前完成交車，其後辦理規格查驗、驗收及經費核銷事宜。	持續辦理。
南投縣	c008-3-1	擴增及汰換數位式遠端網路即時監控錄影監視系統	警察局(總)	警察局(總)	22,000	5,940	0	4,752	0	80	1070430	1070529	1070515		1070615		1070715	1071031	1071130	第一次未達3家廠商投標，流標。	立即辦理第二次上網招標。
南投縣	c009-1-7	消防局地下室漏水修繕計畫	消防局	消防局	850	468	0	374	0	80	1070520	1070520	1070531		1070630		1071031	1071210	1071231	本案已完成設計確認，目前由建設處進行發包作業簽核中。	擬請建設處加速辦理。
南投縣	c009-1-8	逐年修繕室內消防栓計畫	消防局	消防局	200	110	0	88	0	80	1070630		1070630		1070630		1071130	1071215	1071231	目前正收集各分隊資料簽辦中。	加速辦理。
南投縣	c009-1-11	強化山城事故搜救裝備器材	消防局	消防局	2,000	1,100	0	880	0	80	1070531	1070531	1070630		1070630		1070930	1070930	1071031	目前正在規劃招標作業中。	加速辦理。
南投縣	c009-1-12	辦理核生化災害搶救裝備器材定期保養、檢測校正及耗材汰換補充，以維堪用狀態	消防局	消防局	766	421	0	337	0	80	1070630	1070508	1070630		1070630		1071231	1071231	1071231	第一次流標，正在辦理第二次招標作業中。	加速辦理。
南投縣	c009-1-16	強化潛水搜救裝備器材	消防局	消防局	400	220	0	0	0	0	1070630		1070630		1070630		1071130	1071130	1071231	規格簽核中。	加速辦理。
南投縣	c009-1-26	消防無線電基地台、中繼台、手提台暨衛星電話手提台汰換補充中程計畫	消防局	消防局	400	0	0	0	0	0	1070625		1070625		1070630		1070915	1070925	1071025	規格簽辦中。	加速辦理。
南投縣	c009-1-30	南投縣災害應變中心資通訊設備汰換	消防局	消防局	675	371	0	297	0	80	1070630	1070629	1070630		1070630		1071001	1071130	1071231	招標作業簽核中。	加速辦理。

南投縣	c009-1-43	編排及印製 108 年南投縣縣政推廣月曆	農業處	農業處	1,500	100	0	0	0	0	1070601	1070629	1071012	1071116	1071123	1071130	月曆圖檔與編輯原預併月曆印製一起發包，為降低月曆編印費用，改由本府提供圖檔並另予規劃設計後再發包印製，故延後時程。	目前圖檔已定案，將於 7 月上旬發辦委託規劃設計，預定於 8 月初辦妥設計圖檔後，即發辦上網發包，預計 8 月底前可上網發包。			
南投縣	c009-1-44	補助肉品市場基金—辦理肉品市場屠宰場之營運設備增設、更新及整修計畫等工程	農業處	農業處	100	15	0	0	0	0	1070601	1070629	1070831	1070928	1071130	1071207	南投縣農產運銷股份有限公司僅完成整留場點豬走道工程，餘刻正積極規劃中。	將督促該公司加快相關工程腳步			
南投縣	c009-1-45	南投縣珍貴樹木保育計畫	農業處	農業處	500	275	43	126	0	62	1070410	1070503	1070415	1070503	1070430	1070503	1070720	1071010	1071215	目前尚無列管老樹需辦理修剪防治等相關工作。	俟業務實際狀況需求盡速辦理發辦作業。
南投縣	c009-1-53	第 7 屆中臺灣農業博覽會或中彰投苗 4 縣市或本縣大型活動規劃執行計畫	農業處	農業處	4,000	0	0	0	0	0	1070601	1070711	1070629	1070921	1070928	1071003	1071130	本案目前正在上網招標審核程序中。	待鈞長核定後立即辦理上網公開招標事宜		
南投縣	c009-1-55	山坡地造林計畫	農業處	農業處	96	0	0	0	0	0	1070630	1070630	1070930	1071231	1071231	1071231	該款項為造林計畫臨時人員年終工作獎金。	俟年終依規辦理年終工作獎金核撥作業。			
南投縣	c009-1-56	國姓驛站（即福隆莊）建物及設備整修	農業處	農業處	700	0	0	0	0	0	1070630	1070630	1070912	1071022	1071130	1071231	本案為木造建築，規劃、設計、監造費用未達公告金額十分之一，經多方徵詢南投縣內建築師承辦，均因木造建築維修專業及經驗而被婉拒致無法發辦發包。	本案已於上(6)月下旬洽得台中市鄭永亮建築師前往實地勘查現場，並願意接案，已發辦委託規劃、設計、監造發包作業中，預定本年 8 月底前可完成規劃、設計，即可辦理發包			

南投縣	c009-1-58	山坡地超限利用改正清查及管理計畫	農業處	農業處	1,000	0	0	0	0	0	107043 0	107070 3	107052 0	107053 0	107062 0	107121 0	107123 1	因近期有中央水土保持管理計畫2件標案及本案,因案件決標後均需請各鄉鎮公所承辦人員參與會議,為避免公所承辦人員舟車勞頓,故整合案件一請進行招標作業,爰致進度落後(旨揭計畫已核定辦理,並已上網公告107/7/10辦理開標作業)。	緊急趕辦	
南投縣	c009-1-114	縣轄風景據點整建計畫工程	觀光處	觀光處	5,900	773	0	0	0	0	107060 6	107063 0	107083 1	107103 1	107113 0	107123 1	計畫尚未核定	盡速確認辦理		
南投縣	c009-1-116	日月潭地區公有船舶上架檢修場經營管理計畫	觀光處	觀光處	300	81	0	0	0	0	107053 1	107063 0	107071 5	107093 0	107123 1	107123 1	上架場工程進度因水文因素稍有延遲,擬於第3季辦理。	視工程進度配合辦理。		
南投縣	c009-1-120	南投縣竹山鎮竹山文化園區委託經營管理計畫	觀光處	風景區管理處	1,000	300	0	0	0	0	107043 0	107033 1	107063 0	107083 1	107103 1	107112 0	107122 5	縣長核示屬公所土地及設施,由其自行維管	檢討會議討論	
南投縣	c009-1-124	南投縣觀光自行車道設備維修計畫	觀光處	風景區管理處	1,200	0	0	160	0	10	107043 0	107040 9	107053 1	107050 4	107062 9	107092 8	107113 0	107123 1	竹山鎮公所委託規劃設計發現工程經費不足,於6月中旬向本所要求增加經費,尚未開工	本所將另辦會勘
南投縣	c009-1-127	經管縣有非公用不動產費用	觀光處	風景區管理處	1,290	0	0	0	0	0	107063 0	107063 0	107063 0	107113 0	107113 0	107113 0	107113 0	本案為每年度地價稅支出,相關經費已編列於南投縣風景區管理處107年度歲出計畫"風景區管理	於11月份地價稅開徵期間覈實報銷。	

																				業務-風景區營運管理-業務費(稅捐及規費)"科目項下，擬於11月地價稅開徵期間，依地價稅繳款單覈實報銷。		
南投縣	c009-1-128	南投縣天然氣事業管理及輔導計畫	建設處 (產業發展科)	建設處 (產業發展科)	200	80	44	0	0	55	107033 1	107010 1	107053 0	107073 1	107093 0	107103 1	107123 1		依實支金額核實填報	相關活動主要辦理期程為下半年，後續依進度辦理。		
南投縣	c009-1-130	「建築管理業務電子化作業」便民服務計畫	建設處 (建築管理科)	建設處 (建築管理科)	1,000	0	0	0	0	0	107043 0	107042 7	107053 1	107063 0	107073 1	107113 0	107123 1		本案經與計畫處資訊管科討論後，擬採用共同供應契約採購辦理	擬採購之電腦設備將於7月後改版，故須於共同供應契約內之規格更新後辦理		
南投縣	c009-1-133	南投縣住宅補貼計畫	建設處 (城鄉發展科)	建設處 (城鄉發展科)	4,272	2,136	792	0	0	37	107022 8	107022 6	107033 1	107032 0	107033 1	107032 0	107093 0	107123 1	107123 1	住宅補貼人數逐月下降導致撥款金額不如預期	持續積極辦理	
南投縣	c009-1-135	中彰投地方產業運籌中心營運計畫	建設處 (產業發展科)	建設處 (產業發展科)	1,660	1,660	1,365	0	0	82	107033 1	107010 1	107033 1	107010 1	107033 1	107021 5	107043 0	107062 9	107053 1	107123 1	「日月潭水社遊客中心隔間、招牌等拆除工程」案為符合實際需要，預算書多次修正致工程標案作業延後	「日月潭水社遊客中心隔間、招牌等拆除工程」案已於7/3上網招標，7/10開標，預計於8/30前完成驗收付款，即可符合預算執行率。
南投縣	c009-1-136	補助投資南投縣中小企業地價稅房屋稅抵減及產業發展	建設處 (產業發展科)	建設處 (產業發展科)	4,500	1,800	1,175	0	0	65	107033 1	107010 1	107053 1	107010 1	107073 1	107031 5	107093 0	107113 0	107123 1	因符合補助資格之廠商，其申請房屋稅及地價稅之	俟奉核動支第二預備金，續辦廠商稅額補助	

		實質需求計畫	發展 (科)	發展 (科)																補助款項已超出騰餘預算 值，刻正簽辦動支第二預 備金	事宜，即可達成預算執 行率。
南投縣	c009- 1-139	特定事業稽查車汰購計畫	建設處 (產業 發展 科)	建設處 (產業 發展 科)	664	221	68	0	0	31	107033 1	107053 1	107073 1	107093 0	107113 0	107123 1				依據本府工商特定事業稽 查車租購案契約 (105.10.17~108.10.16) ，租金及油料費概算189 萬，分3年編列，每年編 列66.4仟元。編列金額含 3年後購回金額30萬元， 期間以實際日數計算租 金，目前仍使用105年度 保留經費。	編列金額含3年後購回金 額30萬元，契約期間 (105.10.17~108.10.16)仍以實際日數計算租 金，將優先使用105.106 年度保留經費。
南投縣	c009- 1-151	建構南投縣政府所屬機關學 校雲端架構版公文編輯與簽 核系統暨行動簽核流程改善 計畫	計畫處	計畫處	2,950	0	0	0	0	0	107053 1	107032 9	107063 0	107073 1	107093 0	107123 1	107123 1		送一層簽核中	簽核完成後辦理下訂事 宜，預計7月10日辦理 完成。	
南投縣	c009- 1-154	南投縣政府所屬二級VPN網 路內機關AD導入計畫案	計畫處	計畫處	344	0	0	0	0	0	107043 0	107060 4	107053 1	107062 9	107061 5	107062 9	107071 6	107073 1		為趕辦前瞻基礎建設招標 作業，俾於規定期程內上 報行政院資安處獲得補助 款，故順延本案期程。目 前已完成公開取得報價單 或企劃書公告，並於7月 8日截止收件。	積極趕辦。
南投縣	c009-	原住民地區飲水設施改善計	原住民	原住民	3,000	0	0	500	0	10	107053	107052	107063	107073	107093	107121	107123		規劃設計欠周	修改預算書圖中	

	1-161	畫	族行政 局	族行政 局						0	1	2	0		1		0		5		1			
南投縣	c009- 1-166	南投縣政府縣民廣場整修工程	新聞及 行政處	新聞及 行政處	7,000	0	0	0	0	0	107060 1	107041 3	107063 0		107091 4		107110 1		107113 0		107123 1		因縣民廣場供公眾休憩之場所，爰為使設計規劃更臻完善，故與建築師多次商討及變更設計方案內容，以致影響進度。	已於6月22日與建築師確認設計方案，將儘速辦理發包事宜
南投縣	c009- 1-169	南投縣政府7樓國際會議廳會議系統設備更新	新聞及 行政處	新聞及 行政處	900	0	0	0	0	0	107061 5		107063 0		107093 0		107103 1		107121 7		107122 8		因會議室設備種類繁多且專業，為使日後操作會議設備更加便利，爰設備規格仍洽專業廠商蒐集中。	俟彙整各式規格資料後，儘速辦理發包事宜
南投縣	c009- 1-178	e-GPS 衛星定位接收儀(2台)	地政處	地政處	1,200	600	0	0	0	0	107013 0	107013 0	107043 0		107052 1		107062 9		107073 0		107073 0		無線電率訂資料尚於NCC(國家通訊傳播委員會)審核(約7月底)	已請廠商送件
南投縣	c009- 1-179	全測站經緯儀(2部)	地政處	地政處	600	300	0	0	0	0	107013 0	107013 0	107043 0		107052 1		107062 9		107073 0		107073 0		無線電率定資料尚於NCC審核中(約7月底)	已請廠商送件
南投縣	c009- 1-194	辦理南投縣空氣污染減量工作小組業務推動計畫	環境保 護局	環境保 護局	200	54	0	13	0	25	107051 5	107050 4	107053 1	107061 9	107053 1	107061 9	107053 1	107061 9	107113 0		107121 5		辦理事項已達原預定工作數量之50%，惟委員出席人數需視委員出席現況而定，另亦需視委員依據當年度本縣空品狀況及空污減量工作辦理情形，建議是否辦理研討或優良縣市觀摩等活動，較難先行預估。	本年度預計至竹山鎮舉辦環保論壇，以研商及討論解決竹山空污良策。

南投縣	c009-1-195	南投縣 107 年垃圾處理計畫	環境保護局	環境保護局	156,000	42,120	17,745	0	0	42	1070630	1070101	1070630	1070101	1071130	1071130	1071130	1071231	<p>本縣 93 年奉行政院命令停建焚化爐，垃圾處理需委由外縣市焚化廠處理，惟近幾年垃圾轉運困難，其中臺中市自去(106)年底減少甚至停止收受本縣垃圾，本(107)年自 2 月起完全停止收受本縣垃圾，以致本縣垃圾有堆置之情形，無法完全去化處理，故實際焚化處理費落後原預期之進度。</p> <p>本局 105 年至 107 年多次函請行政院環境保護署及各縣市政府協助處理本縣垃圾，本(107)年本局依「現有大型焚化廠統一調度辦法」正式向環保署提出申請垃圾統一調度，惟皆無法獲得正面回應或協助。本局將再函請行政院環境保護署協助調度處理本縣垃圾，倘有餘裕量將儘速執行本案經費核銷。</p>
南投縣	c009-1-196	南投縣 107 年度垃圾轉運計畫	環境保護局	環境保護局	2,000	540	0	0	0	0	1070630	1070101	1070630	1070101	1071130	1071130	1071130	1071231	<p>本縣 93 年奉行政院命令停建焚化爐，垃圾處理需委由外縣市焚化廠處理，惟近幾年垃圾轉運困難，其中臺中市自去(106)年底減少甚至停止收受本縣垃圾，本(107)年自 2 月起完全停止收受本縣垃圾，以致本縣垃圾有堆置之情形，無法完全去化處理，故實際焚化處理費落後原預期之進度。</p> <p>本局 105 年至 107 年多次函請行政院環境保護署及各縣市政府協助處理本縣垃圾，本(107)年本局依「現有大型焚化廠統一調度辦法」正式向環保署提出申請垃圾統一調度，惟皆無法獲得正面回應或協助。本局將再函請行政院環境保護署協助調度處理本縣垃圾，倘有餘裕量將儘</p>

																						速執行本案經費核銷。
南投縣	c009-1-197	加強垃圾掩埋場營運管理及廢棄物清運處理，改善環境衛生，確保環境品質	環境保護局	環境保護局	4,000	1,080	0	390	0	36	1070630	1070531	1070630	1070531	1070930	1071031	1071130	1071231			本案為補助鄉鎮市公所廢棄物車輛、機具所需油料及雜項支出暨廢棄物處理場相關設施、車輛及機械設備養護費及垃圾場操作維護費。因本案預算有限，加上經費爭取不易，且本年度尚有6個月，為因應後續如有緊急狀況之發生時，尚有經費可以補助各鄉鎮市公所及因應突發之狀況，故截至目前為止，所核定及補助各公所之經費仍有限，以致未達預期之進度。	尚各公所有上述之需求，將儘速補助各公所辦理，以達原預期之進度。
南投縣	c009-1-199	南投市廢樹木破碎廠興建計畫	環境保護局	環境保護局	2,700	729	0	0	0	0	1070531	1060510	1070630	1070831	1070930	1071031	1071031				本案係補助南投市公所辦理廢樹木破碎廠興建，因本案分廠房及機具部份，分2年度執行，依南投市公所表示，因本案廠房之建置尚未完成，故尚未依政府採購法辦理發包採購機具，故目前本案進度落後。	本局已多次督促南投市公所儘速辦理，並於本(107)年5月7日及6月26日正式函文督促南投市公所儘速辦理。

12. 雲林縣

雲林縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 14.06 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
93	13.68	0.38	495,096.828	344.87	35.21	93	88	85	80	44	68	19	48	0	22	0	16

本年度基本設施補助經費 14.06 億元(中央補助 13.68 億元，地方自籌 0.38 億元)，截至 6 月底止，共有標案 93 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 143,559.97 仟元，預算實際支用數 329,020.685 仟元，已執行應付未付數 165,933.651 仟元，發包結餘數 142.492 仟元，合計預算執行數 495,096.828 仟元，預算執行率 344.87%，預算達成率 35.21%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,399,998 仟元，鄉鎮公所執行 6,000 仟元，縣(市)執行率 342.57%，預算達成率 35.13%；鄉鎮公所執行率 100%，預算達成率 55.09%。
- 依標案執行情形進度區分：93 件標案，已設計完成者 88 件，已發包決標者 80 件，已開工者 68 件，施工進度已達 50%者 48 件，已完工者 22 件，已驗收完成者 16 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，93 件標案計有 10 件落後，落後比率 10.75%。
落後原因：

1. 107 年 6 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 9 件。

2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、其他因素落後者 7 件及未填寫落後原因 1 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 35.21%，較平均預算達成率 36.76%落後 1.55 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費(34.45%)、體育經費(22.06%)、補助貧瘠鄉鎮市(50.02%)、水利建設經費(21.50%)、農業建設經費(3.90%)、公有建物及設施經費(13.55%)等六類預算達成

率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案，分屬水利處(4 件)、城鄉發展處(1 件)、教育處(4 件)、環保局(1 件)等執行案件。未填寫落後原因 1 件，請雲林縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

雲林縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育											3		1	4
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設											2			2
c007. 農業建設											2			2
c008. 公有建物 及設施	1				1									2
c009. 其他建設														0

雲林縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
雲林縣	c002-1-1	各項體育活動競賽	雲林縣政府	教育處	9,750	0	3,000	0	0	100	107061 5	107063 0	107093 0	107103 1	107113 0	107123 1	107123 1	今年因棒球場整修無舉辦賽事，往年補助棒球場門票約200萬~240萬，故造成進度落後。	詢問是否有其他需補助運動賽事，協助申請補助經費					
雲林縣	c002-1-3	補助各項鎮市運動會	雲林縣政府	教育處	180	0	0	0	0	0	107061 5	107063 0	107103 1	107113 0	107122 9	107122 9	本年度尚未有鄉鎮市公所申請相關補助	詢問本縣鄉鎮市公所是否有相關活動可向本府申請補助經費						
雲林縣	c002-1-4	各比賽績優團體、個人獎勵金	雲林縣政府	教育處	3,000	2,600	0	600	0	23	107043 0	107043 0	107051 0	107050 9	107061 1	107060 8	107062 9	107062 2	107073 1	107070 2	107083 1			
雲林縣	c002-1-7	全國性運動會績優選手及教練獎勵金	雲林縣政府	教育處	8,000	0	47	0	0	100	107061 5	107063 0	107103 1	107113 0	107121 5	107123 1	本年度全民運尚未舉辦，致至無法統計獎	待全民運動會舉辦完畢後，						

																					勵金	盡速統計 獎勵金金 額並頒發 給參賽選 手及教練
雲林縣	c006-1-5	本縣轄區內抽水站、水閘門改善修繕等汰舊換新	水利處	水利處	15,000	0	0	0	0	0	107060 1	107062 5	107063 0	107071 5	107103 1	107113 0	107123 1				基本設計資料 已完成。	7/10召開 基本設計 書圖審查 會。
雲林縣	c006-3-1	辦理雨水建設及維護修繕工程	水利處	水利處	5,000	0	0	0	0	0	107060 1	107050 8	107062 9	107092 8	107103 1	107113 0	107123 1				廠商 107.06.30提 送修正後基本 設計和細部設 計	請公所積 極趕辦
雲林縣	c007-2-2	加強辦理本縣治山防災計畫工程	水利處	水利處	2,820	120	0	120	0	100	107053 1	107051 4	107063 0	107083 1	107103 1	107123 1	107123 1				預算書送府審 核中	審核完成 後即辦理 招標程序
雲林縣	c007-2-3	辦理重劃區外山坡地範圍內農路維護改善計畫工程	水利處	水利處	12,133	0	0	0	0	0	107053 1	107051 4	107063 0	107083 1	107103 1	107123 1	107123 1				預算書送府審 核中	審核完成 後即辦理 招標程序
雲林縣	c008-2-3-1	垃圾車汰換計畫	環保局	環保局	15,000	0	0	0	0	0	107063 0		107063 0	107080 1	107113 0	107113 0	107123 1				未達公告三家 以上，因此流 標	辦理第二 次招標公 告
雲林縣	c008-5-2	「城鎮之心工程計畫」政策引導型補助計畫-雲林縣西螺鎮	城鄉發展 處	城鄉發展 處	20,000	0	0	0	0	0	107053 1		107063 0	107070 1	107093 0	107123 1	108022 8				因社區提出較 多修正意見，	已排定 6/15與地

		捕心社區環境景觀改造計畫																			致 5/31 無法完 成細設	方召開說 明會，後 續將請設 計公司儘 速定案
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------------------------

13. 嘉義縣

嘉義縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 14.82 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
251	14.82	0	473,508.36 7	249.42	31.96	247	243	238	236	187	199	44	110	8	44	7	40

本年度基本設施補助經費 14.82 億元(中央補助 14.82 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 251 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 189,843.937 仟元，預算實際支用數 344,382.688 仟元，已執行應付未付數 127,203.044 仟元，發包結餘數 1,922.635 仟元，合計預算執行數 473,508.367 仟元，預算執行率 249.42%，預算達成率 31.96%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,481,539 仟元，縣(市)執行率 249.42%，預算達成率 31.96%。
- 依標案執行情形進度區分：251 件標案，已設計完成者 243 件，已發包決標者 236 件，已開工者 199 件，施工進度已達 50%者 110 件，已完工者 44 件，已驗收完成者 40 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，251 件標案計有 13 件落後，落後比率 5.18%。
落後原因：
1. 107 年 6 月落後標案 13 件，屬預算執行未達 80%者 3 件，屬查核點進度落後者 7 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 3 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 1 件、因天然因素落後者 2 件、其他因素落後者 8 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 31.96%，較平均預算達成率 36.76%落後 4.80 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費(31.24%)、補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、道路養護及道安計畫(18.85%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(36.60%)、水利建設經費(16.92%)、農業建設經費(24.21%)、公有建物及設施經費(21.47%)等七類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 13 件落後標案，分屬地

政處重劃科(3件)、建設處道路工程科(1件)、建設處道路養護科(3件)、消防局(4件)、教育處國民教育科(1件)、警察局(1件)等執行案件。請嘉義縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

嘉義縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫										2	2			4
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設														0
c007. 農業建設												3		3
c008. 公有建物 及設施	1	1										2		4
c009. 其他建設				1								1		2

嘉義縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策	
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際			
嘉義縣	c004-1-7	嘉義縣縣道橋梁檢測及維修作業	建設處	建設處道路工程科	4,500	0	0	0	0	0	107050	107060	107063		107093		107103		107113		107123		1	因本縣橋梁經檢視原需辦理維修橋梁接近一百座橋，初勘討論與現地勘查橋梁，部份由行善團或本府水利處經費改建，因橋梁數量眾多且現地確認廢時。於六月才設計完成橋梁。	儘速辦理。
嘉義縣	c004-1-8	公路防災資訊系統簡訊專線租賃及簡訊費用	建設處	建設處道路養護科	100	20	4	4	0	38	107010	107010	107033	107033	107063		107103		107113		107123		1	災害發生時簡訊傳送，無災害發生	災害發生時簡訊傳送，無災害發生
嘉義縣	c004-1-9	辦理本縣易致災路段及橋梁災	建設處	建設處道	4,220	700	0	147	0	21	107010	107010	107010	107010	107010	107010	107083		107123		107123			災害發生時值	災害發

		害預警巡視、巡查等相關執勤業務		路養護科							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	班及巡查，未有災害發生	生時值班及巡查，未有災害發生
嘉義縣	c004-1-11	縣道養護工程(含道路改善、拓寬、橋梁路面養護)	建設處	建設處道路養護科	10,000	5,000	1,200	1,000	0	44	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107073 1	107123 1	107123 1	依實際派工	依現實際需求派工施工	
嘉義縣	c007-1-1	農地重劃區內農路之整修及改善	地政處	地政處重劃科	15,000	0	0	0	0	0	107053 1		107062 9		107092 8		107111 5	107121 4	107123 1	農委會尚未核定補助案件	俟農委會核定後儘速辦理	
嘉義縣	c007-1-2	農地重劃區農水路維護	地政處	地政處重劃科	15,000	0	0	0	0	0	107053 1		107062 9		107092 0		107110 9	107121 4	107122 8	農委會尚未核定補助案件	俟農委會核定案件後儘速辦理	
嘉義縣	c007-1-3	早期農地重劃區農水路更新改善	地政處	地政處重劃科	3,000	300	150	0	0	50	107050 1	107043 0	107062 9		107081 5		107093 0	107120 1	107123 1	工程案件送內政部審核需較多時日	加緊趕辦中	
嘉義縣	c008-1-1-2	朴子分局東石分駐所辦公廳舍改建工程	警察局	警察局	6,000	0	10	0	0	100	107063 0		107083 1		107093 0		107120 1	107121 5	107123 1	本局因辦理2018年臺灣燈會，期間自2月16日至3月11日長達24日，燈會期間因專案勤務繁重(內勤支援外	督促承攬建築師事務所加速辦理規劃設計作業，以期趕上預定進度。	

																						勤)，致影響進度。另本案因採「限制性招標」及「準用最有利標」方式辦理委託勘測規劃、設計及監造技術服務採購，依規定須於招標前成立「採購評選委員會」亦因執行臺灣燈會致花費較長時間 與各評選委員聯繫確定本案評選時間，故進度稍落後。	
嘉義縣	c008-1-2-1	太保消防分隊廳舍興建工程	消防局	消防局	3,789	0	0	0	0	0	106101 1	106101 1	107063 0	107083 1	107111 5	107122 3	107123 1	(1)本案興建用地計有2筆，分別為「太保市祥和段1223-2地號」及「太保市祥和段	(1)本案設計已於106年10月11日完成核定，惟建				

																						業，俾本局能於建築法第36條規定之改正期限內補正送請建管單位復審核發建築執照。
嘉義縣	c008-1-2-3	東石消防分隊廳舍興建工程	消防局	消防局	5,845	0	0	0	0	0	1061220	1061220	1070630		1070831	1071130	1071223	1071231			(1)本案建造執照業於本(107)年5月24日取得，為降低履約過程中變更契約之機率，本局將俟五大管線單位審核作業完成後，再廣辦工程採購招標作業。 (2)預計本(107)年8月完成五大管線	(1)本案建造執照業於本(107)年5月24日取得，為降低履約過程中變更契約之機率，本局將俟五大管線單位審核作業完成後，再廣

																					單位審核作業後，本(107)年9月辦理工程採購招標作業。	續辦理工程採購招標作業。(2)預計本(107)年8月完成五大管線單位審核作業後，本(107)年9月辦理工程採購招標作業。
嘉義縣	c008-5-3	老舊校舍拆除計畫	教育處	教育處國民教育科	500	50	0	0	0	0	107063 0	107083 1	107103 1	107113 0	107123 1	107123 1					本年度尚無學校申請校舍拆除經費	電子郵件通知各校如有校舍拆除需求，且於年底前可發包者，盡速辦理建物報廢

																									及拆除經費動支、發包等
嘉義縣	c009-1-14	設施及機械設備養護費	消防局	消防局	800	800	504	80	0	73	1070504	1070501	1070629	1070613	1070731	1070629	1071031	1071207	1071228	對系統不熟悉，致預定經費支出設定錯誤。	重新設定經費支出				
嘉義縣	c009-1-29	汰換消防衣帽鞋櫃	消防局	消防局	400	0	0	0	0	0	1070511	1070511	1070601	1070601	1070629		1071115	1071130	1071231	本案採取最有利標精神，經2次開標，投標廠商皆未符合本局需求。	預計於7月10日進行第3次開標。				

14. 屏東縣

屏東縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 21.09 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件 數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
134	21.07	0.02	693,715.49 8	108.82	32.90	134	131	131	127	85	90	60	72	47	51	46	50

本年度基本設施補助經費 21.09 億元(中央補助 21.07 億元，地方自籌 0.02 億元)，截至 6 月底止，共有標案 134 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 637,462.647 仟元，預算實際支用數 465,540.052 仟元，已執行應付未付數 228,175.446 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 693,715.498 仟元，預算執行率 108.82%，預算達成率 32.90%。
 - 依執行機關區分：由縣(市)執行 2,108,858 仟元，縣(市)執行率 108.82%，預算達成率 32.9%。
 - 依標案執行情形進度區分：134 件標案，已設計完成者 131 件，已發包決標者 127 件，已開工者 90 件，施工進度已達 50%者 72 件，已完工者 51 件，已驗收完成者 50 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，134 件標案計有 7 件落後，落後比率 5.22%。
落後原因：
 - 107 年 6 月落後標案 7 件，屬查核點進度落後者 4 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 3 件。
 - 落後原因分析：因拆遷補償落後者 1 件、因招標作業落後者 4 件、其他因素落後者 2 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 32.90%，較平均預算達成率 36.76%落後 3.86 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費(27.31%)、補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、道路養護及道安計畫(28.21%)、水利建設經費(29.53%)、農業建設經費(30.00%)、公有建物及設施經費(26.59%)、其他建設經費(34.35%)等七類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 7 件落後標案，分屬工務處(2 件)、水利處(2 件)、

消防局(2件)、警察局(1件)等執行案件。請屏東縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

屏東縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設				1								1		2
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施				2										2
c009. 其他建設			1	1								1		3

屏東縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
屏東縣	c006-2-6	水利地與河道海堤整理	水利處	水利處	2,000	600	0	0	0	0	107060 1	107070 6	107063 0	107070 6	107093 0	107070 6	107103 1		107113 0		107123 1		本案視發生案件辦理	儘速辦理後續事宜
屏東縣	c006-2-8	屏東縣簡水系統輔導管理計畫	水利處	水利處	950	285	0	0	0	0	107050 1		107051 5		107060 1		107063 0		107113 0		107123 1		已收集資料完畢，簽辦計畫中	預計7月底前簽准並上網辦理招商
屏東縣	c008-1-1-1	建國派出所新建工程	警察局	警察局	9,000	0	0	0	0	0	107063 0		107083 1		107093 0		108033 1		108081 5		108093 0		因本案經費未列入預算書經費，故秉府簽陳縣府辦理墊付作業，致招標作業落後。	於107年5月31日委託規劃設計已議價完成並於6月19日訂定契約，於9月27日完成規劃設計工作。
屏東縣	c008-1-	長治、枋寮、車城消防分隊辦	消防局	消防局	12,000	3,240	0	3,240	0	100	107060	107052	107063	107071	107081		107113		107122		107123		已於6月19日	預定於7

	2-1	公廳舍整修工程									5	9	0	2	5		0	0	1	公告上網，並於7月3日工程開標，僅一家廠商投標未達三家故流標。	月12日辦理第二次工程開標。
屏東縣	c009-1-11	縣道200線(東門橋2K+200至5K+300)拓寬工程	工務處	工務處	18,191	4,913	2,244	2,669	0	100	1061130	1061130	1070308	1070308	1070510		1070930	1071130	1071231	徵收作業尚未完成無法進場施作	已積極辦理中
屏東縣	c009-1-12	屏47線道路拓寬工程	工務處	工務處	44,267	12,000	0	0	0	0	1070531	1070531	1070630		1070831		1071031	1071130	1071231	6月份上網招標流標，目前準備辦理重新招標中	招標完成後請廠商儘速辦理開工事宜
屏東縣	c009-1-32	特搜大隊營區環道圍籬綠美化照明工程	消防局	消防局	10,000	2,700	0	2,700	0	100	1070605	1070522	1070630	1070712	1070815		1071130	1071220	1071231	已於6月21日公告上網，並於7月3日工程開標，僅一家廠商投標未達三家故流標。	預定7月12日辦理第二次工程開標。

15. 臺東縣

臺東縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 14.03 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
151	13.7	0.34	388,947.62 2	109.82	27.72	137	143	131	137	104	112	65	74	46	52	30	40

本年度基本設施補助經費 14.03 億元(中央補助 13.7 億元，地方自籌 0.34 億元)，截至 6 月底止，共有標案 151 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 354,169.154 仟元，預算實際支用數 385,057.622 仟元，已執行應付未付數 3,300 仟元，發包結餘數 590 仟元，合計預算執行數 388,947.622 仟元，預算執行率 109.82%，預算達成率 27.72%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,400,539 仟元，鄉鎮公所執行 2,832 仟元，縣(市)執行率 109.83%，預算達成率 27.62%；鄉鎮公所執行率 108.32%，預算達成率 73.59%。
- 依標案執行情形進度區分：151 件標案，已設計完成者 143 件，已發包決標者 137 件，已開工者 112 件，施工進度已達 50%者 74 件，已完工者 52 件，已驗收完成者 40 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，151 件標案計有 19 件落後，落後比率 12.58%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 19 件，屬預算執行未達 80%者 8 件，屬查核點進度落後者 10 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
 - 落後原因分析：因規劃設計落後者 3 件、因預算編列落後者 1 件、因天然因素落後者 1 件、其他因素落後者 13 件及未填寫落後原因 1 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 27.72%，較平均預算達成率 36.76%落後 9.04 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(17.83%)、道路養護及

道安計畫(0.80%)、公有建物及設施經費(0.17%)、其他建設經費(29.96%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有19件落後標案，分屬文化處(1件)、民政處(1件)、建設處(12件)、消防局(1件)、國際發展及計畫處(2件)、農業處(1件)、關山鎮公所(1件)等執行案件。未填寫落後原因1件，請臺東縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

臺東縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化											1		1
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫	1										2		3
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設	1										4		5
c007. 農業建設											1		1
c008. 公有建物 及設施											1		1
c009. 其他建設	1								1	1	4	1	8

臺東縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際												
臺東縣	c001-1-3	臺東縣史增修計畫	文化處	文化處	4,554	2,760	25	0	0	1	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107010 1	107073 1	107083 1	107093 0			期末報告紙本預計於7月6日前繳交供審查，故尾款尚不能撥付	將盡速完成審閱及修訂事宜	
臺東縣	c004-1-1	107年全縣縣鄉道路橋樑基本資料及目視安全檢測工作	建設處	建設處	3,000	0	0	0	0	0	107051 5	107051 5	107061 5	107070 5	107063 0		107103 1	107121 5	107123 1			因使用最有利標行政程序較為繁瑣	儘速辦理	
臺東縣	c004-1-2	道路交通秩序與交通安全改進方案號誌標線標誌增劃設工作	建設處	建設處	1,000	0	0	0	0	0	107053 1	107062 7	107062 9		107073 1		107092 8	107113 0	107123 1			規劃設計中	儘速辦理	
臺東縣	c004-1-6	全縣橋樑維修、維護工程	建設處	建設處	10,000	0	0	0	0	0	107053 1		107063 0		107072 0		107093 0	107113 0	107123 1			審核預算書初稿延誤	後續招標作業趕辦	
臺東縣	c006-2-6	辦理縣管河川、區排、堤防、排水之興建及新設照明設備工程等相關業務	建設處	建設處	114,320	0	12	0	0	100	107033 0	107052 2	107043 0	107061 2	107053 1	107070 2	107123 1	107123 1	107123 1			分案執行中	積極趕辦	
臺東縣	c006-2-8	流域綜合治理計畫特別預算用地費配合款	建設處	建設處	123,205	123,205	119,699	0	0	97	106011 9	106011 9	106021 8	106021 8	106021 8	106021 8	106032 1	106032 1	106032 1	106032 1	107062 9		因南王左岸二號堤防加高加強於6月25日	積極趕辦

																					內政部退回修正中、卑南左岸堤防加高加強於6月26日送至內政部審查中，故無法發放補償金	
臺東縣	c006-3-1	辦理兩水下資訊系統建置	建設處	建設處	3,000	0	0	0	0	0	1070601	1070629	1070601	1070601	1070701	1070917	1071001				後續擴充簽准中	後續擴充積極趕辦
臺東縣	c006-3-2	辦理兩水下水道維護工作	建設處	建設處	6,000	1,000	0	0	0	0	1070228	1070208	1070315	1070306	1070330	1070320	1070831	1071031	1071231		1案執行中，1案採購中	加緊趕辦
臺東縣	c006-3-3	辦理兩水下水道疏濬清淤維護等	建設處	建設處	3,617	500	0	0	0	0	1070331	1070301	1070531	1070530	1070629	1070615	1071031	1071130	1071231		相關機關之請款資料延後送交本府	督促鄉鎮市公所
臺東縣	c007-2-7	107年度辦理農業各項公共設施水土保持維護改善工程	農業處	農業處	20,000	0	8	0	0	100	1070601	1070402	1070630	1070731	1070930	1071130	1071231				本計畫係辦理公所、議員、代表及民眾建議辦理之水土保持設施工程，因案件數眾多且分梯次辦理規劃設計，因此，前期之執行率難以確實呈現	儘速辦理

臺東縣	c008-1-2-1	臺東大隊南王分隊、關山大隊關山分隊及延平分隊、大武大隊大武分隊而翻補強改善工程經費	消防局	消防局	15,000	0	98	0	0	100	1070401	1070330	1070515	1070507	1070601	1070731	1071015	1071231	縣編列預算不足，為爭取更多預算（前瞻計畫）以保障本局外勤同仁生活安全，致執行進度落後。	1.積極辦理工程案招標作業。2.工程決標後，請監造單位督促承傷依契約規定每月申請估驗計價。			
臺東縣	c009-1-11	永續智慧社區創新實證示範計畫-臺東智慧友善園區	國際發展及計畫處	國際發展及計畫處	20,000	8,000	0	0	0	0	1070331	1070417	1070430	1070528	1070430	1070528	1070630	10710638	1071031	1071031	6/21完成第一階段審查，7/5奉核，刻正辦理撥付第一期事宜	6/21完成第一階段審查，7/5奉核，刻正辦理撥付第一期事宜	
臺東縣	c009-1-13	1999 話務中心系統執行計畫	國際發展及計畫處	國際發展及計畫處	6,500	220	67	0	0	30	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1070101	1071031	1071231	1071231				
臺東縣	c009-1-17	議員建議補助政府機關學校辦理活動經費及辦理其他計畫	民政處	民政處	18,000	9,500	4,365	0	0	46	1070228	1070228	1070430	1070330	1070629	1070501	1070831	1070601	1071031	1070630	1071231	受補助單位申請核銷進度較慢	建議於時效內改善

臺東縣	c009-1-19-11	議員建議--107年臺東縣關山鎮樂樂棒球錦標賽	民政處	關山鎮公所	50	0	0	0	0	0	1070329	1070329	1070409	1070409	1070501	1070501	1070525	1070525	1070602	1070831	因6月1日下午關山鎮大雨，場地泥濘不堪，擔憂如期舉辦易造成人員受傷，故延後辦理。已先向縣府補助單位電話告知。	將於近期邀請相關單位人員召開會議，重新訂定辦理期程。已於107年6月27日關山鎮文字1070007723號函發函縣府，改期於9月1日辦理。俟縣府核定後申請期程異動。
臺東縣	c009-1-28	山海鐵道維護管理業務	建設處	建設處	3,530	1,630	1,409	0	0	86	1070228	1070330	1070430	1070430	1070630		1070831		1071031	1071231	配合自然軸帶計畫及回驛計畫工程施作範圍。	配合工程施作範圍調整維護整修範圍，避免重複施作

																							浪費公 幣。
臺東縣	c009-1- 29	知本污水處理廠操作維護管 理業務	建設處	建設處	12,450	6,225	570	0	0	9	107033 1	107033 1	107043 0	107043 0	107053 1	107053 1	107093 0	107113 0	107123 1	107123 1	本案為三年代 操作(目前106 年保留款已支 付完畢)	積極趕辦	
臺東縣	c009-1- 30	房屋基地、地上物拆遷補償 救濟及其他土地購置費用	建設處	建設處	10,000	10,000	0	0	0	0	107033 0	107031 9	107043 0		107053 1		107062 9	107083 1	107103 1	107103 1	經查明尚有1 筆土地需補 查，已定於 6/13日辦理， 擬於六月底前 完成所有查估 資訊，並送地 用科辦理發放 等後續事宜	盡速辦理	
臺東縣	c009-1- 31	大武觀光漁港觀光休息區興 建計畫	建設處	建設處	14,040	350	0	0	0	0	107043 0	107030 8	107053 1	107053 0	107083 1		107123 1	107123 1	107123 1	107123 1	本案修訂基本 設計後於6月 1日送至本府 召開審查會議 後，6/28日營 建署召開審查 會，本案尚未 核定。	待營建署 審查通過 後，盡速 辦理後續 事宜。	

16. 花蓮縣

花蓮縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 16.03 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
329	15.79	0.24	562,438.59 7	234.65	35.08	322	313	314	300	215	247	77	115	25	59	20	51

本年度基本設施補助經費 16.03 億元(中央補助 15.79 億元，地方自籌 0.24 億元)，截至 6 月底止，共有標案 329 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 239,693.069 仟元，預算實際支用數 390,762.875 仟元，已執行應付未付數 167,395.876 仟元，發包結餘數 4,279.846 仟元，合計預算執行數 562,438.597 仟元，預算執行率 234.65%，預算達成率 35.08%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,603,105 仟元，縣(市)執行率 234.65%，預算達成率 35.08%。
- 依標案執行情形進度區分：329 件標案，已設計完成者 313 件，已發包決標者 300 件，已開工者 247 件，施工進度已達 50%者 115 件，已完工者 59 件，已驗收完成者 51 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，329 件標案計有 26 件落後，落後比率 7.90%。
落後原因：
1. 107 年 6 月落後標案 26 件，屬預算執行未達 80%者 7 件，屬查核點進度落後者 15 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 4 件。
2. 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 4 件、因施工作業落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 15 件。
管考建議：截至 6 月預算達成率為 35.08%，較平均預算達成率 36.76%落後 1.68 個百分點，執行情形待加強。其中文化經費(39.71%)、道路養護及道安計畫(5.72%)、水利建設經費(29.25%)、其他建設經費(35.25%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 26 件落後標案，分屬人事處(3 件)、文化局(1 件)、客家事務處(1 件)、建設處(2 件)、原住民行政處(5 件)、消防局(3 件)、動植物防疫

所(1件)、農業處(5件)、衛生局(2件)、觀光處(3件)等執行案件。請花蓮縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

花蓮縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化				1							2		3
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫	1												1
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設	1			1							3		5
c008. 公有建物 及設施	2				1				1				4
c009. 其他建設	1			2							10		13

花蓮縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
花蓮縣	c001-1-10	辦理花蓮縣文化创意產業發展計畫	文化局	文化局	1,500	280	206	0	0	73	107010 1	107010 1	107030 8	107030 8	107051 1	107051 1	107073 1		107113 0	107123 1			設計師帶路及文創營第一期款尚未撥付	已完成議價，將盡速依契約第一期款付款條件撥付。
花蓮縣	c001-1-28	107年原住民藝術文化活動行銷推廣計畫	原住民政處	原住民政處	2,800	400	50	30	0	20	107012 2	107012 2	107021 5	107021 5	107021 5	107021 5	107063 0		107123 1	107123 1			本案經費250萬支應本府觀光處辦理「夏戀嘉年華-部落巡旅」活動，尚未核銷，且因填報經費超過總經費50%，未能填列系統，致進度落後。	依據本府107年5月24日TR1070000952號簽案辦理經費勻支。
花蓮縣	c001-1-34	辦理花蓮縣深耕客家文化措施	客家事務處	客家事務處	1,500	0	0	0	0	0	107062 9		107063 0		107093 0		107103 1		107121 5	107123 1			因招標廠商尚未檢送招標文件而導致落	已催促廠商盡快檢送資料。

																					後。		
花蓮縣	c004-1-1	辦理鳳林鎮箭瑛大橋改建工程	建設處	建設處	35,750	0	0	0	0	0	107063 0	107083 1	107093 0	107111 5	107120 1	107123 1						因橋梁工程設計較一般平面道路複雜	儘速趕辦
花蓮縣	c007-2-1	辦理無毒農業園區設施興修	農業處	農業處	1,000	0	0	0	0	0	107060 1	107053 0	107063 0	107093 0	107103 1	107113 0	107123 1					本案於107年6月28日辦理第一次招標，因投標文件不符合規定，廢標。	已訂於107年7月12日辦理第二次招標。
花蓮縣	c007-2-15	辦理縣境內景觀重點、主要道路兩旁、閒置公有土地空間等綠美化景觀工程	農業處	農業處	4,000	0	87	97	0	100	107061 5	107062 9	107063 0	107071 5	107103 1	107121 5	107123 1					本處於107年6月20日時函請設計單位辦理「知卡宜公園休憩設施修繕工程」規劃設計作業。	設計單位於107年6月29日申報設計竣工，將盡速辦理預算書圖審查及後續工程發包作業，以提升計畫執行績效。
花蓮縣	c007-2-16	美崙山公園公共設施新建及維護	農業處	農業處	2,850	0	92	0	0	100	107061 5	107063 0	107071 5	107103 1	107121 5	107123 1						尚在盤點美崙山損壞需辦理修繕的設施中。	將盡速辦理後續規劃設計，以提升計畫執行績效。
花蓮縣	c007-2-	知卡宜綠森林親水公園及苗圃	農業處	農業處	450	0	70	0	0	100	107061	107063	107071	107103	107121	107123						尚在盤點知卡	將盡速辦理

	17	環境設施後續改善工程									5	0		5	1	5	1	宣綠森林親水公園及苗圃環境設施須修繕之設施。	相關規劃設計以提升計畫執行績效。		
花蓮縣	c007-2-18	辦理農村景觀專區入口意象、農村發展規劃及建設計劃	農業處	農業處	200	0	0	0	0	0	107061 5	107063 0		107071 5	107103 1	107121 5	107123 1	尚在規劃相關建設地點中。	將盡速辦理相關規劃設計以提升計畫執行績效。		
花蓮縣	c008-1-2-4	萬榮救助技能訓練場新建高低塔工程	消防局	消防局	1,375	200	0	0	0	0	107013 1	107010 1	107022 8	107010 1	107053 1	107030 9	107083 1	107122 8	107123 1	細部設計尚未完成	李志城建築師事務所預定於107年7月中旬提報細部設計報告。
花蓮縣	c008-1-2-6	壽豐分隊增建工程規劃設計費	消防局	消防局	8,257	200	98	0	0	49	107062 2	107010 4	107063 0		107093 0		107122 8	107123 1	107123 1	因變更設計，重起設計作業，細部設計尚未核定。	已召開細部設計審查會議，並責請廠商儘速修正。
花蓮縣	c008-1-2-8	豐濱分隊遷建工程相關費用	消防局	消防局	1,500	100	5	0	0	5	107053 1	107032 9	107063 0	107053 1	107093 0	107061 4	107122 1	107122 1	107123 1	預算不足支應服務費用。	行政院已核定本案花東地區永續發展基金補助，刻正辦

																							理追加預算 程序中。
花蓮縣	c008-5-33	衛生局電梯設施工程	衛生局	衛生局	1,707	0	96	0	0	100	1070228	1070228	1070430	1070529	1070510		1070831		1071031	1071130	尚未辦理開工	積極趕辦開 工事宜	
花蓮縣	c009-1-12	人員專案加班費實施計畫(人事費)	人事處	人事處	180	90	19	0	0	21	1070111	1060103	1070320	1070320	1070320	1070320	1070920		1071220	1071228	縣長室加班人員未提出申請	請加班人員 按月提出申請	
花蓮縣	c009-1-13	人員專案加班費實施計畫(業務費)	人事處	人事處	162	81	43	0	0	53	1070111	1060103	1070320	1070320	1070320	1070320	1070920		1071228	1071228	縣長室加班人員未提出申請	請加班人員 按月提出申請	
花蓮縣	c009-1-16	花蓮縣政府購置機關表單簽核流程自動化系統登錄作業計畫	人事處	人事處	400	0	0	0	0	0	1070531		1070630		1070930		1071031		1071031	1071231	編列經費不足	研議辦理先 期變更計畫	
花蓮縣	c009-1-25	辦理全縣原住民婦女意見領袖研習費用	原住民政處	原住民政處	500	100	0	0	0	0	1070531		1070630		1070630		1070930		1071130	1071231	未正確預估辦理時間	變更預定期 程	
花蓮縣	c009-1-28	辦理原住民特色產業聯合展銷推廣計畫	原住民政處	原住民政處	1,000	550	0	0	0	0	1070301	1070511	1070601		1070629		1070701		1070731	1070930	聯合豐年節在七月中下旬舉辦,展銷推廣計畫已完成研擬	預計 107/7/7 辦理完成招商(抽籤)作業	
花蓮縣	c009-1-30	辦理原住民手工藝及農特產品行銷展售計畫	原住民政處	原住民政處	1,000	0	0	0	0	0	1070531	1070511	1070620		1070630		1070930		1071130	1071231	原農市集在10月中下旬舉辦,展銷推廣計畫仍在研擬中	請主辦人員 積極趕辦	
花蓮縣	c009-1-	辦理光華工業區後期土壤及地	觀光處	觀光處	3,000	0	0	0	0	0	107053		107063		107073		107103		107103	107123	本府尚在辦理	本案監測計	

	56	下水檢測相關費用									1	0		1		1				1	1	本案招標作業 畫書於107年 6月26日,刻 正辦理本案 需求書撰寫 及招標作業
花蓮縣	c009-1-67	原住民族部落道路、排水溝及擋土牆等設施維護改善工程	原住民政處	原住民政處	3,000	0	480	531	0	100	107043 0	107043 0	107053 1		107063 0		107093 0		107113 0	107123 1	本計畫尚有 「卓溪鄉崙 山、上清水及 古風等3部落 基礎設施改善 工程」未發 包,經4次招 標均流標,檢 討預算再次重 新公告。	本案已檢討 預算重新公 告,並於 6/26第1次 開標流標, 雖為流標, 但已有廠商 投標,預計 7/10第2次 開標。
花蓮縣	c009-1-82	花蓮地區水資源回收中心二沉池驅動設備汰換	建設處	建設處	1,600	200	0	0	0	0	107022 2	107022 2	107030 6	107030 6	107030 6	107030 6	107073 1		107103 1	107113 0	於3月6日決 標,因是勞務採 購	已經積極在 辦理
花蓮縣	c009-1-99	辦理觀光設施維護修繕工程	觀光處	觀光處	505	0	66	0	0	100	107053 1	107032 0	107063 0		107081 5		107103 1		107113 0	107123 1	規劃設計內容 須修正	儘速辦理規 劃設計作業
花蓮縣	c009-1-107	縣府全球資訊網站升級建置	觀光處	觀光處	1,500	0	0	0	0	0	107053 1	107070 3	107063 0	107070 4	107073 1		107083 1		107093 0	107103 1	因會辦主計處 後相關招標文 件需進行修改 造成落後	於7月3日簽 准完成
花蓮縣	c009-1-	辦理本縣禽流感防治與監控計	動植物防	動植物防	2,150	0	0	0	0	0	107033	107051	107041		107043		107073		107110	107121	業於107年6 擬辦理第3次	

	115	畫經費	疫所	疫所							1	6	6		0		1		6	4	月5日辦理第1次開標，因無廠商投標而流標，於107年6月11日辦理第2次上網公開招標公告，等標期10天，於107年6月21日，辦理第2次開標，因無廠商投標而流標。	上網公開招標公告，並積極向相關學術單位邀標。
花蓮縣	c009-1-153	補助醫療輔具及醫療費	衛生局	衛生局	889	288	209	0	0	72	1070101	1070101	1070531	1070531	1070731		1070930		1071130	1071220	受補助對象條件限制，申請案件不如預期。	結合13衛生鎮所及本縣長照中心，設置受理申請窗口，增加民眾申請輔具之可近性。

17. 澎湖縣

澎湖縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 7.65 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
98	7.65	0	233,321.28 3	103.57	30.48	98	90	98	86	73	68	22	29	5	12	4	11

本年度基本設施補助經費 7.65 億元(中央補助 7.65 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 98 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 225,286.652 仟元，預算實際支用數 221,124.555 仟元，已執行應付未付數 11,898.378 仟元，發包結餘數 298.35 仟元，合計預算執行數 233,321.283 仟元，預算執行率 103.57%，預算達成率 30.48%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 765,409 仟元，縣(市)執行率 103.57%，預算達成率 30.48%。
- 依標案執行情形進度區分：98 件標案，已設計完成者 90 件，已發包決標者 86 件，已開工者 68 件，施工進度已達 50%者 29 件，已完工者 12 件，已驗收完成者 11 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，98 件標案計有 22 件落後，落後比率 22.45%。
落後原因：
 - 107 年 6 月落後標案 22 件，屬預算執行未達 80%者 4 件，屬查核點進度落後者 13 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 5 件。
 - 落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因招標作業落後者 3 件、因驗收作業落後者 1 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 12 件。
 管考建議：截至 6 月預算達成率為 30.48%，較平均預算達成率 36.76%落後 6.28 個百分點，執行情形待加強。其中補助貧瘠鄉鎮市(49.40%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(16.38%)、水利建設經費(0.52%)、農業建設經費(3.13%)、公有建物及設施經費(3.15%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 22 件落後標案，分屬工務處(8 件)、文化局(1 件)、民政處(2 件)、林務公園管理

所(2件)、建設處(1件)、家畜疾病防治所(1件)、旅遊處(2件)、消防局(1件)、農漁局(1件)、環保局(3件)等執行案件。請澎湖縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

澎湖縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫	1													1
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設	2										4			6
c007. 農業建設	1													1
c008. 公有建物 及設施	1			1							1			3
c009. 其他建設				2		1			1		7			11

澎湖縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
澎湖縣	c004-2-3	辦理各鄉市村里道路、維護工程	工務處	工務處	12,000	0	0	0	0	0	107060 5	107042 7	107063 0		107083 1		107103 1		107113 0		107123 1		細部設計圖及預算書有誤，已修正完成，即刻辦理發包作業。	加速發包作業。
澎湖縣	c006-1-1	辦理各鄉市區域、中小排水路及村里溝渠排水疏浚等改善工程、中小排緊急搶修修護工程水利構造物檢查與工程設	工務處	工務處	19,680	0	98	0	0	100	107053 1		107063 0		107081 5		107093 0		107113 0		107123 1		已於107年6月7日完成初步設計審查，尚未完成細部設計審查作業。	廠商已提送細部設計預算書圖，預計107年7月6日召開細部設計審查會議。
澎湖縣	c006-1-2	補助各鄉市區域及中小排水路清淤疏浚工程	工務處	工務處	500	0	0	0	0	0	107053 1		107063 0		107073 1		107093 0		107113 0		107123 0		中央檢核本府提報之請款資料，工管費計算有誤，已退回本府修正，	已退回收據、納入預算證明及請款明細表予公

																					尚無法請款。	所辦理請款事項，擬請公所加速辦理請款事宜。
澎湖縣	c006-1-3	補助各鄉市區及中小排水路清淤疏浚工程(疏浚清淤部分)	工務處	工務處	7,905	0	0	0	0	0	107043 0	107063 0	107063 0	107083 1	107123 1	107123 1					中央檢核本府提報之請款資料，工管費計算有誤，已退回本府修正，尚無法請款。	已退回收據、納入預算證明及請款明細表予公所辦理請款事項，擬請公所加速辦理請款事宜。
澎湖縣	c006-1-4	山水西衛污水處理廠、大倉污水淨化設施代操作及修繕維護費	工務處	工務處	3,500	970	0	0	0	0	107010 1	107010 1	107022 6	107022 6	107030 1	107030 1	107073 1	107070 6	107122 5	107123 1	配合契約價金給付	依契約給付規定辦理
澎湖縣	c006-3-1	辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程	工務處	工務處	14,000	7,700	0	0	0	0	107053 0	107062 9	107081 5	107101 5	107113 0	107123 1					尚於細部設計審查中	本案預定於107年7月6日召開細設審查會，

																						後續將儘速辦理發包作業。
澎湖縣	c006-3-2	辦理雨水下水道及排水疏濬改善工程(疏浚淤積部分)	工務處	工務處	1,000	500	3	147	0	30	107033 0	107032 0	107043 0	107032 2	107051 5	107040 3	107092 8	107122 0	107123 1	因尚未有疏濬案件，故未達付款條件。	因承商未申請辦理撥款。	
澎湖縣	c007-2-1	補助湖西鄉公所辦理湖西鄉南寮農路新建工程經費及補助望安鄉公所辦理農澎望003農路改善工程經費	農漁局	農漁局	5,000	0	0	0	0	0	107043 0	107043 0	107053 1	107111 5	107113 0	107122 0	107123 1	湖西鄉公所完成法定預算延宕	待法定預算結束儘速趕辦			
澎湖縣	c008-1-1-3	消防廳舍整建	消防局	消防局	6,000	100	98	0	0	98	107062 9	107062 9	107113 0	107123 1	107123 1	107123 1	107123 1	已完成地質鑽探，目前辦理規劃設計及建築師評選作業	107年7月完成委託規劃及設計建築師評選			
澎湖縣	c008-5-3	澎湖縣漁業公共設施建設計畫縣配合款	工務處	工務處	1,800	0	0	0	0	0	107053 1	107062 9	107073 1	107103 1	107121 7	107123 1	前期因以最有利標方式辦理勞務採購，費時較久。後因協調地方建物用地，會勘及審查會議等，致進度有些微落後。	目前已辦理審查會議及第二次會勘，與地方協調確認施工位址。				
澎湖縣	c008-5-7	興建公立收容所建築物(含行人事處	家畜疾病	5,600	0	0	0	0	0	0	107013	107011	107022	107022	107042	107092	107121	107123	1. 規劃設計廠	1. 為設置		

																						商分別於106年10月23日、107年2月22日、4月17日及6月6日四次提出建造執照申請，目前建照仍審查中。2、由於本項工程為鄰避設施，選擇地點偏僻，公共設施不足(無公共排水溝渠)，建造執照審查不易，已協調相關單位協助排解，使能符合法令規定。	公共溝渠，辦理無償撥用馬公市烏崁新段350及358地號2筆國有地，目前已函送相關撥地表件送財政部國有財產署層轉行政院審核。2.俟建造執照核發後，儘速開工、施工，加強執行，期趕上進度。
澎湖縣	c009-1-5	白沙鄉後寮生命紀念館新建及	民政處	民政處	5,771	3,080	0	0	0	0	107010	107010	107013	107012	107043		107073		107121		107123	107年6月底建	請公所儘

		維運計畫 107 年度經費									1	2	1	2	0		1	4	1	照及五大管線 已審核通過以 至延誤工期	速辦理工 程進度
澎湖縣	c009-1-8	辦理火化塔葬及檢骨進塔獎勵 金	民政處	民政處	40,000	23,000	16,098	0	0	70	107010 1	107010 1	107043 0	107043 0	107062 9		107083 1	107113 0	107123 1	民眾舊墓檢骨 意願低 以致執 行率下降	對民眾宣 導檢骨進 塔
澎湖縣	c009-1-12	107 年度城鎮之心工程計畫	建設處	建設處	8,341	0	0	456	0	100	107041 3	107040 9	107043 0	107060 4	107051 4		107083 1	107121 4	107122 8	因配合細部設 計審查修 正，107 年 4 月 9 日核定後， 至 107 年 5 月 22 日始完成上 網作業。	盡速辦 理，並已 於 107 年 6 月 4 日 完成決 標。
澎湖縣	c009-1-16	補助七美鄉公所辦理對外大宗 建材運補租用民間貨輪經費	旅遊處	旅遊處	2,000	800	0	804	0	101	107010 1	106081 5	107063 0		107093 0		107103 1	107113 0	107123 1	七美鄉公所尚 未辦理請款， 惟累計應付未 付數已達累計 預定支用額 度。	儘速請其 辦理請 款。
澎湖縣	c009-1-19	補助設籍本縣 2 歲以上至未滿 12 足歲孩童搭乘民用航空器 2 折票差額補貼優惠	旅遊處	旅遊處	4,000	1,150	710	0	0	62	107010 1	107010 1	107053 1	107020 1	107093 0		107103 1	107113 0	107123 1	本案係以 107 年度補助設籍 本縣 2 至 11 歲 兒童搭乘民用 航空器票價作 業計畫執行，	本案持續 依計畫執 行，辦理 經費撥 付。

																					原3月至6月 預估值為為 1150000元， 惟實際申請補 貼金額710210 元，故未能如 原規劃經費撥 付。	
澎湖縣	c009-1- 29	垃圾焚化處理費	環保局	環保局	39,140	5,500	0	0	0	0	107021 6	107011 2	107042 7	107050 1	107103 1	107113 0	107123 1				1.因台灣本島 焚化廠(高雄) 歲修及維修， 所以垃圾轉運 至台灣受阻無 法進場焚化。 2.各縣市底渣 再利用計畫去 化管道均嚴重 受阻，連帶導 致再利用機構 處理期程延 宕。	1.已積極 協商其他 縣市之焚 化廠進行 垃圾處 理。2. 請再利用 廠商每月 舉辦推廣 再生粒料 會議進行 推廣。
澎湖縣	c009-1- 31	補助沙灘垃圾清除機具	環保局	環保局	2,223	1,223	0	0	0	0	107043 0	107063 0	107063 0	107093 0	107113 0	107122 0					調整預算編列 科目並列入追 加減預算辦理	儘速辦理
澎湖縣	c009-1-	流動公廁單品(單品公廁及公	環保局	環保局	1,000	550	191	0	0	35	107043	107031	107062	107042	107083	107103	107113	107123			廠商尚未辦理	持續督促

	33	廁器械)相關設施養護經費									0	9	9	6	1		1		0		1	款項撥付	廠商辦理 請款作業
澎湖縣	c009-1-35	辦理澎湖休憩園區新建辦公廳暨附屬建築物工程廣場道路鋪面。(第18屆第5次定期會墊付轉正)	農漁局	林務公園 管理所	2,650	2,650	0	2,650	0	100	107011 5	107010 1	107021 5	107010 1	107030 1	107010 1	107033 1	107031 5	107050 1	107051 2	107053 1	本案經107年6月15日驗收後，尚有缺失待改善，限期至6月30日改善完成。	俟驗收合格後，即可結算付款。
澎湖縣	c009-1-36	銀合歡剷除活化計畫	農漁局	林務公園 管理所	4,500	0	0	0	0	0	107053 1		107061 5		107063 0		107113 0		107123 1		107123 1	目前配合議員建議案件，辦理招標文件及上網公告，尚未完成發包作業。	積極趕辦發包作業
澎湖縣	c009-1-38	澎湖縣演藝廳冷氣空調主機設備更新	文化局	文化局	8,400	3,000	0	3,532	0	118	107020 1	106091 2	107042 3	107051 8	107050 7	107051 8	107051 7		107053 1		107073 1	演藝廳檔期管制	聘請專業技師規劃、設計

18. 基隆市

基隆市 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 35.74 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件 數)		施工進度 達 50% (件數)		完工 (件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
293	35.41	0.33	1,072,508.2 6	113.63	30.01	289	286	278	273	220	225	63	67	6	7	4	3

本年度基本設施補助經費 35.74 億元(中央補助 35.41 億元，地方自籌 0.33 億元)，截至 6 月底止，共有標案 293 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 943,877.834 仟元，預算實際支用數 987,512.613 仟元，已執行應付未付數 74,944.578 仟元，發包結餘數 10,051.069 仟元，合計預算執行數 1,072,508.26 仟元，預算執行率 113.63%，預算達成率 30.01%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 3,224,890 仟元，區公所執行 349,476 仟元，縣(市)執行率 115.26%，預算達成率 28.9%；區公所執行率 103.87%，預算達成率 40.24%。
- 依標案執行情形進度區分：293 件標案，已設計完成者 286 件，已發包決標者 273 件，已開工者 225 件，施工進度已達 50%者 67 件，已完工者 7 件，已驗收完成者 3 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，293 件標案計有 37 件落後，落後比率 12.63%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 37 件，屬預算執行未達 80%者 17 件，屬查核點進度落後者 9 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 11 件。
 - 落後原因分析：因規劃設計落後者 4 件、因招標作業落後者 4 件、因人力需求落後者 2 件、因預算編列落後者 2 件、其他因素落後者 25 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 30.01%，較平均預算達成率 36.76%落後 6.75 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(28.94%)、體育經費

(12.05%)、道路養護及道安計畫(3.56%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(14.66%)、水利建設經費(1.71%)、其他建設經費(34.30%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 37 件落後標案，分屬工務處下水道科(2 件)、工務處土木工程科(5 件)、工務處公用事業科(2 件)、工務處河川水利科(5 件)、工務處養護工程科(4 件)、文化局(5 件)、民政處戶政科(1 件)、交通旅遊處觀光工程科(2 件)、財政處公有財產科(1 件)、動物保護防疫所(2 件)、產業發展處海洋事務科(2 件)、都發處都市更新科(1 件)、暖暖高中(1 件)、環境保護局(3 件)、警察局後勤科(1 件)等執行案件。請基隆市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

基隆市 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化	1										4		5
c002. 體育													0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫	2										3		5
c005. 交通建設											4		4
c006. 水利建設	1										3		4
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施											1		1
c009. 其他建設				4				2	2		10		18

基隆市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際												
基隆市	c001-1-5	文物展陳	文化局	文化局	9,726	1,880	1,220	0	0	65	107033 1	107033 1	107053 1	107053 1	107063 0	107063 0	107103 0	107103 0	107113 0	107113 0	107123 1	107123 1	本年度潮藝術因尋找合適的策展人作業時間較長，至6月才完成策展規劃委託案，故本年度潮藝術活動執行委託案延至6月22日上網公告	潮藝術活動執行委託案將於7月6號開標，預計7月中簽約，本局將加速行政作業流程
基隆市	c001-1-8	大基隆歷史現場再現整合計畫	文化局	文化局	10,000	2,000	1,181	0	0	59	107033 1	107030 6	107041 6	107041 6	107043 0	107043 0	107063 0	107062 9	107122 0	107122 0	107123 1	107123 1	各子計畫眾多且成立與討論耗時等，以致前期部份子計畫無法如期執行。	目前仍維持15個子計畫發包，已積極趕辦中。
基隆市	c001-1-10	文化景觀仙洞巖保存維護計畫	文化局	文化局	6,290	2,097	796	0	0	38	107033 1	107031 3	107041 6	107041 2	107043 0	107041 9	107063 0	107062 8	107122 0	107122 0	107123 1	107123 1	原訂於107年4月15日招標，因本科人手不	積極辦理中：1.本市調查研

																							完成評選或議價。
基隆市	c001-1-11	有形文化資產防災守護計畫	文化局	文化局	925	0	0	0	0	0	107043 0	107063 0	107073 1	107103 1	107113 0	107123 1					本計畫文化部文化資產局於107年6月1日核定，導致採購作業延遲。	刻正辦理預算墊付轉正申請	
基隆市	c001-1-14	汰換運輸設備及軟體設備計畫	文化局	文化局	785	785	0	520	0	66	107010 2	107010 2	107010 2	107010 2	107043 0	107043 0	107053 1	107053 1	107063 0	107063 0	依共同供應契約車輛採購履約期為下單後2個月交車因交車期較長至延誤	代交車後積極趕辦後續驗收付款事宜	
基隆市	c004-3-1	橋梁零星維護工程	工務處	工務處養護工程科	13,000	0	0	0	0	0	107053 1	107063 0	107073 1	107101 5	107123 1	108022 8				因勞務招標作業程序冗長，致進度落後	目前規劃設計案辦理基本設計中，已積極趕辦		
基隆市	c004-3-3	全市人行道整、新建工程	工務處	工務處養護工程科	7,400	1,850	0	1,110	0	60	107033 1	107012 8	107043 0	107031 2	107053 1	107041 0	107093 0	107113 0	107123 1	因材料訂製延誤	已積極趕辦		
基隆市	c004-3-5	全市危石及易崩塌地區整修	工務處	工務處養護工程科	1,000	400	291	0	0	73	107022 8	107022 8	107053 0	107031 5	107063 0	107063 0	107103 0	107113 0	107123 1	依實際災害情形辦理	依實際災害情形辦理		
基隆市	c004-3-7	仁愛區成功國小周邊公共環境改善工程	工務處	工務處土木工程科	8,000	0	0	0	0	0	107013 1	107051 6	107033 1	107070 1	107083 1	107103 1	107123 1			都市發展處遲至107年5月	針對招標文件設計		

																					16日方移交本處。	疏漏，本處已於監造案中增加協助修正圖說之契約條款，以為因應。
基隆市	c004-3-8	提升道路品質公共環境改善計畫	工務處	工務處養護工程科	8,780	0	0	0	0	0	107063 0	107073 1	107093 0	107101 5	107123 1	107123 1					因規劃設計案依本府及審查委員意見多次修正(共修正4版本)致進度落後	已積極趕辦，訂於7月11日召開實踐路細部設計審查會(實踐路預計7月31日前完成)
基隆市	c005-2-2	中和路拓寬工程用地補償費	工務處	工務處土木工程科	13,000	8,000	8,470	0	0	106	107013 1	107013 1	107021 5	107021 5	107030 1	107030 1	107033 0	107063 0	107063 0	107122 8	土地所有人準備資料延誤。	7月中旬召開地4次公聽會。
基隆市	c005-2-3	中和路拓寬工程	工務處	工務處土木工程科	25,000	6,000	577	0	0	10	106081 1	106081 1	106091 9	106091 9	107022 8	107033 1	107093 0		107120 1	107123 1	剛開工施作項目較少	請承商積極趕工。
基隆市	c005-2-4	工東街道路拓寬工程	工務處	工務處土	10,000	4,000	0	0	0	0	106081	106081	107022	107042	107063		107121		107122	107123	因第一次工程	1.已完成

																						易展開。	續工項。 2. 第三次變更設計已完成，後續將邀施工廠商議價。3. 第三次變更設計資金缺口約4,000萬元。
基隆市	c006-1-1	基隆市區域排水改善工程(A)	工務處	工務處河川水利科	8,435	0	148	0	0	100	107052 0	107051 4	107063 0	107072 0	107102 0	107112 0	107123 1					成立預算簽核作業稍有延誤，造成進度些許落後	現已完成預算簽核，並送採購中心辦理發包作業，訂於107.07.03辦理第一次招標
基隆市	c006-1-2	基隆市區域排水改善工程(B)	工務處	工務處河川水利科	5,565	0	0	0	0	0	107052 0	107051 4	107063 0	107071 5	107102 0	107113 0	107123 1					成立預算簽核作業稍有延誤，造成進度	現已完成預算簽核，並送

																					些許落後	採購中心 辦理發包 作業，訂 於 107.07.1 0辦理第 一次招標
基隆市	c006-3-1	基隆市都市排水疏濬工程(A)	工務處	工務處河 川水利科	14,700	1,000	100	0	0	10	107051 0	107033 0	107063 0	107072 5	107093 0	107113 0	107123 1				因報府之設計 書圖部份資料 尚需依審查意 見修正	顧問公司 於 107.06.2 9修正完 妥函報本 府現正辦 理後續預 算成立及 發包作 業。
基隆市	c006-3-3	全市雨水下水道零星維護工程	工務處	工務處河 川水利科	25,000	5,000	725	0	0	15	107013 1	106103 1	107033 1	106121 5	107042 0	107011 2	107073 1	107103 1	107123 1		此標案中分3 標均為單價 標，依實際施 作數量計價， 茲因開工至 今，地方建議 施作改善數量 不足	現地方均 已提報地 點且廠商 施作中， 將於施作 完成後催 促承商儘 速提報估

																						驗申請以 提高預算 執行率。
基隆市	c008-1- 1-1	警察局暨所屬單位廳舍屋頂整 修計畫	警察局	警察局後 勤科	2,470	30	0	0	0	0	107031 5	107031 5	107041 0	107041 0	107042 0	107042 0	107063 0	107083 1	107093 0	原編列新臺幣3 萬元係為工程 管理費，本案 尚未使用工程 管理費。	3 持續督促 成商履 約，並依 中央政府 各機關工 程管理費 支用要點 使用工程 管理費。	
基隆市	c009-1- 28	生育獎勵金	民政處	民政處戶 政科	52,320	26,16 0	24,94 0	0	0	95	107010 2	107010 2	107010 2	107010 2	107010 2	107010 2	107063 0	107070 5	107123 1	107123 1	因申請期限為 60日，申請人 得於新生兒出 生當月或次月 提出申請，致 執行數無法於 當月反映與分 配數產生落 差。	擬請各戶 政事務所 於辦理發 放婦女生 育獎勵金 申請經費 核銷作業 時，預留 作業時 程，使執 行數於當 月反映， 以避免發

																						生執行落 後情形。
基隆市	c009-1-38	公產納賦	財政處	財政處公有財產科	54,000	12,000	8,691	0	0	72	1070501	1070501	1070531	1070515	1070531	1070525	1071130	1071210	1071231	稅捐及規費減少支出，係因東岸多目標立體停車場、信二公有停車場重新訂約，107年度房屋稅單3,564,672元由廠商繳納以致於執行落後。	嗣後辦理分配預算時將審慎評估計畫執行進度，以符合實際。	
基隆市	c009-1-40	海洋資源保護與管理計畫	產業發展處	產業發展處海洋事務科	16,757	7,069	2,496	2,766	0	74	1070430	1070302	1070531	1070323	1070601	1070327	1070930	1071130	1071231	本案多項活動係屬契約採購，執行計畫部分均已進行審核工作計畫書階段，並請廠商針對活動工作事項進行修正中，並依契約規定完成工作計畫書審查後撥付第一期款。	俟廠商依審查意見修正後，儘速辦理第一期款撥付作業。	

基隆市	c009-1-41	補助漁業相關團體計畫	產業發展處	產業發展處 海洋事務科	3,288	2,300	1,416	0	0	62	107033 1	106122 9	107043 0	107013 1	107053 1	107013 1	107063 0	107113 0	107123 1	有關輔導刺網轉型計畫業經漁業署4月27日來函說明補助本府經費及項目，經漁業署於6月25日核定。	本案刻正進行製據作業，並先行發函符合本年度轉型之刺網漁業漁船備妥相關行政文件提前審核，俟補助款撥付後，將儘速完成撥款及核銷作業。
基隆市	c009-1-56	都市更新業務	都市發展處	都發處 都市更新科	4,003	900	133	0	0	15	107022 0	107022 0	107043 0	107053 1	107093 0	107113 0	107123 1	本案擬定招標文件工作說明書，經多次內部討論及調整方向，使作業有所延誤。本案業於6月28日上網公告。	刻正積極趕辦		
基隆市	c009-1-	全市道路、橋梁等各式照明設	工務處	工務處公	25,000	12,000	9,546	0	0	80	107042	107042	107063	107043	107083	107043	107103	107122	107122	換裝節能LED	依台電公

	65	備電費計畫		用事業科		0					8	7	0	0	1	0	1		9	9	路燈以致電費支出減少	司電費單實支實付	
基隆市	c009-1-69	107年度全市污水下水道管線及清疏工程	工務處	工務處下水道科	7,000	1,308	630	0	0	48	1061030	1061030	1061231	1061205	1070131	1070103	1070531	1070531	1071031	1071231	1071231	本案分為2小標，其中辦理本市安樂區安樂路二段102號-132號間污水管線截流改善工程於107.3.8決標、107.5.10提送交維計畫書至交旅處審查，107.5.18交旅處審查意見修正	目前辦理試挖路燈及交為計畫書修正中，修改後再次提送交旅處審查。
基隆市	c009-1-72	六堵水資源回收中心第二期老舊設備修繕及更新工程	工務處	工務處下水道科	11,500	1,600	0	0	0	0	1061031	1061031	1070131	1070327	1070228	1070412	1070831	1071031	1071231	1071231	1071231	1. 本案設計監造案係以最有利標方式辦理，惟因本案評選委員人數不足造成延誤，故導致本案決標日期延後，進而導致	本案於107.1.19重新成立預算奉核，已於107.3.27決標，現正積極辦理後續施

																					設計完成日期延後。2.本案工程發包階段，第一次開標因無廠商投標流標，第二次開標雖有一間廠商投標，但經6次減價仍未進入底價而廢標。3.經107.1.19重新成立預算奉核後又於107.2.8第1次開標流標，107.3.1第2次開標廠商又再次5次減價後未進入底價而廢標。	工作業程序
基隆市	c009-1-75	八堵路雨水下水道改善工程	工務處	工務處河川水利科	6,487	0	0	0	0	0	1070131	1070119	1070430	1070531	1070930	1071210	1071231				已簽辦成立工程預算，但因配合現況增加工程預算，108年度預算尚未	107.06.12市務會議討論通過，已函送市議會

																					編列，無法成立預算辦理招標	審議，俟市議會審議通過即可辦理工程預算成立。
基隆市	c009-1-76	公用事業及路燈設備	工務處	工務處公用事業科	17,310	1,000	166	0	0	17	1070228	1070213	1070331	1070306	1070430	1070502	1070731	1071130	1071229		本案路燈工程及纜線清整工程第一期派工尚未竣工；另本年度1至6月份零星工程案例稀少，故款項支付進度落後。	路燈及纜線清整工程刻正積極趕辦中。
基隆市	c009-1-87	基隆嶼遊客遊憩設施改善工程	交通旅遊處	交通旅遊處觀光工程科	21,000	5,000	0	3,414	0	68	1070331	1070331	1070430	1070430	1070531	1070531	1070831	1071130	1071231		正在辦理估驗請款中，俟請款程序完全後，即可付款。	儘速完成付款程序，以符預算執行進度。
基隆市	c009-1-88	望海廊帶鐵馬景觀棧道串連工程	交通旅遊處	交通旅遊處觀光工程科	6,643	2,000	0	0	0	0	1070331	1070331	1070430	1070615	1070531	1070627	1070831	1071130	1071231		本案流標與廢標導致招標期程落後。	本案已於107年6月27日訂約完成。
基隆市	c009-1-	動物保護管制計畫	產業發展	動物保護	1,242	621	494	0	0	80	107010	106120	107011	106121	107013	106121	107063	107122	107123		2月、3月、4	自3/14迄

	144		處	防疫所							1	8	5	4	0	8	0		0	0	月各1名動保 員離職，6/5完 成徵才任用2 名，然6/19再 度有1名離 職，缺額尚有2 名，致進度落 後。	今連續5 次上網徵 才，將加 速辦理任 用。
基隆市	c009-1- 145	動物疾病防治計畫	產業發展 處	動物保護 防疫所	10,709	5,007	3,392	0	0	68	107010 1	106121 4	107011 5	106121 8	107013 0	106122 1	107063 0		107122 0	107123 0	2月28日、3月 31日、4月20 日各1名動保 員離職，6月5 日完成徵才任 用2名，然6月 19日再度有1 名離職，缺額 尚有2名，致 進度落後。	自3/14迄 今連續5 次上網徵 才，將加 速辦理任 用。
基隆市	c009-1- 197	調查評估教育宣導	環境保護 局	環境保護 局	9,802	4,778	3,518	0	0	74	107053 0	107033 0	107063 0		107083 0		107103 0		107113 0	107123 0	依各業務實際 需求核銷。	依各業務 實際需求 核銷。
基隆市	c009-1- 202	一般廢棄物最終處理廠BOO設 置委外處理計畫	環境保護 局	環境保護 局	52,919	26,091	0	0	0	0	107033 1	107033 1	107033 1		107053 1		107063 0		107123 1	107123 1	進場廢棄物尚 未完成妥善處 理，廠商尚未 提出完整請款	已請廠商 儘速將廢 棄物妥善 處理後辦

																						報告。	理請款。
基隆市	c009-1-206	107年度天外天水肥投入站興建計畫	環境保護局	環境保護局	720	500	0	0	0	0	1070131	1070108	1070228	1070108	1070331	1070531	1070831	1071130				於規劃設計發包後技師發現該址相關法令不適合興建,建議重新選址評估地點。	重新辦理選址作業後再行設計規劃,以避免選址不當造成後續的困難
基隆市	c009-1-215	暖暖高中校舍改建三期工程	教育處	暖暖高中	75,500	10,000	5,000	0	0	50	1051030	1051031	1051230	1051230	1060320	1060320	1061210	1061210	1070830	1071130		1.「建照備註事項建管開工程序須取得施工計畫防災說明會核備函乙項」之因素。 2. 水保工程挖掘TS01臨時滯洪池發現地下舊有構造物地樑及H型鋼之因素。 3. 拆除工程遇風雨操場隱蔽基礎因素。 4. 鄰房抗議噪音暫停施	1. 依工程督導會議結論辦理工期展延檢討中。 2. 因趕工計畫追蹤管控點未達成,已請承商提送修正計畫。 3. 每週工務會議及工程督導會議追蹤檢

19. 新竹市

新竹市 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案件數	總經費 13.87 億元		預算執行數 (千元)	預算執行率 (%)	預算達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
114	13.38	0.48	418,651.77 7	96.86	30.19	114	110	112	100	59	71	19	29	9	12	5	8

本年度基本設施補助經費 13.87 億元(中央補助 13.38 億元，地方自籌 0.48 億元)，截至 6 月底止，共有標案 114 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 432,223.028 仟元，預算實際支用數 327,847.083 仟元，已執行應付未付數 90,447.694 仟元，發包結餘數 357 仟元，合計預算執行數 418,651.777 仟元，預算執行率 96.86%，預算達成率 30.19%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,371,515 仟元，區公所執行 15,000 仟元，縣(市)執行率 96.76%，預算達成率 30.21%；區公所執行率 107.54%，預算達成率 29.03%。
- 依標案執行情形進度區分：114 件標案，已設計完成者 110 件，已發包決標者 100 件，已開工者 71 件，施工進度已達 50%者 29 件，已完工者 12 件，已驗收完成者 8 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，114 件標案計有 23 件落後，落後比率 20.18%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 23 件，屬預算執行未達 80%者 7 件，屬查核點進度落後者 6 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 10 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 2 件、因招標作業落後者 6 件、因施工作業落後者 1 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 1 件、其他因素落後者 12 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 30.19%，較平均預算達成率 36.76% 落後 6.57 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(36.82%)、體育經費(28.85%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(27.36%)、水利建設經費(11.25%)、公有建物及設施經費(9.26%)、其他建設經費(32.72%) 等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 23 件落後標案，分屬工務處(8 件)、城市行銷處(3 件)、產業發展處(4 件)、環保局(5 件)、警察局(3 件) 等執行案件。請新竹市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

新竹市 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設				3							2			5
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施				1							1			2
c009. 其他建設	2			2	1	1	1				9			16

新竹市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費 (千元)	預定 支用 數	實際 支用 數	應付 未付 數	剩餘 款	執行 率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策	
											預定	實際													
新竹市	c006-1-2	改善民眾生活品質排水路工程	工務處	工務處	18,857	5,091	0	0	0	0	107053 1	107053 1	107063 0		107073 1		107083 1		107093 0		107123 1		招標資料發辦 中。	儘速辦理 發包事 宜。	
新竹市	c006-1-3	區域排水整治及環境營造工程	工務處	工務處	10,000	2,700	0	0	0	0	107053 1	107053 1	107063 0		107073 1		107083 1		107093 0		107123 1		招標資料發辦 中。	儘速辦理 發包事 宜。	
新竹市	c006-1-4	一般建議急需辦理水利改善工程	工務處	工務處	800	216	0	0	0	0	107053 1	107053 1	107063 0		107073 1		107083 1		107093 0		107123 1		招標資料發辦 中。	儘速辦理 發包作 業。	
新竹市	c006-1-6	客雅溪水防道路環境營造工程	工務處	工務處	6,000	1,620	0	0	0	0	107053 1	107053 1	107063 0		107073 1		107083 1		107093 0		107123 1		陳報中央核定 中。	俟完成後 辦理發包 事宜。	
新竹市	c006-3-1	一般建議急需辦理下水道改善工程	工務處	工務處	550	149	0	0	0	0	107053 1	107053 1	107063 0		107073 1		107083 1		107093 0		107123 1		依陳情建議急 辦需辦理下水 道改善工程辦 理。	俟接獲陳 情案後立 即辦理。	
新竹市	c008-1- 1-1	警察廳舍耐震補強工程	警察局	警察局	16,060	4,410	2	8	0	0	107033 0	107032 0	107043 0	107032 9	107053 0	107051 8	107062 0	107062 0		107072 0		107123 1		本案原訂於107 年6月辦理細 部設計審查會	儘整辦理 細部設計 審查會

																					議，並支付外聘委員審查費，因作業不及，故審查會議延至107年7月上旬舉行。	議。
新竹市	c008-3-2	行動載具	警察局	警察局	1,588	429	0	0	0	0	107060 1	107033 1	107063 0	107062 7	107063 0	107070 9	107093 0	107093 0	107123 1	內政部警政署本(107)年6月27日第一次開標議價，因未低於底價廢標。	本(107)年7月9日辦理第2次開標議價。	
新竹市	c009-1-10	新竹市中華路4段451巷沿鐵道路旁連接181巷自行車道及人行步道工程	工務處	工務處	10,000	2,700	0	2,700	0	100	107043 0	107043 0	107063 0		107073 1		107083 1	107093 0	107123 1	尚未發包完成	刻正簽辦發包作業，預計8月初可決標	
新竹市	c009-1-11	新竹市三民國中、三民國小周邊學生通學步道工程	工務處	工務處	20,000	5,400	0	5,400	0	100	107053 1	107053 1	107063 0		107073 1		107083 1	107093 0	107123 1	依營建署要求，將與6案合併(步行城市)辦理發包作業	俟城銷3案公園確認設計完成，續辦理發包作業。	
新竹市	c009-1-12	新竹市東門國小周邊學生通學步道工程	工務處	工務處	30,000	8,100	1,800	6,300	0	100	107011 2	107011 2	107063 0		107070 1		107081 0	107093 0	107123 1	依營建署要求，本案與6	俟城銷3案公園確	

																					案合併(步行城市)辦理發包作業。	認設計完成，續辦理發包作業。
新竹市	c009-1-22	107 年度公園綠地觀光遊憩等設施維護及景觀工程	城市行銷處	城市行銷處	30,000	8,100	0	0	0	0	107053 1	107030 5	107063 0	107052 4	107073 1	107083 1	107093 0	107123 1			辦理施工中	盡速辦理
新竹市	c009-1-23	青青草原草地活動	城市行銷處	城市行銷處	2,500	0	0	0	0	0	107063 0	107070 2	107083 1		107083 1	107083 1	107083 1	107103 1			因修改招標文件內容，並會辦相關單位，本案簽准日期為 107/7/2	盡速辦理
新竹市	c009-1-26	綠地、風景區及遊憩用地等設施、設備修繕費用	城市行銷處	城市行銷處	8,000	2,200	0	0	0	0	107043 0		107053 1		107062 9	107081 7	107093 0	107123 1			本經費原預作為青青草原與十七公里相關建設使用，為節省本府市庫，並業已向交通部觀光局申請相關建設經費，本補助案因而將遞延至年底前發包執行。	年底前儘速發包執行。
新竹市	c009-1-54	各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設置	警察局	警察局	7,000	1,890	0	0	0	0	107063 0	107061 5	107063 0	107062 9	107063 0	107093 0	107093 0	107123 1			本案因建置地點散布全市，	本案已於 6 月 29 日

																					規劃較為複雜，另部分鄰里建置地點為符當地治安、交通需求，經與當地鄰里長多次會勘後，始完成會勘工作，已盡速辦理後續工作。	進行公告招標並積極辦理後續作業。
新竹市	c009-1-61	辦理客雅溪污水截流站維護操作費	環保局	環保局	5,400	1,458	317	0	0	22	1061125	1061125	1061227	1061227	1061227	1061227	1070101	1070101	1071231	1071231	辦理契約變更中，因項目金額有變。	俟完成契約變更後，立即依新契約付款。
新竹市	c009-1-64	資源回收暨物業管理計畫	環保局	環保局	2,562	692	0	0	0	0	1061130	1061130	1061229	1061228	1061229	1061228	1070831		1071214	1071231	本案為委託辦理計畫，依合約規定於107年7月辦理期中報告審查，審查通過始得給付期款	依期程辦理期中報告審查作業
新竹市	c009-1-66	資源回收場新建工程	環保局	環保局	8,500	366	0	0	0	0	1070501	1070521	1070630		1070716		1070831		1071019	1071231	新竹市資源回收場新建工程委外規劃、設	加速工進，冀能如期如質

																						代為請領建造執照，且刻正辦理工程發包事宜。於決標後支付第一期款項。	
新竹市	c009-1-71	購置鏟裝車及小貨車	環保局	環保局	3,000	810	0	0	0	0	107063 0	107020 6	107063 0	107021 2	107063 0	107021 2	107093 0	107041 3	107093 0	107060 7	107123 1	本計畫皆為購置特種車輛，於廠商交車且驗收合格後一次付款。	將於驗收合格且簽准後儘速付款。
新竹市	c009-1-72	購置濾煙器	環保局	環保局	1,900	0	0	0	0	0	107063 0	107063 0	107063 0	107093 0	107093 0	107123 1						招標決標方式改為最低標。	會辦各科提供專業意見，修正招標文件再綜簽。
新竹市	c009-1-79	新竹漁港及周邊環境與設施改善	產業發展處	產業發展處	45,199	12,204	215	0	0	2	107030 1	107030 1	107063 0	107062 9	107070 5	107083 0	107093 0	107123 1	1970萬元屬支應南運動公園部分工程款，工程尚施工中。	俟達契約付款條件，儘速辦理付款程序。			
新竹市	c009-1-80	新竹漁港、海山漁港及其周邊等設施維護工程	產業發展處	產業發展處	7,000	1,890	379	0	0	20	107043 0	107043 0	107063 0	107052 9	107071 6	107083 1	107093 0	107123 1	因廠商施工機具人力不足，導致進度落	廠商於6月份已加派人員機			

																					後，未達估驗付款條件	具進場施作，俟達估驗條件即可辦理估驗付款
新竹市	c009-1-81	農產運銷公司建物漏水修繕	產業發展處	產業發展處	4,500	1,215	0	0	0	0	1070430	1070630	1070716	1070831	1070930	1071231					契約廠商依契約規定於107年6月8日提交細部設計報告書，本府於107年6月21日召開細部設計審查會，請顧問公司依審查意見於14天內提修正報告書。(廠商預計於107年7月5日提送細部設計報告書(修正版)。)	俟廠商提送細部設計報告書(修正版)並於本府核定後，儘速辦理工程招標作業。
新竹市	c009-1-82	東門市場整修	產業發展處	產業發展處	18,000	0	0	0	0	0	1070420	1070323	1070430	1070412	1070615	1070731	1070831	1071231			初步設計於107.5.16辦理審查(未通過)，於	俟報告書修正完成並備查後，督促

20. 嘉義市

嘉義市 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 21.18 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件 數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
362	21.18	0	533,260.41 1	110.30	25.18	322	326	268	266	141	157	38	52	23	24	20	22

本年度基本設施補助經費 21.18 億元(中央補助 21.18 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 362 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 483,472.484 仟元，預算實際支用數 413,782.73 仟元，已執行應付未付數 116,609.944 仟元，發包結餘數 2,867.737 仟元，合計預算執行數 533,260.411 仟元，預算執行率 110.30%，預算達成率 25.18%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 2,024,655 仟元，區公所執行 93,412 仟元，縣(市)執行率 111.03%，預算達成率 24.68%；區公所執行率 100.5%，預算達成率 36.03%。
- 依標案執行情形進度區分：362 件標案，已設計完成者 326 件，已發包決標者 266 件，已開工者 157 件，施工進度已達 50%者 52 件，已完工者 24 件，已驗收完成者 22 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，362 件標案計有 26 件落後，落後比率 7.18%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 26 件，屬預算執行未達 80%者 10 件，屬查核點進度落後者 9 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 7 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 5 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 20 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 25.18%，較平均預算達成率 36.76%落後 11.58 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費(21.14%)、道路養護及道安計畫(7.93%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(9.85%)、水利建設經費(26.03%)、公有建物及設施經費(2.03%)、其他建

設經費(26.76%)等六類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 26 件落後標案，分屬工務處土木工程科(1 件)、工務處水利工程科(6 件)、工務處養護工程科(6 件)、交通處(1 件)、建設處(2 件)、消防局(1 件)、財政稅務局(2 件)、智慧科技處(1 件)、環保局(4 件)、警察局(1 件)、觀光新聞處(1 件)等執行案件。請嘉義市政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

嘉義市 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫				1							1			2
c005. 交通建設														0
c006. 水利建設											3			3
c007. 農業建設														0
c008. 公有建物 及設施														0
c009. 其他建設				4					1		16			21

嘉義市基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付款數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
嘉義市	c004-3-1	提昇道路品質	工務處	工務處 養護工程科	70,000	4,998	0	4,998	0	100	107043 0	107043 0	107053 1	107053 1	107063 0		107093 0		108013 1		108033 1		本案多次招標 仍未發包	已請顧問 公司重新 檢討預算 書圖
嘉義市	c004-3-2	整修各里道路等應急搶修工程	工務處	工務處 土木工程科	30,000	2,000	485	1,515	0	100	107040 1	107040 1	107050 1	107060 7	107051 5		107103 1		107123 1		108013 1		本案為開口契約。 約。	盡速派工 且加速辦 理結算驗 收事宜。
嘉義市	c006-1-2	區域排水改善工程	工務處	工務處 水利工程科	10,000	4,800	0	4,800	0	100	107031 0	107031 0	107041 0		107052 0		107092 0		107103 0		107123 1		發包程序審查 中	加緊辦理
嘉義市	c006-3-1	兩水下水道建設及維護工程	工務處	工務處 水利工程科	20,000	2,000	0	2,000	0	100	107021 0	107021 0	107033 1		107041 5		107101 5		107121 0		107123 1		加緊辦理	加緊趕辦
嘉義市	c006-3-2	兩水下水道建設工程	工務處	工務處 水利工程科	10,000	1,000	0	1,000	0	100	107043 0	107043 0	107053 1		107073 0		107101 5		107121 5		107123 1		設計作業中	趕辦中
嘉義市	c009-1-26	電腦軟硬體汰換	智慧科技處	智慧科技處	1,500	1,500	914	0	0	61	107022 8	107022 8	107033 1	107032 8	107043 0	107043 0	107053 1		107053 1		107053 1		整合規劃後續 採購使用	加強預算 控管與執

																							行，預定 7月執行 採購。
嘉義市	c009-1-52	濫建估用物拆除清除及造林撫育等	建設處	建設處	550	50	0	0	0	0	107043 0	107073 1	107083 1	107093 0	107113 0	107123 1						已規劃造林撫育範圍，開始執行	已規劃造林撫育範圍，已開始發辦
嘉義市	c009-1-63	各公園綠地水電費	建設處	建設處	8,916	4,200	2,541	320	0	68	107043 0	107043 0	107053 1	107053 1	107073 1	107093 0	107113 0	107123 1				辦理部分公園用電契約容量調整,與汰換部分節能燈具,致電費與水費支出節約.	持續辦理節約能源事宜.
嘉義市	c009-1-69	路燈線路養護	工務處	工務處 養護工程科	2,000	600	0	0	0	0	107040 1	107042 0	107050 1	107123 1	108033 1	108053 1						完成簽約後續第一次派工	積極趕辦
嘉義市	c009-1-70	購置修換路燈材料	工務處	工務處 養護工程科	800	400	183	0	0	46	107040 1	107041 0	107050 1	107050 1	107060 1	107060 1	107090 1	107110 1	107123 1			全市更換LED後，燈泡耗材減少採購	視預算執行情形減少編列下年度預算
嘉義市	c009-1-71	公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置	工務處	工務處 養護工程科	3,000	800	0	0	0	0	107040 1	107040 1	107050 1	107083 1	107103 1	107113 0	107123 1				修正招標文件，延長等標期	已修正招標文件，刻正辦理後續評選作業	

嘉義市	c009-1-72	瀝美土、AC、碎石級配及AC路面養護	工務處	工務處 養護工程科	30,000	1,836	0	1,836	0	100	107043 0	107043 0	107053 1	107053 1	107063 0	107093 0	108013 1	108033 1	本案多次招標 仍未發包	已請顧問 公司重新 檢討預算 書圖				
嘉義市	c009-1-74	路燈裝設費	工務處	工務處 養護工程科	3,800	1,140	0	0	0	0	107040 1	107060 5	107042 0	107050 1	107123 1	108033 1	108053 1	完成簽約已第 一次派工	積極趕辦					
嘉義市	c009-1-89	土地補償金及地上物補償費	工務處	工務處 水利工程科	3,200	1,200	0	1,200	0	100	107033 0	107032 3	107041 5	107053 0	107073 0	107083 0	107123 1	規劃程序中	加緊辦理					
嘉義市	c009-1-91	雨水下水道	工務處	工務處 水利工程科	42,000	4,000	0	4,000	0	100	107043 0	107043 0	107053 1	107073 0	107101 5	107121 5	107123 1	招標程序中	趕辦中					
嘉義市	c009-1-94	水情監控系統設備租賃及系統擴充	工務處	工務處 水利工程科	4,000	1,000	0	0	0	0	107043 0	107051 0	107061 0	107093 0	107123 1	108030 1	設計需求作業 中	設計需求 作業中						
嘉義市	c009-1-116	鐵路高架化計畫房屋租金	交通處	交通處	600	600	0	450	0	75	107033 1	107033 1	107043 0	107043 0	107051 0	107051 0	107051 5	107051 5	107052 0	107053 1	訂約中	儘速辦理		
嘉義市	c009-1-132	市民報行銷宣導	新聞科	觀光新 聞處	2,000	2,000	1,539	0	0	77	107013 1	107013 1	107022 8	107022 8	107033 1	107032 7	107043 0	107032 7	107061 5	107061 5	107063 0	107063 0	因預算遭議會 刪減，變更契 約，未及於6 月底前付款。	相關契約 變更已完 成，將儘 速辦理付 款事宜。
嘉義市	c009-1-197	購置消防衣帽鞋、排煙機等	消防局	消防局	10,281	1,070	810	0	0	76	107033 1	107033 1	107043 0	107043 0	107053 1	107053 1	107113 0	107121 5	107123 1	招標已完成， 經費尚未交付	儘速辦理			

																						廠商，預計11 月交貨	
嘉義市	c009-1- 214	經管西市場大樓管理費、土地 拆除、清理及訴訟費用等	財政稅 務局	財政稅 務局	2,220	1,020	575	0	0	56	107033 1	107033 0	107053 1	107053 1	107063 0	107062 9	107093 0		107120 1		107122 5	核實開支,及攤 節支出所致.	嗣後考量 本年度預 算執行情 形,重新 檢討預算 分配數.
嘉義市	c009-1- 222	中長期貸款及款期借款利息	財政稅 務局	財政稅 務局	10,325	600	15	0	0	3	107013 1	107033 0	107063 0	107062 9	107083 1		107103 1		107113 0		107123 1	本項屬經常性 經費,依實際數 核實開支,因未 如預期動用透 支及短期借款 額度,致透支及 短期借款利息 支出數未達預 定數.	之後仍依 實際數額 開支.
嘉義市	c009-1- 266	行動電話取證器	警察局	警察局	1,100	1,100	0	0	0	0	107051 0	107051 0	107063 0	107062 7	107083 1	107062 7	107101 0		107113 0		107122 0	第一次招標流 標。	已於第二 次招標 (107年6 月27日) 決標。
嘉義市	c009-1- 281	焚化廠委託操作管理費用、監 督技術服務費用、底渣及固化 體處理費用、焚化廠延役評估	環保局	環保局	125,000	53,10 1	34,61 1	0	0	65	107010 1	107010 1	107050 1	107050 1	107070 1		107100 1		107121 5		107123 1	已完成驗收作 業,刻正辦理 撥付款項。	請廠商加 速將驗收 文件備

		作業、焚化廠建物公共安																				妥、俾利 後續撥款 作業。	
嘉義市	c009-1-283	辦理里、社區、團體等垃圾減量、資源回收等	環保局	環保局	570	278	97	0	0	35	107010 1	107010 1	107050 1	107050 1	107070 1	107100 1	107121 5	107123 1			本項經費為一般事務費，主要為市府相關政令行銷宣導使用，依實際辦理情形核實支付。	依實際辦理情形核實支付。	
嘉義市	c009-1-284	湖內里等回饋相關事項	環保局	環保局	10,250	7,435	2,566	0	0	35	107010 1	107010 1	107050 1	107050 1	107070 1	107100 1	107121 5	107123 1			回饋金補助係由各回饋里基金管理委員會依執行情形提出申請資料。	依各回饋里申請情形核實支出。	
嘉義市	c009-1-292	汰換購置新型噪音計	環保局	環保局	600	0	0	0	0	0	107042 0	107042 0	107051 0	107061 4	107052 0	107061 5	107061 0	107062 0	107063 0			招標作業延誤	已完成招標

21. 金門縣

金門縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 6.03 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
274	6.03	0	121,848.54 9	100.94	20.19	260	238	250	232	232	224	153	163	135	149	129	142

本年度基本設施補助經費 6.03 億元(中央補助 6.03 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 274 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 120,707.912 仟元，預算實際支用數 116,257.091 仟元，已執行應付未付數 3,952.761 仟元，發包結餘數 1,638.697 仟元，合計預算執行數 121,848.549 仟元，預算執行率 100.94%，預算達成率 20.19%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 477,874 仟元，鄉鎮公所執行 125,500 仟元，縣(市)執行率 108.02%，預算達成率 25.21%；鄉鎮公所執行率 15.22%，預算達成率 1.12%。
- 依標案執行情形進度區分：274 件標案，已設計完成者 238 件，已發包決標者 232 件，已開工者 224 件，施工進度已達 50%者 163 件，已完工者 149 件，已驗收完成者 142 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，274 件標案計有 63 件落後，落後比率 22.99%。

落後原因：

- 107 年 6 月落後標案 63 件，屬預算執行未達 80%者 11 件，屬查核點進度落後者 30 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 22 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 8 件、因土地取得落後者 1 件、因招標作業落後者 11 件、因驗收作業落後者 1 件、因計畫變更落後者 2 件、因預算編列落後者 1 件、其他因素落後者 19 件及未填寫落後原因 20 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 20.19%，較平均預算達成率 36.76% 落後 16.57 個百分點，執行情形欠佳。其中水利建設經費均未執行，文化經費(22.98%)、補助貧瘠鄉鎮市(50.00%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(15.67%)、其他建設經費(14.91%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 63 件落後標案，分屬文化園區管理所(3 件)、社會處(2 件)、金門縣大同之家(1 件)、金門縣文化局(1 件)、金門縣水產試驗所(2 件)、金門縣林務所(2 件)、金沙鎮公所(5 件)、金城鎮公所(2 件)、金湖鎮公所(3 件)、金寧鄉公所(2 件)、工務處(4 件)、行政處(3 件)、建設處(1 件)、財政處(1 件)、觀光處(11 件)、消防局(1 件)、烈嶼鄉公所(3 件)、畜產試驗所(1 件)、金門縣港務處(4 件)、金門縣稅務局(1 件)、金門縣農業試驗所(2 件)、金門縣衛生局(4 件)、金門縣養護工程所(2 件)、金門縣警察局(1 件)、採購招標所(1 件)等執行案件。未填寫落後原因 20 件，請金門縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

金門縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計	
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他			
c001. 文化														0
c002. 體育														0
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市														0
c004. 道路養護 及道安計畫														0
c005. 交通建設	2								1		4	9	16	
c006. 水利建設												2	2	
c007. 農業建設													0	
c008. 公有建物 及設施				1			1						2	
c009. 其他建設	6	1		10		1	1				15	9	43	

金門縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策	
											預定	實際													
金門縣	c005-1-6	金寧鄉東洲鄉村整建工程	金門縣公所	金門縣金寧鄉公所	4,000	2,000	0	0	0	0	106110 2	106110 2	106112 8	106112 8	107010 5	107011 5	107061 8	107051 8	107082 0		107103 1		廠商未計價。	請廠商盡速辦理計價事宜。	
金門縣	c005-1-7	烈嶼鄉后頭社區活動中心暨周邊環境整建工程-二期工程	金門縣公所	金門縣烈嶼鄉公所	1,500	1,000	0	0	0	0	107030 9	107042 7	107042 0	107052 9	107050 4	107061 3	107061 5			107071 0		107081 0			
金門縣	c005-1-8	烈嶼鄉聚落環境整建工程	金門縣公所	金門縣烈嶼鄉公所	4,500	3,000	0	0	0	0	106082 8	106082 8	107010 5	107010 5	107012 5	107012 5	107041 3			107060 8		107080 8			
金門縣	c005-1-11	金門縣金城鎮天后宮廣場與周邊景觀改善工程	金門縣公所	金門縣金城鎮公所	2,000	600	0	0	0	0	107033 0	107032 3	107042 0	107041 0	107052 0	107051 6	107083 0			107103 1		107113 0		1. 廠商材料進場時程延宕 2. 申請延宕	已完成申請程序，並於107年7月9日派工進場施作
金門縣	c005-1-12	金寧鄉安岐聚落文化風華再現計畫	金門縣公所	金門縣金寧鄉公所	5,000	0	0	0	0	0	107011 8	107011 8	107020 8	107020 8	107032 2	107032 2	107062 9			107091 4		107103 1		107/4/13辦理停工，施工放樣後因民眾反映施工位置未	待施作位置確認後請廠商盡速進場施

																						盡完善。復工日期為107/06/01，停工34天。	作。	
金門縣	c005-1-13	光點聚焦-金湖鎮海岸門戶再生計畫	金門縣 金湖鎮公所	金門縣 金湖鎮公所	6,000	0	0	0	0	0	107012 6	107012 6	107020 9	107020 9	107040 2	107080 2	107103 1	107113 0						
金門縣	c005-1-14	水岸、綠地、老聚落-金沙鎮后浦頭村門戶再造計畫	金門縣 金沙鎮公所	金門縣 金沙鎮公所	4,000	0	0	0	0	0	107031 5	107031 5	107050 4	107062 9	107092 8	107111 5	107122 0							
金門縣	c005-1-15	金沙鎮官嶼里聚落周邊環境發展委託設計監造	金門縣 金沙鎮公所	金門縣 金沙鎮公所	1,000	0	0	0	0	0	107043 0	107043 0	107093 0	107111 0	107121 0	107123 1								
金門縣	c005-1-16	106年度金城鎮庵前社區活動中心周邊景觀改善工程	金門縣 金城鎮公所	金門縣 金沙鎮公所	2,000	300	0	0	0	0	107043 0	107070 2	107053 1	107063 0	107103 1	107122 8	108012 8						1. 配合主體建築工程變更設計而調整規劃設計工項 2. 配合社區意見調整工項	已完成圖說修正，刻正發辦招標作業
金門縣	c005-1-17	金沙鎮汶沙里農田排水暨產業道路整建	金門縣 金沙鎮公所	金門縣 金沙鎮公所	2,000	0	0	0	0	0	107033 0	107033 0	107043 0	107061 9	107061 1	107092 8	107112 0	107122 1					請縣府重新發包	開工後請廠商派員進場趕工
金門縣	c005-1-19	北九劃段1468地號農田排水暨產業道路整建工程	金門縣 金沙鎮公所	金門縣 金沙鎮公所	1,000	500	0	0	0	0	106120 6	106120 6	106121 2	106121 2	107031 5	107031 5	107060 8	107050 2	107112 2	107061 5	107122 0			

金門縣	c005-1-21	金湖鎮太湖劃測段 233-1 地號等農路改善工程	金門縣 金湖鎮 公所	金門縣 金湖鎮 公所	1,800	0	0	0	0	0	106121 5	106121 5	106122 9	106122 9	107022 1	107022 1	107053 1	107073 1	107092 8				
金門縣	c005-1-22	金城鎮泗湖海邊聯外道路工程	金門縣 金城鎮 公所	金門縣 金城鎮 公所	1,300	1,200	0	200	0	17	106120 5	106120 5	106122 6	106122 6	107012 6	107012 6	107051 5	107070 2	107080 1		因配合現況土質辦理變更設計	已完成變更程序。	
金門縣	c005-2-1	為後豐新村開發，辦理範圍內道路與公共管線設施新建、箱涵石籠與明渠改道等作業	金門縣 政府工務處	金門縣 政府工務處	12,000	9,000	8,044	0	0	89	106080 2	106080 2	106091 9	106091 9	106112 4	106112 4	107061 9	107102 3	108052 3		承商備料及進場期間延遲、變更增加工項影響。	要求承商提報趕工計畫，增加加班趕工。	
金門縣	c005-2-4	辦理金門醫院聯外道路新建暨排水暗溝、RC 擋土牆、單孔箱涵、路燈工程，全長約 605 公尺，寬 8 公尺。	金門縣 金湖鎮 公所	金門縣 金湖鎮 公所	9,000	0	0	0	0	0	106083 0	106083 0	106091 9	106091 9	106110 7	106110 7	107041 3	107062 7	107071 0				
金門縣	c005-2-6	辦理烈嶼鄉九井路道路 AC 面層刨鋪、標線等改善工程。	金門縣 烈嶼鄉 公所	金門縣 烈嶼鄉 公所	10,000	0	0	0	0	0	107031 9		107051 0		107052 5		107082 0	107092 2	107112 2				
金門縣	c006-1-1	金門縣各流域攔蓄水、排水改善工程	金門縣 政府工務處	金門縣 政府工務處	38,951	3,000	0	0	0	0	107042 0		107052 1		107060 1		107090 3	107122 8	108021 5				
金門縣	c006-1-2-2	疏浚清淤工程	金門縣 政府工務處	金門縣 政府工務處	1,000	100	0	0	0	0	107043 0	107030 1	107051 4	107040 3	107060 1	107060 1	107091 7	107123 1	108011 5				
金門縣	c008-5-	辦理金湖地區新增污水抽水	金門縣	金門縣	20,000	16,83	19,96	0	0	119	105081	105081	106071	106071	106081	106081	107022	107022	107051	107092		因配合道路政	已請水廠

	1	總站以及周邊相關管線改善工程	政府工務處	政府工務處		8	5				0	0	8	8	4	4	8	8	8	8		策，本工程太湖路二段部分水廠檢討修改施工方式，致進度落後。	督促廠商完成變更後積極趕辦。	
金門縣	c008-5-2	各公園設施整建美化工程	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	3,000	400	216	0	0	54	1070515	1070607	1070615	1070705	1071030	1071215	1071231					工程尚未發包	已加速作業並已完成招標公告	
金門縣	c009-1-7	汰換電話主機系統及網路相關設備	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	600	600	0	0	0	0	1070322	1070322	1070327	1070327	1070413	1070416	1070531	1070531	1070531	1070531	1070608	1070608		
金門縣	c009-1-11	汰換局本部 84 年大樓電梯 1 部	金門縣警察局	金門縣警察局	1,200	0	0	0	0	0	1070422	1070430	1070506	1070509	1070520	1070719	1070726	1070810				107年5月29日、6月12日、6月27日公開招標多次均高於底價，主持人當場宣布廢標(截至目前共計三次)。	委由金門縣採購招標所於107年7月6日辦理第四次公開招標，已參考前三次之開標紀錄各投標廠商之報價，重新	

																								簽陳訂定 底價，已 符合市場 行情。
金門縣	c009-1- 13	柴油引擎發電機組 100kw	金門縣 水產試驗所	金門縣 水產試驗所	800	800	0	0	0	0	107011 5	107013 1	107031 5	107030 8	107041 6	107030 8	107051 4	107061 6	107062 0	107061 6	107062 9	107062 9		
金門縣	c009-1- 14	多參數水質監測儀器	金門縣 水產試驗所	金門縣 水產試驗所	750	750	0	0	0	0	107031 5	107040 9	107041 6	107042 4	107041 6	107052 2	107042 5		107042 5		107043 0		投標廠商投標 文件不齊全	已完成招 標手續
金門縣	c009-1- 24	縣府 GSNVPN 線路交換器汰換	金門縣 消防局	金門縣 消防局	500	500	0	0	0	0	107041 5	107033 0	107043 0	107042 4	107051 5	107042 4	107063 0	107062 2	107063 0	107062 2	107063 0	107062 7		
金門縣	c009-1- 38	原有動物園區整建工程	金門縣 畜產試驗所	金門縣 畜產試驗所	5,000	0	0	0	0	0	107043 0	107041 3	107053 0	107053 0	107062 5		107082 7		107121 0		107123 1		劃設計暨監造 服務案，第二 次公告因不符 採購法第 48 條，於 6 月 6 日由工作小組 宣佈廢標。6 月 14 日辦理第 三次公告，21 日截標，22 日 開資格標，有 一家廠商投標 且符合資	積極辦理 配合辦 理。

																					格。28日辦理評選會議，以平均得分 77.4 得標。辦理契約簽訂相關事宜。	
金門縣	c009-1-47	公園改善工程	金門縣林務所	金門縣林務所	5,000	0	0	0	0	0	1070615	1070629	1070713	1070928	1071031	1071115					本案於 107 年 5 月 11 日起案辦理工程規劃設計(含監造)並於 5 月 15 日公告,並於 107 年 6 月 29 日由漢鑫技術顧問有限公司得標。	案請得標廠商依約規定完成相關設計規畫作業。
金門縣	c009-1-48	生態導覽館改善工程	金門縣林務所	金門縣林務所	5,000	0	0	0	0	0	1070615	1070629	1070713	1070928	1071231	1071231					本案於 107 年 3 月 26 日起案辦理工程規劃設計(含監造)公告,經 3 次公開招標均無廠商辦理投標。	目前將依政府採購法第 22 條辦理後續事宜,並於決標後,要求得標廠商加速辦

																						而延後採購； 以致交貨日期 相對延後。	成後辦理 付款結 案。	
金門縣	c009-1- 105	投影機3台	金門縣 農業試 驗所	金門縣 農業試 驗所	140	0	0	0	0	0	107050 1	107070 4	107050 4	107071 0	107050 4	107071 0	107060 1	107071 0	107060 8	107061 5		因安裝施工較 為複雜，尋覓 合適廠商期程 較長。	已於6月 洽廠商估 價簽准， 並完成第 一台安裝 作業，第 二台預定 於預定於 7月中安 裝完成。	
金門縣	c009-1- 107	冷氣12組	金門縣 農業試 驗所	金門縣 農業試 驗所	600	600	0	0	0	0	107050 4	107051 0	107050 7	107051 5	107050 7	107051 5	107060 4	107060 4	107060 4	107060 4	107061 8	107070 4	因需安裝冷氣 並測試冷氣效 果，故驗收期 程較長。	業已順利 驗收完 成。
金門縣	c009-1- 108	辦理小三通相關設施改善工 程	金門縣 港務處	金門縣 港務處	3,500	0	0	0	0	0	107043 0		107053 1		107061 5		107081 5		107103 1	107113 0		彙整招標需求 延誤	俟得標 後，加速 後續設計 作業	
金門縣	c009-1- 114	金門港區老舊碼頭改善維護 工程	金門縣 港務處	金門縣 港務處	5,000	0	2,653	0	0	100	107042 0		107042 0		107042 7		107083 1		107123 1	107123 1		彙整招標需求 延誤	俟得標 後，加速 後續設計 作業	

金門縣	c009-1-115	料羅港北碼頭區圍堤造地工程規畫設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	8,000	0	0	0	0	0	107063 0	107063 0	107123 1	107123 1	107123 1	107123 1	彙整招標需求 延誤	俟得標後，加速後續設計作業		
金門縣	c009-1-117	水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	8,000	0	0	0	0	0	107063 0	107063 0	107123 1	107123 1	107123 1	107123 1	彙整招標需求 延誤	俟得標後，加速後續設計作業		
金門縣	c009-1-136	辦公室汰換冷氣機3台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	98	98	0	0	0	0	107051 1	107052 8	107051 1	107052 8	107051 1	107052 8	107061 1	107061 1	107063 0	與廠商議定附加採購項目及金額之時間起出預期。 依契約規定，廠商應於107年7月12日前履約完成，因目前履約情形正常，預計可依限完成安裝。
金門縣	c009-1-137	物資儲藏室冷氣機	金門縣衛生局	金門縣衛生局	30	30	0	0	0	0	107051 1	107052 8	107051 1	107052 8	107051 1	107052 8	107061 1	107061 1	107063 0	與廠商議定附加採購項目及金額之時間起出預期。 依契約規定，廠商應於107年7月12日前履約完成，因

																						目前履約情形正常，預計可依限完成安裝。
金門縣	c009-1-138	辦公室冷氣機 19 台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	664	664	43	0	0	6	1070511	1070528	1070511	1070528	1070511	1070528	1070611	1070611	1070630		與廠商議定附加採購項目及金額之時間超出預期。	依契約規定，廠商應於 107 年 7 月 12 日前履約完成，因目前履約情形正常，預計可依限完成安裝。
金門縣	c009-1-139	辦公室冷氣機 1 台	金門縣衛生局	金門縣衛生局	38	38	0	0	0	0	1070511	1070528	1070511	1070528	1070511	1070528	1070611	1070611	1070630		與廠商議定附加採購項目及金額之時間超出預期。	依契約規定，廠商應於 107 年 7 月 12 日前履約完成，因目前履約情形正常，預計

																						可依限完 成安裝。
金門縣	c009-1- 151	金城、山外、沙美車站旅遊 服務中心及金城民生車站民 生大樓二樓抗道展示館室內 裝修。因應建築法規室內裝	金門縣 政府觀 光處	金門縣 政府觀 光處	5,000	50	0	0	0	0	107061 5	107063 0	107073 1	107103 1	107121 5	107123 1					廠商目前提供 規劃及基本設 計報告書	預定於7 月30日 召開審查 會議
金門縣	c009-1- 152	既有景點設備設施零星修 繕、維護費。	金門縣 政府觀 光處	金門縣 政府觀 光處	2,000	0	0	0	0	0	107032 9	107032 9	107032 9	107103 1	107122 8	107123 1					為景點常態性 修繕，執行為 全年度	為景點常 態性修 繕，執行 為全年度
金門縣	c009-1- 153	12人座電瓶車10輛含運費 (大膽島3輛、烈嶼鄉因應大 膽開放觀光3輛於大膽島上供 遊客遊程中急難救護時使	金門縣 政府觀 光處	金門縣 政府觀 光處	6,840	0	0	0	0	0	107040 2	107040 9	107040 9	107071 3	107071 3	107071 3					報價高於底 價。	辦理第四 次投標。
金門縣	c009-1- 154	公務車1輛及運費(於大膽島 上供遊客遊程中急難救助時 使用)	金門縣 政府觀 光處	金門縣 政府觀 光處	692	0	0	0	0	0	107043 0	107043 0	107043 0	107073 1	107073 1	107073 1					原編列預算不 足	原編列預 算不足
金門縣	c009-1- 155	各景點設施、設備汰換更 新。	金門縣 政府觀 光處	金門縣 政府觀 光處	5,000	0	0	0	0	0	107032 9	107043 0	107051 1	107073 1	107121 4	107123 1					為景點常態性 修繕，執行為 全年度	為景點常 態性修 繕，執行 為全年度
金門縣	c009-1- 156	后湖海濱淋浴設施及周邊環 境改善計畫。	金門縣 政府觀 光處	金門縣 政府觀 光處	4,000	700	266	0	0	38	107043 0	107052 4	107051 5	107062 6	107061 5	107083 1	107113 0	107123 1			配合地方及現 況需求修正規 劃設計內容， 致未按預定期	已請廠商 依審查意 見修正， 並上網招

																					程上網招標及撥付款項。	標於107.6.26決標、107.7.9開工。
金門縣	c009-1-157	105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元,105年2,000萬元,106年	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	1,000	0	0	0	0	1070430	1070531	1070615	1070815	1071031	1071130					廠商提報規劃設計內容經審查尚有需修正	已請廠商依審查意見辦理修正
金門縣	c009-1-158	新景點暨辦公室設施修繕、規劃設計、監造、工程、設備改善購置計畫。	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	6,000	1,500	0	0	0	0	1070330	1070330	1070430	1070413	1070530	1070504	1070715	1070831	1071015		廠商報價低於80%	依採購法請廠商說明後決標
金門縣	c009-1-161	停車場土地取得	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	32,000	0	0	0	0	0	1070630	1070731	1070831	1070930	1071031	1071231					本案預定購買金城地區鳳翔社區停車空間,細停1-1-3及細停1-8,因細停1-1及1-3部份土地為鳳翔社區協會所有,業已請金城鎮公所黃主秘協助遊說社	俟社區協會確認出售意願後,本府再召開各地主價購意願協調會討論價購事宜。

																					區協會理事長 召開社區大會 提出討論以求 共識，俟確認 出售意願後再 召開各地主價 購意願協調會 討論價購事 宜。
金門縣	c009-1- 163	辦理金門地區停車場工程。	金門縣 政府觀 光處	金門縣 政府觀 光處	5,000	1,000	0	0	0	0	107053 1	107063 0	107073 1	107093 0	107103 1	107123 1	本案為補助各 鄉鎮公所興建 及改善停車場 設施工程，惟 本年度補助之 金城鎮、金寧 鄉、金沙鎮各 一案，目前金 城鎮鳳翔社區 停車場工程業 已進行規劃程 序，金寧鄉李 光前將軍廟前 停車場仍處規 劃及用地取得 中，金沙鎮沙	將請鄉鎮 加速各工 程進度， 確實掌握 各皆段工 程進度。			

																					東劃測段 338 及 339 地號整 建工程業已完 成發包作業， 並於 6/25 日開 工，刻正依約 執行尚無延 誤。	
金門縣	c009-1- 164	金城綜合福利館興建工程	社會處	社會處	4,000	1,530	877	0	0	57	106110 6	106110 6	106121 9	106121 9	107022 3	107022 3	107113 0	108080 6	108113 0	107 年 6 月份 廠商未向本府 申請工程估驗 計價及請款作 業。	本案 107 年 6 月 25 日至同年 7 月 1 日 工程預定 進度 14.641% ，實際進 度 1.341%， 進度落後 13.269% ，預定於 107 年 7 月 6 日上 午 10 時，在本	

																						府第四會議室召開趕工進度檢討會議，以利工進及請款事宜。	
金門縣	c009-1-165	金門縣金湖社會福利大樓興建工程	社會處	社會處	5,000	700	88	0	0	13	107053 1	107063 0	107073 1	108013 1	108073 1	108093 0					本案金湖鎮公所於107年6月29日於政府電子採購網公告公開招標，標案案號1070629，截止領標為7月9日17時30分，開標時間為翌日9時15分整。	廉績督導公所，依預定期程辦理。	
金門縣	c009-1-175	財政處公產科購置A3彩色多功能影印機1台。	金門縣政府財政處	金門縣政府財政處	120	120	0	21	21	35	107031 4	107031 4	107031 4	107031 4	107031 4	107032 7	107032 7	107032 7	107032 7	107042 7	107041 3		
金門縣	c009-1-181	本府各部門(單位)臨時必要之零星設備購置。	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	1,500	750	594	0	0	79	107033 0	107053 1	107073 1	107092 8	107120 3	107123 1						臨時必要之零星設備，並本摺節預算使用	持續積極辦理採購設備事

																						宜，並搏 節支出依 實之用
金門縣	c009-1-189	汰換本府主機房不斷電系統-本府主機房不斷電系統設備2套(一組 20K 並連成 80K，分別於 92, 94, 9	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	3,400	0	0	0	0	0	107043 0	107050 2	107063 0	107070 1	107090 1	107100 1	107103 1				因投標家數未 達法定家數流 標	於 107 年 7 月 6 日 第二次開 標
金門縣	c009-1-192	購置政府組態管理軟體-推動智慧城市行動智慧政府資通訊網路安全政策，導入全縣府主機組態管理，以維資訊安	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	800	0	0	0	0	0	107050 1	107053 1	107063 0	107071 0	107071 0	107103 1	107111 0				需求規格市場 訪價	規劃時間 再延長
金門縣	c009-1-194	觀光處辦公室裝潢整修工程	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,500	1,100	0	0	0	0	107053 1	107063 0	107071 5	107091 5	107113 0	107121 5						
金門縣	c009-1-203	購置異味清淨滅菌器一組	金門縣大同之家	金門縣大同之家	100	100	0	0	0	0	107042 0	107042 0	107042 0	107042 0	107042 0	107062 9	107062 9	107062 9			採購異味清淨 滅菌器一組，為 應實際需要，更 變外觀型式，預 定於 7 月 20 日 前交貨完成。	預定於 7 月 20 日 前交貨完 成。
金門縣	c009-1-209	辦理三漁港公共設施、設備、環境維護整修改善及漁村後續公共設施建設、出海口道路工程及屠牛場屠宰設	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	7,201	1,800	0	0	0	0	107030 1	107030 1	107030 1	107031 6	107030 1	107033 0	107123 1	107123 1	107123 1			

		備、農																						
金門縣	c009-1-214	整合本局網頁設計及增加硬體設備	金門縣文化局	金門縣文化局	4,000	0	0	0	0	0	1070629	1070731	1070914	1071031	1071130	1071214							服務建議書徵求規範研議中需內部開會討論	盡速擬定服務建議書徵求規範
金門縣	c009-1-216	教育行政大樓複合式多功能視聽教室整修工程	人事處	文化園區管理所	4,500	0	0	0	0	0	1070420	1070520	1070601	1070901	1071010	1071016								
金門縣	c009-1-217	教育行政大樓親子閱讀區及傳藝工坊設置工程	人事處	文化園區管理所	4,000	0	0	0	0	0	1070420	1070520	1070601	1070901	1071010	1071016								
金門縣	c009-1-218	文化園區入口指標及綠美化工程	人事處	文化園區管理所	500	0	0	0	0	0	1070420	1070520	1070601	1070901	1071010	1071016								

22. 連江縣

連江縣 107 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案 件數	總經費 5.53 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
67	3.37	2.16	135,752.13 4	83.86	24.53	59	60	52	56	26	35	11	16	6	9	5	9

本年度基本設施補助經費 5.53 億元(中央補助 3.37 億元，地方自籌 2.16 億元)，截至 6 月底止，共有標案 67 件。

107 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 161,883.44 仟元，預算實際支用數 130,131.932 仟元，已執行應付未付數 5,584 仟元，發包結餘數 36,202 仟元，合計預算執行數 135,752.134 仟元，預算執行率 83.86%，預算達成率 24.53%。
 - 依執行機關區分：由縣(市)執行 553,381 仟元，縣(市)執行率 83.86%，預算達成率 24.53%。
 - 依標案執行情形進度區分：67 件標案，已設計完成者 60 件，已發包決標者 56 件，已開工者 35 件，施工進度已達 50%者 16 件，已完工者 9 件，已驗收完成者 9 件。
 - 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 107 年 6 月底止，67 件標案計有 10 件落後，落後比率 14.93%。
落後原因：
 - 107 年 6 月落後標案 10 件，屬預算執行未達 80%者 7 件，屬查核點進度落後者 3 件。
 - 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 4 件、因預算編列落後者 3 件、其他因素落後者 2 件。
- 管考建議：截至 6 月預算達成率為 24.53%，較平均預算達成率 36.76%落後 12.23 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(28.91%)、水利建設經費(12.42%)、公有建物及設施經費(1.57%)、其他建設經費(25.51%)等四類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案，分屬交通旅遊局(5 件)、地政局(1 件)、行政處(1 件)、消防局(1 件)、教育處(1 件)、衛生福利局(1 件)等執行案件。請連

江縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按期程適時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

連江縣 107 年 6 月份落後案件統計表—依計畫類別

計畫類別	已填寫落後原因標案											未填寫 落後原因	總計
	規劃設計	土地取得	拆遷補償	招標作業	施工作業	驗收作業	計畫變更	人力需求	預算編列	天然因素	其他		
c001. 文化													0
c002. 體育				1									1
c003. 補助貧瘠 鄉鎮市													0
c004. 道路養護 及道安計畫													0
c005. 交通建設													0
c006. 水利建設													0
c007. 農業建設													0
c008. 公有建物 及設施				1									1
c009. 其他建設	1			2					3		2		8

連江縣基本設施補助計畫落後標案清冊

單位：件數

縣市別	標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(千元)	預定支用數	實際支用數	應付未付數	剩餘款	執行率(%)	設計完成		發包決標		開工		施工進度達50%		完工		驗收完成		進度落後原因	解決對策
											預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
連江縣	c002-1-5	連江縣運動會	教育處	教育處	7,000	1,000	0	0	0	0	107032 9	107031 5	107060 7	107060 5	107072 7		107083 1		107091 9		107101 1		本案已於6月完成招標作業，依契約規定辦理撥款事宜。	本案已於6月完成招標作業，依契約規定辦理撥款事宜。
連江縣	c008-1-2-1	東引消防分隊辦公廳舍整修工程	消防局	消防局	7,500	300	0	0	0	0	107051 1	107051 1	107062 9	107062 9	107071 6		107092 8		107113 0		107122 0		廠商辦理請款，送件中	加快審查作業
連江縣	c009-1-15	辦理本府駐台辦事處大樓裝修工程	行政處	行政處	4,900	0	0	0	0	0	107041 5	107040 2	107043 0	107053 0	107053 1		107083 1		107103 1		107123 1		廠商提供初步規劃設計報告書有需修正事項致預定期程延誤。	本案規劃設計報告書退回請廠商補齊資料後已於7/2送本府，目前將擇期召開審查會。

連江縣	c009-1-27	107 公有船舶維修改善計畫	交通旅遊局	交通旅遊局	18,000	18,000	0	0	0	0	1070101	1070101	1070105	1070105	1070301	1070301	1070315	1070315	1070320	1070327	1070323	1070328	經查連江航業 4 月 25 日工程師離職，5、6 月臺馬之星故障頻傳，因人力短缺需修理現場與物料補給，導致未將請款相關資料提送至本局，6 月底新進工程師到位，本局已催請連江航業盡快提送。	俟廠商 7 月辦理請款後，即可辦理請撥款作業。
連江縣	c009-1-31	臺馬間海運交通基本航次補貼計畫	交通旅遊局	交通旅遊局	49,600	9,800	0	0	0	0	1070430	1070424	1070430	1070424	1070720	1071031	1071220	1071231	1071231	業於 107 年 6 月 28 日收到第 1 季補助經費。	俟撥款作業核准後，撥付補助款於連江航業。			
連江縣	c009-1-32	馬祖島際間海運交通基本航次補貼計畫	交通旅遊局	交通旅遊局	64,730	16,200	0	0	0	0	1070430	1070424	1070510	1070424	1070720	1071031	1071220	1071231	1071231	業於 107 年 6 月 30 日收到第 1 季補助經費。	俟撥款作業核准後，撥付補助款於連江航業。			

																						業。
連江縣	c009-1-33	馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫	交通旅遊局	交通旅遊局	22,610	2,000	0	0	0	0	1060828	1060828	1070101	1070101	1070731	1071031	1071201	1071231			委託廠商提送請款憑証落後，造成撥款延遲。	督促廠商確實依計畫期程，提送相關憑証辦理請款。
連江縣	c009-1-35	107 臺馬輪支援臺馬航線與霧季航班補貼計畫	交通旅遊局	交通旅遊局	12,600	1,050	0	0	0	0	1070430	1070424	1070510	1070424	1070720	1071031	1071220	1071231			因交通部航港局預算延誤，旨案工作計畫書於 107 年 4 月 24 日交授航港字第 1070054896 號函核定。	已於 107 年 5 月 29 日提送請款資料及領據至交通部航港局請領補助款，俟交通部航港局撥款。
連江縣	c009-1-40	衛生所醫療設備	衛生福利局	衛生福利局	539	0	0	0	0	0	1070531	1070607	1070629		1070731	1070928	1071031	1071130			為使招標文件完善無誤，多次修正改進	預計 0704 開標完成
連江縣	c009-1-46	充實地政局資訊及交通設備	地政局	地政局	5,223	850	807	0	0	95	1070430		1070531		1070716	1070831	1070930	1071030			於 7 月 2 日因未達 3 家以上廠商流標	刻正辦理第二次招標公告
