列管案件進度月報

№ 120021

列管案件進度月報

（資料截止時間：63年11月30日）

目　錄

一、概　　述

二、施政計畫列管案件總數及分類

三、列管案件執行情形分析

四、進度落後案件綜合分析

五、重要經建計畫列管項目執行進度概況

六、進度落後案件個案分析

七、各機關列管案件進度統計分析

八、各機關公文時效管制統計

一、概　　述

㈠本院64年度施政計畫由院列管案件164案，於本年十一月間撤銷一案，實際列管163案，佔施政計畫總數3.59％，較去年度減少0.23％，但經濟建設計畫列管案之比重比去年增加1.61％。

㈡163個列管案，截至本年十一月底止，其執行情形，經追蹤分析如下：

進度符合及超前與完成者計115案，佔70.55％，進度落後者計48案，佔29.45％。

落後程度較大者為：

國防部的「龍淵計畫」。經濟部的「協和第一部機火力發電工程」、「北部煉油廠計畫」、「第二輕油裂解工廠」、「巳內醯胺計畫」、「蔗渣紙漿廠計畫」。經設會的「編擬第六期四年經建計畫六十四年度計畫」、「研擬十年長期經建計畫及第七期四年經建計畫」。科學發展其他機構的「台灣與美國西部溫帶林中檜木之生態比較合作研究」。退輔會的「繼續辦理華崗示範農墾」。台灣省政府的「新竹大陳義胞房屋遷建」、「鐵路幹線電氣化計畫」、「高雄第二港口開闢計畫工程」、「東部幹線改善工程」、「六十四年度添購新車計畫」。台北市政府的「籌建第二榮譽國民之家計畫」、「興建急診醫院」。

㈢重要經建計畫列管案，「南北高速公路工程」等十項執行情形，詳見第五節。

㈣六十三年十月份院屬各機關公文處理時效，平均使用天數為：4.42天，人民申請案依限辦出者達99.69％，訴願案件依限辦出者達97.55％。

二、施政計畫列管案件總數及分類

本院所屬各部、會、處、局、署、及省、市政府64年度施政計畫，由院列管案件計164案，本月份撤銷一案，實際列管163案，佔施政計畫總數4,539案的3.59％。

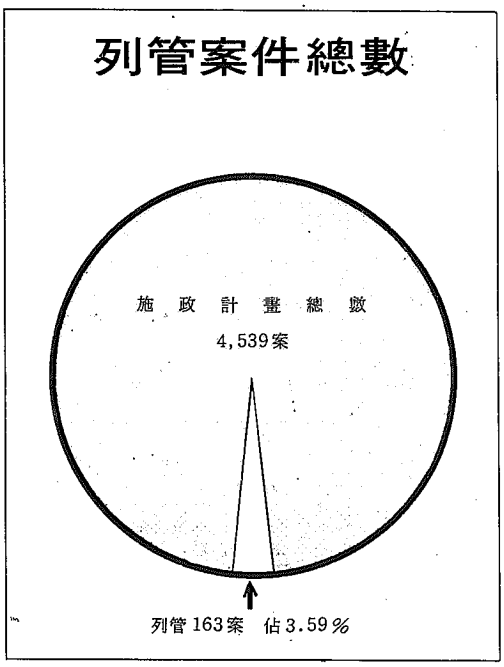

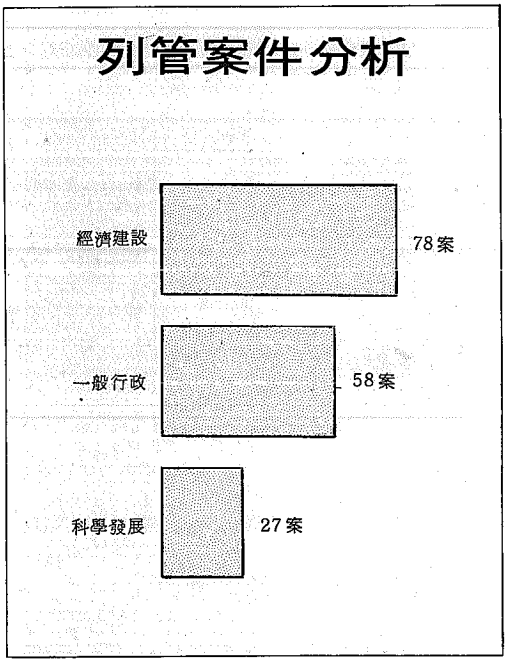

本院列管163案，區分為經濟建設計畫78案，一般行政58案，科學發展27案，經建計畫佔47.85％。

除科學發展列管案件，由國科會追蹤管制外，其餘案件均由研考會負責追蹤管制。

三、列管案件執行情形分析

列管案件163案，截至本年十一月底止，其執行情形，經追蹤統計分析如下：

進度符合者計92案，佔56.44％。

進度超前者計21案，佔12.88％。

執行完成者計2案，佔1.23％。

進度落後者計48案，佔29.45％。

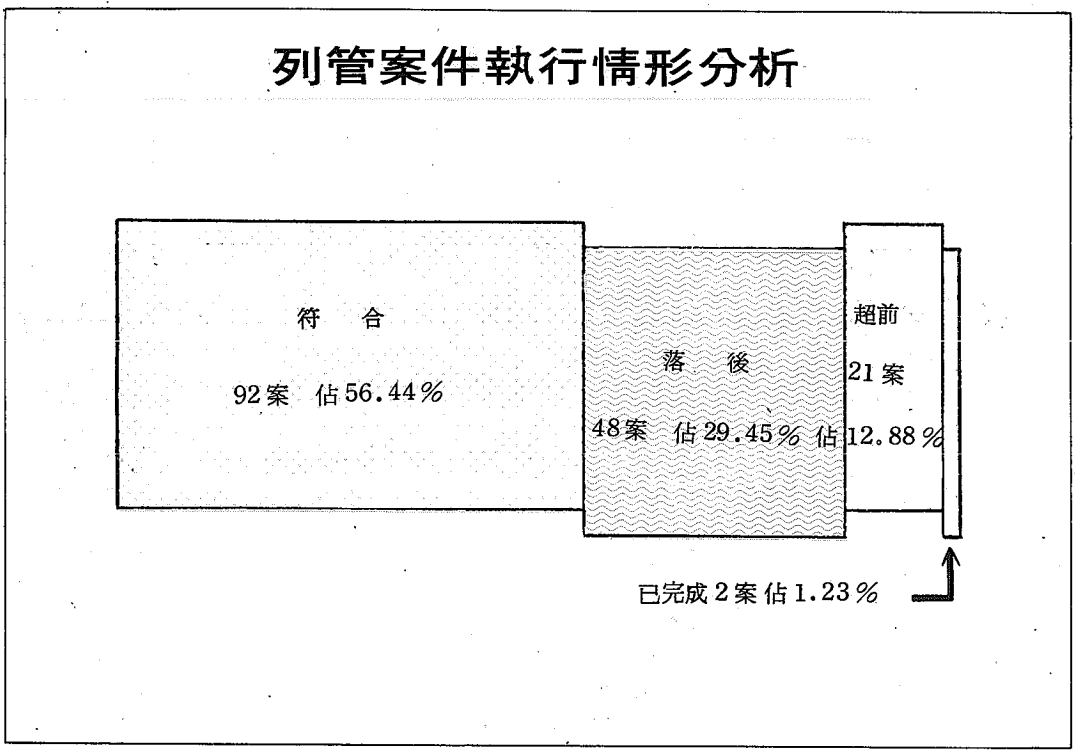

四、進度落後案件綜合分析

落後案件48案，其落後情形，經統計分析如下：

落後0.1—4.9%者29案，佔60.42%落後5—9.9%者7案，佔14.58%落後10—14.9%者3案，佔6.25%；落後15—19.9%者6案，佔12.50%落後20%以上者3案，佔6.25%。

以上落後案件其落後原因經詳細分析計有81項因素，部份計畫落後原因，有兩項以上因素者，經整理歸納為十二大類如下圖：

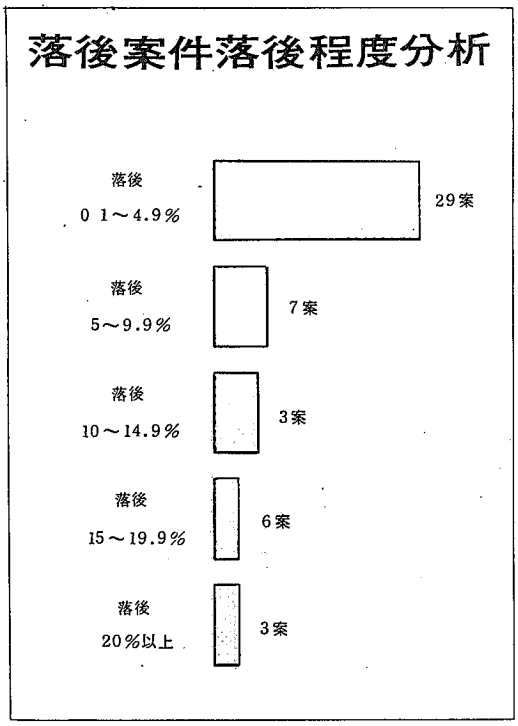

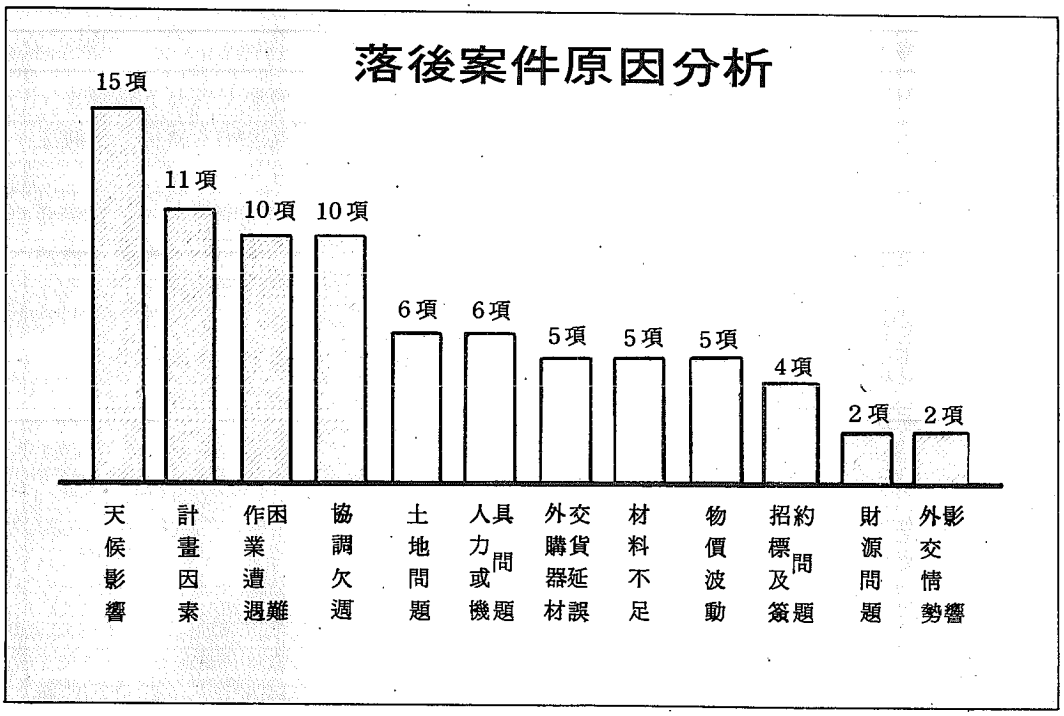

五、重要經建計畫列管項目執行進度概況

㈠臺灣區南北高速公路工程					
主辦單位	交通部高速公路工程局		計畫期程		58.9～67.12.
計畫內容	執行進度		預算支用（截至63. 10. 31.）		說明
（分項計畫）	預定%	實際%	預定（單位：千元）	實際（單位：千元）	
總計畫	45.25	41.28			因用地征購及天雨影響，致總進度落後3.97%正趕辦中。
1.基隆內湖段	54.64	55.89	929,500	528,392	1.第一段超前1.25%。
2.內湖台北段	50.63	48.35	1,948,600	937,336	2.施工稍有落後，正趕工中。
3.台北三重段	72.08	68.24	433,800	498,372	3.仝　上
4.三重中壢段	100.00	100.00	1,647,330	1,624,755	4.已於七月廿九日通車。
5.中壢楊梅段	84.44	79.00	535,100	322,843	5.施工稍有落後，正趕工中。
6.楊梅新竹段	40.60	36.66			6.用地征購預定進度偏高，即將修正計畫，落後部份正趕辦中。
7.新竹苗栗段	40.00	34.45			7.仝　上
8.苗栗大安溪段	34.05	27.58			8.仝　上
9.大安溪彰化段	33.20	30.38			9.仝　上
10.彰化西螺段	34.05	26.78			10.仝　上
11.西螺嘉義段	34.05	24.18			11.仝　上
12.嘉義新營段	38.05	37.45			12.仝　上
13.新營台南段	39.65	37.78			13.仝　上
14.台南岡山段	43.61	40.69			14.仝　上
15.岡山覆鼎金段	43.90	40.60			15.仝　上
16.覆鼎金鳳山段	39.90	39.65			16.仝　上
					楊梅至鳳山十一段分段預算尚待重新編列，容待補填。

(二)一貫作業鋼鐵廠第一期第一階段建廠計畫

主辦單位	中鋼公司		計畫期程		61.1.～66.12.
計畫內容（分項計畫）	執行進度		預算期程（截至63.11.30.）		說明
	預定 %	實際 %	預定（單位：千元）	實際（單位：千元）	
總計畫	11.30	11.32	2,276,067	3,591,259	總進度符合 1. 少數設備之規劃及採購落後： (1)原料搬運及儲存系統已於六月份發標，現正與廠商洽中。 (2)供配電系統發電工廠及鼓風設備計三十三標已訂購完成。 (3)公用設施正與美鋼公司研討招標規範。 2. 土地整理略有延誤，惟不影響整體計劃目標。 3. 碼頭B工程落後，原因爲主鋼料、鋼板樁未運抵工地及改變碼頭基樁設計。 4. 軋鋼廠以議價方式採購設備進度超前。 5. 甲乙種職員宿舍、辦公大樓及施工用電等略有延誤。
1. 工程規劃人員訓練及技術服務	11.30	13.15	177,710	290,807	
2. 土地購置及整理	100.00	79.36	459,399	180,041	
3. 碼頭設備	43.30	40.97	82,260	45,550	
4. 軋鋼設備工程	0	4.36	336,680	962,815	
5. 公用設施及其他工程	27.30	25.19	427,528	820,583	

㈢興建桃園國際機場

主辦單位	交通部民用航空局		計畫期程		61.11.～67.12.
計畫內容（分項計畫）	執行進度		預算支用（截至63.11.30.）		說明
	預定%	實際%	預定（單位：千元）	實際（單位：千元）	
總計畫	32.00	31.00	9,480,485	1,112,981	總進度落後1%。
1.規劃設計(佔總計畫14%)	14.00	14.00	207,950	213,641	1. 機場後期用地於63.11.19.奉准征收，特准先行使用。 2. 地上物繼續辦理補償。 3. 勤務道路地清册已繕造完畢。 4. 交流道橋樑於63.11.19.完工。
2.土地收購(佔總計畫18%)	17.64	16.38	872,600	700,775	5. 交流道進度達33.4%。 6. 航站大廈地下室排水工程達6.8%。
3.工程施工(佔總計畫68%)	0.54	0.58	8,399,935	198,565	7. 航站大廈地層電機及給水配管工程於63.11.16.開工。

㈣臺中港興建計劃

主辦單位	台中港工程局		計畫期程		60.7.～65.10.
計畫內容（分項計畫）	執行進度		預算支用（截至63.10.31.）		說明
	預定%	實際%	預定（單位：千元）	實際（單位：千元）	
總計畫	27.30	27.13	1,014,529	983,522	1. 總進度落後0.19%，係因進入季節風季，部份工程難以施工，略爲影響進度。 2. 利用季風期工程休閒期間，加強明年度各項重要工程之準備工作，其中沙灘上製造沈箱工作亦已積極展開。
1. 堤防工程	23.20	23.72	310,564	486,854	
2. 港埠工程	31.90	31.18	471,680	371,699	
3. 浚填工程	24.00	24.01	232,285	124,969	

㈤鐵路電氣化					
主辦單位	臺灣省交通處鐵路管理局		計畫期程		58.9.～67.12.
計畫內容（分項計畫）	執行進度		預算支用（截至63.11.30.）		說明
	預定 %	實際 %	預定（單位：千元）	實際（單位：千元）	
規劃階段	100	99.70	22,248	22,248	C組貸款草約業已寄達，規劃階段接近完成。
配合鐵路電氣化改進計畫：	47.51	47.64	548,456	566,755	配合改進計畫工程進行順利，進度超前0.13％。
1. 地下車輪鏇床採購及安裝	0.77	0.77	10,011	10,310	1. 承造廠機器製造中。
2. 基隆彰化間（經山線）281公里加強軌道工程	27.34	27.45	427,600	427,600	2. ⑴外洋鋼軌及配件均到貨，扣件陸續運達。 ⑵PC枕第一、二批四萬根已開工。
3. 竹南彰化間（經海線）99公里加強軌道工程	2.54	2.54	22,100	44,500	3. 路基加寬，曲線改善，改良道碴等工程，順利進行中。
4. 南港客車調車場征購土地	8.50	8.50	40,100	36,250	4. 征收案已由臺北市政府依法公告期滿（11月25日） 5. 正洽臺北市政府辦理都市計畫變更中。
5. 南港客車調車場至臺北站間運輸線購地	2.40	2.40	13,200	12.570	6. ⑴土木部份：除趕辦鋪軌工作外，其他工程已完工。
6. 南勢北方延長線及號誌增設工程	2.92	2.92	9,254	9,334	⑵電務部份：俟鋪軌完成後方能開始。
7. 站場改善工程	3.04	3.06	26,125	26,125	7. 站場工程改善進行順利，進度超前。
工程研究及準備階段	80.40	75.15	33,565	28,954	邀請G.E.廠團研辦發包施工方案，進度落後5.25％。
1. 工務部份	36.50	39.25	0	0	1. 南港客車場用地奉准征收土地已可使用。 2. 進行順利，進度超前。
2. 機務部份	10.50	15.50	0	0	3. ⑴繼續與GEC廠團及依力伸廠進行工程研究。
3. 電務部份	33.40	20.40	0	0	⑵變電站系統設計，GEC廠團進行遲緩。

㈥興建北廻鐵路

主辦單位	臺灣省交通處北廻鐵路工程處		計畫期程		62.12～67.12
計畫內容（分項計畫）	執行進度		預算支用（截至63.11.30.）		說明
	預定 %	實際 %	預定（單位：千元）	實際（單位：千元）	
總計畫	5.35	5.23	138,300	132,780	總進度落後0.12%。因受颱風霪雨影響，道路泥濘，致進度落後。
1. 用地取得	2.74	2.74	65,100	65,100	1. 第二階段用地取得，因受颱風影響，繼續辦理內部作業。
2. 路基工程	1.15	1.14	32,200	29,720	2. 南北兩端完成土石方七十七萬立方公尺，護坡五千六百平方公尺。
3. 橋涵工程	0.40	0.55	11,230	24,550	3. 南北兩端完成：大橋390公尺，小橋148公尺，涵管750公尺。
4. 房屋建築工程	0.12	0.12	3,380	0	4. 崇德、永春、漢本合計完成宿舍1,280平方公尺。
5. 規劃建設	0.15	0.15	4,200	4,200	5. 中線測量、震坡探測、地質鑽探、地質研究，完成總體0.15%。
6. 隧道工程	0.73	0.50	20,490	9,210	6. 第二、三、五、六號隧道及永春、崇德混凝土預鑄場，因連續降雨乃間歇施工。
7. 站場、安全電訊設備工程	0.06	0.03	1,700	0	7. 因連續陰雨，電訊工程延期開工。

㈦建設高雄造船廠計畫

主辦單位	中船公司		計畫期程		62.4～66.4
計畫內容（分項計畫）	執行進度		預算支用（截至63.11.30.）		說明
	預定 %	實際 %	預定（單位：千元）	實際（單位：千元）	
總計畫	46.00	45.50	3,269,323	2,496,084	1. 總進度落後0.5％。 2. 船塢工程基樁部份，因新製樁品質不一，影響進度，已協助其增加製樁承包人，以期改進。 3. 船體工場基樁工程IFG公司承打樁之機械前因故障使進度落後，現已修復，正積極趕工中，並催請該公司進口特種鋼導桿，以加速進度。
1. 船塢碼頭	11.50	11.30	936,434	712,536	
2. 350T及20T另車各二台	8.30	8.30	107,692	125,192	
3. 船體工場工程	8.20	7.90	467,856	324,554	
4. 機具設備	6.30	6.30	781,621	444,548	
5. 廠房及其他	6.50	6.50	772,958	720,097	
6. 人員訓練工程服務及開辦費	2.20	2.20	212,762	169,157	

㈧蘇澳港興建計畫（商港部份）

主辦單位	蘇澳港工程處		計畫期程		63,7～68.6
計畫內容（分項計畫）	執行進度		預算支用（截至63.11.30.）		說明
	預定 %	實際 %	預定（單位：千元）	實際（單位：千元）	
總計畫	1.79	1.50	82,100	28,376	1. 總進度落後0.29％，係受天候影響。 2. 碎波堤菱形塊鐵模製造60套，菱形塊製作316塊。 3. 深水碼頭採用基樁棧橋式重新設計。 4. 新購沉箱浮塢定64年1月7日開標，舊浮塢及海底整平吊桿船已委託中信局標購中，新造四百噸台船施工中，已完成87.75％。
1. 碎波堤	4.41	4.23	28,000	17,689	
2. 深水碼頭	0.47	0.40	8,000	238	
3. 填築新生地	1.37	0.52	7,500	298	
4. 施工機械	4.42	3.93	3,000	7,284	
5. 沉箱浮塢	10.00	6.75	0	26	
6. 施工便道	5.12	5.12	29,100	388	
7. 零星工程及一般行政費	8.28	8.28	6,510	2,453	

(八)蘇澳港興建計畫（軍港部份）

主辦單位	海軍蘇澳港灣工程處		60.3～66.6
	執行進度		
計畫內容（分項計畫）	預定 %	實際 %	說明
總計劃	47.75	36.26	1. 總進度後 11.49 % 除落後原因同前外，11 月份因雨天超過20天，影響各項工程施工。
1. 碼頭建造	12.28	7.89	
2. 防波堤構建	8.97	5.01	2. 改進措施： (1)督促儘速完成颱風豪雨所造成災害之復舊工作。 (2)呈報擬同意榮工處第三次函送趕工計畫及網狀圖資料修正於 66.12.31. 完工，調整工程預定進度以縮短差距。
3. 岸上設施興建	8.37	5.24	
4. 道路興建	5.16	5.00	(3)協助施工單位利用已完工之RC浮沉台及商借商港購置之沉箱浮塢先行使用製作防波堤RC沉箱。
5. 各項工程設計	12.97	13.12	3. 經費截至十一月底止。 預支 905,068 千元 實支 625,314 千元

(九)興建發電廠——核能——廠第一部機工程

主辦單位	台灣電力公司		57.9～65.10.
計畫內容（分項計畫）	執行進度		說明
	預定 %	實際 %	
總計畫	46.59	45.51	1. 總進度落後 1.08 %，原因爲:
1.廠基開挖及構築	100.00	100.00	(1)熟練技工缺乏，承包商僱工流動性大。
2.廠房建築	39.00	38.90	(2)廠房上部結構埋設物複雜。
3.防波堤施工	69.00	98.00	(3)包封容器內生物遮蔽牆鋼柱無法配合反應器基座塗漆同時進行，遮蔽牆內埋設管路原設計差錯，經核准修訂，損失七天。
4.冷却水排水渠道	100.00	100.00	
5.熱傳遞及保安設備安裝	34.00	33.00	(4)外購器材（管件）未能配合裝機順序交貨。
6.儀表及控制設備安裝	19.00	13.00	(5)土木工程進度落後，影響核燃料處理及儲存設備安裝關工。
7.冷凝器和附屬設備安裝	36.50	53.00	2. 改進措施：
8.輔助及什項電氣設備安裝	30.00	28.00	(1)招募契約工予以訓練，並協調承包商增加出工人數。
9.配管及管路設備安裝	17.00	7.00	(2)落後工程均正積極趕工中。
10.汽輪發電機安裝	24.00	14.00	3. 本計劃包括 29 項分項工程已完成 5 項，進度超前 7 項，符合 2 項，落後 12 項 ，尚未有進度者 3 項。
11.反應器設備安裝	8.50	6.50	4. 經費截至十一月底止。 預支 6,770,631 千元 實支 7,586,440 千元
12.輸電線架設	12.00	12.00	

㈨興建發電廠——核能——廠第二部機工程

主辦單位	台灣電力公司		57.9～66.10
計畫內容（分項計畫）	執行進度		說明
	預定 %	實際 %	
總計畫	25.19	24.49	1. 總進度落後0.70%係受第一部機工程落後影響。
1.廠基開挖及構築	82.00	82.40	
2.冷却水進水隧道	87.00	86.80	2. 本計畫包括二十七項分項工程，完成四項，進度超前五項，符合二項，落後六項，尚未有進度者十項。
3.施工設備及工廠	85.00	90.00	
4.輔助及什項電氣設備安裝	14.00	13.00	3. 經費截至十一月底止預支4,673,521千元。實支4,647,382千元。
5.廠房建築	8.00	7.70	
6.儀表及控制設備安裝	1.50	1.50	
7.包封容器	100.00	100.00	
8.放射性廢料處理及處置設備安裝	6.00	6.00	
9.熱傳遞及保安設備安裝	4.00	3.00	
10.冷凝器及附屬設備安裝	3.00	7.00	

㈨興建發電廠——協和第一部機火力發電工程

主辦單位	台灣電力公司		60.7～65.12
計畫內容（分項計畫）	執行進度 預定 %	實際 %	說明
總計畫	41.10	26.70	1. 總進度落後 14.40％ 落後原因爲：
1.海堤建造	84.00	89.00	⑴受季風及霪雨季節影響，海堤之堤心石方塊鼎塊暫時無法修復。
2.廠房基礎施工	98.00	97.00	
3.抽水機房及循環水進水結構建造	58.00	59.00	⑵部份鍋爐鋼架尚未到料，已到鋼架順序錯誤影響進度。
4.循環水進水渠道建造	60.00	14.00	⑶受下雨影響，施工困難。
5.其他土木工程	57.00	42.00	2. 工程進度落後甚大，正設法改進趕工中。
6.燃油設備安裝	55.00	11.50	
7.供水及水處理設備安裝	65.00	26.00	3. 本計畫包括二十二項分項工程，已完成一項，進度超前二項，符合一項，落後十四項，尚未有進度者四項。
8.廠內電氣設備安裝	31.00	7.00	
9.廠房鋼架安裝及廠房建造	85.00	48.00	4. 經費截至十--月底止
10.汽輪發電機安裝	23.00	7.00	預支 2,474,827千元。
11.冷凝器及循環水系統設備安裝	30.00	15.00	實支 2,291,983千元。

(九)與建發電廠——大林第五部機火力發電工程

主辦單位	台灣電力公司		60.2～64.12
計畫內容（分項計畫）	執行進度		說明
	預定 %	實際 %	
總計畫	61.21	67.74	1. 總進度超前 6.53 %。
1.廠房基礎施工	100.00	100.00	2. 本計畫包括二十一項分項工程，已完成四項，進度超前十二項，落後四項，尚未有進度者一項。
2.廠房鋼架安裝及廠房建造	88.00	87.77	
3.抽水機房及循環水進水結構建造	88.00	91.00	3. 經費截至十一月底止預支 2,232,647 千元。實支 2,583,745 千元。
4.鍋爐安裝	52.00	62.78	
5.通風設備安裝及烟囪建造	63.00	77.02	
6.汽輪發電機安裝	53.00	71.45	
7.冷凝器及循環水系統設備安裝	40.00	56.36	
8.廠內電氣設備安裝	50.00	51.83	
9.管路及保溫設備安裝	51.00	47.18	
10.控制設備安裝	14.00	30.00	

(十)石油化學工業相關計畫執行概況

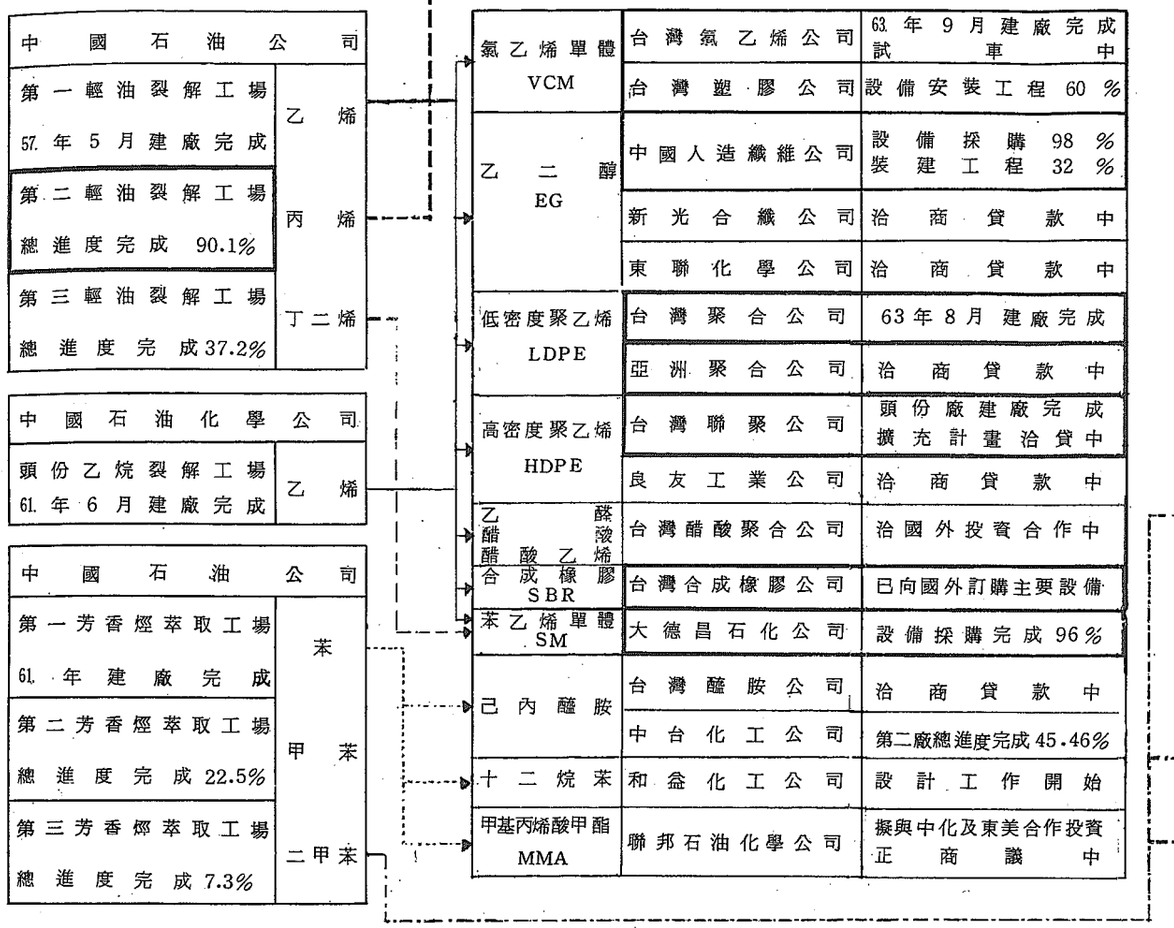

說　明：

一、國營事業目前進行中之計畫而由本院列管者 6 項。

1. 第二輕油裂解工廠：預定進度：98.6%　實際進度：90.1%
2. 第三輕油裂解工廠：預定進度：37.4%　實際進度：37.2%
3. 第三芳香烴萃取工廠：預定進度：7.3%　實際進度：7.3%
4. 丙烯腈計畫—預定進度：71%　實際進度：69.4%
5. 己內醯胺計畫—預定進度：98.58%　實際進度：74.43%
6. D.M.T. 擴充計畫—預定進度：58.6%　實際進度：58.0%

二、民營事業 28 項計畫，建廠完成3 項，正洽商貸款者 17 項，進行設計採購者 5 項，開始安裝工程者 2 項，另一項計畫正由三家公司協商合作投資中。

圖　例：

第二輕油裂解供應之下游計畫。
第三輕油裂解供應之下游計畫。
第二、三輕油裂解供應之下游計畫。

六、進度落後案件個案分析

機關名稱	計畫名稱	落後百分比	原因分析	解決辦法
內政部	規劃臺灣地區土地測量	2%	出國人員考察蒐集資料甚多，携帶不便，郵寄未到，延誤撰寫，致使進度落後。	已催請出國人員趕辦中
外交部	繼續加強我與韓、菲、泰友好關係，推動經濟合作	2%	原計畫預定於本年十一月間舉行中泰部長級經濟合作會議，因受泰國政局影響，致使會議停開。	俟六十四年元月廿六日泰國舉行大選，新政府成立後，再積極交涉期能於明年初召開。
	加強對非洲國家技術合作	5%	原預定於十月間派遣技術考察團赴非洲，因政策上變更，延於十一月七日啓程與原訂進度遲緩一個月。	該考察團原定回國時間延後於十二月間返國。
國防部	龍洲計畫	11.49%	1. 防波堤及碼頭工程因下述原因而影響進度： (1)受當地氣候多雨。 (2)施工場地狹小。 (3)石源不足。 2. 對防波堤ＲＣ沉箱之製造未決 3. 施工碼頭變更設計牽累各型碼頭及岸上各項設計與滑道、消浪岸壁等工程，未能按期完工 4. 本月份工程實際進度較預定進度落後０.７８％其原因雨天超過20天，影響各項工程施工推展所致。	1. 督促施工廠商儘速完成颱風豪雨所造成災害之復舊作業。 2. 同意榮工處第三次函送趕工計畫及網狀圖資料修正於66.12.31.完工。調整工程預定進度以縮短差距。 3. 協助施工單位榮工處妥爲利用已完成之RC浮沉台及商借商港購置之浮塢兩座先行使用製作防坡堤ＲＣ沉箱，俾於近期內趕上進度。
財政部	開闢七股新鹽灘計畫	2.67%	本工程由於榮工處抽砂填基工程施工就延，難以有效趕工。	繼續聯繫有關單位催趕中。

教育部	體育研究與發展	5%	因經費問題，體能測驗進度稍落後。	協調趕辦中。
經濟部	改進農產運銷方案	0.5%	臺北市屠體交易場因土地問題尚未解決，進度落後。	與有關單位接洽中。
	高雄臨海工業區開發	1.45%	十一月份上旬因雨影響工程進行及污水下水道未開工，山區截水溝亦因變更設計而停工。	積極趕工中。
	協和第一部機火力發電工程	14.4%	1. 受東北季風及霪雨季節影響海堤之堤心石方塊，鼎塊暫時無法修復。 2. 部份鍋爐鋼架尚未裂料，已到鋼架順序錯誤影響進度。 3. 受下雨影響，施工困難。	正趕工中。
	核能一廠第一部機發電工程	1.08%	1. 熟練技工缺乏，承包商僱工流動性大。 2. 廠房上部結構埋設物複雜。 3. 包封容器內生物遮蔽牆鋼柱無法配合反應器基座塗漆同時進行，遮蔽牆內埋設管路原設計差錯，經核准修訂損失七天。 4. 外購器材未能配合裝機順序交貨 5. 土木工程進度落後使核燃料處理及儲存設備安裝開工之日較晚	1. 招募契約工予以訓練，並諭知承包商增加出工人數。 2. 各落後工程正積極追趕中。
	核能一廠第二部機發電工程	0.7%	受第一部機工程落後影響致進度落後。	正設法趕工中。
	北部油運及儲存計畫	4.01%	受雨季影響，油槽區土木工程進度稍落後。	正設法趕辦中。
	北部煉油廠計畫	8.7%	1. 由於世界性物價波動影響，器材購置困難。 2. 受天雨影響土木工程進度稍落後	催促趕辦中。
	第二輕油裂解工廠		1. 部份購料因全球性缺貨及交貨延誤，影響進度。	正積極催交貨及趕工中

經		8.5%	2. 有些器材因廠商罷工，影響交貨甚鉅。 3. 管線材料許多項目無現貨可供應，影響建廠進度。 4. 器材交貨延誤，施工無法全面展開。	
	加氫裂解設備	1.3%	管架預製安裝稍有落後。	正趕工中。
	石油化學基本原料生產計畫（前期）	0.48%	1. 第十蒸餾工場興建計畫變更，目前尚未定案，有關工作均暫停。 2. 國外材料普遍缺料，致廠商報價不踴躍及所訂交貨日期過長，訂購困難。 3. 國外各種器材普遍延遲交貨很多。	正極力催交並設法加速裝運。
濟	D.M.T. 擴充計畫	0.6%	1. First DMT reactor 之 Agitator & Mechanical seal經屢次交涉結果，最快交貨期爲明年 8月底，而本計畫預定期限爲明年 6月底。 2. 電器導管一批原訂 11月 30日裝船現供應商要求增價 25%，否則要求取消合約，以上購料進度落後影響總進度。	正積極協商中
	丙烯晴計畫	1.6%	1. 美國製造廠商由於材料困難及技術人力缺乏，不能如期交貨 2. 部份器材如 Tower等不能如期交貨使裝建工程不能依進度安裝機器。	本公司以電報催貨，並派員赴美催辦。
部	己內醯胺計畫	24.15%	1. 儀電安裝仍因設備安裝及土木工程之延遲而落後。 2. 因人手不足且工人素質較低，致使進度遲緩。	促請中技社設法趕工及改善工人素質。

經濟部			3. 由於中技社雇用之電焊工素質差，致鍋爐焊接工作不佳，於試壓時滲漏之處甚多，現正由該社積極修補中。	
	第三期擴充煉鋁及加工設備計畫	4.12%	1. 部份機器設備因收到L／C過遲均展延交貨日期。 2. 電解工場廠房由於臺幣資金不足未能如期發包。	已函催承製商趕製並提早交貨且正積極籌措資金。
	中國造船公司高雄造船廠計畫	0.5%	1. 船塢工程基樁部份，因新製新樁品質不一，影響進度。 2. 船體工場基樁工程IFG公司承打樁之機械因故障使進度落後。	1. 已協助其增加製樁承包人，以期改進。 2. 已修復機械正積極趕工中。
	蔗渣紙漿廠計畫	15.4%	1. 承商未能如期提供各項詳圖。 2. 工程人員缺乏，自辦部份亦深受影響。	1. 除分別函電催促承商外，並派駐日工程師就近洽催。 2. 正分別以不同方式及途徑覓求補充有經驗之工程人員，以期配合工程需要。
交通部	臺灣區南北高速公路工程	3.97%	由於用地征購作業預定進度偏高，兼以入秋以來陰雨連綿致總工程進度落後。	修訂用地征購作業計畫並積極趕工中。
	配合城鄉發展擴充郵務設施。	0.58%	購置郵局基地議價簽約進度落後	協調辦理中。
	興建桃園國際機場計畫	1%	因土地征收遲緩，進度落後。	已協調桃園縣政府繼續辦理。
	擴充各地市內電話228,800門	0.2%	日貸案中臺北北二局，高雄南局及各地擴充案中機房建築因受土地及物價變動等因素影響，未能如期完成，影響各地擴充工程進行。	正調度支應中。

人事行政局	辦理在職訓練	5%	基層人事人員在職訓練第一梯次因故延至十一月中旬實施，第二梯次順延至十二月二日開訓，實際進度與預定計畫順延二週。	修正計畫往後順延二週
新聞局	加強雜誌輔導與管理	5%	1. 爲愼重起見，將省市新聞處所提名優良雜誌最近發行二期出版品及其資料加以審核。 2. 爲示隆重將頒發獎狀改爲獎牌	仍照原計畫於十二月底頒發。
經設會	編擬第六期四年經建計畫六十四年度計畫	25%	1. 六十四年度預測模型試算須待報院核定中之國民所得資料核定後才能予以調整，致進度落後。 2. 農業方面因重訂增產計畫所作估計工作亦須配合調整	待本院核示原則後，加強辦理。
	研擬十年長期經建計畫及第七期四年經建計畫	25%	因編擬之“十年長期經建計畫之構想”於本年十月八日呈院核示，迄未蒙核定，致編擬計畫未克進行。	待本院核示後積極趕辦
科其學他發機展構	臺灣與美國西部溫帶林中檜木之生態比較合作研究	15%	因本年度以來至十月間豪雨特多，山區交通受阻，致進度落後。	俟天氣好轉山區道路通暢後加強辦理推進工作
退輔會	繼續辦理華崗示範農墾	8.8%	國防部人力司(63)傑偉字第3617號函，華崗農墾第二期計畫延緩辦理，故本月份無實際進度。	正積極協調國防部中。
臺灣省政府	新竹大陳義胞房屋遷建	15%	因工程用地與軍方協調中，故工程進度稍緩。	現工程用地已獲協議可望於十二月初開工。
	菸酒生產計畫更新及擴建工程	0.25%	成功啤酒廠部份進度落後。	正趕工中。

臺灣省政府	繼續實施林相變更	1.35%	造林工作受季節及氣候影響，本年度雨水過多，致分月進度稍落後。	趕工中。
	鐵路幹線電氣化計畫	5.20%	1. 因工程研究關連電化案整體計畫，內容複雜，牽連甚多，故進行未如理想。 2. 變電站系統設計因GEC廠團進行遲緩，又電車線勘測設計幾經與承商ＧＥＣ廠團研商，須俟正式簽訂合約後設計工作方可展開，故進度落後。	積極協調趕辦中。
	北廻鐵路興建計畫	0.12%	路基、隧道、房屋建築、電訊設備工程等施工，前有颱風與多霪雨影響，低窪地區今尚積水施工道路泥濘、機械無法發揮效率，工程落後。	積極趕辦中。
	蘇澳港興建計畫	0.29%	1. 因受施工場地及天候所限，菱形塊裂作無法大量製造。 2. 碼頭地質因不適用墩座棧橋式碼頭，經研討決採用基樁棧橋式，重新設計故落後一個月。 3. 新生地填築因施工方式意見未一致，現停工並辦理申覆。 4. 沉箱浮塢原擬以議價方式採購，現奉令送中信局公開招標，現因辦理手續故進度落後。 5. 海底整平吊桿船原擬議購，現改爲開標，進度稍落後。	積極趕辦中。
	臺中港興建計畫	0.17%	本港已進入季節風季，部份工程難於施工，致略爲影響進度。	洽催承包商榮工處儘力趕工，並增派機具及人工以彌補落後之進度。
	高雄第二港口開闢計畫工程	10.69%	因受本年物價波動及颱風災害，63年度工程未達預定進度，故64年度部份工程未能進行。	修訂計畫延長工期。

臺灣省政府	東部幹線改善工程	17.00%	橋樑工程設計較遲開工延後致進度落後。	正辦理調整作業計畫中
	六十四年度添購新車計畫	16.80%	本案原計畫前因奉示有所變更，經本局考慮實際需要情形，陳奉交通處核准，仍按原計畫辦理。	變更執行進度網狀圖呈請交通處核備。
	加強水土保持	0.20%	推廣水土保持處理區域面積進度稍落後。	積極辦理中。
	增加米穀生產計畫	0.15%	加強機耕隊營運服務因農閒期致進度落後	積極趕辦中。
臺北市政府	籌建第二榮譽國民之家計畫	16.00%	1. 厨房餐廳經費尚待大會審議，影響施工進度。 2. 本月份風量特多，影響工期。	洽請輔導會積極準備發包中。
	興建急診醫院	4.50%	養工處尚未與中興工程顧問社簽約，致影響工程設計工作。	積極洽催中。
	六張犁段地區市地重劃	1.00%	因天雨影響施工，致進度落後。	正趕工中。
	華江地區區段征收	4.00%	第二期範圍內房屋之複估及拆除有關問題因年來建築材料及一般物價猛漲，又地價亦有波動，原擬訂之征收與重建計畫必須修訂	俟報請核定原則後辦理

七、各機關列管案件進度統計分析

機關名稱	列管案數	執行情形				落後案件進度分析			備考
		完成	符合	超前	落後	9.9%以內	10—19.9%	20%以上	
內政部	8		7		1	1			
外交部	5		3		2	2			
國防部	6		5		1			1	
財政部	5		4		1	1			
教育部	6		5		1	1			
司法行政部	5		5						
經濟部	29	1	8	4	16	13	2	1	
交通部	10		2	4	4	4			
蒙藏委員會	3		3						
僑務委員會	4		4						
主計處	3		3						
新聞局	4		3		1	1			
人事行政局	3		2		1	1			
衞生署	3		3						
經濟設計委員會	2				2			2	
國軍退除役官兵輔導委員會	6		2	3	1	1			
青年輔導委員會	2			2					
原子能委員會	6		6						
國家科學委員會	1		1						
科學發展其他機構	14		13		1		1		
臺灣省政府	26	1	8	5	12	8	4		
臺北市政府	12		5	3	4	3	1		
合計	163	2	92	21	48	36	8	4	
附記	落後案件48案，請各主管機關排除困難，趕上進度，或適時調整計畫，符合現況。								

八、行政院所屬各機關六十三年十月份公文稽催成果管制統計表

機關 \ 數量 \ 項目	收文統計			本月份已結案件統計												本月份待辦統計		
					發文													
	合計	本月份新收文	截至上月底未辦件數	合計	發文小計	1－3天辦結 件數	%	4－6天辦結 件數	%	7－15天辦結 件數	%	16－30天辦結 件數	%	30天以上辦結 件數	%	發文使用平均天數	存查	件數	%
總計	366,156	342,940	23,216	342,193	184,357	111,816	60	45,491	25	21,954	12	4,459	2	637	1	4.42	157,836	25,966	7
院本部	2,627	2,482	145	2,427	1,300	697	54	318	25	184	14	73	6	28	2	5.75	1,127	200	8
內政部	3,890	3,390	500	3,160	1,555	851	55	468	31	176	11	37	2	23	2	4.85	1,605	730	19
外交部	13,706	13,478	228	14,031	6,881	5,802	84	891	12	123	3	50	2	15	1	3.86	7,150	315	1
國防部	18,611	18,307	304	20,783	8,882	5,503	62	2,148	24	1,111	13	120	1			3.68	11,901	310	2
財政部	9,572	9,301	271	9,719	5,841	2,218	38	1,461	25	1,417	24	723	12	22	1	7.64	3,878	278	3
教育部	6,467	6,033	434	6,042	3,523	1,514	43	1,373	39	436	12	122	4	78	2	5.70	2,519	425	7
司法行政部	1,648	1,629	19	1,626	837	360	43	303	36	161	19	13	2			4.52	789	22	1
經濟部	7,820	7,578	242	8,228	3,094	1,405	45	992	32	596	19	91	3	10	1	4.90	5,134	223	3
交通部	1,822	1,735	87	1,592	950	490	52	229	24	155	16	64	7	12	1	5.87	642	135	7
蒙藏委員會	462	456	6	474	76	66	87	4	5	6	8					2.29	398	34	7
僑務委員會	3,544	3,467	77	4,187	1,805	915	51	361	20	408	23	113	6	8		5.94	2,382	60	2
行政院主計處	2,648	2,324	324	2,478	1,180	690	58	307	26	104	9	53	4	26	2	5.27	1,298	321	12
新聞局	2,538	2,492	46	2,770	992	499	50	261	26	196	20	24	2	12	2	5.40	1,778	39	2
人事行政局	10,446	10,207	239	10,596	2,517	1,927	77	322	13	196	8	54	2	18	1	3.37	8,079	205	2
衛生署	2,146	2,052	94	2,088	948	432	46	217	23	192	20	70	7	37	4	7.04	1,140	110	5
經濟設計委員會	486	474	12	481	83	47	57	15	18	15	18	6	7			5.50	398	5	1
國軍退除役官兵輔導委員會	9,924	9,851	73	10,940	7,154	4,010	56	2,129	30	953	13	56	1	6		4.06	3,786	55	
青年輔導委員會	385	376	9	481	350	125	36	180	51	45	13					4.20	131	10	3
原子能委員會	498	467	31	611	218	146	67	37	17	33	15	2	1			3.59	393	11	2
國家科學委員會	1,158	905	253	1,078	702	352	50	184	26	145	21	14	2	7	1	4.87	376	279	24
故宮博物院	264	241	23	295	180	137	75	25	14	15	8	3	2			2.80	115	27	11
行政院研究發展考核委員會	693	667	26	698	115	53	46	28	23	23	20	11	10			6.48	583	49	
臺灣省政府	127,080	119,300	7,780	112,652	69,846	40,073	58	21,048	30	7,750	11	716	1	59		4.14	42,806	9,152	7
福建省政府	53	51	2	56	29	24	83	2	7	3	10					2.40	27	3	6
臺北市政府	137,668	125,677	11,991	124,700	65,299	43,480	67	11,988	18	7,511	12	2,044	3	276		3.60	59,401	12,968	9
臺灣省各縣（市）政府	228,201	207,673	20,528	204,974	140,414	51,329	37	43,402	31	35,289	25	9,271	7	1,123	1	6.81	64,560	21,377	9
臺北市各區公所	29,295	28,916	379	28,711	16,979	15,653	92	997	6	291	2	36		2		1.74	11,732	584	2

備註

一、臺灣省各縣（市）政府，及臺北市各區公所數字，未列入本表總計欄內統計。

二、本表各%欄係採用四捨五入，保持整數便於閱覽。

行政院研究發展考核委員會

資料起止日期：63年10月1日至63年10月31日

行政院所屬各機關六十三年十月份訴願案件統計表

數量項目 / 機關	收件統計			本月份已結案件統計					本月份待辦統計	
	合計	本月新收件份數	截至上月未辦件數	合計	依限辦出		逾限辦出		件數	%
					件數	%	件數	%		
總計	1,627	977	650	978	954	97.55	24	2.45	649	39.89
院本部	311	292	19	282	282	100.00			29	9.32
內政部	105	30	75	16	16	100.00			89	84.76
國防部	6	1	5	4	4	100.00			2	33.33
財政部	308	148	160	197	197	100.00			111	36.04
司法行政部	1	1		1	1	100.00				
經濟部	391	331	60	289	288	99.65	1	0.35	102	26.34
教育部	8	6	2	6	6	100.00			2	25.00
交通部	6	1	5	2	2	100.00			4	66.67
新聞局	6	6		3	3	100.00			3	50.00
衛生署	1	1							1	100.00
臺灣省政府	370	134	236	157	134	85.35	23	14.65	213	57.57
臺北市政府	114	26	88	21	21	100.00			93	81.58

備註

一、訴願案件，必須依據法定辦理時限，作爲審定「依限辦出」與「逾限辦出」之依據，未依據法定辦理時限或未依據辦理時限審定機關請改進。

二、訴願案件之管制，必須以「案」爲單元計算，即每收一案計列一件，不宜以處理過程中之收發文數量爲管制統計單元，以「文」爲單元機關請改進。

行政院發展考核委員會製　　資料起止期63年10月1日至63年10月31日

行政院所屬各機關六十三年十月份人民申請案件統計表

數量項目 / 機關	收件統計			本月份已結案件統計					本月份待辦統計	
	合計	本月新收件份數	截至上月未辦件數	合計	依限辦出		逾限辦出		件數	%
					件數	%	件數	%		
總計	233,813	223,970	9,843	223,735	223,041	99.69	694	0.31	10,078	4.31
內政部	329	329		329	317	96.35	12	3.65		
外交部	14,416	14,109	307	14,086	14,086	100.00			330	2.29
財政部	168	127	41	133	133	100.00			35	20.83
司法行政部	3	3		3	3	100.00				
經濟部	13,780	13,368	412	13,275	13,267	99.94	8	0.06	505	3.20
教育部	453	440	13	435	416	95.63	19	4.37	18	3.97
交通部	1,199	1,199		1,199	1,136	94.75	63	5.25		
蒙藏委員會	2	2		2	2	100.00				
僑務委員會	9,613	9,228	385	9,205	8,842	96.05	363	3.95	408	4.43
新聞局	2,210	2,207	3	2,206	2,206	100.00			4	0.18
衛生署	2,139	2,033	106	2,036	2,016	99.17	20	0.83	103	4.81
青年輔導會	216	208	8	213	211	99.06	2	0.94	3	1.39
臺灣省政府	11,428	11,154	274	11,246	11,243	99.97	3	0.03	182	1.59
臺北市政府	177,857	169,563	8,294	169,367	169,163	99.88	204	0.12	8,490	4.77
臺灣省各縣（市）政府	33,869	31,001	2,868	31,308	30,970	98.92	338	1.08	2,561	7.56
臺北市各區公所	3,369	3,347	22	3,366	3,366	100.00			3	0.09

備註

一、臺灣省各縣（市）政府，臺北市各區公所數字，未列入本表總計欄內統計。

二、人民申請案件必須依其性質分類編目，分別訂定辦理時限，作爲審定「依限辦出」與「逾限辦出」之依據，每月統計結果，其「依限辦出」均爲100%機關，請自行檢討所訂之各類辦理時限標準有無偏低，若標準偏低，即失却管制意義，請檢討改進。

行政院研究發展考核委員會製　　資料起止日期63年10月1日至63年10月31日
