列管計劃執行進度月報

限閱

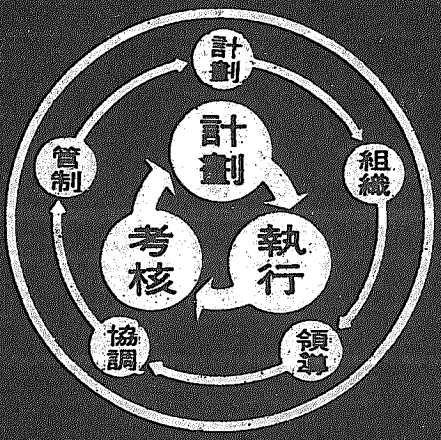

第二十三期

№ 050190

行政院研究發展考核委員會編印

中華民國六十二年五月二十日

列管計劃執行進度月報

（資料截止時間：六十二年四月三十日）

目錄

壹、概　述

貳、列管案件總數及分類統計圖

叁、執行進度綜合分析圖

肆、各機關列管案件超前落後情形比較圖

伍、落後案件原因分析圖

陸、落後案件進度百分比分析圖

柒、各月份執行進度比較圖

捌、各機關列管案件進度統計總表

玖、實地查證建議事項提要表

拾、執行進度落後案件原因分析表

拾壹、六十二年度由院列管計劃全年度執行情形一覽表

拾貳、各機關公文稽催成果管制統計表

壹、概述

一、本院六十二年度施政計劃，依照「重點管制，分層負責」原則，由院列管項目計一八七案，包括一般行政計劃七十八案，經濟建設計劃八十五案，科學發展計劃二十四案。截至本年四月底止，其執行情形爲：

完成及進度符合與超前者計一五二案，佔百分之八一。三，進度落後者三十五案，佔百分之十八．七。

二、進度落後案件較多之機關爲經濟部、臺灣省政府、臺北市政府，進度落後較大案件計有：經濟部「第一蔗渣紙漿廠計劃」，人事行政局「完成興建雙溪中央社區第二期公務人員住宅」，臺灣省政府「基隆彰化間經山線二八一公里加强軌道工程」等。

進度落後原因主要爲「變更計劃或設計」、「受建材漲價影響」及「招標議價發包延誤」。

三、列管計劃由經合會，研考會分別實地查證各一案，一爲「拉號馬武督戰備道路工程」，一爲臺北市「加强實施九年國民教育」，並經提出具體建議，請有關機關參辦。

四、六十二年度由院列管計劃全年度執行情形概況一覽表，提供參考。

五、六十二年三月份院屬各機關及省、市政府公文處理時效，發文平均使用天數爲六。〇二天。

貳、本院列管案件總數及分類統計圖

一、列管案件總數

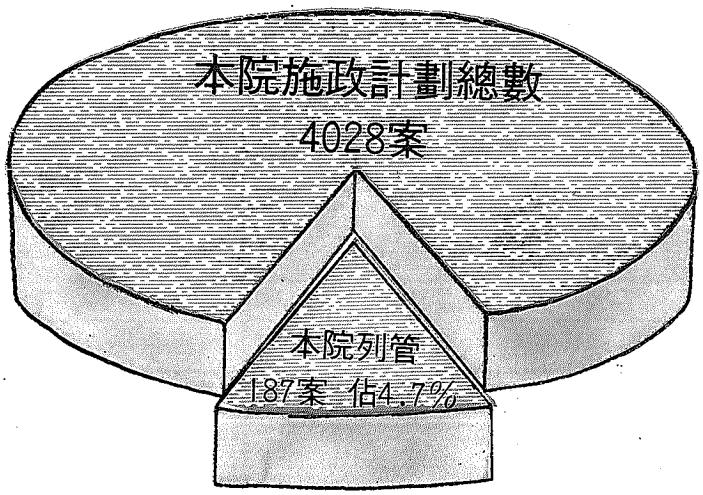

二、列管案件分類

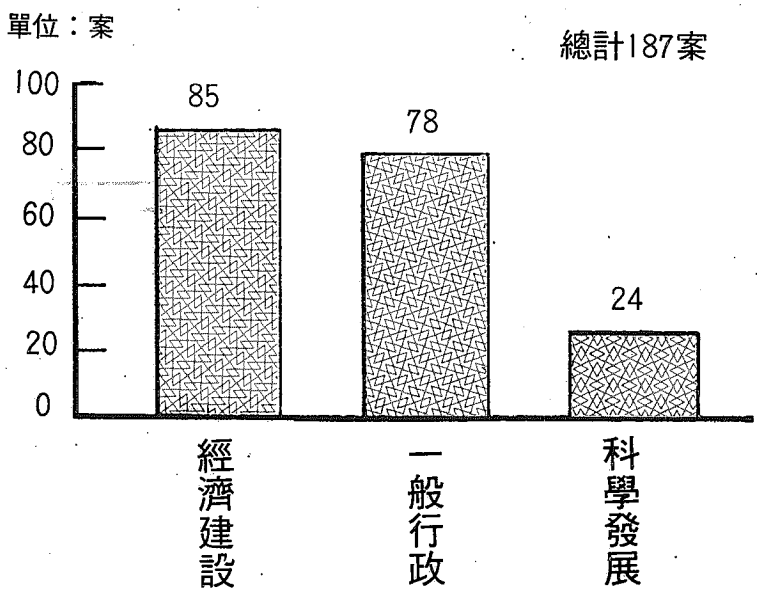

叁、執行進度綜合分析圖

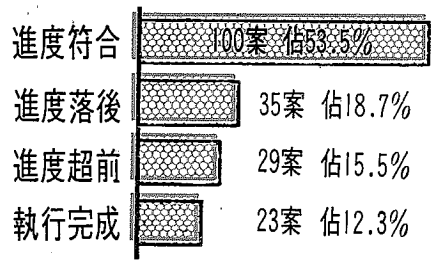

肆、各機關超前落後情形比較圖

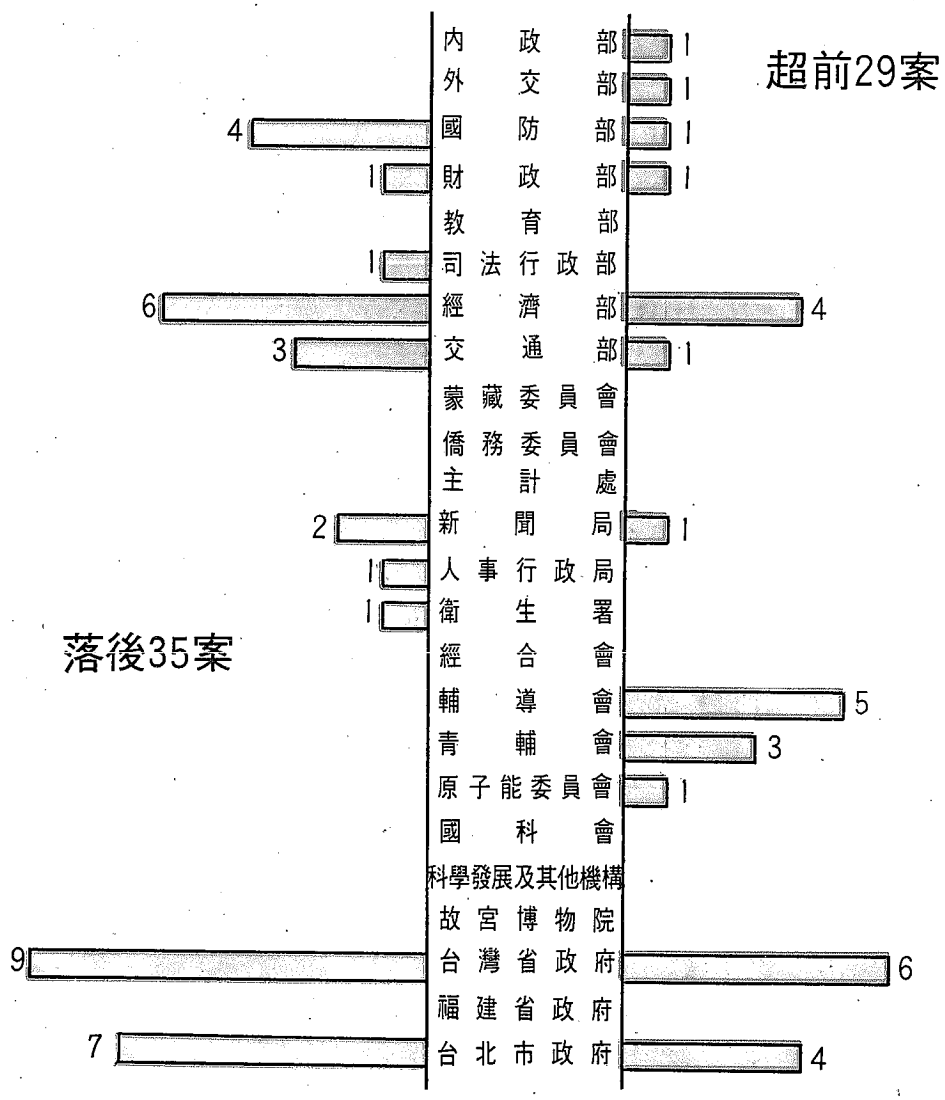

伍、落後案件原因分析

落後案件計三十五案，執行進度落後原因經詳細分析計有四十九項，部份計劃落後原因亦有受二項以上因素之影響者，經整理歸納爲九大類，如圖所示：

落後案件原因分析圖

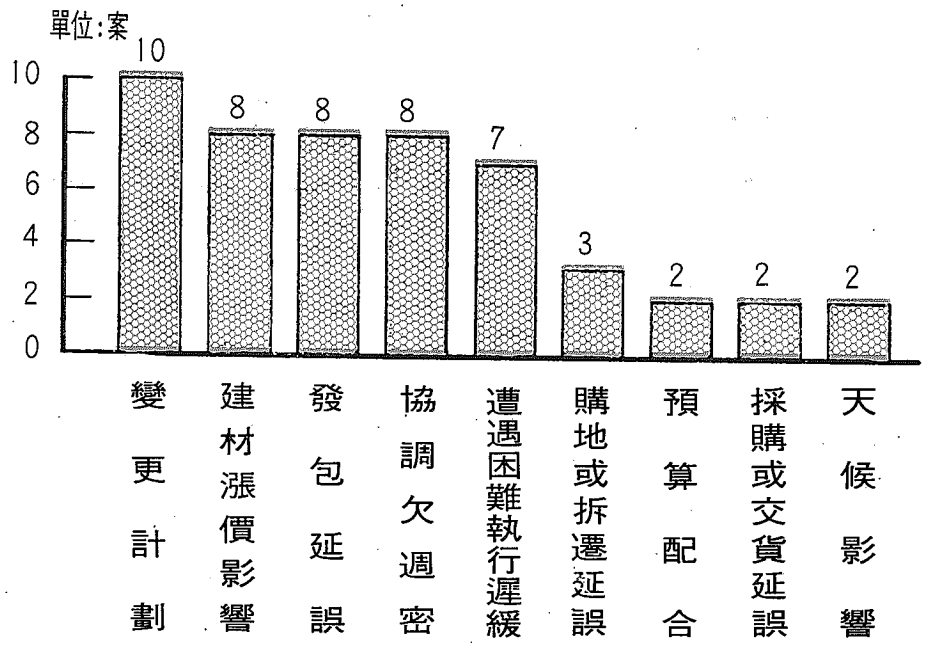

陸、落後案件進度百分比分析圖

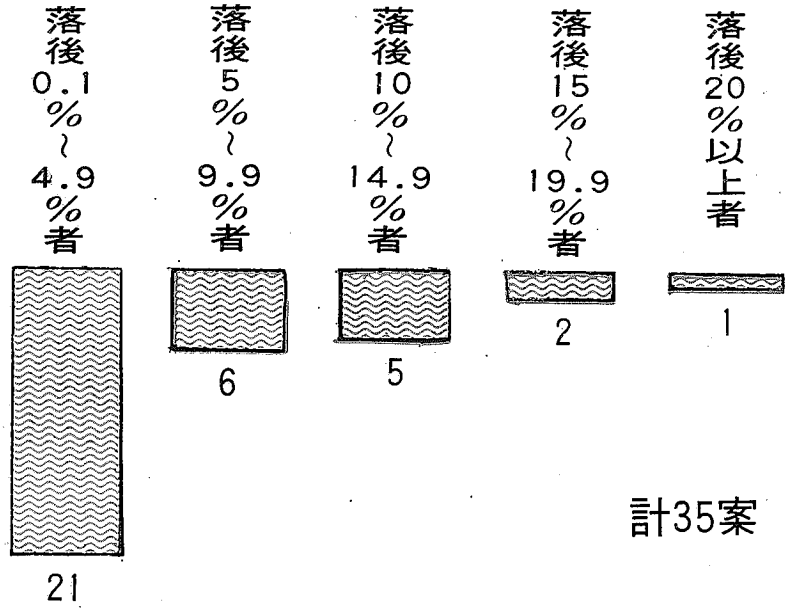

計35案

柒、各月份執行進度比較圖

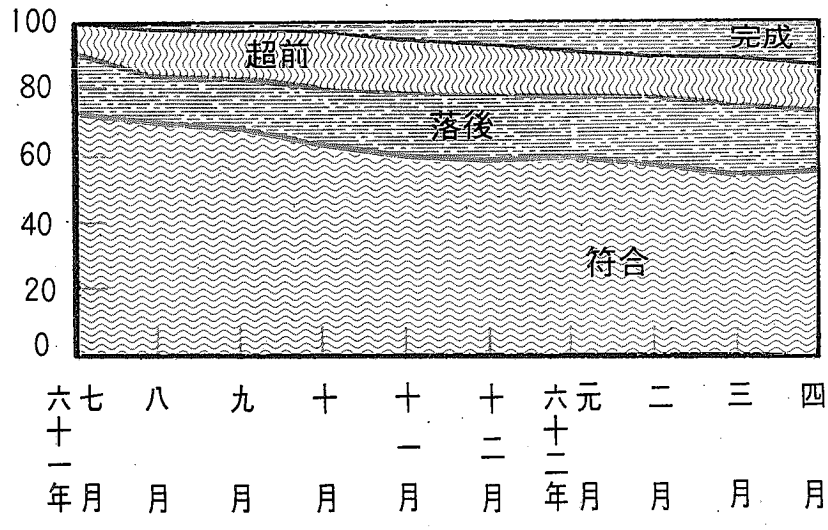

捌、各機關列管案件進度分析總表

機關名稱	列管案數	執行情形				落後案進度分析			備考
		已完成	符合	超前	落後	9.9%以內	10—19.9%	20%以上	
內政部	7	3	3	1					
外交部	5		4	1					
國防部	9		4	1	4	4			
財政部	10	1	7	1	1	1			
教育部	7		7						
司法行政部	4		3		1	1			
經濟部	27	4	13	4	6	5	1		
交通部	12	2	6	1	3	3			
蒙藏委員會	2		2						
僑務委員會	5	1	4						
主計處	3	3							
新聞局	4		1	1	2	2			
人事行政局	3	1	1		1			1	
衛生署	3	1	1		1	1			
國際經濟合作發展委員會	2	1	1						
國軍退除役官兵輔導委員會	7		2	5					
青年輔導委員會	4		1	3					
原子能委員會	6		5	1					
國家科學委員會	1		1						
科學發展其他機構	6		6						
故宮博物院	1		1						
臺灣省政府	34	5	14	6	9	6	3		
福建省政府	1		1						
臺北市政府	24	1	12	4	7	4	3		
合計	187	23	100	29	35	27	7	1	

附記：落後案件35案請各主管機關，積極迅速地排除困難，趕上進度。

玖、實地查證建議事項提要表

機關名稱	查證計劃	查證機關	查證日期	建議事項	研考會
臺灣省政府	拉號馬武督戰備道路工程。	經合會	六十二年三月廿三日	一、本工程由省公路局規劃，由工兵部隊施工，於五十九年十一月廿八日開工，原定於六十一年七月完成，後因雨季影響展延至六十一年九月卅日竣工。 二、此次查證發現部份路段（7K—12K）路況較差，新闢道路上下邊坡尚未穩定，容易發生坍方，擬請公路局加强養護，以發揮該道路之功能。 三、道路沿線原設有混凝水圳長十餘公里，施工期間曾受損毀長達八公里，現正辦理修復工作中。惟修復後水圳路線仍沿道路兩旁，易爲路線坍方而再度受損，公路局無法繼續負責，將影響該地區四十餘公頃稻田之灌溉，此一問題擬請省府注意改善。 四、本道路工程完工以來，迄今尚未有客運班車行駛，爲便利山地交通，擬請省府輔導民營客運公司延長其現有行駛路線。	六十二年五月十一日
臺北市政府	加强實施九年國民教育			一、民族國中校地上，蠶業改良場借用之房舍，如果遷建新址房屋工程，不能如限完成，勢將影響該校工程進度，請省農林廳對此遷建計劃列入管制，如期完成，及時遷讓原有房舍以免影響民族國中建校工程。 二、忠孝國中校地上，尚有軍眷二十八戶，經臺北市政府屢	

次協調陸軍總部，已歷三年均不得要領，臺北市政府教育局建議，請行政院研考會協調國防部出面解決。

拾、執行進度落後案件原因分析

機關名稱	計劃名稱	管考分類	落後百分比	原因分析	解決辦法
國防部、	固本一號計劃	一般行政	2.5%	因工業限電及鋼筋供應不繼，致進度落後。	現正協調唐榮鋼鐵廠速即供應鋼筋，並修正計劃調整進度。
	固本二號計劃	一般行政	3.7%	因外購機器程式變更，材料漲價，延緩訂約，致進度落後。	現正協調軍資組對外購機器迅即交運，並督導土木工程趕工。
	龍宮計劃	一般行政	6.62%	因水中混凝土施工困難，致影響進度落後。	現正積極趕工中。
	籌建黑藥製造廠	一般計劃	9%	因建材暴漲延誤土木工程發包，致進度落後。	除專案報請追加預算外，並建議修正計劃中。
財政部	開闢七股一、二工區新鹽灘計劃	經濟建設	1.9%	因物價波動影響，招標議價難獲成議，致進度落後。	正積極協議中。
司法行政部	督導遷建臺北地方法院看守所	一般行政	2%	因鋼筋價格波動且缺貨，致所訂購鋼筋未能如期送達，使工程停頓。	現正積極催促運送中。
經濟部	農產運銷改進方案	經濟建設	5%	一、因建材漲價，預算不足，影響東園街新市場工程發包手續之進行。 二、臺北市及基隆市之屠體交易場與冷藏	第一及第二兩項均趕辦中，第三項已改爲公開招標方式辦理。

				庫工程，經四次招標始決標，影響工程之進行。 三、北區各縣市冷藏肉櫃之推行工作，臺北市審計處未同意以比價方式辦理，致進度落後	
達見大壩發電工程	經濟建設	3.9%		一、第二號索道捲場機之發電機故障，影響混凝土工作進度。 二、排洪隧道棒號四四四—三六〇間地質不良，開挖工作困難。 三、志樂引水道工程因水量多，出碴困難，致進度受影響。	一、已設法加速器材之修復及人員之補充。 二、志樂引水道之處理已擬具計劃洽請包商辦理。
北部煉油廠計劃	經濟建設	1.6%		長途油管路線涉及國防部預定電臺位置，致工程規劃之進度落後。	已修改路線，正趕辦中。
第一蔗渣紙漿廠計劃	經濟建設	17.6%		因機器設備之技術標廢標兩次，致延誤進度。	一、正進行第三次審標工作。 二、擬按政院六十一年八月份核定之修正計劃，修訂進度報核。
第二期擴充造船設備	經濟建設	4.3%		部份工廠廠房，因材料價格上漲，影響採購事宜，致未能如期施工。	已積極協調中。
一貫作業大鋼廠計劃	經濟建設	4.9%		一、外購器材之標單未能如期送達，以致影響開標。 二、原宿舍預定地改爲禁建區，須另覓新	均已在趕辦中。

					地。 三、專用碼頭工程，顧問公司建議重行設計。	
交通部	桃園國際機場工程設計	經濟建設	1.2%	因建築工程部份變更設計，致進度略有落後。	正趕辦中。	
	雷達及航管系統改進	經濟建設	7.3%	一、部份工程之外購器材延遲運達。 二、雷達備份零件訂購工程，因中信局辦理詢價手續延遲，致進度落後甚多。	一、正趕工中。 二、正趕辦議價手續中。	
	興建臺灣區高速公路計劃（基隆、楊梅段）	經濟建設	1.1%	受天雨影響，致進度稍有落後。	正趕工中。	
新聞局	編印中外文定期書刊。	一般行政	1.5%	編印六十三年記事案曆因元月份變更工作計劃，致影響進度。	現正趕辦中。	
	製作彩色紀錄影片以加強國際宣傳	一般行政	2.4%	拍攝「木材加工出口」影片一部初剪完成後，發現部份鏡頭尚需調整或加強。	正再行修剪中。	
人事行政局	完成興建雙溪中央社區第二期公務員住宅	一般行政	45%	奉指示雙溪社區開發計劃須重新檢討，第二、三期暫緩開發。	另辦修訂計劃手續。	
衛生署	推行臺灣地區家庭計劃	經濟建設	2.5%	推動家庭計劃之地方人士座談會因故延期舉行，致督導臺灣地區家庭計劃之工作進度稍有落後。	正趕辦中。	

臺灣省政府

改善貧民生活四年計劃	一般行政	1.4%	因臺南市及臺南縣建救濟院工程進度落後。	正在趕工中。	
三重永和建設工程	經濟建設	1.5%	因地方政府辦理購地及拆遷等手續延遲影響，致第一期部份工程進度落後。	正積極協調中。	
基隆彰化間經山線二八一公里加强軌道工程	經濟建設	18.7%	一、有關器材改向歐美地區採購。 二、道岔器材超過底價而廢標。 三、改良道碴工作與榮工處議價甚久方獲協議。	第一、二兩項正審標中，預計於五月中開標。 第三項正趕工中。	
西部幹線塔寮坑龜山段改善工程	經濟建設	1.5%	一、橋樑改建工程，因設計及預算修正費時，影響發包施工。 二、路基路面工程，因發包工作略有延遲，致進度落後。	均正趕辦中。	
基隆高架公路工程	經濟建設	1.2%	因承包商人力不足，致工程進度略有落後。	洽承包商增派人員趕工。	
繼續辦理貨櫃儲運設備計劃	經濟建設	9.7%	一、貨櫃通棧工程，承包商工作遲緩。 二、中航公司要求變更通棧及修護之設計。 三、起重機招標延遲。	第一項主辦單位擬收回自行辦理。第二、三兩項正趕辦中。	
基隆突堤碼頭	經濟建設	3.6%	因執行單位部份人員失職，部份工程奉令停工，致進度落後。	俟安全鑑定後再行趕工。	
臺中港建設工程	經濟建設	10.6%	一、海中養殖補償問題延未解決。 二、向唐榮公向價購之鋼筋延未交貨。	正協調及洽催中。	

	基隆山坡地建地開發	經濟建設	11.3%	因預算尚未撥到，工程無法進行，致進度落後。	正協議中。
臺北市政府	加強實施九年國民教育	一般行政	12.75%	一、民族國中新址校地，蠶業改良場分三期騰讓未能全部接管，第一期工程雖已發包未能開工。 二、忠孝國中校地尚有合法住戶六戶，水利局倉庫一幢及軍眷廿八戶尚未拆除。 三、因建材上漲，影響開標及施工。	現正在分別協調解決中。
	籌設市立工業專科學校	經濟建設	5%	一、校舍工程設計草圖之繪製工作延遲。 二、本計劃專案小組審核工程文件遲緩，影響發包工作之進行。 三、委請省立臺北工專擬訂設備規格之工作延未完成。	第一項已趕辦完成。 第二、三兩項均洽辦中。
	遷建臺北市魚菜菜批發市場	經濟建設	12.8%	征購土地工作業已完成，惟因建築師編列之預算過高，須變更設計，致影響進度。	正催請建築師趕辦變更設計中。
	新建道路橋樑工程	經濟建設	1.2%	一、和平西路新建工程，因天雨影響，箱涵工程施工困難。 二、新生南路拓寬工程，因燈桿及管線延未拆除，影響工程之進行。 三、復興南路新建工程，因違建攤販要求延緩遷移，本工程延一個月施工。 四、特三號排水溝兩側道路工程，因地下	第一、三兩項均正趕工中。 第二、四兩項均正洽辦中。

				管線材料採購困難。	
雨水下水道工程	經濟建設	4.5%	一、抽水站工程因發照較遲及發包工作延誤。 二、溫州街及臨沂街幹線工程，因管線延未遷移，致工程進度落後。	正趕辦及協調中。	
華江地區區段徵收	經濟建設	13%	一、第一期重建房屋及規劃空地之配售補充規定及作業程序，依照首長會報決議，再行研議有關內容。 二、第一期區段征收範圍內軍方之博愛新村十八眷戶迄未拆除，致影響重建工程之進行。	第一項已依照有關規定及結論，重新作業。 第二項曾召開九次協調會議，仍未獲協議，正繼續洽辦中。	
道路橋樑六十一年度未完工程	經濟建設	3.8%	一、忠孝路拓寬工程，因部份配合工程尚未完成，無由施工。 二、新生南路拓築工程，因水廠埋設水管延未完成，致進度落後。 三、景美木柵路拓築工程，因水管尚未拆遷，致影響工程之進行。	均正趕工及協調中。	
合計	三十五案				

拾壹、六十二年度由院列管計劃全年度執行情形一覽表

正常△　超前✓
完成○　落後×

主管機關	編號	計劃名稱	月份										備考
			七	八	九	十	十一	十二	一	二	三	四	五	六	
內政部	62-01-A01	督導臺灣省五屆省議員及七屆縣市長選舉	△	△	△	△	△	△	△	○	○	○			
	62-01-A02	推行人口政策	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○			
	62-01-A03	全面實施平均地權	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
	62-01-A04	整理營建法規	△	△	△	△	△	✓	✓	△	△	△			
	62-01-A05	加強勞工福利	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
	62-01-A06	地籍圖航空重測之規劃及試測	△	△	△	△	✓	○	○	○	○	○			
	62-01-A07	辦理各種救濟	△	△	✓	✓	✓	✓	△	△	△	✓			
外交部	62-02-A01	繼續加強對日關係	△	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	62-02-A02	加強中美間之相互訪問與文化交流	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			

	62-02-A03	加强我對中南美國家之農工技術合作及貿易	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
	62-02-A04	加强對海外宣傳工作及匪情報導	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
	62-02-A05	重新佈建與我無邦交地區之據點	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
國防部	62-03-A01	軍車生產	△	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	62-03-A02	步機槍生產	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
	62-03-A03	直昇機製造	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
	62-03-A04	固本一號計劃	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×			
	62-03-A05	固本二號計劃	△	△	△	△	△	△	△	△	×	×			
	62-03-A06	龍淵計劃	△	√	△	△	△	△	×	△	△	△			
	62-03-A07	龍宮計劃	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×			
	62-03-A08	籌建黑藥製造廠	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×			
	62-03-A09	軍隊動員計劃	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			

	財政部										教育部	
	62-04A-01	62-04-E01	62-04-E02	62-04-E03	62-04-E04	62-04-E05	62-04-E06	62-04-E07	62-04-E08	62-04-E09	62-05-A01	62-05-A02
	國有財產全面管理	革新稅制—稅法之研討及修訂	改善稅政—稅捐征收法之制訂	修訂關稅進口稅則	加強特種金融機構之管理	加強保險業務之管理	促進銀行業務現代化	督導糧食管理	電析精鹽工廠建廠計劃	開闢七股一、二工區新鹽灘計劃	修訂二年制各類專科學校科目表	修訂各類職業學校課程標準
	△	△	△	△	△	△	△	△	×	×	△	△
	√	△	△	△	△	△	△	△	×	×	△	△
	√	△	△	△	△	△	△	√	×	×	△	×
	√	√	△	△	△	△	△	√	×	×	△	△
	√	△	△	△	△	△	△	√	×	×	△	△
	√	△	△	△	△	△	△	√	×	×	△	△
	√	△	△	△	△	△	△	○	△	×	△	△
	√	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△
	√	△	△	△	△	△	△	○	×	×	△	△
	√	△	△	△	△	△	△	○	△	×	△	△

教育部										
62-05-A03	指導國中畢業生升學就業	△	△	△	△	△	△	△	×	△
62-05-A04	加強學校生活教育	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-05-A05	嚴格執行電影電視檢查政策加強各地查驗工作	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-05-S01	中學科學課程標準及教材綱要改進	△	△	△	△	×	×	×	×	△
62-05-S02	小學科學課程教材改進及實驗研究	△	△	△	△	△	△	△	△	△

司法行政部										
62-06-A01	提高民事案件辦案正確性及結案速度	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-06-A02	改進刑事審判業務提高辦案績效	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-06-A03	加強少年事件處理法之實施	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-06-A04	繼續督導遷建臺北看守所	×	×	△	△	△	×	×	×	×

經濟部										
62-07-E01	國內市場商品檢驗	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-07-E02	農業運銷改進方案	×	△	△	△	×	×	×	×	×
62-07-E03	蘭嶼地區銅礦探勘	△	×	×	×	×	×	×	×	△

經濟部												
62-07-E04	高雄臨海工業區開發	△	△	△	△	△	△	△	×	×	△	
62-07-E05	達見大壩發電工程	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
62-07-E06	大林火力第三部機發電工程	△	△	√	√	√	√	√	○	○	○	
62-07-E07	大林火力第四部機發電工程	△	△	√	√	√	√	√	√	√	√	
62-07-E08	大林火力第五部機發電工程	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
62-07-E09	核能第一部機發電工程	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△	
62-07-E10	核能第二部機發電工程	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△	
62-07-E11	協和火力發電工程	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
62-07-E12	北部油運及儲存計劃	×	△	△	△	√	△	√	√	√	√	
62-07-E13	陸上油氣探勘計劃	△	△	△	×	×	×	×	×	√	√	
62-07-E14	第二輕油裂解工場計劃	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
62-07-E15	DMT製造計劃	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	

經濟部

62-07-E16	興建製造已內醯胺工廠	×	×	×	×	△	△	△	△			
62-07-E17	加氫裂解設備計劃	△	△	△	△	△	△	△	△			
62-07-E18	北部煉油廠計劃	×	×	×	×	△	△	△	×			
62-07-E19	第一蔗渣紙漿廠計劃	×	×	×	×	×	×	×	×			
62-07-E20	第二期擴充造船設備計劃	×	△	√	△	△	×	×	×			
62-07-E21	物價問題調查研究	△	△	△	△	△	△	△	△			
62-07-E22	物力調查計劃	△	△	△	△	△	△	△	△			
62-07-E23	儲備戰時用油及儲油所需油池之建造	△	×	×	×	×	△	△	√			
62-07-E24	一貫作業大鋼廠計劃	△	△	△	△	×	×	×	×			
62-07-S01	氯化聚氯乙烯之研究	△	△	△	△	△	×	×	○			
62-07-S02	馬口鐵皮脫錫防止研究	△	△	×	√	√	○	○	○			
62-07-S03	高強度低合金鋼之研製	△	×	√	×	△	△	△	△			

62-08-A01	加强道路交通安全	×	△	△	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62-08-E01	桃園國際機場工程設計	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×
62-08-E02	雷達及航管系統改進	△	×	△	×	×	×	×	×	×	×
62-08-E03	興建臺灣區高速公路第一期工程（基隆—楊梅）	△	✓	✓	✓	✓	✓	✓	△	△	×
62-08-E04	興建臺灣區高速公路第二期工程規劃（楊梅—新竹、嘉義—鳳山）	△	△	△	△	△	△	△	○	○	○
62-08-E05	裝置電子郵件機械設備	△	△	×	×	×	×	×	×	×	△
62-08-E06	擴充北中南地區市內自動電話	△	✓	△	✓	△	△	△	△	✓	△
62-08-E07	建設印度洋區衛星通訊地面電臺	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△
62-08-E08	建立半自動及全自動國際電報交換中心	△	×	×	×	○	○	○	○	○	○
62-08-E09	擴充東部微波幹線及其他短程微波電路	△	△	△	△	×	×	×	△	△	△
62-08-S01	資信傳輸之研究	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-08-S02	電子計算機共時作業之研究	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

蒙藏委員會	62-09-A01	培植並儲備蒙藏幹部	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	62-09-A02	輔導海外蒙藏社團及文教事業	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
僑務委員會	62-10-A01	僑團聯繫與輔導	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	62-10-A02	十月慶典僑民回國接待	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○
	62-10-A03	僑校輔助	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	62-10-A04	僑民文化事業輔助	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	62-10-A05	輔導世界華商各專業聯誼會	△	△	△	×	×	×	×	×	×	△
主計處	62-11-E01	六十三年度中央政府總預算之核編	△	△	×	×	×	×	×	×	○	○
	62-11-E02	六十一年度中央政府總決算之核編	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○
	62-11-E03	結束五十九年臺閩地區農漁業普查報告編輯工作	△	△	△	△	×	○	○	○	○	○
人事行政局	62-12-A01	健全機關組織功能	△	△	△	×	×	×	×	×	×	○
	62-12-A02	貫徹執行退休資遣	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

	62-12-A03	完成興建雙溪中央社區第二期公務人員住宅	△	×	△	√	△	△	×	×	×	×
新聞局	62-13-A01	蒐集輿論民意推行政府公共關係	△	△	△	△	△	×	√	√	√	√
	62-13-A02	配合外交工作加强國際宣傳	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	62-13-A03	編譯中外文定期書刊	△	△	√	△	△	△	×	×	△	×
	62-13-A04	製作彩色紀錄影片以加强國際宣傳	△	△	△	√	△	△	△	△	△	×
衛生署	62-14-A01	草擬公害防治法令	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△
	62-14-E01	推行臺灣地區家庭計劃	△	△	△	×	×	△	△	△	×	×
	62-14-S01	國民衛生需要調查	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○
故宮博物院	62-15-A01	增闢文物山洞	△	△	△	×	×	×	×	×	×	△
經合會	62-16-A01	第六期四年經濟建設計劃之研擬	△	△	△	√	○	○	○	○	○	○
	62-16-E01	配合高速公路興建區域開發規劃研究。	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△
輔導會	62-17-A01	安置計劃之策訂與檢討	△	△	√	√	√	√	√	√	√	√

	輔導會								青輔會			國科會	
	62-17-A02	62-17-A03	62-17-A04	62-17-A05	62-17-E01	62-17-E02	62-18-A01	62-18-A02	62-18-A03	62-18-A04	62-19-S01	62-19-S02
	輔導就學	介紹就業	輔導就醫	安置就養	工業生產	農業生產	輔導策進青年就業	工業職業示範訓練	輔導貧困青年	青年人力需求調查	遴選科技研究人員出國進修	糧食作物之品種及栽培改良
	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△
	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△
	△	√	√	√	×	△	√	△	√	△	△	△
	△	√	√	√	×	×	√	△	√	△	△	△
	△	√	√	√	△	×	√	△	√	△	△	△
	△	√	√	√	√	√	√	△	√	△	△	△
	△	√	√	√	√	△	√	△	√	△	△	△
	△	√	√	√	√	△	√	△	√	△	△	△
	△	√	√	√	√	△	√	△	√	△	△	△
	△	√	√	√	√	△	√	√	√	△	△	△

62-19-S03	家禽家畜育膜與遺傳—豬種選育	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-19-S04	臺灣植物病原線蟲研究	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-19-S05	臺灣近海漁類之增殖及生態之研究	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-19-S06	造船工程—船模試驗	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-19-S07	抗癌藥物研究—鷄母珠毒蛋白抗癌作用研究	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-20-S01	幅射安全—劑量測定方法之研究	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-20-S02	幅射安全—本省環境放射性之測定	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-20-S03	同位素生產供應及應用—同位素生產供應	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-20-S04	同位素生產供應及應用—活性化分析之應用研究	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-20-S05	反應器技術與應用—移動式訓練用反應器之設計與建造	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-20-S06	反應器技術與應用—重水反應器建造及實驗	△	△	✓	✓	✓	✓	△	✓	✓	
62-21-A01	地籍圖航空重測之規劃										

原子能委員會

臺灣省政府

政策尚待核定

臺灣省政府

62-21-A02	實施九年國民教育	×	×	△	△	△	△	△	×	×	×
62-21-A03	發展職機教育	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-21-A04	加強礦場安全檢查	△	√	√	√	√	√	√	√	√	√
62-21-A05	社區發展之策劃及推動	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-21-A06	改善貧民生活四年計劃	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×
62-21-A07	徹底檢肅竊盜	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-21-A08	精簡機構統一事權	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-21-A09	都市計劃及地籍圖套繪印售										
62-21-A10	改進田賦代金征收繳納手續	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
62-21-E01	山坡道路興修	△	√	√	√	√	√	△	√	√	△
62-21-E02	加強輔導整理信用合作社	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-21-E03	菸酒生產計劃更新及擴建工程	×	×	×	×	×	△	×	×	×	√

61.9.6.臺六十一內八八二三號令解除管制

62-21-E04	三重永和建設工程	△	×	△	×	×	×	△	△	×	×			
62-21-E05	三重塔寮坑拓寬工程	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○			
62-21-E06	林相變更	△	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
62-21-E07	增加漁業生產	△	√	√	√	√	△	○	○	○	○			
62-21-E08	山坡地水土保持	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
62-21-E09	基隆彰化間經山線二八一公里加强軌道工程	×	△	△	△	×	×	×	×	×	×			
62-21-E10	西部幹線塔寶坑龜山段改善工程	△	△	×	×	×	△	△	△	×	×			
62-21-E11	基隆港高架公路工程	×	△	√	√	△	×	×	×	×	×			
62-21-E12	繼續辦理貨櫃儲運設備計劃	△	△	△	×	×	×	×	×	×	×			
62-21-E13	高雄第二港口開闢工程（第六年度）	△	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
62-21-E14	基隆突堤碼頭	△	△	△	×	×	△	△	×	×	×			
62-21-E15	家庭計劃與人口研究	△	√	√	√	√	√	√	√	√	√			

臺灣省政府	62-21-E16	曾文水庫建設工程	△	△	√	√	√	√	√	△	△	△				
	62-21-E17	臺中港建設工程	×	×	△	×	×	×	×	×	△	×				
	62-21-E18	基隆山坡地建地開發	×	△	△	△	×	×	×	×	×	×				
	62-21-E19	加强推行農業機械化	×	√	△	√	√	√	△	√	√	√				
	62-21-E20	鐵路電氣化計劃														計劃迄未定案
	62-21-E21	繼續修築澐水至密枝戰備道路	△	△	×	×	△	△	△	√	√	△				
	62-21-E22	繼續修築拉號至馬武督戰備道路	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○				
	62-21-E23	能高大圳灌溉工程	×	×	×	√	√	○	○	○	○	○				
	62-21-S01	衛生昆蟲調查研究	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
	62-21-S02	發展科學教育	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
福建省政府	62-22-A01	修訂重建方案草案	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				
臺北市政府	62-23-A01	推行九年國民教育第二期三年計劃	△	△	△	△	×	×	×	×	×	×				

62-23-A02	工礦檢查	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-23-A03	規劃社區發展	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-23-A04	消防救災救護	△	△	△	√	△	√	△	√	△	△	√
62-23-A05	充實監理設備嚴格檢查車輛	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	√
62-23-A06	空氣及水源防污	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-23-A07	辦理六張犁土地市地重建	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△
62-23-A08	清理日據時期零星段地區重劃土地	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-23-A09	發展職業教育	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-23-A10	地籍圖航空重測之規劃											
62-23-E01	加強輔導整理信用合作社業務管理	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
62-23-E02	籌設市立工業專科學校	△	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×
62-23-E03	遷建臺北菓業市場及漁市場	△	△	√	△	×	×	△	×	×	×	×

政策尚待核定

臺北市政府

62-23-E04	新建道路橋樑工程	△	△	△	△	△	×	△	✓	✓	×	
62-23-E05	雨水下水道工程	△	△	✓	✓	✓	△	△	△	×	×	
62-23-E06	推行家庭計劃	×	×	×	×	×	×	△	✓	✓	✓	
62-23-E07	內湖特定區之開發計劃	△	△	△	△	△	△					62.1.15臺元十二內〇四二五號院令撤銷列管
62-23-E08	華江地區區段征收	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×	
62-23-E09	第一期四年工務建設第四年新建工程	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
62-23-E10	雨水下水道六十一年度未完工程	△	△	×	×	×	×	△	△	✓	✓	
62-23-E11	道路橋樑六十一年度未完工程	△	△	△	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	
62-23-E12	安裝新店溪嵢蜍山淨水廠柴油發電廠	△	△	△	△	×	△	×	×	△	△	
62-23-E13	臺北區自來水第三期擴建計劃	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
62-23-E14	南北墜道未完工程	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
62-23-S01	發展科學教育	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

拾貳、行政院所屬各機關六十二年三月份公文稽催成果管制統計表

項目 / 機關	收文統計			本月份已結案件統計												本月份辦結統計待	
	合計	本月份新收來文	截至上月份未辦件數	合計	發文小計	1—3天辦結 件數	%	4—6天辦結 件數	%	7—15天辦結 件數	%	16—30天辦結 件數	%	31天以上辦結 件數	%	發文使用天數平均	存查	件數	%
總計	354,815	327,488	27,327	325,192	180,595	88,229	49	45,386	25	35,505	20	8,451	5	3,024	1	6.02	144,597	29,384	8
院本部	2,974	2,887	87	2,848	1,691	678	40	481	28	328	19	124	7	80	5	7.84	1,157	126	4
內政部	4,922	4,547	375	4,458	3,658	763	21	1,632	45	1,095	30	140	4	28	1	7.06	800	464	9
外交部	13,467	13,407	60	13,893	6,126	4,309	70	1,269	21	435	7	95	2	18	1	4.97	7,767	52	3
國防部	21,415	20,981	434	23,529	9,294	5,770	62	2,145	23	1,225	13	148	2	6		4.23	14,235	481	2
財政部	10,530	9,777	753	10,065	5,658	1,889	33	1,582	28	1,319	23	524	9	344	6	8.70	4,407	760	7
教育部	6,068	4,774	1,294	4,358	2,296	1,176	51	509	22	372	16	112	6	127	6	6.80	2,062	1,710	28
司法行政部	1,883	1,870	13	1,863	803	294	37	297	37	199	25	12	1	1		5.69	1,060	20	1
經濟部	3,400	3,168	232	3,297	988	236	24	284	29	341	35	118	12	9	1	8.74	2,309	224	7
交通部	3,053	2,883	170	3,044	2,280	1,216	53	532	23	379	17	103	5	50	2	5.78	764	176	6
蒙藏委員會	304	277	27	305	119	99	83	15	13	5	4					2.34	186	65	22
僑務委員會	4,299	3,135	1,164	3,927	2,390	1,125	47	547	23	532	22	136	6	50	2	6.68	1,537	1,506	35
行政院主計處	2,418	2,308	110	2,527	1,150	678	59	287	25	126	11	33	3	26	2	4.94	1,377	95	4
新聞局	1,980	1,980		2,192	795	285	36	231	29	241	30	38	5			6.60	1,397	55	2
人事行政局	10,419	9,698	721	10,062	3,843	1,801	47	1,030	27	832	22	138	4	42	1	5.30	6,219	716	7
衛生署	3,289	2,519	770	3,084	2,068	711	34	462	22	537	26	289	14	69	3	8.90	1,016	780	24
國際經濟合作發展委員會	1,364	1,303	61	1,314	321	136	42	63	20	92	29	26	8	4	1	6.59	993	50	4
國軍退除役官兵輔導委員會	9,305	9,255	50	10,225	7,016	3,890	56	2,272	32	791	11	56	1	7		3.95	3,209	50	1
青年輔導委員會	188	183	5	250	205	126	61	61	30	18	9					3.70	45	11	4
原子能委員會	197	186	11	254	159	144	91	8	5	5	3	1	1	1	1	2.70	95		
國家科學委員會	1,350	990	360	1,036	558	132	24	186	34	181	32	40	7	19	3	6.40	478	461	34
故宮博物院	247	230	17	264	198	155	78	33	17	10	6					2.90	66	16	6
行政院研究發展考核委員會	732	664	68	771	217	161	74	32	15	18	8	3	1	3	1	3.90	554	64	11
臺灣省政府	121,586	111,282	10,304	103,336	65,152	24,355	37	17,315	27	18,056	28	4,693	7	733	1	4.87	38,184	10,362	9
福建省政府	73	66	7	73	33	21	64	1	3	10	33	1	3			4.50	40	5	7
臺北市政府	129,352	119,118	10,234	118,217	63,577	38,079	60	14,112	22	8,358	13	1,621	3	1,407	2	5.34	54,640	11,135	9
臺灣省各縣(市)政府	203,857	178,668	25,189	176,400	121,824	37,750	31	31,094	26	40,322	33	11,392	9	1,266	1	5.84	54,576	25,426	12
臺北市各區公所	30,126	29,265	861	29,112	18,115	15,329	85	1,915	11	798	4	63		10		2.81	10997	1,014	3

備註

一、臺灣省各縣（市）政府，及臺北市各區公所數字，未列入本表總計欄內統計。

二、本表各%欄係採用四捨五入，保持整數便於閱覽。

三、財政部、司法行政部、臺灣省政府、臺北市政府，訴願案件及人民申請案件未列入本表統計。

行政院研究發展考核委員會調製

資料起止日期：62年3月1日至62年3月31日
