限　閱
主管研考業務人員及
有關計畫主管人員

№ 060083

列管案件進度月報

第132期

計畫
計畫
管制
組織
考核
執行
協調
領導

行政院研究發展考核委員會編印

中華民國七十一年六月二十日

列管案件進度月報

資料截止時間： 71年 5 月31日

目　次

一、概述…… 1
二、列管案件總數及分類…… 2
三、列管案件執行情形分析…… 2
　㈠綜合分析…… 2
　㈡各機關執行情形統計…… 3
四、進度落後案件分析…… 4
　㈠綜合分析…… 4
　㈡個案分析…… 5
五、季報案件執行情形概要…… 8
六、半年報案件執行情形概要…… 13
七、追蹤案件執行情形概要…… 18
八、十二項重要建設計畫執行情形…… 19
　㈠執行進度總表…… 19
　㈡分項執行情形概要…… 20
九、重要方案、計畫執行概要…… 38
十、公文時效統計分析…… 49
　㈠綜合分析…… 49
　㈡各機關分類統計…… 50
　　1. 一般公文統計…… 50
　　2. 人民申請案件統計…… 52
　　3. 訴願案件統計…… 53

一、概　　述

㈠本院所屬各機關71年度施政計畫，由院列管146案，經納入管制者144案；另2案計畫尚未定案，暫列爲追蹤案。

㈡144案中按月提報進度者101案，按月提報辦理情形者1案（教育部的「建立每一縣市文化中心」），按季提報執行情形者23案，每半年提報執行情形者19案。截至本（71）年5月底止，101案之執行進度經統計如次：

1. 完成9案，占8.91％。
2. 進度符合及超前65案，占64.36％。
3. 進度落後27案，占26.73％。

㈢本月份落後案件中，落後程度較大者爲：經濟部的「核能三廠一、二部機發電工程」；交通部的「擴充北、中、南地區市話暨加速裝機計畫」、「觀光資源保育與風景區管理」、「大台北地區郵政存簿儲金連綫即時作業暨實施通儲作業計畫」；台灣省政府的「高雄港過港隧道工程」、「繼續完成德基水庫集水區陡坡農用地處理先期作業」、「開發新市鎭」、「加速改善重要農田排水系統」、高雄市政府的「開發萬壽山綜合遊樂區」、「興建勞工育樂中心」、「籌建高雄市職業訓練中心」等11案，詳見第四節。

㈣季報案件執行情形概要，詳見第五節。

㈤半年報案件執行情形概要，詳見第六節。

㈥追蹤案件執行情形概要，詳見第七節。

㈦十二項重要建設執行情形，詳見第八節。

㈧重要方案、計畫執行概要，詳見第九節。

㈨71年4月份院屬各機關公文處理時效，平均使用天數3.81天；人民申請案件，已結案件中依限辦出者達99.13％；訴願案件，已結案件中依限辦出者達97.94％；詳見第十節。

二、列管案件總數及分類

本院所屬各機關71年度由院列管項目146案，依其性質區分爲10類如下圖

列管案件分析

民國71年度

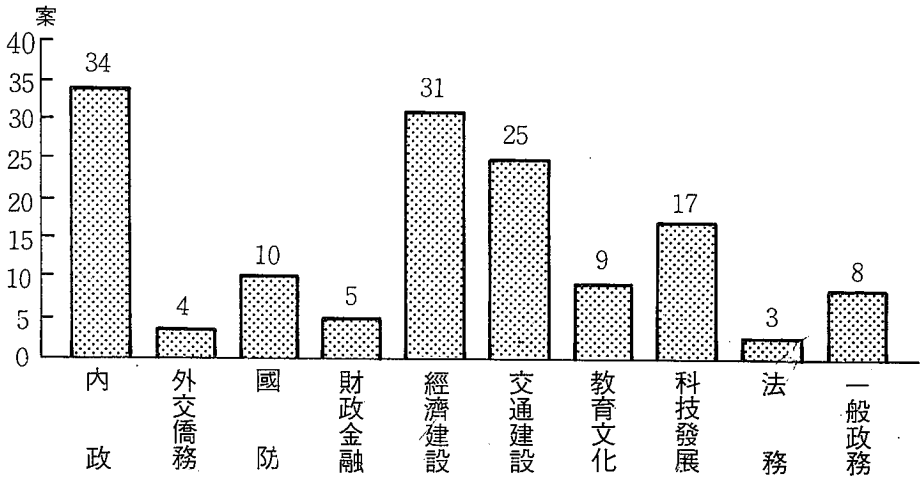

三、列管案件(月報)執行情形分析

(一)綜合分析

截至71年 5月底止

總計 101 案＝100%

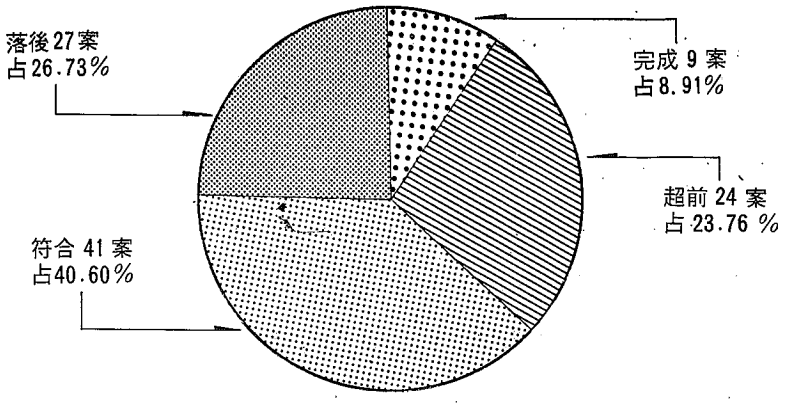

(二)各機關執行情形統計

截至 71 年 5 月底止

機關名稱	管件制案數	執行情形			
		完成	符合	超前	落後
內政部	1	—	—	—	1
外交部	3	—	3	—	—
國防部	6	1	2	3	—
財政部	2	1	1	—	—
教育部	5	—	3	—	2
法務部	2	—	2	—	—
經濟部	9	—	2	4	3
交通部	4	—	—	—	4
蒙藏委員會	1	—	1	—	—
僑務委員會	2	—	1	1	—
主計處	3	—	3	—	—
人事行政局	1	—	—	—	1
新聞局	1	—	1	—	—
衛生署	3	—	2	1	—
經濟建設委員會	2	2	—	—	—
國軍退除役官兵輔導委員會	4	2	2	—	—
原子能委員會	6	—	6	—	—
科學發展機構	5	2	3	—	—
中央選舉委員會	1	1	—	—	—
臺灣省政府	28	—	6	12	10
臺北市政府	5	—	2	2	1
高雄市政府	7	—	1	1	5
合計	**101**	**9**	**41**	**24**	**27**

資料來源：各主管機關

四、進度落後案件分析

(一)綜合分析

落後案件27案，以主管機關區分：內政部、人事行政局、及台北市政府各1案；教育部2案；經濟部3案；交通部4案；高雄市政府5案；台灣省政府10案。

落後原因部份乃受兩項以上因素影響，經統計分析歸納9類；其主要爲受「計畫變更、設計延誤」及「用地取得延誤」等影響較大，詳如下圖。

機關名稱	落後程度				
	4.99%以下	5～9.99%	10～14.99%	20%以上	合計
內政部	1	—	—	—	1
教育部	2	—	—	—	2
經濟部	2	1	—	—	3
交通部	1	1	2	—	4
人事行政局	1	—	—	—	1
台省府	6	1	2	1	10
北市府	1	—	—	—	1
高市府	2	1	1	1	5
合計	**16**	**4**	**5**	**2**	27

落後案件原因綜合分析

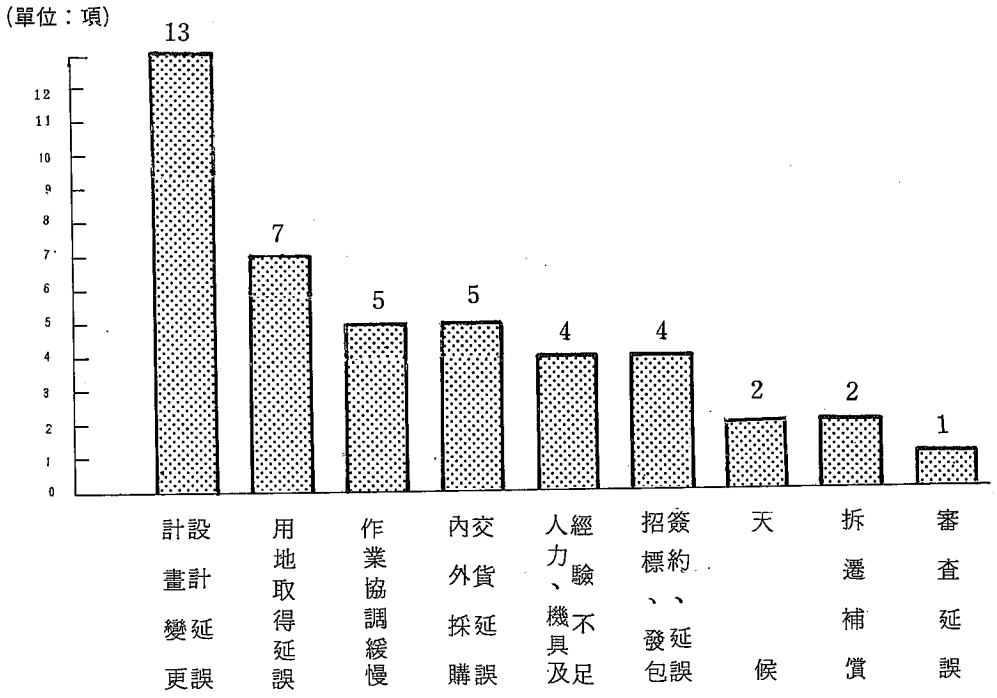

(二)個案分析

截至 71 年 5 月底止

機關名稱	計畫名稱	落後百分比	原因分析	解決辦法
內政部	改進警政工作方案	0.95	詳見第 39 頁。	同左。
教育部	研訂發展與改進國教六年計畫	3.00	本計畫執行草案提報院會討論，本月份尚未討論。	院會核定後，再邀請省、市教育廳局研討下年度執行細節。
	興建中正運動公園	1.50	道路、排水工程辦理招標作業進度落後。	辦理中。
經濟部	核能三廠一、二部機發電工程	6.21	詳見第 26 頁。	同左。
	興達第一、二部機火力發電	0.77	1. 設計圖延遲頒發影響土木施工及後續工程。 2. 中船、台機公司因人員設備及經驗不足，承製之器材無法按時交貨。 3. 新購二號機之發機轉子交貨太遲，影響安裝工程。	趕工中，落後情形，已漸次改善。
	通霄複循環氣渦輪機組發電工程	3.66	部份吊架等外購器材交貨延誤。	洽催中。
交通部	擴充北、中、南地區市話暨加速裝機計畫	11.60	用戶申裝數有下降趨勢，加速裝機工程落後。	調整下年度擴充計畫
	大台北地區郵政存簿儲金連線即時作業暨實施通儲作業計畫	8.00	中信局辦理決標數度流標，所需端末機尚未交貨。	俟交貨後，加速安裝
	大園、三義、西螺、水上、湖口交流道工程	1.73	用地取得及開工延誤，並受天候影響。	辦理中。

交通部	觀光資源保育與風景區管理	11.72	烏來用地迄未取得，野柳及鯉魚潭之設計延誤，青蛙石活動中心，受天候、施工及財務影響。	烏來部份經費變更使用，鯉魚潭花蓮縣政府修訂設計圖。 活動中心，由觀光局編列預算協助。
人事行政局	加強公務人員訓練及進修	2.40	因審查「籌辦出國進修暨專題研究甄試事宜」各主管機關未依限函送應甄人選延後審查，進度落後。	繼續加速辦理。
台灣省政府	台北地區防洪計畫初期實施計畫	4.03	詳見第 47 頁。	同左。
	改善高屏地區交通計畫	2.95	詳見第 23 頁。	同左。
	加速改善重要農田排水系統	8.21	地方配合款延遲解決，用地及地上補償解決費時，檢討設計原則等影響。	趕工中。
	高速公路交流道連絡道路工程	0.44	用地及征收工程受益費作業延遲及變更設計影響工進。	辦理中。
	農地重劃	2.00	彰化縣義和、嘉義縣南勢、湖底、台南縣詔安等重劃區因工程數次發包流標於四月底始完成。	趕辦中。
	三重永和建設計畫第二期工程	4.00	障礙物清除太慢及用地取得困難，天候影響。	趕辦中。
	高雄港過港隧道工程	11.83	1. 細部設計及附屬機電設備設計，進度落後。 2. 榮工處承辦本工程經驗不足，設計與施工進度不符理想。	召開協調會研究改善。
	開發新市鎮林口新市鎮第二期工程	23.50	詳見第 28 頁。	同左。
	繼續完成德基水庫集水區陡坡農用地處理先期作業	13.73	1. 陡坡農用土地收回，因涉及國家賠償法實施，執行方式，核定中。 2. 防砂工程架索道用地協調，稍有延誤。	辦理中。

台灣省政府	鐵路平交道改善工程	1.40	增設跳動路面需配合宜蘭雙軌工程辦理，暫停施工。	辦理中。
台北市政府	台北自來水第四期建設後段工程	3.08	1. 淨水廠第一座，需擬訂二套前處理及快濾設備，外購器材規範及土建工程設計致進度落後。 2. 陽明第一、二及天母高地等配水池擬調整計畫延後辦理。 3. 配水幹線因前段計畫之三重配水池及加壓站未辦理，致相關之管線擬調整計畫延後辦理。	趕辦中。
高雄市政府	開發萬壽山綜合遊樂區	27.41	規劃工作因審議費時，影響工作細部設計之延後。	正催請設計公司加速設計作業。
	仁愛河污染整治及污水下水道第一階段工作	3.71	1. 因潛盾機損壞換裝。 2. 海洋放流工程特殊規劃設計困難。 3. 技術複雜，工法斟酌費時	1. 經檢討已克服困難，進度漸漸符合。 2. 工程設計已完成，俟完成發包後即可順利推展。 3. 發包方式，已定案，積極辦理招標。
	興建勞工育樂中心	10.00	因設計總工程費過高，未經變更原設計，而刪除部份工程，嚴重影響已發包工程之進行。	1. 經檢討工程缺失，責成建築師重新估算。 2. 追加工程送請審計處核議。
	籌建高雄市職業訓練中心	8.00	1. 缺乏專人專責籌建工作。 2. 職訓職類一再檢討修正，影響原訂進度。 3. 各職類細部規劃牽連較廣，須委託設計延後。	儘速成立職業訓練中心籌備處，聘請專人負責，俾能推動籌建工作。
	開發新市鎮－高坪特定區計畫	4.00	詳見第 29 頁。	同左。

五、季報案件執行情形概要

列管案件中依規定按季提報執行情形者23案，其中「廣建國民住宅」分別列管內政部、台灣省政府、台北市政府、高雄市政府四機關，各案執行情形如下：

(一) 廣建國民住宅

主管機關：內政部、台灣省政府、台北市政府、高雄市政府。

執行情形概要：（資料截至71年3月31日止）詳見第 30 頁

(二) 職業訓練業務執行計畫

主管機關：內政部

執行情形概要：（資料截至71年4月30日止）

截至第三季執行情形：

(1) 加強全國職業訓練之規劃與宣導：實際執行進度爲54.1%較預定進度落後6.8%。

(2) 推展職業訓練擴大訓練能量：實際執行進度爲 64.6%較預定進度落後3.5%。

(3) 輔導企業界辦理在職訓練：實際執行進度爲 22.5%與預定進度相符。

(4) 辦理技能檢定建立職業證照制度：實際執行進度爲 75.3%較預定進度落後6%。

(5) 加強就業輔導與服務：實際執行進度爲 66.4%較預定進度落後 15.7%。

(三) 改進土地行政業務方案

主管機關：內政部

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止）詳見第 38 頁

(四) 都市內地價較高又未妥善利用之公地應研訂妥善方法

主管機關：財政部

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止）詳見第 39 頁

㈤ 加強文化及育樂活動方案

主管機關：教育部

執行情形概要：（資料截至71年4月30日止）詳見第 40 頁

㈥ 加強學生視力保健重要措施

主管機關：教育部

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止）詳見第 41 頁

㈦ 調整大專院校科系

主管機關：教育部

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止）

1. 教育部核定增設所系之原則：
   (1) 配合國家建設整體之需要。
   (2) 申請學校師資、設備之條件。
   (3) 需符合各校院發展特色。
   (4) 參考各校院評鑑及視導結果。
2. 教育部核定七十一學年度公私立大學院校新增所系，計博士班四所、研究所十六所、學系十系。
3. 有關調整系所之規劃作業及長中程策訂方面，教育部已函請各院校先行檢討，自擬分年調整歸併計畫，申請增設案一併由各院校依時送教育部核辦。

㈧ 台灣地區能源政策

主管機關：經濟部

執行情形概要：（資料截至71年3月31日止）

截至第三季執行情形：

(1) 研訂綜合能源供需計畫。

(2) 執行水力能源開發計畫，鈾礦探勘計畫，磷酸提鈾研究計畫；地熱探勘開發計畫；資助北海煤礦探勘海底煤田，輔導煤礦在技術、經營與保安三方面進行改善；陸上、海上油氣探勘。

(3) 台電公司繼續執行核二、核三、核四發電工程。

(4) 繼續國外採油、探油、開發煤礦之投資計畫。

(5) 掌握原油運輸，中油公司預計 71 年全年共可承運（自中東）進口油料，佔總產量百分之五十，並積極進行90天緊急儲油計畫。

(6) 台北地區大衆捷運系統整體規劃設計工作進行中。

(7) 中油、台電等國營事業，增添各項設備提高燃料油品質，減少污染。

(九) 節約能源措施

主管機關：經濟部

執行情形概要：（資料截至 71 年 3 月 31 日止）

截至第三季執行情形：

1. 本部已指定中油公司及台電公司積極籌設「財團法人台灣技術服務社」。
2. 台灣地區十三家瓦斯公司已統計分析用戶使用量，元月份平均用氣量爲 50.6 度，二月份 45.7 度，三月份爲 46.8 度，尙無增長快速用戶。
3. 本季油品銷售合計 446.8 萬公秉，較去年同期減少 8.5 %，天然氣銷售 320 億立方公尺，較去年同期減少 15.5 %。
4. 本季用電量 8,286 百萬度，較去年同期減少 1.95 %。

(十) 設置農業機械化基金促進農業全面機械化

主管機關：經濟部

執行情形概要：（資料截至 71 年 5 月 31 日止）詳見第 35 頁

(十一) 加強現階段海外華僑教育方案

主管機關：僑委會

執行情形概要：（資料截至 71 年 3 月 31 日止）詳見第 42 頁

(十二) 加強行政機關人才延攬培育與運用方案

主管機關：人事行政局

執行情形概要：（資料截至 71 年 5 月 31 日止）詳見第 43 頁

(十三) 輔助中央公教人員購建住宅

主管機關：人事行政局

執行情形概要：（資料截至71年3月31日止）

1．本案正按計畫進度執行中。

2．71年度第三季執行情形：

(1) 貸款自購（1060戶）實際進度49.59，與預定進度符合，其分配情形如下：①中央民意代表貸款已核定124戶。②專案申請貸款已核定213戶。（含公教人員63戶；回國學人17戶；已建讓售138戶）③71年2月9日（71）住福配字1403號函，發布71年度（十三期）輔助自購住宅貸款各部、會、局、署、處配額共750戶。

(2) 集體興建（940戶）實際進度35.98％，與預定進度符合。其辦理情形如下：①已施工興建中者506戶（辦理機關爲：中央研究院268戶；交通部17戶；民用航空局15戶；台灣大學206戶）②其餘戶數，分由內政部、國立編譯館、台灣大學、政治大學、海洋學院等機關學校辦理劃規或工程發包中。

(十四) 台灣地區環境保護方案

主管機關：衞生署

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止）詳見第 44 頁

(十五) 加強B型肝炎防治計畫

主管機關：衞生署

執行情形概要：（資料截至71年3月31日止）詳見第 45 頁

(十六) 加強食品衛生管理方案

主管機關：衞生署

執行情形概要：（資料截至71年3月31日止）詳見 45 頁

(十七) 執行七十一年度青年就業輔導措施

主管機關：青輔會

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止）詳見第 45 頁

(十八) 科學技術發展方案

主管機關：國科會

執行情形概要：（資料截至71年6月15日止）詳見第 46 頁

(十九) 提高農民所得加強農村建設方案

主管機關：農發會

執行情形概要：（資料截至 71 年 3 月 31 日止）詳見第 46 頁

(二十) 台灣鐵路管理局業務改進方案

主管機關：台灣省政府

執行情形概要：（資料截至 71 年 3 月 31 日止）

截至第三季執行情形：

1. 組織與人事改進計畫

(1)組織與人力改進方案：新編制實施計畫綱要，已實施。

(2)待遇制度改進方案：編制內員工准支營運獎金，醫師待遇已獲改善。

(3)資位職務薪給修正方案：就相關職務之平衡性再檢討處理。

(4)退休撫卹改進方案：即提自強會報討論後再送整委會審查。

(5)人才羅致改進方案：已提省府交通處核辦。

(6)升遷考核與輪調候選辦法改進方案：各單位提供修正意見，擬召集會議協調。

(7)員工訓練改進方案：在員工訓練中心及各段場如期實施。

(8)建教合作改進方案：與台北工專辦理現職人員建教合作班。

(9)解決行車搶修人員住宿與員工宿舍方案。

2. 財務與重大投資改進計畫：

(1)財務改善方案：正由行政院經建會研議中。

(2)近中程重大投資方案：東綫拓寬工程三月底進度 90.16 %，宜蘭綫鐵路擴建工程 28.9 %。

3. 營運與服務改進計畫。

(1)運輸政策建議方案。

(2)運價結構改進方案。

(3)營運改進方案。

(4)提高運輸能力與安全方案。

六、半年報案件執行情形概要

列管案件中依規定每半年提報執行情形者19案，其中「台灣經濟建設十年計畫人力發展部門計畫」分別列管內政部、教育部、青輔會、台灣省政府、台北市政府、高雄市政府六機關，「全面推動基層建設方案」分別列管國防部、台灣省政府、台北市政府、高雄市政府四機關。各案執行情形如下：

㈠ 改善社會風氣重要措施

主管機關：內政部

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止）詳見第 38 頁

㈡ 台灣經濟建設十年計畫人力發展部門計畫

主管機關：內政部、教育部、青輔會、台灣省政府、台北市政府、高雄市政府。

執行情形概要：（資料截至70年12月31日止）

本案依據內容性質分由經建會及研考會列管，有關半年執行情形檢討資料，依據經建會70.10.24.管(70)字2130號函，規定各機關於七十一年三月底前分送經建會及研考會，由經建會彙整後報院。

㈢ 全面推動基層建設方案

主管機關：國防部、台灣省政府、台北市政府、高雄市政府

執行情形概要：（資料截至70年12月31日止）

本案依據經建會規定每年元、七月底填報執行情形資料，其元月間應送第一次執行情形，請主管機關儘速辦理。

㈣ 改善地方財政方案

主管機關：財政部

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止）詳見第 40 頁

(五) 機械工業發展方案

主管機關：經濟部

執行情形概要：（資料截至70年12月31日止）

1．發展資本及技術密集之重機械及精密機械工業：由國營事業率先投資發展，藉以帶動國內其他相關工業之全面發展，并兼顧國防工業之需要。

(1)原動機後繼製造計畫：預定至七十一年完成，現正計畫採購機器設備中。

(2)重型工業設備製造計畫—由台機公司委請美國殷格索工程顧問公司完成可行性研究，并將列入長程發展計畫。

(3)發展精密工具機製造計畫—正發展聯合加工機、NC車床、NC銑床，並全力推動NC應用於國產機器。

(4)發展精密齒輪製造計畫—由工技院精密工具機中心及台灣塑膠公司發展製造中。

2．積極發展農業機械工業：訂定「設置農機中心工廠實施要點」預計在十二項建設實施期內（四年）共設置中心工廠五家。

3．輔導改進工作母機之精密度及產業機械之自動化：

(1)修正獎勵投資條例，降低投資金額標準及實施投資抵減，以提高業者投資意願。

(2)運用六億美元貸款，鼓勵業者更新設備促使提高生產力及產品品質。

(3)委託金屬工業發展中心長期辦理「工具廠品質追踪輔導」。

4．加強改進機械工業之基本加工及零件製造技術：

(1)鼓勵業者由國外引進新技術并與國外名廠技術合作。

(2)聘請國外技術專家來台指導基本加工技術，以提高產品品級及品質。

5．輔導單元操作機械之發展及整廠設備之設計與製造：

(1)推動煉油、化學工業等整廠或整套機器設備與單元操作機械之國產化，由各工程公司與各製造業者合作設計製造。

(2)由經濟部有關單位組成訪問團，赴東南亞及東北亞地區各國訪問，以拓展整廠或整套設備之外銷。

(六) 電子工業發展方案

主管機關：經濟部

執行情形概要：（資料截至70年12月31日止）

1．(1)已修訂「生產事業獎勵類目及標準」、「工礦業或事業新建擴充獎勵標準」、「重要生產事業特別獎勵適用範圍及標準」，並會同財政部報院核定中。

(2)有關將電腦軟體公司列屬「生產事業獎勵類目及標準」第十三條技術服務業中，已訂有審核要點做爲核定之標準。

2．開發積體電路重要元件製造技術：工技院除繼續研究開發外並將CMOS 積體電路技術轉移民間聯華公司，預定七十一年初將可大量生產，供應國內外市場所需。

3．委託工技院辦理小型電腦系統技術發展計畫：發展微小型電腦軟體技術及發展工業控制及生產自動化之電腦應用技術及引人發展電腦控制，機械人（手）之基本控制。

4．委託工技院電子所添設檢驗服務組以擔負產品品質與服務事項，對國內電子產品擔負檢驗工作。

5．藉對科學工業園區投資業之審核作業引進新技術，已有卅家左右設廠，多爲電子、電腦工業。

6．積極推動業者生產國內尚未生產之電子工業基本原料：鐵氧磁體、偏向軛、馳返變壓器之鐵芯已開始生產，印刷電路基板之銅箔及玻璃纖維布正建廠中。

7．積極鼓勵業者改善機具設備採用半自動或全自動之機設：發動學者參觀實施自動化有成之示範工廠，並配合機械工業推動業者發展NC及CNC控制器之擴大應用面。

8．推動加強辦理參加國外電子展，已有五十一家電子廠商參加南非約翰尼斯堡之國際電子展。

(七) 促進汽車工業發展方案

主管機關：經濟部

執行情形概要：（資料截至70年12月31日止）

1．促進汽車零件工業之發展：

(1)金屬工業發展中心及中國生產力中心，70.7.1.日開始進入第二期輔導工業。

(2)對汽車零件工廠擴充增加生產設備，繼續以中小企業貸款及六億美元貸款支援，70.年10.月起並辦理購買機器投資抵減之鼓勵。

(3)金屬工業發展中心，完成汽、機車自製率辦法實施之調查及評估。

(4)最近一年內已有美國伊頓公司、洛克威爾公司、班廸克斯公司、英國路克斯公司、及日本三國公司等來台設廠生產汽車傳動軸、剎車、主彈簧、鋼圈及化油器等主要汽車零件，其他德國ZF公司、日本富士公司亦將於最近來台設廠技術合作生產傳動齒輪及方向機等主件。

2．設立重型車輛及柴油引擎工廠：70.年3.月核准華同汽車公司由美國通用公司與台機公司投資設立，目前正積極在中壢工業區建廠，預定72.年完成，並先行利用台機公司台北重車廠之設備，展開生產。首批預定71.年1.月出車。

3．設立以外銷爲主之廿萬輛大規模汽車工廠：對提出投資設廠計畫申請書的日本，豐田及日產公司，經濟部於八月，將審查意見，送請行政院經建會審議在案。

4．加強汽車工業研究發展製造省油輕污染之小汽車：

(1)工業技術研究院金屬工業研究所「熱機（內燃機）實驗室」已設置完成，目前對國產汽車之耗油情況及排放情況進行測試。

(2)行政院衛生署已公佈汽車排氣標準，並已於70.年 7.月正式實施。

(3)唐榮公司及清華大學合作發展電動汽車，70.年12.月完成年產120輛能量之電動汽車工廠，除完成清華五號電動車外，並已於70.年 6.月完成電動公用車之試製。目前正研究電動搬運車及電動國民轎車。

(八) 紡織工業加速改進方案

主管機關：經濟部

執行情形概要：（資料截至70年12月31日止）

1．拓展日本、歐洲市場：紡拓會於70. 3.在日本東京、大阪舉辦「81年代台灣成衣展示會」。並於70. 1.及70. 2.分別在匈牙利、東柏林舉辦台灣紡織品及成衣展示會。預定1982年9月參加「1982年西柏林商展」。

2．獎勵工廠合併：遠東紡織公司與東方人纖公司之合併。中興紡織公司與景美印染公司之合併。丸億實業公司與清雲紡織、嘉億實業、泉義印染、巨光實業公司之合併。億順紡織公司與五榮實業公司之合併。

3．鼓勵生產設備汰舊更新：

(1)自68. 1. 24.日至70.10.31.日期間內，協助紡織業者更新設備進口機器融資：①經審查小組通過核轉案件共六十三件，金額爲81,676,231美元。②經國貿局核准進口案件共九十五件，金額爲36,078,913美元。②中興紡織聚酯棉60噸／日以尼龍絲部份設備改產聚酯絲十五噸／日。

4．促進染整工廠之改進：紡織中心進行染整工廠廢水處理之研究，並提供染整工廠應用改進。

5．促進製衣工廠之改進：紡織中心派遣技術人員至製衣工廠技術輔導計278人次，並實施製衣工廠員工在職訓練858人。

6．促進紡織機械之製造：由紡織中心推動下列各項工作。

(1)協助盛發公司開發劍桿式無梭織機。

(2)協辦國產紡織機械展，該中心開發之斷紗偵測系統示範機，亦參加展出。

(3)協助穗昌機械公司改良其緯編針織機，並正與其合作研究開發微處理機械控制毛衣機。

(4)設立紡織機械零件展示室，已搜集各種紡織機械零件五百餘件，供各紡織工廠參觀。

7．建立紡織技術顧問制度及訓練體系：由紡織中心推動下列各項工作：

(1)擬訂「紡織工業生產設備精簡計畫」及「短纖維精紡機進口審核要點」以供輔導紡織

工業參考。

(2)翻譯英、韓、日三國紡織工業有關資料，共十二種。

(3)會同審查紡織業者進口紡織機器設備申請六億美元貸款案件，共六十二件。

(九) 機械工業輔導辦法

主管機關：經濟部

執行情形概要：（資料截至70年12月31日止）

行政院70.12.10.台(70)經字第17835號函核定。正積極辦理中。

(十) 研訂公平交易法

主管機關：經濟部

執行情形概要：（資料截至70年12月31日止）

正由台大法律研究所積極研擬草案中。

(十一) 道路交通安全重點改善措施計畫

主管機關：交通部

執行情形概要：（資料截至70年12月31日止）

本案上半年度（70.7－12月）執行情形檢討報告，經簽院長詧閱。業經本會71.3.11（71）會管0681號函請辦理。

七、追蹤案件執行情形概要

截至71年3月底止

機關名稱	計畫名稱	執行情形概要
高雄市政府	關建體育公園	本案有關問題，目前尚在研議，可望於71年3月底辦理簽約。
	中山路連接博愛路立體交叉工程	1.本案施工方式經提高雄市政府74次市政會議，原則決定採用地下式施工，惟應依直綫式或曲綫式連通，須再加比較研究。 2.高雄市政府於70.12.28分函委託工程顧問公司，提供服務建議書。 3.預定71.2.28截止收件，於71.3.15辦理公開評審完畢。

資料來源：高雄市政府

上列二案七十二年度擬建議高雄市政府自行列管。

八、十二項重要建設計畫執行情形

(一)執行進度總表

▒ 預定進度，▒ 實際進度。
「＋」進度超前，「－」進度落後。

截至 71 年 5 月底止

計畫名稱			計畫起訖時間	執行進度 (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)	備註
1-2	鐵路	東線鐵路拓寬工程	66.12.～70.6.	93.27 93.29	+0.02
1-2	鐵路	南廻鐵路工程（年度進度）	68.7.～77.12.	54.00 55.80	+1.80
2	公路	新建東西橫貫公路三條	68.7.～73.6.	20.06 22.52	+2.46
3	公路	改善高屏地區交通計畫	69.1.～72.6.	76.78 69.26	−7.52
4	中鋼公司第一期第二階段擴建工程		67.7.～71.6.	99.42 99.52	＋0.10
5-1	核能發電	二廠一、二部機工程	63.9.～71.10.	99.97 99.99	＋0.02
5-2	核能發電	三廠一、二部機工程	67.1.～74.5.	61.08 54.87	－6.21
6	台中港第三期工程		68.11.～71.10.	74.40 74.52	＋0.12
7-1	開發新市鎮	林口台中港第一期	68.7–71.13	84.80 85.10	＋0.30
		林口第二期	69.7–73.3	53.50 30.00	−23.50
		台中港第二期	70.3–73.6	18.50 18.50	符合
		高坪特定區	69.1–74.12	34.92 30.92	－4.00
7-2	廣建國民住宅		65.1.～70.12.	辦理情形詳見第 30 頁	
8	加速改善重要農田排水系統（年度進度）		70.7.～71.6.	88.68 80.47	－8.21
9	修建台灣西岸海堤工程及全島重要河堤工程（71年度進度）		70.7.～71.6.	82.48 85.36	＋2.88
10	公路	屏東鵝鑾鼻道路拓寬工程	67.7.～72.6.	89.89 89.91	＋0.02
11	設置農業機械化基金促進農業全面機械化		67.7.～71.6.	辦理情形詳見 35 頁	
12	建立每一縣市文化中心（圖書館、博物館、音樂廳）		67.7.～72.6.	辦理情形詳見第 36 頁	

(二)分項執行情形概要

1~1 東線鐵路拓寬工程

(1)計畫概要

①將台東至花蓮鐵路軌距放寬與西部鐵路標準相同，原長 176 公里，完成後全線縮短爲 164 公里。（含支線4 公里）

②其中隧道 12 座，總長 10.512 公里餘；大橋 39 座，總長5.368 公里，預定 66 年 12 月至 71 年 6 月完成。

③經費：新台幣 51 億 7,793 萬元。

(2)執行情形

截至 71 年 5 月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至 71.5.31.）	
			預定	實際	比較	預支	實際
總計畫	**100.00**	**71.6**	**93.27**	**93.29**	**+0.02**	**4,082,278**	**4,048,594**
1.規劃建設	5.00	71.6.	99.86	99.86	符合	56,810	50,582
2.路基工程	17.00	71.6.	98.75	98.75	符合	378,500	350,872
3.橋隧工程	42.00	71.6.	95.00	95.10	+0.10	2,215,000	2,213,440
4.軌道工程	24.00	71.6.	97.00	97.05	+0.05	809,400	423,553
5.電信及行車安全工程	2.00	71.6.	88.50	88.40	-0.10	271,800	225,360
6.房屋站場工程	4.00	71.6.	81.00	81.00	符合	145,000	120,593
7.機務工程	6.00	71.6.	55.00	54.50	-0.50	66,000	20,625

資料來源：台灣省交通處鐵路管理局

說　　明：1.總進度超前 0.02 %。

2.自強隧道全長 2,750 公尺，北端低坑已完成 1,847 公尺：南端完成 603 公尺，於達到L67+294 處發生湧泥不能進行擬採用西德建議之新奧地利施工法，正趕辦設計工作已完成，正辦理議價手續中。

3.累計預定支用尚未包括一般行政費等三項計139,768千元，累計支出尚未包括一般行政的工程管理費等二項共 637,569 千元。

4.本計畫自 71.4.1 起按新調整進度及分配經費執行列報。有關修訂作業計畫正由本院經建會核辦中。

1~2 南迴鐵路工程

(1)計畫概要

①自屏東縣枋寮站起經枋山穿越中央山脈至台東縣卑南站，與東線鐵路銜接；預計自 67 年 7 月至 69 年 6 月完成規劃，預定 69 年 7 月 1 日施工，至 77 年 12 月 31 日完成。

②全長 98 公里，其中隧道 33 座，總長 37.446 公里（其中中央隧道長 8.060 公里），大橋 39 座，總長 5.048 公里，車站 19 處（內交會站三處）。

③經費：新台幣 253 億 8,800 萬元。

(2)執行情形

截至 71 年 5 月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至 71.5.31.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫（年度計畫）	**100.00**	**71.12**	**54.00**	**55.80**	**+1.80**	**216,982**	**206,240**
1. 規劃建設	4.50	71.8	2.70	2.80	+0.10	10,900	16,135
2. 路基工程	22.50	71.8	19.50	17.70	-1.80	77,482	76,244
3. 橋隧工程	52.00	71.12	28.80	30.40	+1.60	116,400	100,590
4. 房屋及站場設備工程	21.00	71.12	3.00	4.90	+1.90	12,200	13,271

資料來源：台灣省政府交通處南迴鐵路工程處

說　　明：1. 總進度超前 1.80%。
2. 卑南站用地收購手續已完成 99.9%。
3. 卑南站東拓與南迴併行線路基已辦理完成。
4. 中央隧道高壓電力外綫工程，已完成發包手續，準備開工中。

2. 新建東西橫貫公路三條

(1)計畫概要

①台灣省政府對新闢三條橫貫公路踏勘及研究報告，由經建會核議，經本院67.2.11.台六十七交字第1120號核定；新闢中部橫貫公路區分爲三條：

a. 嘉義玉山線：全長101.93公里，其中新闢21.78公里，改善75.95公里，利用原路4.2公里。

b. 水里玉山線：全長62.5公里，其中新闢28.5公里，改善34公里。

c. 玉山玉里線：全長102.7公里，其中新闢95.6公里，改善7.1公里。

②工程標準：較過去之橫貫公路標準爲高，除經過市集村落及觀光路段可舖設瀝青路面外，其餘先暫以石子路面開放通行，俟路基穩定後，再行加舖高級路面。

③工程總經費：76億1,600萬元，中央與省各半負擔。

④規劃階段經費：核定爲6,720萬元。

(2)執行情形

截至71年 5 月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至71.5.31.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫	**100.00**	**73.6**	**20.06**	**22.52**	**+2.46**	**1,344,085**	**1,524,981**
1.嘉義玉山段	30.00	73.6.	49.68	53.09	+3.41	924,085	988,495
2.水里玉山段	30.00	73.6.	17.19	21.98	+4.79	420,000	536,486
3.玉山玉里段	40.00	未定	-	-	-	-	-

資料來源：台灣省政府交通處公路局

說　　明：1.總進度超前2.46%。

2.規劃作業，併入嘉義玉山，水里玉山及玉里三綫工程，自69.7.起停止月報。（省府69.7.25規69-102-45-23(4)號函呈報）。

3.嘉義玉山段：因山區雨季，坍方不斷，清除費時；且部份路基下陷；而路面因障碍木未能及時標售，影響工進，現正與林務局、榮工處、及其他承包商積極協調辦理及施工中。

4.水里玉山段：因部份路基工程議價不成，部份隧道改線不做，及零星工程延後施工，影響施工進度。

5.玉山玉里段，俟對地質等情形妥加研究後，再決定施工年期。

6.自七十一年元月份起，按修正作業計畫及年度分配預算，修正執行進度及預算。

7.本工程進度超前，故有關拆遷補償、購料及施工等費用均超支，請速調撥，以利工程進度。

3. 改善高屏地區交通計畫

(1)計畫概要

①拓寬台一綫鳳山至屏東間6.5公里、台17綫雙園大橋至水底寮間20.663公里、181綫鳳山至林園間15.99公里、185綫屏東烏龍間20.9公里，四綫共計64.053公里。

②路面標準：以上四綫道路，均拓建爲四綫快車道，二綫慢車道，以消除高雄至屏東間之公路運輸頸。

③預定於72年度前全部完成。

④預定使用經費：25億4,000萬元。

(2)辦理情形

截至71年 5 月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至71.5.31.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫	100.00	72.6	76.78	69.26	－7.52	1,950,100	1,485,319
1. 台一綫鳳山屏東間拓寬	2.66	69.6.	100.00	100.00	完成	188,200	188,200
2. 台17綫雙園橋水底寮段拓寬	47.87	71.6.	94.10	91.24	-1.09	905,000	758,553
3. 181綫鳳山林園段拓寬	25.53	72.6.	69.90	51.65	-4.59	447,400	322,900
4. 185綫屏東至烏龍段拓寬	23.94	72.4.	54.60	48.38	-1.84	409,500	215,663

資料來源：台灣省政府交通處公路局

說　明：1. 總進度落後－7.52%。其原因；台17綫路基面拓寬工程因電信管路施工影響，無法全面施工。
2. 本表係根據調整計畫後之進度及經費列支。
3. 台17線雙園大橋已於70.10.10完成，引道部份已完成，正鋪路AC。
4. 台17線與台187線立體交叉工程PC基樁與大樑全部完成，引道部份施工中。
5. 台17線林邊大橋拓寬工程，已完成預力大樑60支，路基已完成14.60KM，路面完成14.30KM
6. 181線鳳山市都市計劃區已呈報省府辦理，其餘已順利完成徵收手續並已發放補償費。
7. 185線萬丹外環都市計劃案報省核定中，無法辦理，其餘部份均已辦理徵收竣事，補償已大部發放完畢。
8. 本計畫經行政院69.2.21台(69)交1973號函核定。

4. 中鋼公司第一期第二階段擴建工程

(1)計畫概要

①本計畫針對國家經濟發展趨勢，配合國內市場需要，增加熱軋及冷軋鋼帶、鋼片生產，又第一座高爐使用五年後需停爐整修，屆時第二座高爐建立完成，俾鐵水供應不致中輟。

②目標：年產粗鋼 175 萬公噸，產品包括熱軋鋼板、鋼片及冷軋鋼帶、鋼片、底片等共 140 萬公噸。

③期程：自 67 年 7 月開工，至 71 年 6 月完成。

④經費：新台幣 555 億元。

(2)執行情形

截至 71 年 5 月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至 71. 5.31.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫	**100.00**	**71.6**	**99.42**	**99.52**	**+0.10**	**54,909,986**	**52,843,764**
1.土地	0.37	-	100.00	100.00	完成	1,100,000	1,347,952
2.房屋及建築	2.21	71.4	98.60	96.37	-2.23	3,748,593	1,798,449
3.機械設備	95.06	71.6	99.79	99.89	+0.10	48,913,045	47,787,862
4.交通運輸設備	0.62	70.12	99.85	99.92	+0.07	636,015	756,436
5.其他設備	1.74	71.6	80.06	83.19	+3.13	512,333	1,153,065

資料來源：經濟部中鋼公司

說　明：1.總進度超前 0.10 %。

2.工程施工情形：
目前正積極進行試車。

3.試車中之設備：
燒結工場、鋼帶冷軋工場、冷軋精整工場、封盒退火及清洗設備、冷軋調質工場、熱軋鋼帶工場。

4.已試車完成加入運轉的設備：
小鋼胚表面處理工場、脫硫工場、動力工場、花蓮港石料裝船系統、燒石灰工場、第三、四號煉焦爐及副產品工場、氧氣工場、轉爐工場、高爐工場、扁鋼胚連鑄工場、扁鋼胚精密工場、水處理工場。

5.本計畫經行政院 66 年 11 月 30 日台（66）經字 9959 號函核定輸配電設備、原料輸送系統、熱軋精整工場及連續酸洗工場。

5～1 興建核能發電廠—核能二廠第一、二部機工程

(1)計畫概要

①本計畫裝置容量爲197萬瓩，完成後全部可發電104億餘度，淨供電力100億餘度。

②本計畫自 63 年9月起開工，預定 71年10月完成。（ 64年8月初埋鋼筋，71年4月二部機裝塡燃料）。

③經費：新台幣630億3,698萬元。

(2)執行情形

截至 71 年 5 月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至 71.5.31.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫	**100.00**	**71.10**	**99.97**	**99.99**	**+0.02**	**52,187,811**	**56,943,707**（未包括契約應付款 266,374）
1.工地準備	3.00	70.6.	100.00	100.00	完成	---	
2.土木工程	28.50	70.8.	100.00	100.00	完成	---	---
3.機械工程	59.00	71.5.	100.00	100.00	完成	---	---
4.電機工程	8.50	71.1.	100.00	99.98	-0.02	---	---
5.試驗及試運轉	1.00	71.10.	97.00	97.50	+0.50	---	---

資料來源：經濟部台灣電力公司

說　　明：1.總進度超前0.02%。
2.第一部機已完成。
3.第二部機已完成99.95%，超前0.01%。

5～2 興建核能發電廠—核能三廠第一、二部機工程

(1)計畫概要

①本計畫裝置容量爲190.2萬瓩，完成後可發電117億餘度，淨供電力111億餘度。

②本計畫自67年1月起開工，預定74年5月完成。第一部機預定73年5月完成，（67年5月初埋鋼筋，72年11月裝塡燃料）。

③經費：新台幣911億4,407萬元。

(2)執行情形

截至71年 5 月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位、千元）（截至71.5.31.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫	**100.00**	**74.5**	**61.08**	**54.87**	**-6.21**	**46,940,022**	**53,231,692**
1.工地準備	2.20	68.3.	100.00	100.00	完成	---	（未包括契約應付款1,965,165）
2.土木工程	30.55	74.5.	83.76	89.18	+5.42	---	---
3.機械工程	43.80	74.5.	58.25	46.40	-11.85	---	---
4.儀電工程	17.00	74.5.	38.26	28.18	-10.08	---	---
5.試運轉	6.45	74.5.	18.67	4.86	-14.81	---	---

資料來源：經濟部台灣電力公司

說　　明：1.總進度落後6.21%。

2.第一部機完成66.39%，落後7.62%。第二部機完成40.75%，落後4.48%。

3.進度落後原因：

(1)以前受財務及內外購器材延誤，其落後之工期，需假時日趕回。

(2)國外器材仍有部份一再延誤交貨者。

(3)受三哩島事件影響導致之設計變更，尙待貝泰儘速定案。

4.解決辦法：

(1)關鍵工程以兩班制趕工。

(2)責成貝泰駐工地催料小組繼續以函電催辦。

(3)繼續派員赴國外稽催外購器材。

(4)已指令貝泰按台電公司指示之設計原則積極進行設計中。

6. 台中港第三期工程

(1)計畫概要

①台中港爲一兼顧商業、工業及漁業的綜合港。面積3,970餘公頃。

②台中港分三期施工：第一期以營運量280萬公噸爲目標，於62年10月31日開工，已於65年10月開放營運。第二期以營運量450萬公噸爲目標，於65年11月開工，已於68年10月完成，第三期以營運量1,100萬公噸爲目標，已於68年11月開工，預定於72年6月完成。

③第三期主要工程包括深水碼頭15座長3,155公尺，浚挖港池1,700萬立方公尺，填築港區新生地及改良都市計畫區290公頃，延建南海堤，興建漁港1處，以及配合作業。

④經費：第一期新台幣57億元；第二期69億4,700萬元；第三期95億8,526萬元。

(2)執行情形

截至71年5月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至71.4.30.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫	**100.00**	**72.6**	**74.40**	**74.52**	**+0.12**	**5,600,000**	**4,711,896**
1.港埠工程	50.00	72.6	77.80	78.81	+1.01	2,440,000	2,223,955
2.浚填工程	17.00	72.6	80.40	80.47	+0.07	1,080,000	975,084
3.堤防工程	6.00	72.6	60.00	60.04	+0.04	220,000	157,720
4.漁港工程	11.00	72.6	69.00	65.31	-3.69	520,000	452,693
5.配合作業	16.00	72.6	66.50	66.54	+0.04	1,340,000	902,444

資料來源：台灣省政府台中港務局

說　明：1.總進度超前0.12%。

2.深水碼頭十五座，長3155m。13、14、15、26、27號散雜貨碼頭完成啓用；31、32號碼頭16塊面板已於71.5.14.澆置完竣；5A碼頭主體部分施工；24號碼頭上部結構施工；25號碼頭裝設護舷；23號碼頭已安放4座沉箱；28號碼頭建碼頭緣石；29號碼頭澆鑄帽梁；4A碼頭完成啓用；油輪兼化學品碼頭已安放7座沉箱；起水碼頭吊放L塊，背填濾層料。

3.浚挖港池1700萬m^3，（已浚挖1574萬m^3）；填築覆蓋港區新生地及改良都市計劃區290公頃，（已完成171公頃）

4.配合作業：配合主體工程施工。

(1)配合設施：港區配電、給水、排水、污水、道路、綠化、堆貨場、各項營建工程、導航燈標、乾船塢擴建等。

(2)間接工程：船舶機具設備購置及維護，各項模型、材料試驗，品質檢驗，資料調查、分析，土地收購。

5.本計畫經行政院65年5月21日台(65)交4392號函核定。

7～1 開發新市鎮

(1)計畫概要

①林口新市鎮第一期開發工程：計畫完成工程道路總長30,782公尺，雨水下水道總長16,000公尺，污水下水道總長28,500公尺，自來水配水池加壓站1處，管綫63.5公尺。經費10億431萬。第二期開發工程：計畫完成道路工程總長21,753公尺，整地工程面積1,581,000公尺，雨水下水道12,000公尺，污水下水道21,000公尺，自來水工程100M/Mφ管綫48.7公里及配水池、加壓站各一處。經費7億300萬元。

②台中港新市鎮第一期第二階段工程：計畫完成工程道路總長10,100公尺，雨水下水道總長2,625公尺，污水下水道6,685公尺，自來水配水管總長10,523。經費：1億9,000萬元。第二期第一階段工程：計畫完成道路工程總長332,025平方公尺；污水下水道總長36,000公尺及擴建污水廠及抽水站；雨水下水道總長6,700公尺，自來水100M/Mφ 700M/Mφ管綫總長30.76公里。

③高坪特定區開發—預計興建容納60,000戶之國宅，以解決附近工業區從業員工及低收入家庭之居住問題。經費：有關土地徵收、取得、公用事業之開發及公共設施等費用尚未定案正分別籌措中。

(2)執行情形

截至71年5月底止

計畫項目	權重(%)	預定完成日期	執行進度(%) 預定	實際	比較	預算支用(單位:千元)(截至71.5.31.) 預定	實際
1.林口、台中港新市鎮第一期工程							
總計畫	**100.00**	**71.3**	**84.80**	**85.10**	**+0.30**	**1,194,000**	**893,745**
(1)林口第一期工程	84.10	71.3	81.90	82.30	+0.40	1,004,610	679,485
(2)台中港第一期第二階段工程	15.90	70.12	100.00	100.00	完成	190,000	214,161
2.林口新市鎮第二期工程							
總計畫	**100.00**	**73.6**	**53.50**	**30.00**	**-23.50**	**703,000**	**-**
(1)整地工程	14.20	73.6	45.10	30.00	-15.10	100,000	-
(2)道路工程	42.70	73.6	48.40	30.00	-18.40	300,000	-
(3)雨水下水道工程	17.80	73.6	49.10	30.00	-19.10	125,000	-
(4)污水下水道工程	12.80	73.6	49.20	30.00	-19.20	90,000	-
(5)自來水工程	12.50	72.6	47.10	30.00	-17.10	88,000	-

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%） 預定	實際	比較	預算支用（單位：千元）（截至71.5.31.） 預定	實際
3. 台中港新市鎮第二期工程							
總計畫	100.00	73.6	18.50	18.50	符合	767,400	
(1)道路工程	36.40	73.6	6.80	6.80	符合	279,600	-
(2)污水下水道工程	35.10	73.6	22.80	22.80	符合	269,300	-
(3)雨水下水道工程	24.30	73.6	27.50	27.50	符合	166,100	-
(4)自來水工程	4.20	73.6	30.00	30.00	符合	32,400	-
4. 高雄市高坪特定區計畫							
總計畫	100.00	74.12	34.92	30.92	-4.00	4,890	4,250
(1)政策決定	1.00	69.1	100.00	100.00	完成		
(2)選定地形	1.00	69.2	100.00	100.00	完成	1,690	1,690
(3)地形測量	3.00	69.6	100.00	100.00	完成		
(4)撤銷工業用地編定	2.50	70.4	100.00	100.00	完成		
(5)辦理都市計畫禁建	2.50	70.4	100.00	100.00	完成		
(6)成立開發組織	10.00	71.6	94.50	77.50	-17.00		
(7)擬定都市計畫	15.00	71.6	95.93	80.00	-15.93	3,200	2,560
(8)國宅規劃設計	8.00	72.12	-	-	-		
(9)國宅興建	17.00	74.12	-	-	-		
(10)開闢公共設施	15.00	74.12	-	-	-		
(11)土地取得	25.00	73.6	10.71	10.71	符合		

資料來源：經建會、台灣省住宅及都市發展局、高雄市政府工務局

1. 本計畫目前正進行道路、雨水下水道、污水下水道及自來水等項公共工程，部份仍規劃設計中。部份已發包施工。
2. 林口新市鎮第一期開發工程，目前超前0.3%；第二期亦因部份土地尚未取得及拆遷均未完成，以致工程無法進行落後23.50%。
   第一期完工時間考慮延後九個月。第二期完工時間考慮延後一年。
3. 台中港新市鎮開發工程進行順利，第一期第二階段如期完成。第二期第一階段進度符合。
4. 高雄市高坪特定區，正擬訂開發計畫及成立開發組織中；由於計畫規劃延後，且審議費時，目前進度落後0.4%。
5. 大坪頂新市鎮，省府部份已將分期分區開發原則修正完成，擬再陳報行政院，俟奉核定，即據以擬訂開發計畫，林口、台中港及大坪頂三處新市鎮整體開發計畫，均尚待省府儘速提報。

7～2 廣 建 國 民 住 宅

(1)計畫概要

① 65 至 70 年間，台灣省興建 71,827 戶；台北市興建 23,000 戶；高雄市興建 12,104 戶，共核定興建戶數 106,931 戶。

②經費：合計六年使用 278 億 9,200 萬元（貸款額）。

③ 71 至 74 年間預定目標，台灣省興建 69,200 戶；台北市興建 20,000 戶；高雄市興建 10,000 戶，共計興建 99,200 戶。（金馬地區興建國宅之數字未包括在內，又全案尚待核定中。）

(2)執行情形（季報）

截至 71 年 3 月底止

省市別	計畫分配戶數	已完工 (戶)	已完工 (%)	施工中 (戶)	施工中 (%)	正設計中 (戶)	正設計中 (%)	尚未着手規劃 (戶)	尚未着手規劃 (%)	取得備用土地（公頃）
台灣省	1. 續辦六年計畫部分 16,674	5,738	34.40	10,936	65.60	—	—	—	—	—
	2. 71-74 年部分 69,200	119	0.20	15,253	22.00	8,920	12.90	44,908	64.90	34,9987
台北市	1. 續辦六年計畫部分 19,072	3,166	16.60	15,906	83.40	—	—	—	—	—
	2. 71-74 年部分 20,000	—	—	624	3.10	3,846	19.20	15,530	77.70	—
高雄市	1. 續辦六年計畫部分 5,624	1,793	31.90	3,831	68.10	—	—	—	—	—
	2. 71-74 年部分 10,000	—	—	310	3.10	3,497	35.00	6,193	61.90	—
總計	1. 續辦六年計畫部分 41,370	10,697	25.90	30,673	74.10	—	—	—	—	—
	2. 71-74 年部分 99,200	119	0.10	16,187	16.30	16,263	16.40	66,631	67.20	34,9987

資料來源：行政院經建會

說　明：1. 六年計畫續辦部份共 41,370 戶，其中完工者 10,697 戶；施工中 30,673 戶。

2. 目前執行之四年國宅計畫草案執行情形如下：

(1)完工：119 戶，占 0.1 %。

(2)施工中：16,187 戶，占 16.30 %。

(3)正設計中：16,263 戶，占 16.40 %。

(4)尚未着手規劃部份：66,631 戶，占 67.20 %。

3. 四年（71-74 年度）國宅計畫草案，已報院核示，原則上政府興建十萬戶（包括六年計畫未完部份）獎勵民間投資興建 14 萬戶，俟國宅條例修正經立法院修正通過後，即可據以訂定獎勵辦法，依據需要檢討辦理。

8. 加速改善重要農田排水系統

(1)計畫概要：七十一年度農田排水系統工程

①目標：繼續辦理宜蘭、彰化、雲林、嘉南、高平及新苗、台中等地區之區域性排水工程。

②效益：工程完成後，可減少13,905公頃農田之農作物浸水損失，並使計畫地區將來辦理土地重劃工作能順利推行。

③工程費：4億7,405萬元，其中政府補助3億元，地方配合7,405萬元。

(2)執行情形

截至71年 5 月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至71.5.31.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫	**100.00**	**71.6.30**	**88.68**	**80.47**	**-8.21**	**441,690**	**260,142**
宜蘭地區排水工程	5.27	"	90.00	97.00	+0.37	23,488	15,155
新苗地區排水工程	6.12	"	90.00	58.00	-1.96	27,237	12,054
台中地區排水工程	3.16	"	90.00	92.00	+0.07	14,087	4,811
南投地區排水工程	3.16	"	90.00	55.00	-1.10	14,087	6,648
彰化地區排水工程	27.62	"	90.00	77.00	-3.59	123,062	95,166
雲林地區排水工程	10.32	"	90.00	91.00	+0.10	45,937	30,601
嘉南地區排水工程	17.31	"	90.20	93.60	+0.59	77,025	35,775
高雄地區排水工程	12.23	"	90.00	94.20	+0.51	54,487	25,889
屏東地區排水工程	6.33	"	90.00	51.00	-2.47	28,187	29,162
加強改善工程及其他	8.48	"	34.00	65.50	-0.73	34,093	2,211

資料來源：台灣省水利局

說　明：1. 總進度較預定落後8.21%。

2. 表列預算實際累積數均不包括地方配合款在內。

3. 表列預算實際累積數包括實付預付及購料金額在內。

9. 修建台灣西岸海堤工程及全島重要河堤工程

(1)計畫概要

①海堤工程：

68年7月至71年6月，整建海堤70公里。預期可保護田地4,100公頃，漁塭1,800公頃，房屋18,900棟。人口90,000人，並促進沿海地區經濟發展。

②河堤工程：（一般防洪工程）

68年7月至71年6月，新建河堤及護岸79公里，加高加強及歲修養護184公里，預期可保護田地9,800公頃，人口420,000人，房屋70,000棟。另加強水文觀測設施及重要河川治理規劃研究。

③經費：75億7,000萬元。

④七十一年度計畫辦理：

i. 整建及養護海堤13,570公尺，修建堤防護岸39,702公尺，丁埧164座。

ii. 工程費：整建及養護海堤176,000,000元，修建堤防護岸749,165,000元。

(2)執行情形

截至71年5月底止

計畫工程	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至71.5.31.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫	**100.00**	**71.6.30**	**82.48**	**85.36**	**+2.88**	**860,920**	**811,180**
1.台灣省西海岸海堤工程	19.02	71.6.30	15.40	15.69	+0.29	164,000	168,693
2.全省重要河堤工程	80.98	71.6.30	67.08	69.67	+2.59	696,920	642,871
①主要河川新建工程	28.26	71.6.30	22.91	25.43	+2.52	242,000	208,916
②次要河川新建工程	15.64	71.6.30	12.65	12.01	-0.64	133,000	100,624
③主要河川加高加強及歲修養護工程	37.08	71.6.30	31.52	32.26	+0.74	321,920	332,947

資料來源：台灣省水利局

說　明：1.總進度較預定進度超前2.88%。

2.表列預算實際支付累積數均不包括地方配合款在內。

3.表列預算實際支付累積數包括實付，預付及購料金額在內。

10. 屏東至鵝鑾鼻道路拓寬工程

(1)計畫概要

①本計畫目標爲將下列範圍內之道路拓建爲四線高級公路：

自屏東外環線起點，經麟洛、內埔、潮州、新埤、枋寮、楓港、車城、恒春、墾丁至鵝鑾鼻，全長108公里。

②預定自67年7月至72年6月完成。

③經費：35億5,000萬元，中央及省各半負擔。

(2)執行情形

截至71年5月底止

計畫項目	權重（%）	預定完成日期	執行進度（%）			預算支用（單位：千元）（截至71.5.31.）	
			預定	實際	比較	預定	實際
總計畫	**100.00**	**72.6.**	**89.89**	**89.91**	**+0.02**	**2,987,911**	**2,624,107**
1. 用地收購及地上物補償	10.59	72.4.	97.17	99.20	+2.03	274,350	246,282
2. 管綫遷移	6.02	72.6.	99.17	99.60	+0.43	135,430	109,027
3. 配合台電核三廠道路橋樑改善工程	7.53	68.1.	100.00	100.00	完成	203,275	203,275
4. 水底寮至馬鞍山橋樑拓寬工程	4.69	68.9.	100.00	100.00	完成	115,703	115,703
5. 潮州外環綫終點至枋寮拓寬工程	10.35	70.12.	100.00	100.00	完成	338,810	343,516
6. 屏東外環綫終點至潮州外環綫終點拓寬工程	13.97	71.6.	99.36	96.21	-3.15	514,720	461,375

10. 屏東至鵝鑾鼻道路拓寬工程(續)

截至71年 5 底止

計畫項目	權重(%)	預定完成日期	執行進度(%)			預算支用(單位:千元)(截至71.5.31.)	
			預定	實際	比較	預定	實際
7.枋寮外環綫起點至楓港拓寬工程	8.65	70.12.	100.00	100.00	完成	406,030	331,616
8.楓港至鵝鑾鼻拓寬工程	21.31	71.6.	99.01	96.11	-2.90	750,880	602,470
9.屏東外環綫立體交叉工程	3.41	72.6.	-	-	-	-	20,000
10.屏東外環綫新闢工程	4.49	72.6.	-	-	-	114	176
11.佳冬空軍戰備道路工程	3.04	71.1.	100.00	100.00	完成	129,040	105,356
12.附屬工程及預備費	5.95	72.6.	73.83	88.00	+14.17	118,080	65,311

資料來源:台灣省政府交通處公路局

說　　明:1.總進度超前0.02%。

2.屏東外環線用地及地上物已發包議價中,該工程預算報請核定中。

3.附屬工程墾丁特定管理區五之七號道路已開工。

11. 設置農業機械化基金，促進農業全面機械化

(1)計畫概要

①以每年農業農動人口減少1％爲依據，並顧及資金籌措與國產農機生產能量訂定推廣計畫，預定於民國71年度，農田機械方面，每公頃耕地平均馬力可達1馬力以上，整地機械化程度達93％，插秧機械化90％，收穫機械化90％，稻穀烘乾機械化50％，旱地及山坡方面，達成部份機械化；對畜牧及沿岸漁業漁撈操作及機械化也將逐漸推廣。

②經費：國庫撥款32億元，中美基金項下撥貸8億元，設置農業機械化基金，另由有關農業行庫及農漁會每年提供同額的基金配合運用。

(2)執行情形

截至71年5月底止

時間	單位地點	大事記
71 5. 13. 26.～8. 31.	全省	農發會邀集農林廳、農機試驗研究場所及有關大專院校農機科系人員，於茶葉改良場研討明年度農機試驗項目。並於26～28日及31日分別至台南農改場、鳳山農試分所、高雄農改場、屏東農專及桃園農改場進一步檢討雜糧、園藝及特作機械試驗改良計畫，並擬訂明年度計畫內容。
71 5. 18.	台中	農發會及農林廳舉辦農機經銷商改進售後服務講習會。
71 5. 25.	農發會	經濟部農業機械化基金保管運用委員會技術小組第卅六次會議，主要討論及決議事項如后： 一、核定農漁機最高零售價，計擠乳設備五機型、冷凍儲乳槽二機型、中耕管理機二機型、插秧機二機型、曳引機三機型、漁船主機十四機型、省能源漁船二型式以及起網機一機型。 二、農機性能測定本年度共測定十七種機型，均測定合格。 三、擬訂於六月二日召開會議討論如何配合推動大型聯合收穫機國產化措施。 四、農機工廠建議儘速全面管制進口二五馬力以下農用單缸柴油引擎案，請農業局考慮將此類引擎納入「核發農機進口同意函件作業要點」中辦理。 五、金合成農機公司籌設農機中心工廠，其售後服務處所業經檢查合格。
71 5.	基隆 新竹 中壢 高雄	成功大學漁船及船舶機械研究中心及農發會人員辦理省能源漁船海上試俥，測定其性能，計測定七型。另測定漁撈機械一機型。

資料來源：經濟部、農發會

七十一年度推行計畫執行概況：

一、本年度截至四月底止，已貸放2,619百萬元，協助農漁民購買農漁機22,696台。

二、至五月底止，補助農民購買水稻聯合收穫機862台，稻穀乾燥機1,794台，太陽能乾燥機25台，廻轉犂103台，四行式插秧機626台，其他農機13台，合計3,423台。

三、輔導水稻育苗中心計畫至五月底止共核設163處，連同以往已設置者共計836處。

12. 建立每一縣市文化中心，包括圖書館、博物館、音樂廳

(1)計畫概要

①目標：全面推展綜合開發計畫，加速復興民族文化，俾與國家現代化相結合，以期早日達成中興復國建國的歷史使命。

②籌建項目：

中　央：新建音樂廳、國家劇院各一座，遷建國立中央圖書館一所，新建海洋博物館、自然科學博物館及科學工藝博物館各一處，充實改善及改制台灣省立博物館等。

台灣省：各縣市自行規劃以興建圖書館一所爲主，並視地方實際需要輔建或單獨興建文物陳列室、畫廊或美術展覽室、演藝或集會場所。音樂廳部分由省選擇適當地點籌建一座。

台北市：新建與改建圖書總館及分館十五所及興建社教館。另建美術館、天象館、中華民俗文物村、青少年及文藝活動中心；繪製青年公園大壁畫；遷建動物園。

③高雄市：新建中正文化中心一座，圖書分館五所。預計自68年度至72年度五年完成，分區分年執行。

④經費：初步估約65億元（其中不包括中央興建各館在內），其來源爲中央補助、地方財源、社會福利基金及民間投資等。

(2)執行情形

①興建計畫

截至71年4月底止

預定起迄日期	區分	本年度執行項數	進度			已完成項數	備註
			符合	落後	超前		
67.7～72.6	合計	44 (43)	13	26	5	5	本年度執行44項中包括興建國家劇院與音樂廳間附建「地下停車場」一項，故實屬計畫執行項目應爲43項
	中央	7 (6)	1	6	0	0	
	台灣省	19	4	13	2	1	
	台北市	14	4	7	3	2	
	高雄市	4	0	0	2	2	

資料來源：本院經建會

執行情況說明：

一、在44分項計畫中，有26分項落後，尤以省屬若干分項落後原因已連報數月尚無改進，另台中市落後原因爲「原報作業計畫分配失當」，意義不明，應請主管及督導機關查明糾正。

二、以上各節、經建會曾以71.5.1管(71)字0989號函請教育部辦理見覆。

②教育活動及人力計畫（季報）

一、本案執行情形經一七六〇次院會決議如次：

教育部前報經本院核定之「建立縣市文化中心之教育活動及人力計畫」尚未執行完畢，宜繼續加強辦理。惟原計畫中若干工作內容已不盡切合現況需要，應由教育部會同有關機關迅行檢討後重新修訂報院，請邱副院長約集教育部朱部長，文建會陳主任委員，本院主計處鍾主計長，研考會魏主任委員，暨省市政府首長共同審查後再行提出院會討論，其有時間性者可先行處理。」

二、教育部經邀集經建會、研考會及省市政府代表研商後，已訂定「建立縣市文化中心教育活動及人力計畫」執行情形綜合檢討報告，經本院審議要點如次：

㈠所報之執行內容准予備查。

㈡院會決定有關原計畫修訂報院審議部份，需俟經建會審議之「教育部建立縣市文化中心計畫修訂草案」報院後再行決定。

三、本案查證工作已於71.5.18至71.6.11完成，正簽陳院長詧閱中。

九、重要方案、計畫執行概要

本院重要方案、計畫、奉交由本會追蹤管制21案，各案辦理情形概述如下：

(一) 改進土地行政業務方案

主管機關：內政部　　**核定日期文號**：69.10.29.台六十九內12491號函核定

期　　程：70.1－73.6

執行情形概要：（資料截至71年 5月31日 止一季報）

1. 本方案截至七十年十二月底止，進度爲77.5％較預定進度落後0.5％。

一、已完成之數別爲：

(一)改進土地行政切實爲民服務。

(二)改進地政風紀加強人員考核。

二、落後之類別爲：

(一)促進土地利用貫徹地利共享。

(二)強化地政機關組織，提高行政效率。

(三)建立完整地政資料。

(二) 改善社會風氣重要措施

主管機關：內政部等十一個單位　　**核定日期文號**：68.5.18台六十八內4751號函核定

期　　程：經常辦理

執行情形概要：（資料截至71年 5月31日 止一每半年檢討一次）

本案經本院一七七七次會議決定如次：

(一)本措施應由內政部依據執行兩年餘以來之經驗，會同各有關機關重加檢討修正，期能有效執行，以澈底端正社會風氣，下列意見請參辦：

1. 農村之純樸風氣應盡力予以保持，防止其爲都市不良風氣所污染。
2. 促進民間節約工作必須再予加強。婚喪祭典均應避免浪費，由省市政府要求各基層行政單位加強宣傳勸導。

(二)各縣市文化中心將陸續完工，請本院文建會約同教育部、本院新聞局及台灣省政府研擬辦法，指導並協助各中心經常舉辦各類文化活動及各類文物展覽，充分發揮其應有功能。

(三)關於國際觀光旅社附設夜總會之許可計年標準問題，請交通部研究。

㈢ 改進警政工作方案

主管機關：內政部　　**核定日期文號**：69.11.21.台六十九內13486號函核定

期　　程：67.2－73.6

執行情形概要：（資料截至71年 5月31日 止一月報）

1. 截至四月底止，總進度89.17％，落後0.95％。
2. 三十八個執行項目中，一項超前，四項進度符合，六項落後，九項已完成，十八項係經常辦理之工作。
3. 落後六項分述如下：
   (1)「聘請國內外專家對各大地區之交通工程及號誌管制設施，提出改進意見。」：落後4％，因台中市依據專家研究結果，再擬改進案提該市道安全報審議，以致落後。
   (2)「整建基層警察廳舍」：落後1％，原因係第一期工程部份因流標或用民地地主不同意使用等因素，以致落後，正趕辦中。
   (3)「官警兩校勤務課程內容配合加強警察勤務具體措施施教」：落後1.62％。中央警官學校勤務課程內容之審查，因教材內容繁多，正認眞積極審查中，致進度落後。
   (4)「執行高瞻工作計畫」：落後3.5％。有關採購500 D直昇機一架案，已委託海軍簽約，正辦理結滙中。
   (5)「建立電子處理資料作業系統」：落後3.09％，因與NEC公司簽約延遲，進度稍落後。
   (6)「辦理台灣地區遙控警報系統」，落後4.6％，因海外進口器材以海運運送延遲，其他工作無法與之配合，致進度落後。
4. 本案已於五、六月間實施實地查證完畢，正撰寫查證報告中，一俟完成，即將簽報院長鑒核。

㈣ 都市內地價較高而又未妥善利用之公地應研訂妥善方法

主管機關：財政部、人事行政局、台灣省政府、台北市政府

期　　程：經常辦理、定期檢討

執行情形概要：（資料截至71年 5月31日 止一季報）

1. 本案經院長批示請副院長邀集人事行政局、國有財產局等機關協調後，決定在四個月內進行全面清查全台北市區的國有眷舍及公地，有多少面積可供運用輔建中央公教住宅，

重新規劃，擬具處理辦法報行政院處理。請把握時效儘速完成。

2. 財政部國產局經協調各有關機關訂定「各機關經管未妥善利用之公有土地及公營事業土地之清查處理綱要」已報院，並經修正核定，納入本案管制。

㈤ 改善地方財政方案

主管機關：財政部　　**核定日期文號**：69.8.11台六十九財9299號函核定

期　　程：經常辦理

執行情形概要：（資料截至71年5月31日 止一半年報）

一、本方案計分四大類廿五項二十目，其中除「研究工作簡化，並實施使用機器代替人工，以減少機關用人費負擔」一項，併「加強行政機關人才延纜培育與運用方案」檢討辦理，由交通部、本院主計處、人事行政局及經建會等機關主管之八項係一年辦理檢討一次，本次未做檢討外，其餘大部分項目，均執行順利，僅有少部份項目進度稍落後。

二、本案執行情形檢討經簽奉院長鑒詧，並分函有關機關查照辦理。

㈥ 加強文化及育樂活動方案

主管機關：教育部　　**核定日期文號**：68.2.6台六十八教1026號函核定

期　　程：68.7～73.6

執行情形概要：（資料截至71年4月30日 止一季報）

一、本案奉　院長批示：「文化及育樂活動方案，應由文建會速行擬具，並將教育部擬訂之方案包括在內，另加新聞局，國防部各項活動一併列入，成爲全面性之方案」（依71.3.11本院秘書長台七十一教3727號函）

二、文建會正在研擬中。

㈦ 工職教育改進計畫

主管機關：教育部　　**核定日期文號**：68.2.10台六十九教1223號函核定

期　　程：68.7～71.6（第一期）

執行情形概要：（資料截至71年5月31日 止一月報）

截至5月底止總進度達97.00％，與預定相符。執行情形如下：

1. 「加強工職工科師資培育、羅致與在職進修」：協調國立台灣大學等六校，辦理電機、工程等十三科組之進修班，預定本年七月開課。

2. 「充實工科教學及實習設備」：已撥款補助台灣省充實工科設備，目前完成電器冷凍修護科、機械製圖、模具建築等科之採購招標；汽車修護、土木測量、儀表等科，預定六月完成採購訂約；化工及電子設備修護科，正辦理中。
3. 「改進工職設科、課程與畢業生之進修」：已指定省立海山高工、桃園農工進行機械及電子科課程實驗，另大安高工、木柵高工進行電機及機械類課程實驗。

(八) 加強學生視力保健重要措施

主管機關：教育部　　**核定日期文號**：69.4.24 台六十九教 4580 號函核定

期　　程：69.5～72.6

執行情形概要：（資料截至 71 年 5 月 31 日止一季報）

1.「近程措施」執行：

(1) 加強視力保健之宣傳：
　① 製作視力保健電視卡通影集十集，撰寫廣播插播詞，於電視、廣播中播出。
　② 透過報紙、雜誌、傳單、海報宣傳學生視力保健。
　③ 台北市教育局公開徵選視力保健歌詞及歌曲，廣爲宣傳。
　④ 辦理學校護士或衞生導師研習會。

(2) 繼續改善照明設備及粉板工作。
　① 台電公司普遍測量各級學校教室照明度，未達標準部份當場輔導學校改善。
　② 台北市各中、小學利用暑假整修教室燈光照明，並粉刷粉板 1,500 面。
　③ 高雄市已改善全部校舍電源與照明設備，新設學校注意採光，粉板採用標準弧形。

(3) 省市廳局已指示各校，每學期開學一週內，爲各班身材較高與較矮學生調整課桌椅高度。

(4) 購置測光錶，附燈光 E 字型視力檢查表，分發各校使用及美化環境，以增進學生健康。

(5) 調整水電費及實習、實驗費，並各校不得爲節約電費而影響室內照明度。

(6) 研訂「印製發行中、小學生課外讀物輔導要點」，公布施行。

(7) 辦理學生視力檢查，並計畫於各省之醫院等設「學生視力保健特別門診」。加強眼鏡裝配人員之訓練與管理。

2. 「中程辦法」之執行：

(1) 繼續進行防治近視各種研究實驗。

(2) 訂定學生視力保健有關法規。

(3) 充實衞生保健護士員額。

(4) 研擬「修訂國民中學課程標準總綱草案」。

3. 「長程目標」之執行：

(1) 矯正升學主義。

(2) 改進高中、高職、五專招生考試之策略，進行研究可行辦法。

(3) 加強輔導國民中、小學正常化教學。

(九) 加強推展青少年公民教育計畫

主管機關：教育部　　**核定日期文號**：68.12.13台六十八教12530號函核定

期　程：69.7～70.6

執行情形概要：（資料截至71年2月28日止一季報）

1. 七十年七月至十二月執行情形已於71.3.13報院。
2. 教育部已就本案69.7至70.6之執行情形辦理成效評估，聘請學者專家自70.10.12至70.12.22實地評估60所大專院校高中、高職、國中，10所教育行政機關，12所社教機構10所民間社團。正撰寫評估總報告中，將於近期內完成報院。

(十) 加強現階段海外華僑教育方案

主管機關：僑務委員會　　**核定日期文號**：70.1.23台七十忠授四字第00582號函核定

期　程：70.7～75.6

執行情形概要：（資料截至71年3月31日止一季報）

1. 截至3月底止總進度14.85％，符合進度。
2. 本方案內容包括六項，其執行情形分述如下：

(1) 編印適合個別地華文與當地文對照讀物：

① 將中華歷史故事以卡通連環圖方式編寫，並各配以中英文、中日文……等八種版本。

② 將中、英文對照「華語六百句」乙書翻譯中西、中法、中日、中泰文版本。

③ 由國立編譯館主編「三民主義」及「國父說故事」二書（書名未定，採連環故事圖方式編寫），預計出版後再翻印中西、中英文等版本。

(2) 拍攝教授華文之錄影與錄音電化視聽教材：改編新編美洲版華語等三冊一至十六課拍攝脚本及內外景部份。

(3) 獎勵海外部份地區僑校教師：

① 籌編下年度頒發獎金之預算：原報院之「僑民學校教師服務獎勵辦法」修正草案，經遵照指示邀請行政院秘書處、主計處、人事行政局、外交部、教育部等機關將於近期會商後報院核辦。

② 調查各僑校教師服務情形：經分函駐外機構推荐現任職僑校優良中國語文或中國歷史教師，刻正擬訂著作審查及核獎等有關事項，以憑頒獎。

(4) 鼓勵海外僑社創設華文補習班：

籌劃下年度補助中文班預算：經繼續函請駐外單位詳細查報各地中文班辦理情形，重新整理中文班名單，加以分類、籌劃補助開辦費用。

(5) 補助僑社設立社教中心供應資料器材：

函駐外使領館推荐補助單位：駐羅安琪辦事處推荐越南僑胞聚集之LINCOLN HEIGHTS地區覓得社教中心，可容納四、五百人之房舍一所，可供設置。全部房價約計美金28萬元左右，頭款約需預付美金10萬元，當地僑團如可籌足，即可在近期內設置成立。另洽金山及美國中、南部僑胞較多地區籌擬選擇中。

(6) 擴大辦理華裔青年回國研習團及觀摩團接待設備：擴建劍潭青年活動中心設備，經在七十二會計年度預算編列經費計一億八千萬元，經奉院函核定延後一年辦理。

(十) 端正政風整肅貪污方案

主管機關：人事行政局　　**核定日期文號**：68.7.8台六十八人政叁1565號函核定

期　程：經常辦理

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止一半年報）

本案一年來執行工作檢討報告，已提報71.5.13，1780次院會，院長提示要點如次：各級行政機關新進用之同仁，在到職前，宜由人事單位將有關公務人員所有應瞭解遵守之法令規章（包括十項革新措施）詳予介紹說明，或在職前訓練時，詳予講解，促請其遵守。

(十一) 加強行政機關人才延攬培育與運用方案

主管機關：行政院人事行政局

核定日期文號：70.7.25.台七十人政貳字第20344號函核定

期　程：70.7～74.4

執行情形概要：（資料截至71年5月31日止一季報）

1. 本管制案包括「流暢行政機關人事管道改進人事措施實施方案」，「行政機關組織編制與業務配合方案」，「積極推動人事革新改善政治風氣方案」之尚未辦結事項，上述各方案者即併銷。主要內容如次：

(一)實施整體公務人力規劃。

(二)流暢人事管道擴大延攬人才。

(三)加強人才培育與儲備。

(四)有效運用人力，精簡編制員額。

(五)強化基層人事，鼓勵人才下鄉。

2.本案半年執行情形已提報本院一七七一次院會，並准予備查。

㈢ 加強農村醫療保健四年計畫

主管機關：衞生署　　**核定日期文號**：67.11.15 台六十七衞字 10216 號函核定

期　　程：68.7～72.6

執行情形概要：（資料截至71年 5月31日 止一月報）

1. 截至5月底止總進度達83.30％，超前0.50％。
2. 廿五個工作項目中，已完成八項，超前一項，進度符合十項，落後五項，另一項併科技方案辦理，落後之項目爲：①「衞生所之重建及增建急診觀察病房」，②「興建村里衞生室」，③「充實省縣市立醫療院醫療設備」，④「興建醫師宿舍」，⑤「建立衞生情報庫」。主要因工程發包延誤，建地使用權取得困難，採購延誤，及IBM中文系統故障等影響。

㈣ 台灣地區環境保護方案

主管機關：衞生署　　**核定日期文號**：68.4.26 台六十八衞 3872 號函核定

期　　程：68.1～79.6

執行情形概要：（資料截至71年 5月31日 止一季報）

一、本案截至七十年三月底止，進度爲64.2％，比預定進度落後5.5％。

其中各類進度落後者摘陳如次：

1. 健全管理組織與制度：
   (1)研訂公害防治基本法。
   (2)公害防治設備示範性改善計畫之執行。
2. 改善空氣污染防治
   (1)訂定空氣污染防治各種標準。
   (2)硫氧化物及煙塵污染之治本控制問題。
3. 改善水污染防治
   (1)加強督導管制及輔導工作。
   (2)改善工業廢水污染。
4. 改善廢棄物處理：垃圾綜合處理。
5. 其他環境污染防治：公害糾紛處理法尚在草擬中。

二、有關空氣污染管制部份，本會已於71.5.11～15分三組完成查證工作，報告正在彙整中。

(十五) 加強食品衛生管理方案

主管機關：衞生署　　**核定日期文號**：70.7.28 台七十衞字 10603 號函核定

期　　程：70.7～73.6

執行情形概要：（資料截至71年 3 月31日止一季報）

本案奉院核定自 71 年度開始實施，本院衞生署遵照核定方案內容，策訂實施計畫，經陳奉院長核「可」由本會已五送衞生署在案。本案正按照實施計畫執行中。

(十六) 加強B型肝炎防治計畫

主管機關：衞生署　　**核定日期文號**：70.8.24 台七十衞字第12099 號函核定

期　　程：

執行情形概要：（資料截至71年3月 31日一季報）

1. 肝炎患者病情資料追蹤部份—經費尚在國科會審議中，本會實施追蹤。
2. 加強B 型肝炎防治衞生教育部份—衞生署正研訂分項計畫中。
3. 肝炎研究部份—執行進度落後，請衞生署加強辦理。
4. 預防肝炎傳染部份—經常辦理中。

(十七) 七十一年度青年就業輔導措施

主管機關：青年輔導委員會　　**核定日期文號**：70.6.18 台七十青字第 8354 號函核定

期　　程：70.7～71.6

執行情形概要：（資料截至71年5月 31日止一季報）

1. 截至三月底止，總進度 90.76％，超前 12.04％。
2. 五類廿六個執行項目中，十一項進度符合，十一項超前，四項及三小項落後。
3. 落後項目分述如下：
   (1) 「乙級船員訓練 1,000人」，截至七十一年三月底止已招訓 435 人，落後 17％
   (2) 「中央省市及各縣市選舉委員會進用大專及高中職畢業青年 50 人」，本年一至三月因未辦理選舉，無法進用臨時人員，落後 20％。
   (3) 「各縣市文化中心進用50人」，各縣市文化中心除高雄中正紀念堂上年度業已落成，進用部份臨時及服務人員 5、6 人外，餘皆因營建進度落後，尚未正式成立，目前無法進用人員。落後 40％。
   (4) 「高雄市國民就業輔導所 150人」，截至三月底止，共輔導 105 人就業。落後 10％。
   (5) 「金融保險人員及關稅務人員特考預計錄取 1,500 人」，七十年十二月金融特考共錄取 645 人。落後 37％。
   (6) 「設置 50 名額安排已回國者擔任短期研究工作」，本期已推介四人。落後 10％。

(7) 「協助回國創業5至10名」，本期已協助二人回國創業。落後5%。

(六) 科學技術發展方案

主管機關：國科會等　　**核定日期文號**：68.5.29行政院秘書長台六十八秘字第5196號函核定

期　程：68年～70年（第一次中期計畫）

執行情形概要：（資料截至71年6月15日止）

1. 本方案計191項（節），由院列管34項；各部會及省市政府自行列管157項。
2. 截至70年12月底止，業已完成45節，正在辦145節。尚在協調研議中1節。
3. 本院第二次科學技術會議，已於71年2月8日至11日召開，分下列八個中心議題，分組研討。
   (1) 促進人才培育及延攬國外人才之策略。
   (2) 建立國內基礎科學研究之環境
   (3) 如何有效進行技術引進移轉及建立科技密集工業之有利條件。
   (4) 重點科技之發展。
   (5) 如何促進建教合作及政府與企業之分工合作暨提高民間企業對研究發展之投資意願
   (6) 如何調整農業研究方向與內涵，使有助於解決當前農業重大問題。
   (7) 如何促進醫藥衞生之研究發展以提高技術水準。
   (8) 政府組織及人事預算制度與科技發展之配合。
4. 本案經簽奉院長批示，請本院國科會修正報院。業經本會71.2.2(71)會管字第0315號函請辦理。
5. 國科會已於71年3月23日、5月13日及5月14日召開科技方案修訂會議，修正草案預定於7月1日前報院。

(十九) 提高農民所得加強農村建設方案

主管機關：農發會綜合　　**核定日期文號**：67.12.16台六十七經1125號函核定

期　程：68.7.1～71.6.30

執行情形概要：（資料截至71年3月31日止一季報）

本方案第三季（1～3月）執行情形，已完成總進度72.13%，較預定超前0.13%，其各項執行如次：

1. 「推動第二階段農地改革，提高農業生產力」，進度73.00%，落後0.48%。
2. 「促進計畫產銷，穩定農產價格」，進度73.79%，超前0.79%

3. 「加強農業公共設施」，進度 60.74％，落後 5.26％。
4. 「加強農業試驗與推廣」，進度 73.62％，超前 0.62％。
5. 「加強農村福利措施」，由省府專案列管。
6. 「推動農業區域發展專案計畫」，進度爲 64.05％，超前 0.05％。
7. 「其他」實際進度與預定進度相符進度爲 73.60％，超前 0.6％。

(二) 台北地區防洪計畫初期實施計畫

主管機關：台灣省政府　　**核定日期文號**：68.1.11 台六十八經 352 號函核定

期　程：68.7～73.6

執行情形概要：（資料截至 71 年 5 月31日 止一月報）

截至 5 月底總進度達 44.05％，落後 4.03％，辦理情形及檢討概述如下：

1. 「工程用地」：台北縣政府繼續辦理發放補償費、辦理漏估、複估地上物補償及編造清冊。三重堤防工程用地內之構造物已強制執行拆除完畢。進度落後 3.80％。
2. 「排水工程」：溪美排水幹線 B 工程，因用地尚在征收中無法施工，其餘各線已施工或完成。進度達42％與預定相符。
3. 「防洪工程」：蘆洲堤防工程與榮工處議價中，預定六月可動工。編製疏洪道左、右岸第二段堤防工程預算書初稿，入口工程預算書。三重堤防工程積極趕工中。進度落後 5.79％。
4. 「疏洪道橋工程」：設計原則經省建設廳與有關單位協調後仍採暫建過水路橋方式，現正辦理規劃設計中。
5. 本計畫第五次半年執行檢討報告已提 71.5.6. 第 1779 次院會。請台省府、北市府及經濟部照院會決定辦理。

(三) 提高行政效率加強爲民服務方案

主管機關：行政院研究發展考核委員會

核定日期文號：69.8.2 台六十九研展 2100 號函核定

期　程：經常辦理

執行情形概要：（資料截至 71 年 2 月 28 日止一半年報）

本案七十年七月至十二月之各機關執行情形，經簽陳　院長鑒核，五十五目工作中，奉准繼續列管者十一目：(1)推動各部門策訂各期程之計畫；(2)研究建立建築師責任制度；(3)研訂辦法解決未辦工商登記之工商事業，其取締與繳稅問題；(4)訂定「爲民服務工作考核與獎

懲要點」並定期舉辦查證；(5)擬訂「加強公文處理管制作業要點」並定期考核評估；(6)推動各機關建立資訊組織體系；(7)建立行政機關資料管理及交流制度及政府出版品管理制度；(8)定期檢討評估各機關會議之效果，加以改進；(9)修訂「事務管理手冊」；(10)完成「行政機關組織通則」草案；(11)訂定「各機關分層負責考核辦法」。以上各目工作每半年提送執行情形，七十一年元月至六月底執行情請各機關於七十一年七月十日前填送本會，以利彙辦，其餘各目工作由各機關自行列管。

十、公文時效統計分析

(一)綜合分析

71年 4 月份

申請案件統計圖

收件總計 272,192 件



訴願案件統計圖

收件總計 2,833 件



一般公文時效統計表

71年 4 月份

收件總數：425,756件
發文平均使用天數：3.81天

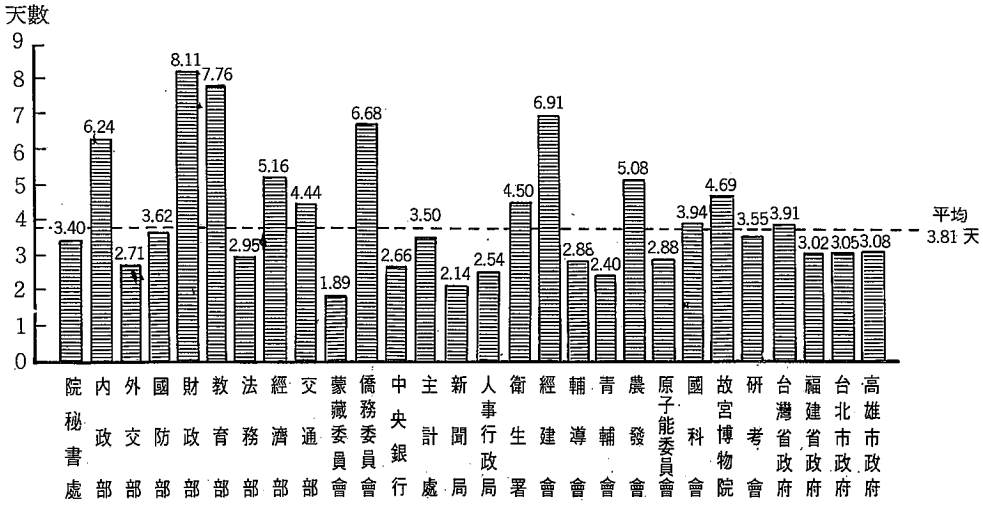

(二) 各機關

1. 一 般 公

數量項目 / 機關	收文統計 合計	收文統計 本月新收來文	收文統計 截至上月未辦件數	本月份 合計	本月份 發文小計	本月份 1—3天辦結 件數	本月份 1—3天辦結 %
總計	425,756	382,462	43,294	442,582	239,456	164,897	69
院秘書處	2,501	2,490	11	2,498	1,292	928	72
內政部	4,686	2,645	2,041	3,367	1,914	848	44
外交部	13,133	12,967	166	14,548	8,941	7,661	86
國防部	16,500	15,423	1,077	20,116	9,482	5,958	64
財政部	10,927	9,444	1,483	10,044	4,280	1,206	28
教育部	7,268	6,979	289	6,969	3,508	894	25
法務部	4,626	4,348	278	4,302	3,349	2,849	85
經濟部	8,199	7,848	351	9,022	4,561	2,502	55
交通部	6,053	5,570	483	6,006	2,447	1,521	62
蒙藏委員會	485	413	72	572	160	133	83
僑務委員會	2,509	2,395	114	2,762	1,219	439	36
中央銀行	4,216	3,780	436	3,842	1,662	1,419	85
行政院主計處	3,088	2,811	277	3,175	1,354	1,048	77
新聞局	2,909	2,883	26	3,695	1,932	1,613	83
人事行政局	5,276	5,113	163	5,393	3,436	2,821	82
衞生署	4,302	4,210	92	4,798	2,353	1,452	62
經濟建設委員會	648	551	97	740	296	115	39
國軍退除役官兵輔導委員會	12,427	11,034	1,393	13,502	8,131	6,130	75
青年輔導委員會	1,632	1,621	11	1,682	1,251	1,146	92
農業發展委員會	2,325	2,228	97	2,196	534	302	57
原子能委員會	1,052	993	59	1,183	555	432	78
國家科學委員會	2,152	1,875	277	2,355	1,270	763	60
故宮博物院	396	360	36	419	174	90	52
行政院研究發展考核委員會	967	886	81	947	255	181	71
臺灣省政府	108,750	95,579	13,171	108,321	61,171	39,857	65
福建省政府	46	45	1	57	16	15	95
臺北市政府	150,856	133,529	17,327	154,911	82,480	57,849	70
高雄市政府	48,879	45,435	3,444	55,160	31,433	24,725	79
臺灣省各縣(市)政府	192,387	169,909	22,478	193,018	119,752	74,581	63
臺北市各區公所	19,549	19,013	536	25,753	14,613	14,127	97
高雄市各區公所	14,683	12,219	2,464	15,417	12,452	11,964	96

資料來源：各主管機關

備　　註：一、台灣省各縣(市)政府，及台北、高雄市各區公所數字，未列入本表總計欄內統計。

二、本表在顯示不同性質機關公文的數量與時效分佈狀況，其平均天數的高低，不作爲績效比較之依據。

分類統計

文 統 計

71年4月份

已結案件統計										存查	本月份待辦統計	
4—6天辦結		7—15天辦結		16—30天辦結		31天以上辦結		平均天數	文標準差		件數	%
件數	%	件數	%	件數	%	件數	%					
47,720	**20**	**23,128**	**10**	**3,288**	**1**	**423**	**0**	**3.81**	**3.71**	**203,126**	**41,112**	**9**
184	14	143	11	30	2	7	1	**3.40**	3.24	1,206	3	0
732	38	164	9	61	3	109	6	**6.24**	7.37	1,453	1,319	28
937	10	309	3	34	1	–	–	**2.71**	2.21	5,607	171	1
2,522	26	883	9	114	1	5	0	**3.62**	4.66	10,634	1,043	6
1,562	36	934	22	466	11	112	3	**8.11**	7.32	5,764	1,352	12
1,137	32	1,187	34	289	8	1	0	**7.76**	5.81	3,461	299	4
361	11	124	4	15	1	–	–	**2.95**	2.06	953	324	7
1,180	26	650	14	204	4	25	1	**5.16**	5.31	4,461	265	3
556	23	309	13	54	2	7	0	**4.44**	4.26	3,559	413	7
23	14	3	2	1	1	–	–	**1.89**	2.91	412	19	4
247	20	421	35	112	9	–	–	**6.68**	7.23	1,543	111	4
97	6	96	6	44	3	6	0	**2.66**	4.71	2,180	448	11
186	14	88	7	25	2	7	0	**3.50**	4.11	1,821	269	9
254	13	65	3	–	–	–	–	**2.14**	2.46	1,763	37	2
497	14	118	4	–	–	–	–	**2.54**	2.14	1,957	214	4
607	26	194	8	73	3	27	1	**4.50**	5.10	2,445	71	2
101	34	53	18	21	7	6	2	**6.91**	6.40	444	68	11
1,354	17	625	8	21	0	1	0	**2.88**	3.11	5,371	1,001	8
74	6	31	2	–	–	–	–	**2.40**	1.54	431	39	2
118	22	92	17	22	4	–	–	**5.08**	4.96	1,662	129	6
67	12	46	8	10	2	–	–	**2.88**	3.47	628	68	6
292	23	168	13	37	3	10	1	**3.94**	5.49	1,085	357	16
44	25	34	20	6	3	–	–	**4.69**	5.33	245	37	9
40	16	32	12	2	1	–	–	**3.55**	3.66	692	135	14
14,082	23	6,563	11	594	1	75	0	**3.91**	3.51	47,150	12,104	11
–	–	1	5	–	–	–	–	**3.02**	1.48	41	2	4
15,764	19	7,939	10	912	1	16	0	**3.05**	3.99	72,431	16,952	11
4,702	15	1,856	6	141	0	9	0	**3.08**	2.68	23,727	3,930	8
25,433	21	16,717	14	2,804	2	217	0	**4.46**	4.35	73,266	22,832	12
411	3	74	1	1	0	–	–	**1.26**	1.90	11,140	408	2
376	3	106	1	6	0	–	–	**2.18**	1.06	2,965	2,911	20

2. 人民申請案件統計

71年 4 月份

項目 數量 機關	收件統計			本月份已結案件統計					本月份待辦統計	
	合計	本月份新收件數	截至上月份未辦件數	合計	依限辦出		逾期辦出		件數	%
					件數	%	件數	%		
總計	287,258	272,192	15,066	271,804	269,431	99.13	2,373	0.87	15,454	5.38
內政部	371	359	12	325	310	95.38	15	4.61	46	12.39
外交部	50,273	49,921	352	50,036	49,960	99.85	76	0.15	237	0.47
財政部	143	121	22	131	125	95.42	6	4.58	12	8.39
法務部	9	9	-	9	9	100.00	-	-	-	-
經濟部	2,637	2.606	31	2,598	2,577	99.19	21	0.81	39	1.48
教育部	1,779	1,779	-	1,779	1,779	100.00	-	-	-	-
交通部	3,057	2,985	72	2,925	2,871	98.15	54	1.85	132	4.32
僑務委員會	23,715	23,701	14	23,691	23,325	98.46	366	1.54	24	0.10
中央銀行	4,980	4,501	479	4,621	4,570	98.90	51	1.10	359	7.21
新聞局	6,294	6,263	31	6,245	6,245	100.00	-	-	49	0.78
衛生署	1,512	1,502	10	1,505	1,488	98.87	17	1.13	7	0.46
青年輔導會	61	61	-	61	61	100.00	-	-	-	-
臺灣省政府	15,467	14,304	1,163	14,250	14,207	99.70	43	0.30	1,217	7.87
台北市政府	141,600	129,939	11,661	129,166	127,481	98.70	1,685	1.30	12,434	8.78
高雄市政府	35,360	34,141	1,219	34,462	34,423	99.89	39	0.11	898	2.54
臺灣省各縣（市）政府	45,468	37,405	8,063	36,578	33,747	92.26	2,831	7.74	8,890	19.55
台北市各區公所	2,006	2,004	2	2,003	2,003	100.00	-	-	3	0.15
高雄市各區公所	1,025	1,025	-	1,022	1,022	100.00	-	-	3	0.29

資料來源：各主管機關

備　　註：台灣省各縣（市）政府，台北市、高雄市各區公所數字，未列入本表總計欄內統計。

3. 訴願案件統計

71年4月份

項目 數量 機關	收件統計			本月份已結案件統計					本月份待辦統計	
	合計	本月份新收件數	截至上月未辦件數	合計	依限辦出		逾限辦出		件數	%
					件數	%	件數	%		
總計	4,576	2,833	1,743	2,815	2,757	97.94	58	2.06	1,761	38.48
院秘書處	945	870	75	881	881	100.00	-	-	64	6.77
內政部	120	45	75	33	33	100.00	-	-	87	72.50
國防部	6	2	4	3	3	100.00	-	-	3	50.00
財政部	740	94	646	198	176	88.89	22	11.11	542	73.24
經濟部	1,687	1,323	364	1,344	1,344	100.00	-	-	343	20.33
教育部	12	12	-	12	12	100.00	-	-	-	-
衛生署	43	43	-	43	43	100.00	-	-	-	-
臺灣省政府	726	282	444	178	178	100.00	-	-	548	75.48
臺北市政府	219	121	98	71	35	49.30	36	50.70	148	67.58
高雄市政府	78	41	37	52	52	100.00	-	-	26	33.33

資料來源：各主管機關
