

強化基本設施補助 自主管理作為

國家發展委員會
管制考核處

大 綱

壹、緣起

貳、問題研析

參、推動策略

肆、具體措施

伍、優良案例

壹、緣起

人民對行政效能的期許


院長指示

各部會首先必須落實「減法原則」，要能做到「減人、減事」，制定與落實具有長期目標的核心業務

秘書長提示

請國發會就現行管考項目及機制，朝簡化、鬆綁、放寬(減少管考頻率)等方向積極檢討

管考制度變革方向

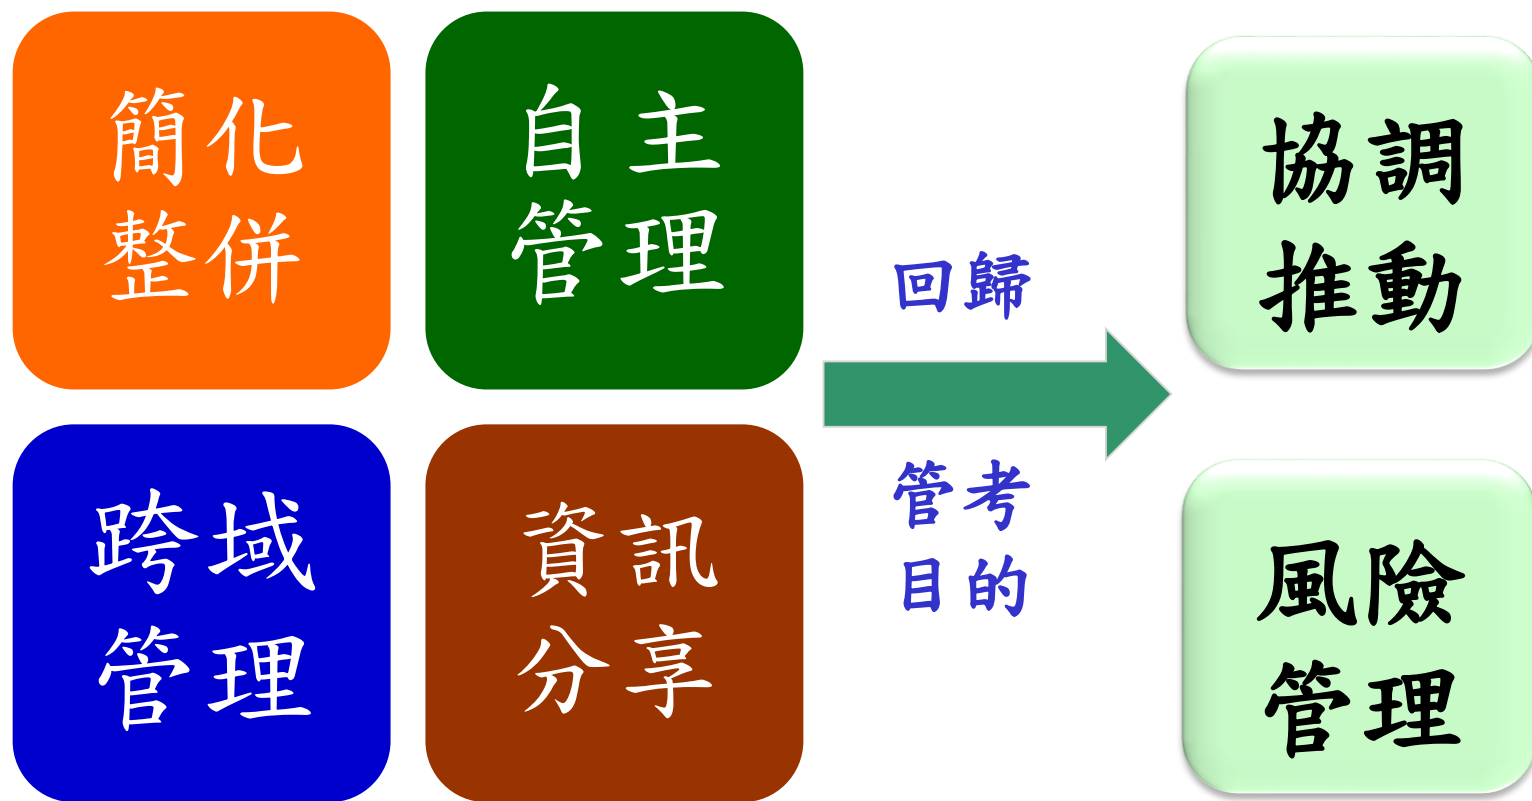

管考簡化三原則

1

強化自主管理，落實分層課責

2

善用差別性管考，提升執行績效

3

多元管考作為，減少表報作業

基層立即有感之簡化措施

大幅簡化基本設施補助計畫管考

105年

調降管考頻率，
由每月填報改為每季

以現有管考系統取代
年終書面績效報告

減少書面審核
與簡化欄位

推動

106年

地方政府
自主管理

貳、問題研析

問題研析

- (一)目前各地方政府主要以行政管考為主，
尚可進一步加強品質管考及策略管考等
創新作為
- (二)各地方政府計畫管理能力，影響管考機
制之建置及效益
- (三)標案規劃及管理能力的仍可進一步強化

問題研析

(四)地方政府主辦人員流動

(五)地方自行辦理查證，後續追蹤仍有待
落實

(六)首長重視程度影響計畫執行成效

參、推動策略

三大推動策略

盤點檢討，源頭減量

院級先行，帶動各級

基層反映，優先解決

管考需求來源

政府回應民眾對施政績效的期待

外部監督的要求

災害應變處理

機關內部管理需求

新增業務的需求

推動策略

- (一) 結合管考作業簡化，輔導地方政府強化自主管理能力，並逐步朝向品質管考及策略管考，以提升治理能力
- (二) 組成本會與地方研考人員中階主管群組，以輔導各地方政府強化計畫管理能力，提升治理量能
- (三) 強化標案管理規劃與事前溝通協調

推動策略

(四)持續加強網路管考及系統操作

(五)逐步推動資訊公開，促進府際合作與
經驗交流

(六)建議地方政府常設協調督導機制

肆、具體措施

簡化步驟

1、延續性或經常性業務，去任務化

2、業務重複列管者，檢討整併

3、仍有管考必要性者，再行簡化

簡化做法

管考週期放寬

- 依據風險性、重要性及時效性設定彈性的管考頻率
- 原則鬆綁週期，針對風險較高項目採例外管理

管制項數減少

- 集中資源管考跨部會及重要關鍵項目
- 機關自主管理、分層課責
- 併案管考

表格內容精簡

- 剔除不必要欄位
- 基本資料共享，減少重複填報

組成管考社群



記事本

相簿

成員



各位地方研考伙伴大家好:
歡迎加入【管考後花園】，
在這麼多群組流竄的年代中，這[後花園]要做什麼!
[後花園]不是前台，所以可以放鬆交流!
[後花園]不是團購園，所以不會有人跟你要錢!
[後花園]不是宮廷園，所以可以天馬行空，前瞻或回顧!
總之，歡迎大家，本群組自即日起試營運，公測三個月，
歡迎大家，激盪智慧資本、累積綿密社會資本，
讓我們業務整合資源、持續躍升前瞻、穩健前進!



國家發展委員會

NATIONAL DEVELOPMENT COUNCIL

管考後花園(13)



今天

行政院院會報告-長期照顧十年計畫2.0報告.pdf

下載期限：~6月9日 上午10:49
檔案大小：1.4 MB

上午10:49

林盛豐委員簡報檔.docx

下載期限：~6月9日 上午10:...
檔案大小：29 KB

上午10:50



康康



10:50



國家發展委員會

NATIONAL DEVELOPMENT COUNCIL

自主管理系統更新



自主管理及公開成果資訊登錄

縣市別	臺北市府
執行機關	請選擇
類別	實地查證（工程查核）

統計件數：7件

項次	縣市別	執行機關	類別	次數
1	臺北市府	臺北市府文化局	實地查證（工程查核）	3
2	臺北市府	臺北市府工務局水利工程處	實地查證（工程查核）	1
3	臺北市府	臺北市府消防局	實地查證（工程查核）	1
4	臺北市府	臺北市府環境保護局	實地查證（工程查核）	1
5	臺北市府	臺北市府警察局	實地查證（工程查核）	1

自主管理系統更新



自主管理及公開成果資訊登錄-新增

縣市別	臺北市府
執行機關	臺北市府文化局
類別*	請選擇 ▼
日期*	
網址連結	
內容*	字數限制：1000字。
附檔	瀏覽 注意事項： 1.上傳格式包含word、pdf等格式。 2.上傳檔案大小限制5MB以下。

自主管理系統更新



自主管理及公開成果資訊登錄-編輯

縣市別	臺北市府										
執行機關	臺北市府文化局										
類別*	實地查證（工程查核）▼										
日期*	106.2.1										
網址連結	http://www.gov.taipei/test										
內容*	測試 測試 測試 字數限制：1000字。										
附檔	瀏覽										
	<table border="1"><thead><tr><th>項次</th><th>文件名稱</th><th>上傳時間</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>公文</td><td>106.2.1</td><td> 編輯刪除 </td></tr></tbody></table>			項次	文件名稱	上傳時間		1	公文	106.2.1	編輯刪除
	項次	文件名稱	上傳時間								
1	公文	106.2.1	編輯刪除								
注意事項： 1.上傳格式包含word、pdf等格式。 2.上傳檔案大小限制5MB以下。											

伍、優良案例



案例一：臺中市政府管考簡化

管考系統整合優化行動計畫



目標

簡化表件

整合共享

職能提升

系統整合

案例一：臺中市政府管考簡化

管考系統整合優化行動計畫



目標二：系統整合與建置，效率提升

改善計畫	計畫期程	權責單位
建置和平計畫、28區重大建設及市長/副市長承諾事項管考系統	8月底(已完成，最後測試中)	管考組、資訊中心
人民陳情系統稽催層級設定	9月底	為民服務組、資訊中心
專案暨計畫管考平台-議事系統操作介面改善	12月底	管考組、資訊中心
標案管考系統與工程會標案管理系統整合	中長程計畫	管考組、資訊中心

案例一：臺中市政府管考簡化

管考系統整合優化行動計畫



目標三：職能提升，事半功倍

改善計畫	計畫期程	權責單位
開辦計畫管理課程，運用座談機制分享管考經驗，強化各機關研考功能	每年辦理	研展組、管考組
設置網路學習專區	12月底前	資訊中心



案例一：臺中市政府管考簡化

管考系統整合優化行動計畫



策略

● 積極與中央政府對話

- 善用每次開會時間，ex.市長參加行政院會、中央召開檢討會議
- 發文請求協助，ex.帳號密碼

● 首長支持與堅持

- 隨時表達關心與注意

● 廣納各方意見

- 召開座談會
- 平時利用各方管道、廣為蒐集民意


案例一：臺中市政府管考簡化

管考系統整合優化行動計畫--
基本設施補助計畫管考作業



現階
段成效

取消年終書面評核報告

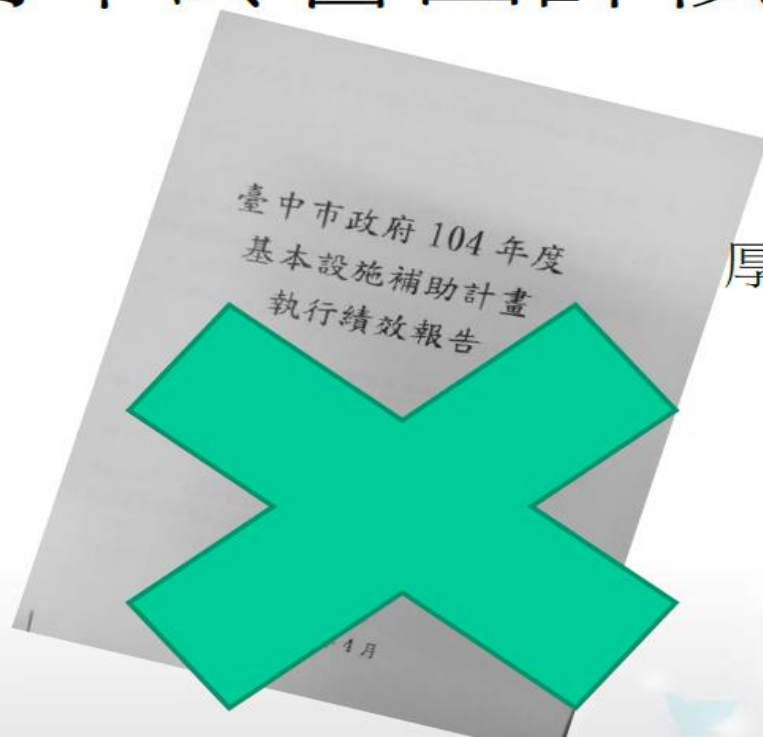

厚達42頁

案例二：屏東縣政府簡化欄位及開發行動版

透過行動設備
隨時隨地可了解
案件執行狀況



案例二：屏東縣政府簡化欄位及開發行動版

承辦人填報容易

1. 填檢核點
2. 每月填報進度

屏東縣政府

大潮州人工湖周邊取水設施改善工程

修改檢核點（工作進度）

版本	預訂完成時間	預訂達成目標或完成工作
1	2016年11月	用地取得
1	2016年12月	土地同意書取得
1	2017年01月	規劃設計
1	2017年02月	完成基本設計
1	2017年03月	預算書圖核定
1	2017年04月	上網招標
		決標、開工
		基礎工程

送出存檔

不可移動，可複製

- 水利工程
- 各類活動案件
- 委託研究案件
- 規劃設計案件
- 系統(網站)建置
- 財務採購案件
- 建築工程
- 景觀工程
- 古蹟修復工程

屏東縣政府

大潮州人工湖周邊取水設施改善工程

每月填報進度

版本	預訂完成時間	預訂達成目標或完成工作	選擇	實際完成日期	落後原因及改進方式	操作
1	2016年11月	用地取得	完成 落後			確定送出
1	2016年12月	土地同意書取得	完成 落後			

案例二：屏東縣政府簡化欄位及開發行動版 執行成果

手機畫面



電腦畫面



簡報完畢 敬請指導

